




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

sábado 16 de mayo de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	1.211
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	1.215
Central La Tablada	-98
Central P. del Tigre	5.974
APR A	2.083
APR B	2.169
APR C	1.923
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	-0
C. Baygorria	-6
C. Palmar	0
C. Salto Grande	6.946
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	5.469
TOTAL Generación	25.671

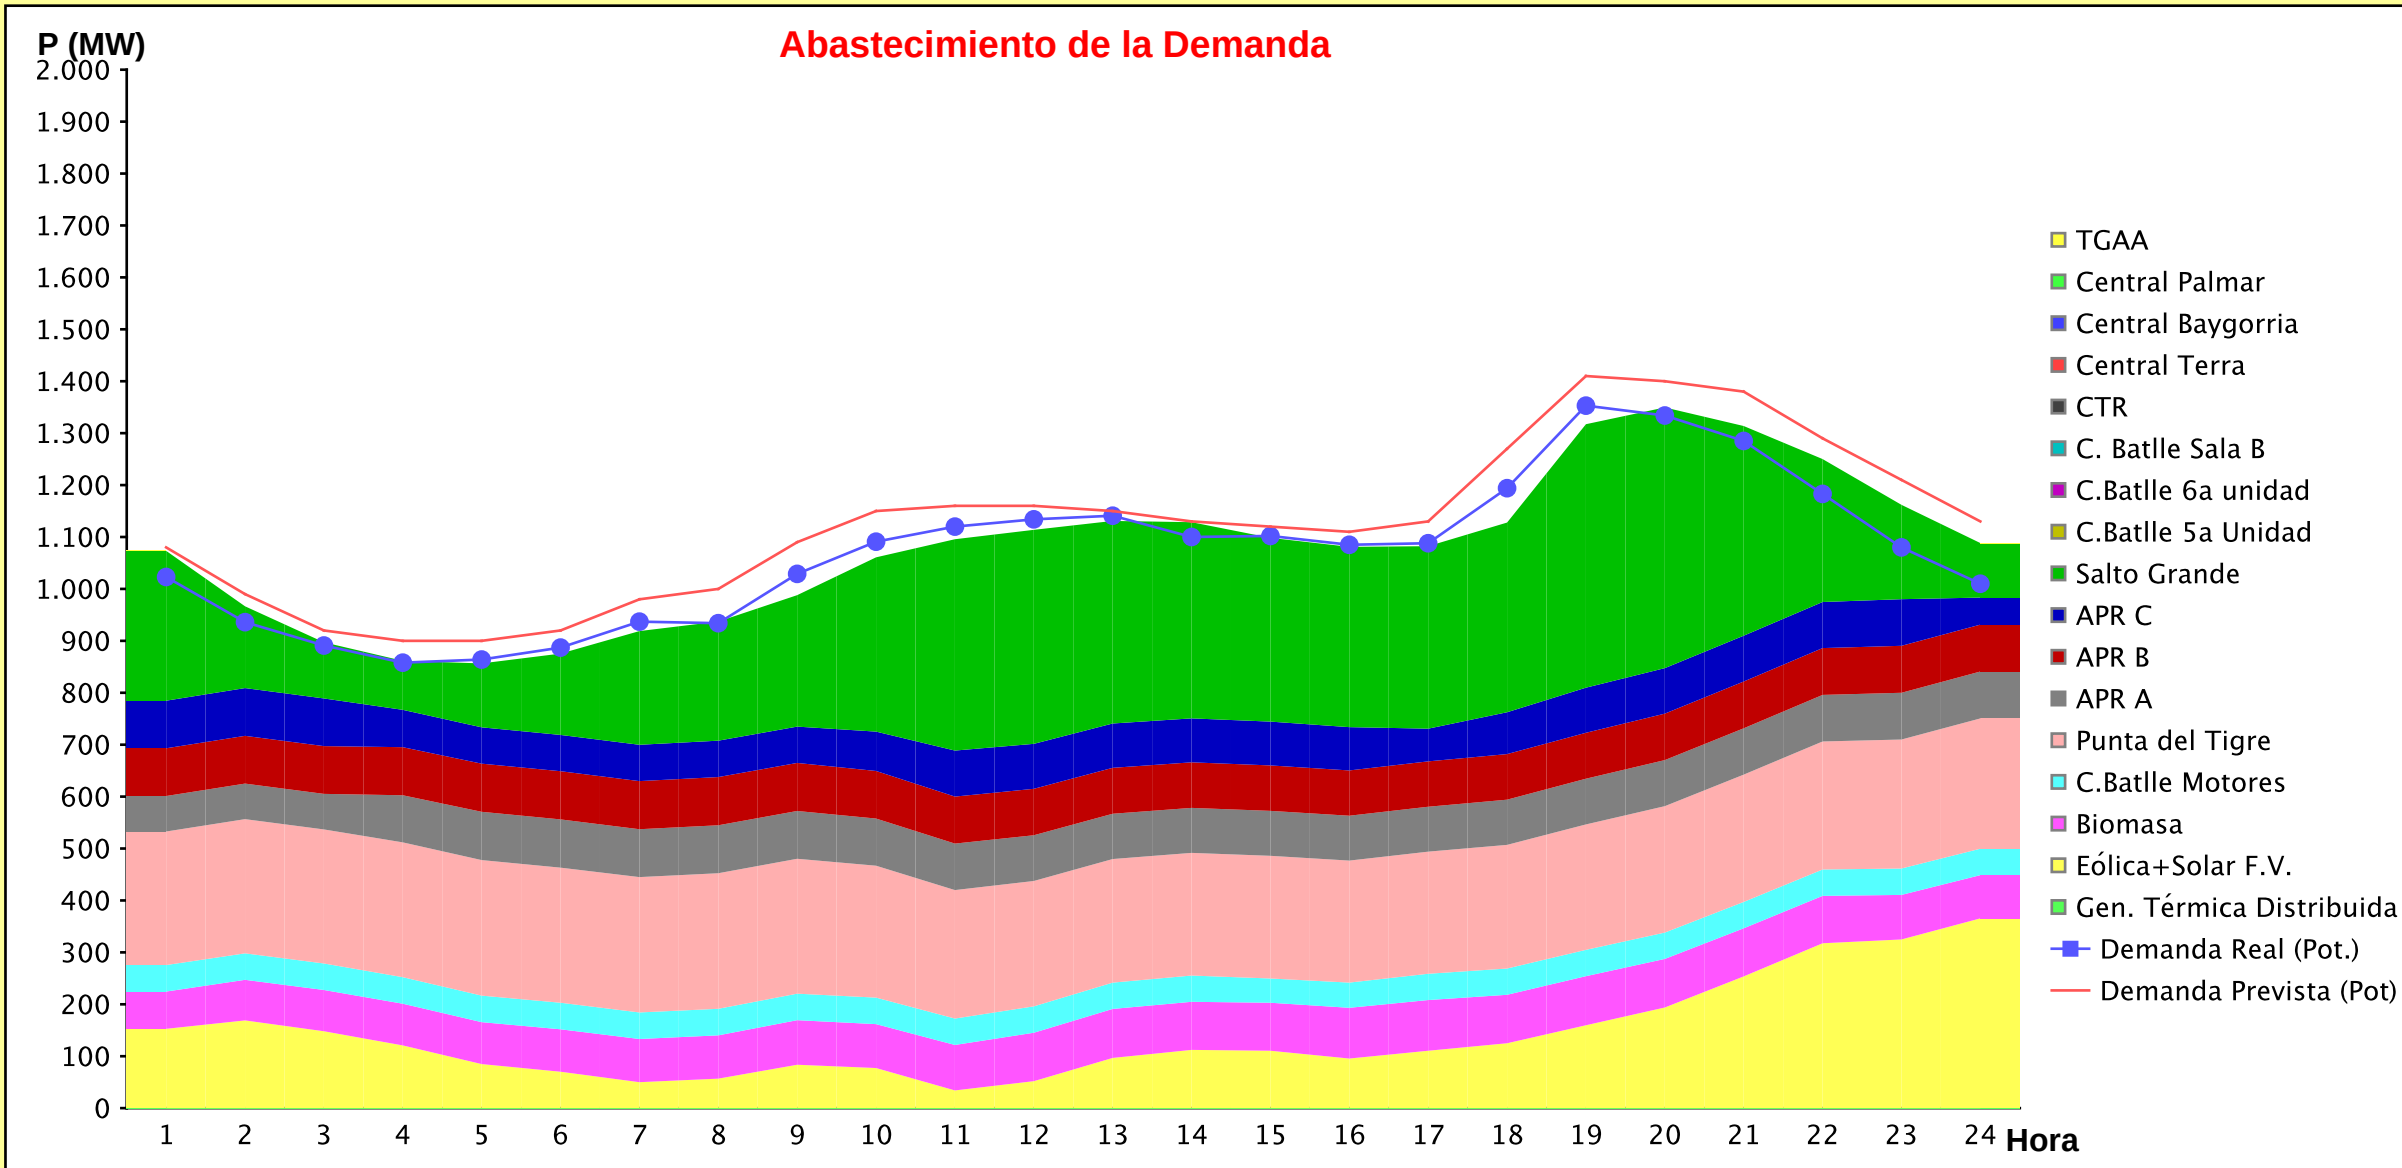

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0


DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	25.671
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	26.980
Diferencia (MWh)	-1.309
Ejecutada - Programada	-4,85 %

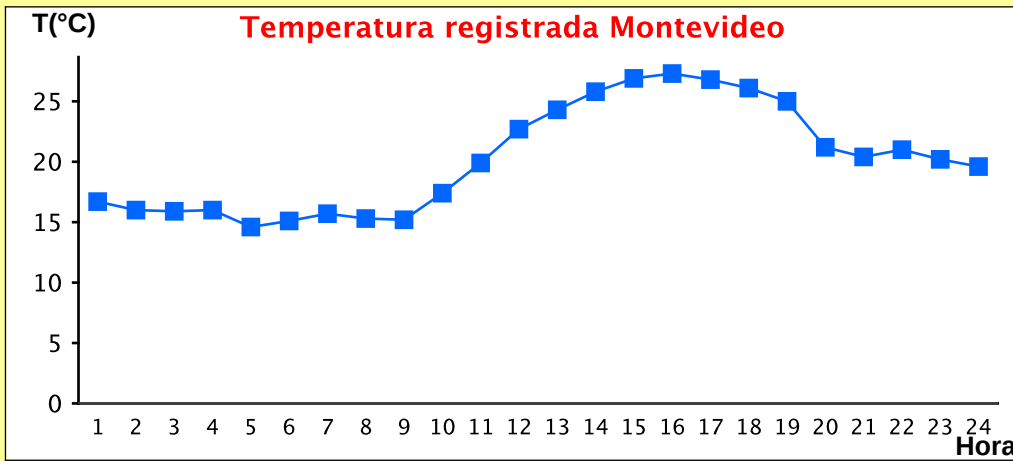


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1152,29 Hora 13:06
Potencia mínima:	840,39 Hora 04:19
Pico noche:	1360,68 Hora 19:05

Generación Media (MW)	
Eólica	140,8
Biomasa	87,9
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0


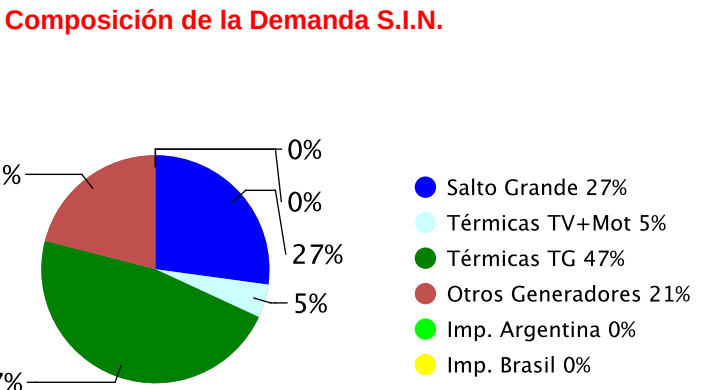


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

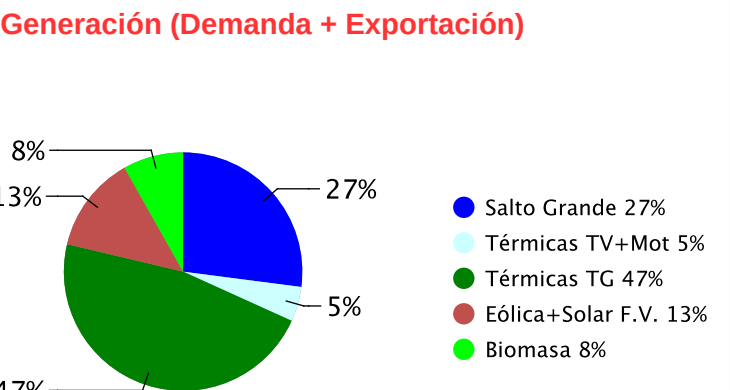



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

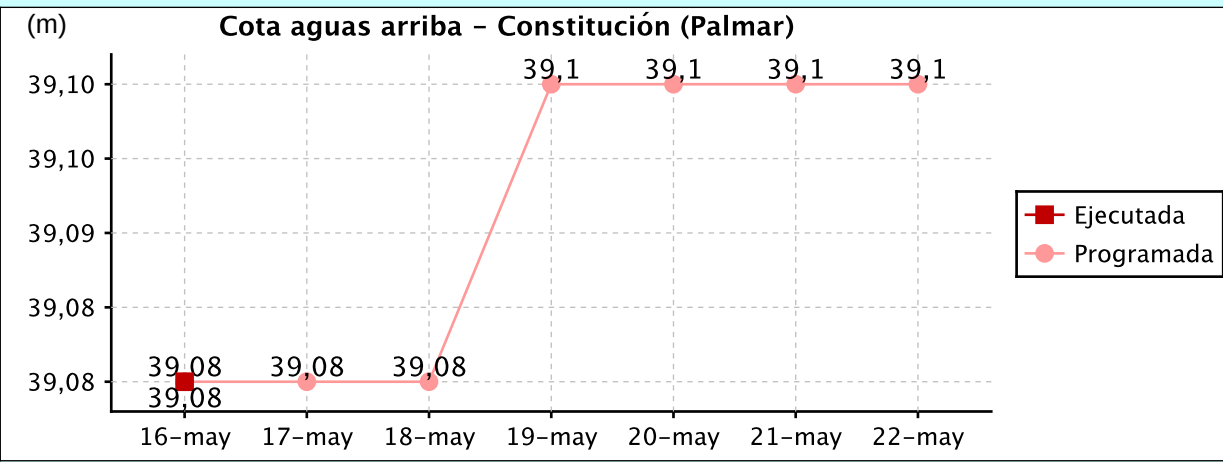
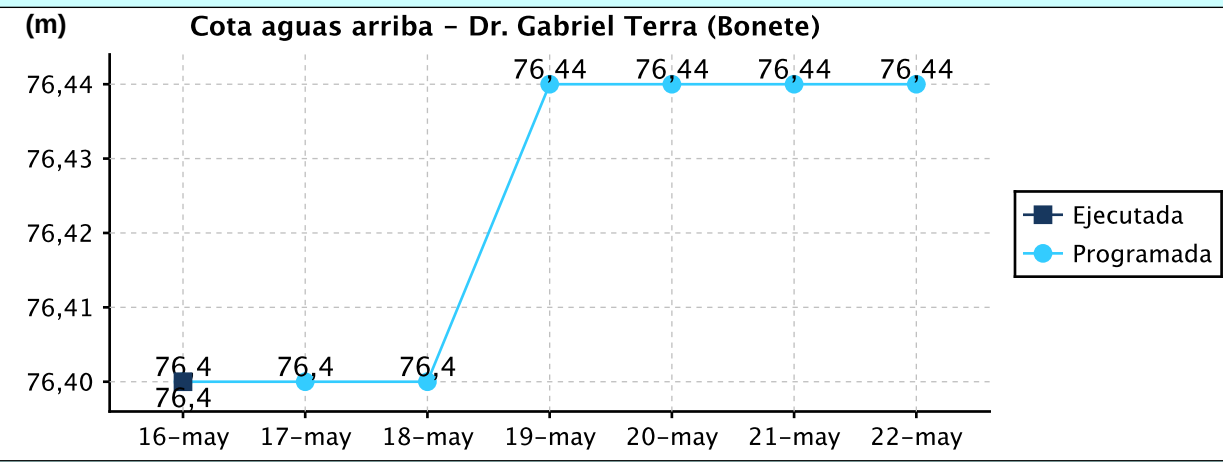


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,40	76,4
Baygorria	53,98	53,94
Palmar	39,08	39,08
SGU	34,19	34,19

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

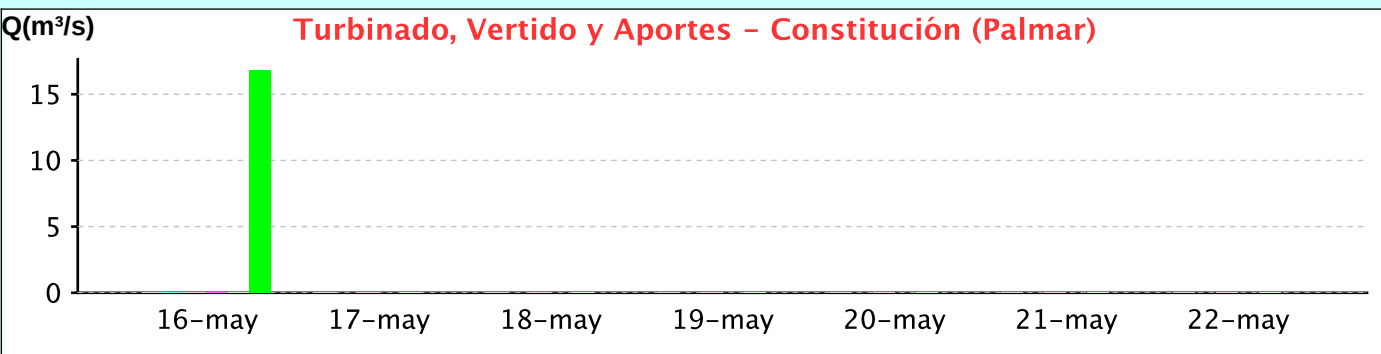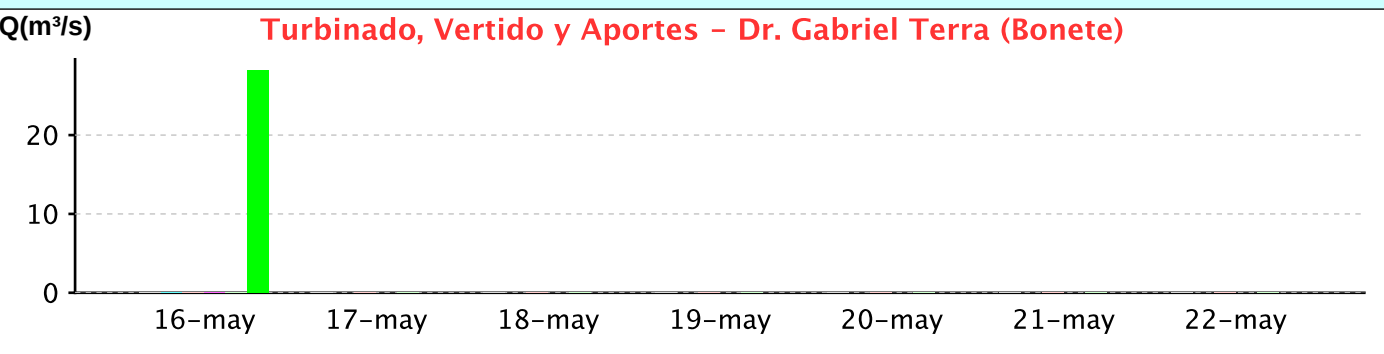

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

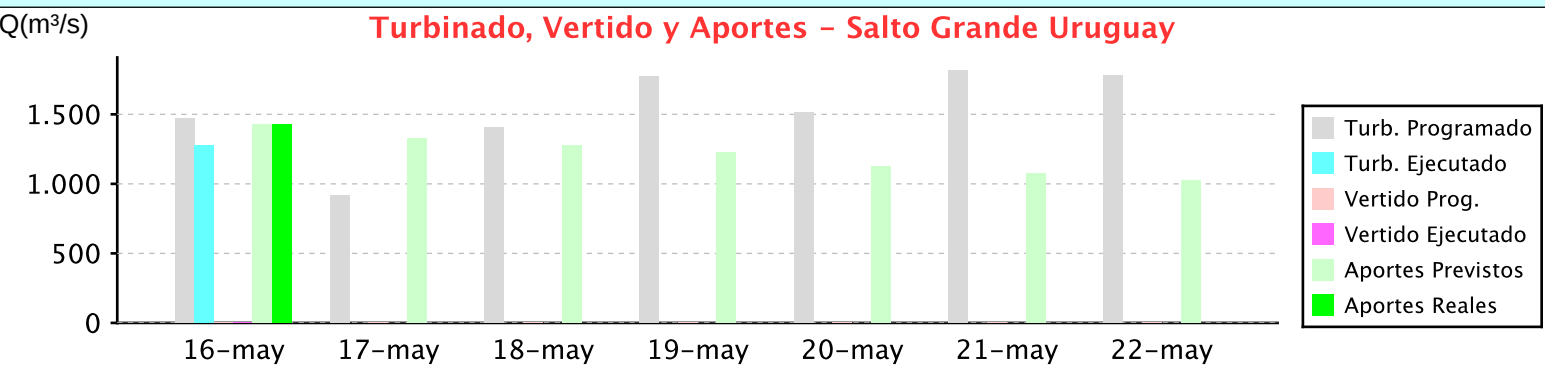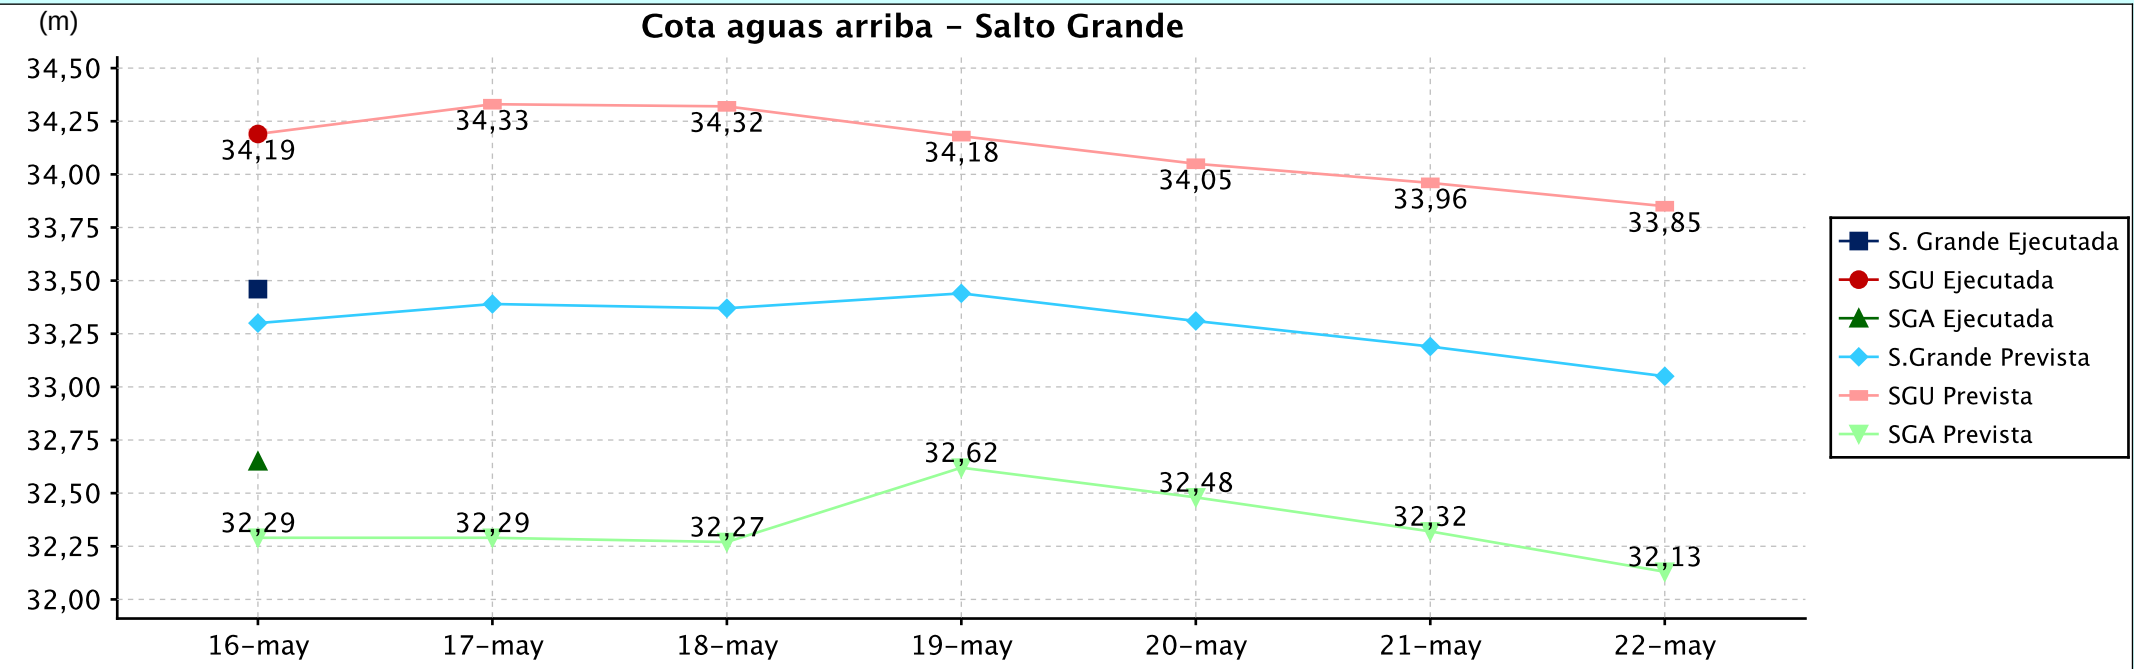

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,19
Cota Vista Arg	32,65
Cota real	33,46
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
29.466	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	1.470	1.278

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	28
Baygorria	0	-4
Palmar	0	17
SGU	1.425	1.427

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
