




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

domingo 17 de mayo de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	1.208
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	1.212
Central La Tablada	-101
Central P. del Tigre	5.731
APR A	1.654
APR B	1.389
APR C	1.173
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	-0
C. Baygorria	-6
C. Palmar	0
C. Salto Grande	4.605
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	7.427
TOTAL Generación	23.079

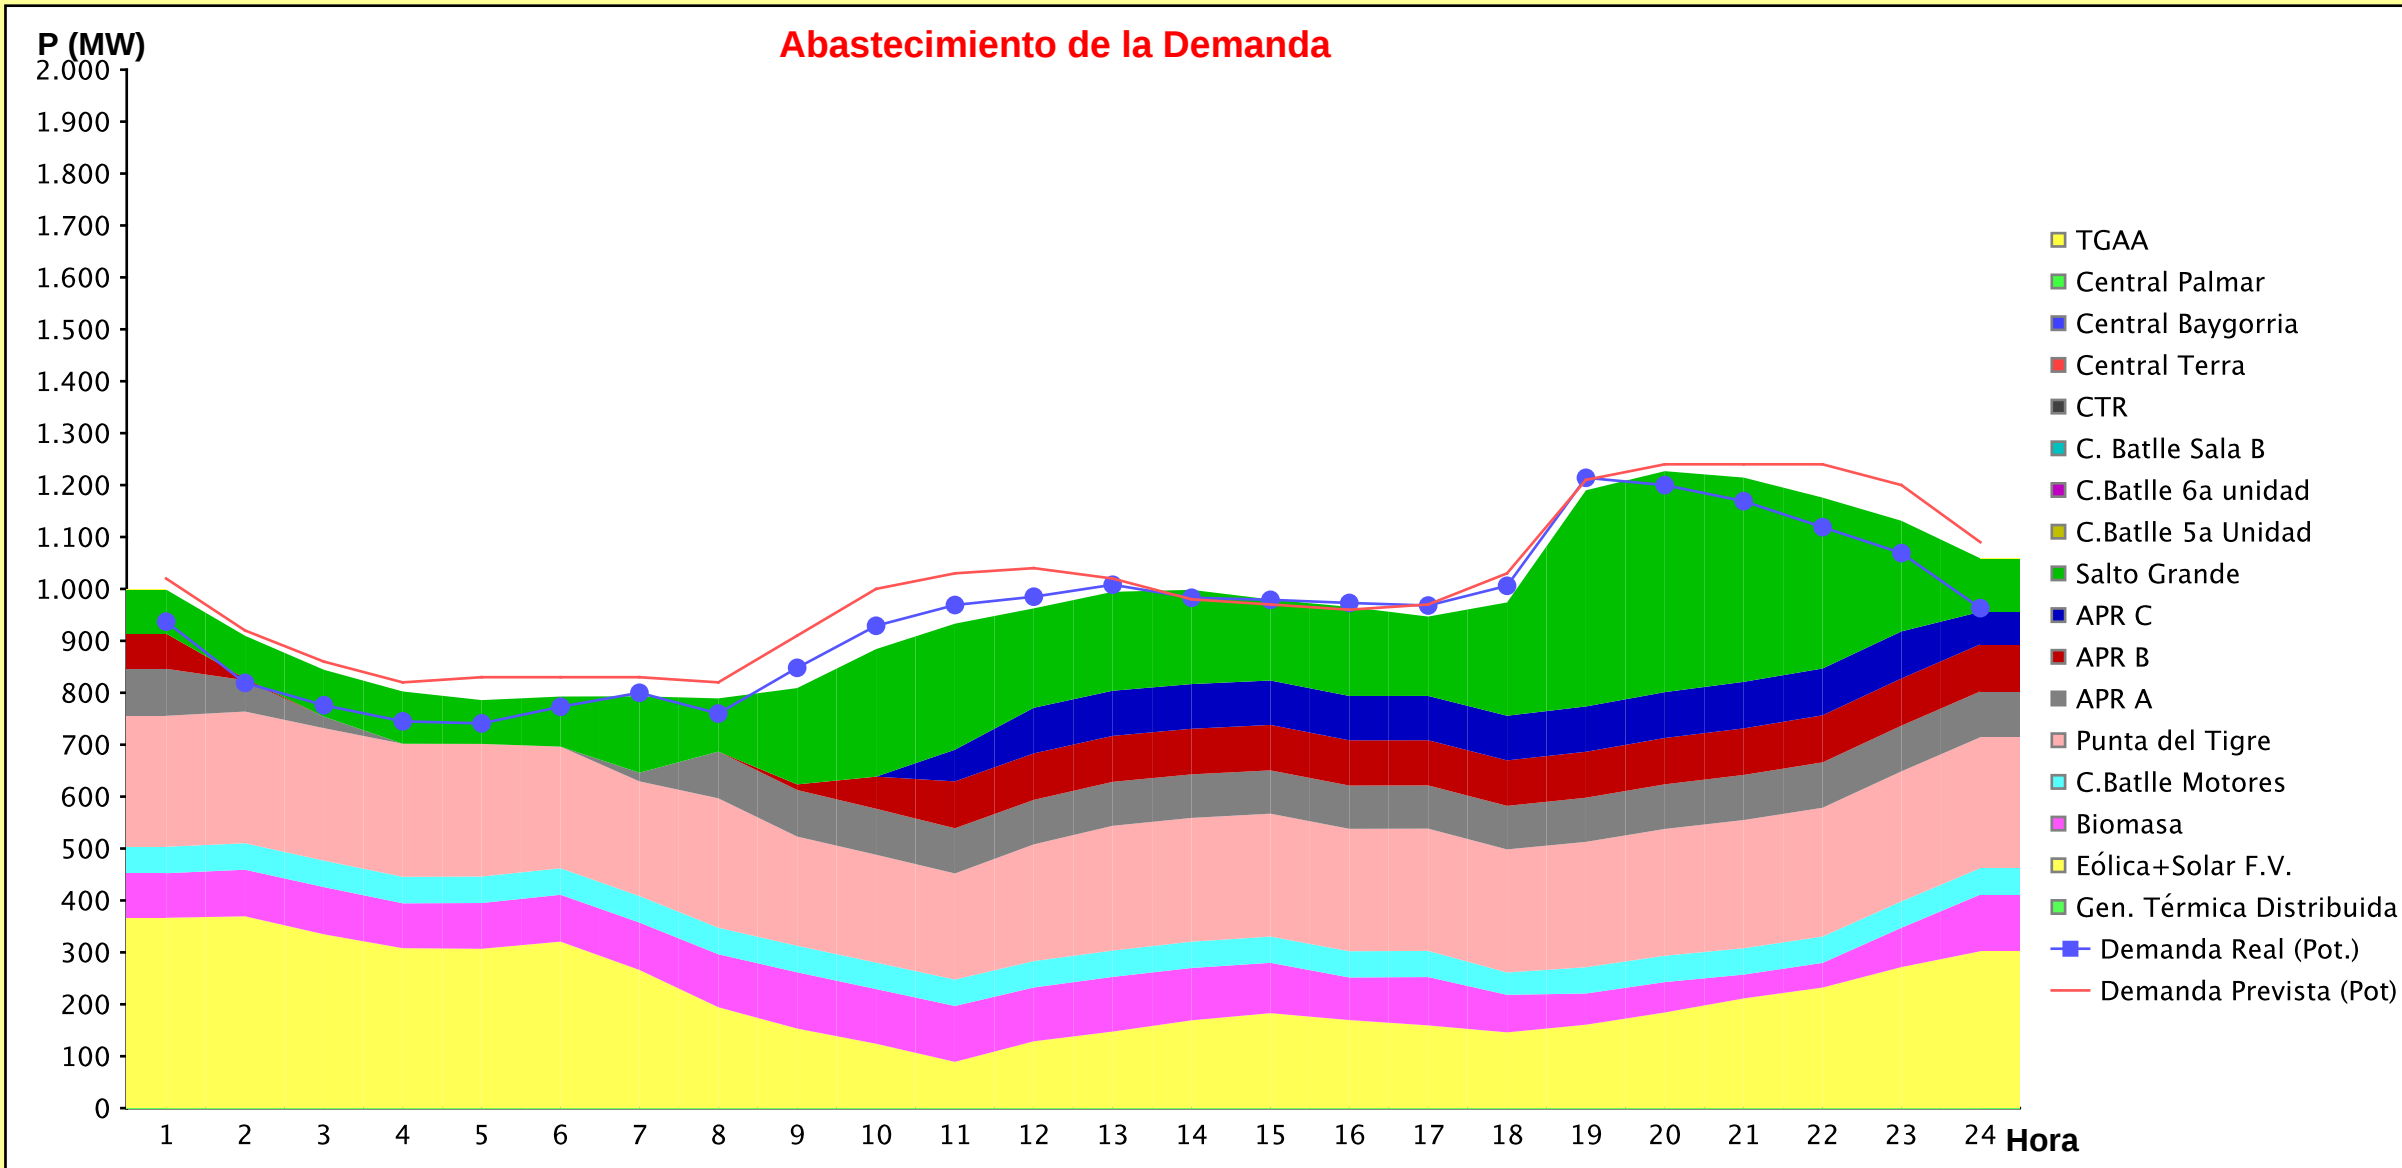

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0



DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	23.079
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	24.060
Diferencia (MWh)	-981
Ejecutada - Programada	-4,08 %

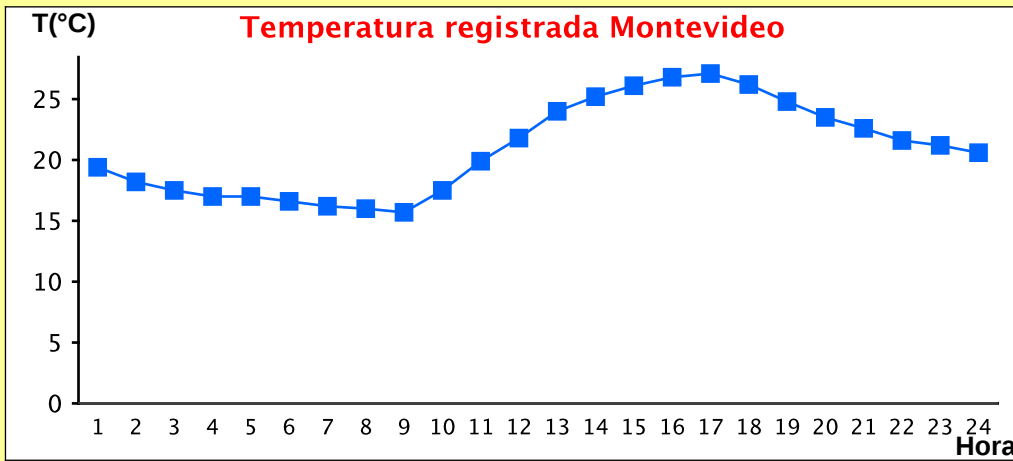


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1027,92 Hora 13:10
Potencia mínima:	772,62 Hora 04:57
Pico noche:	1238,89 Hora 19:03

Generación Media (MW)	
Eólica	220,9
Biomasa	87,7
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

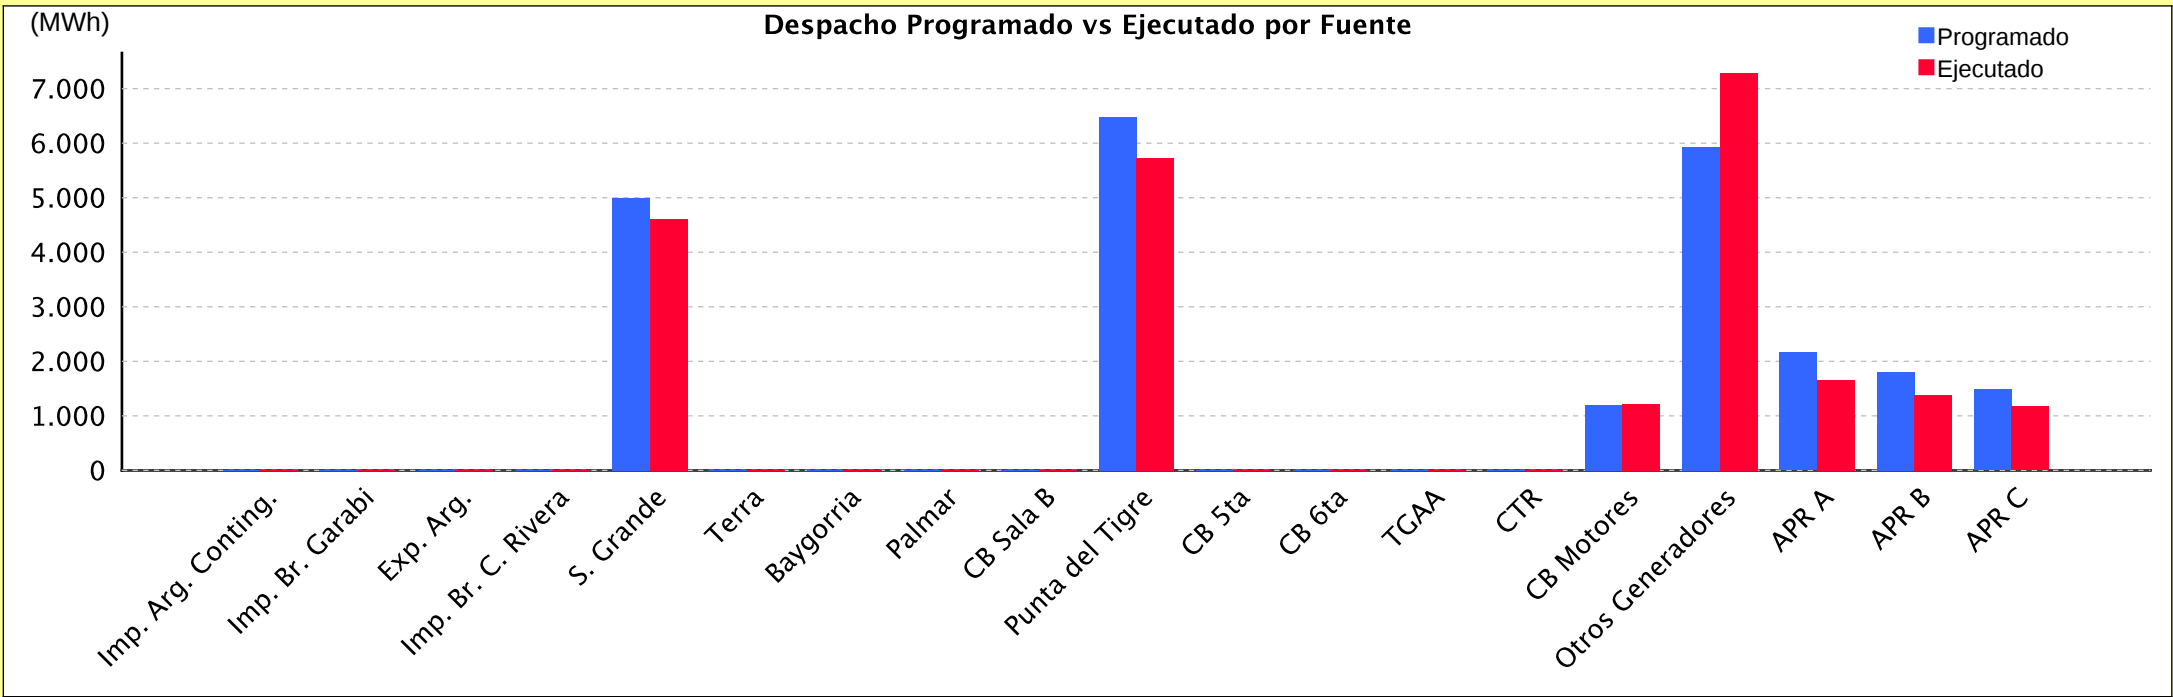
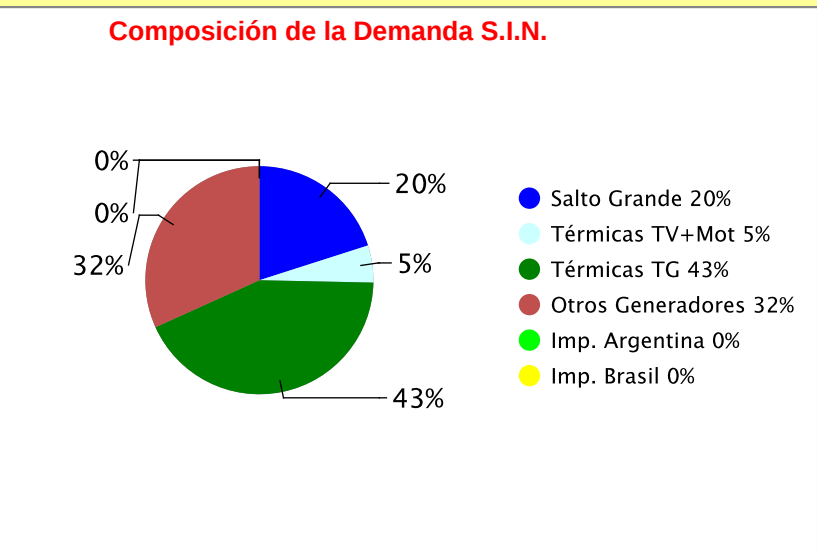


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

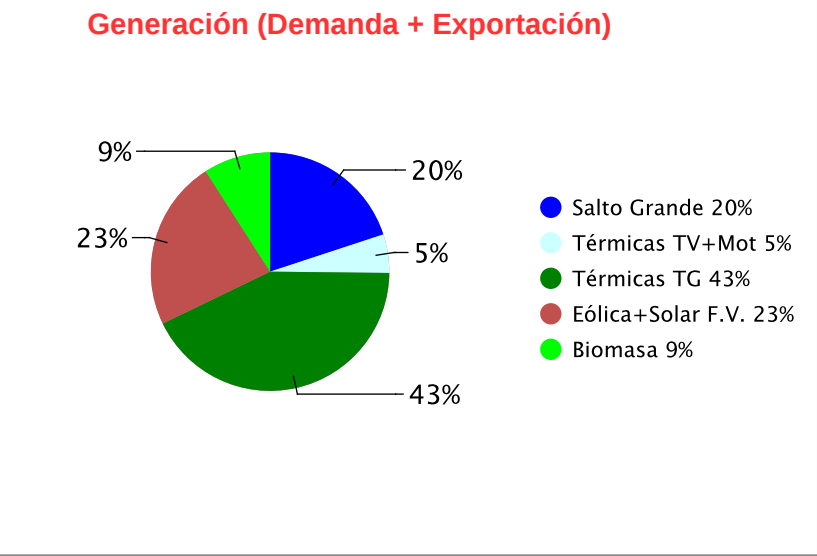



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

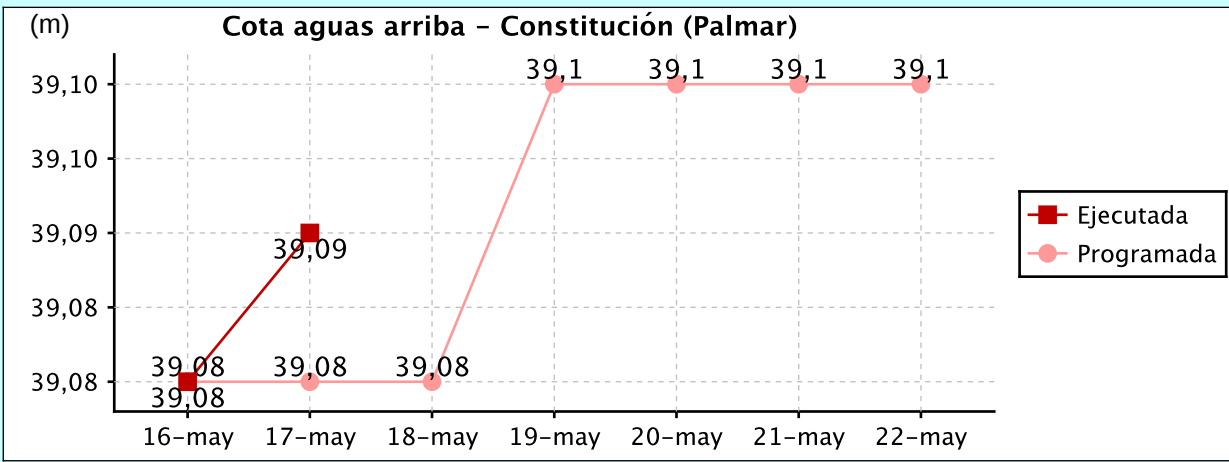
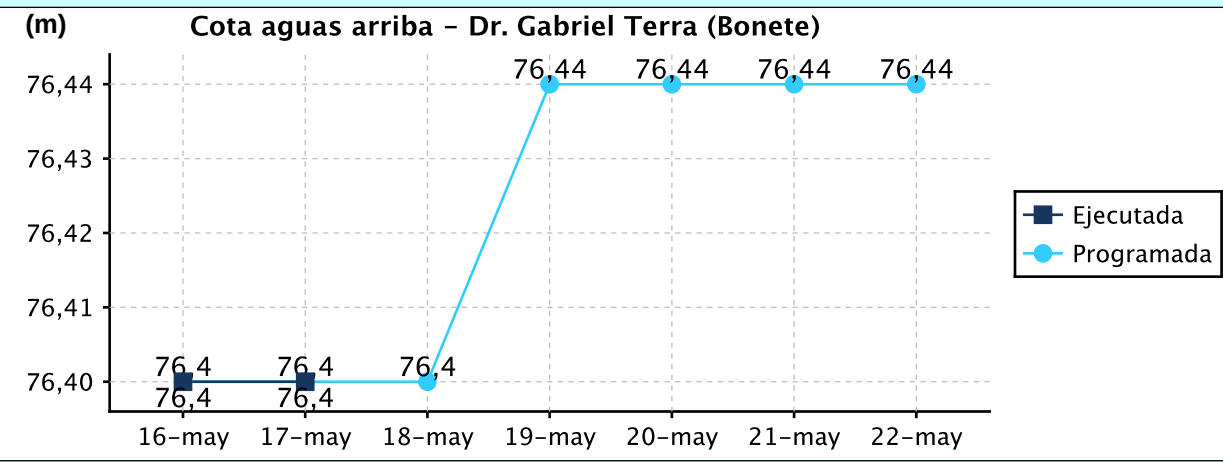


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,40	76,4
Baygorria	53,98	53,95
Palmar	39,08	39,09
SGU	34,33	34,29

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

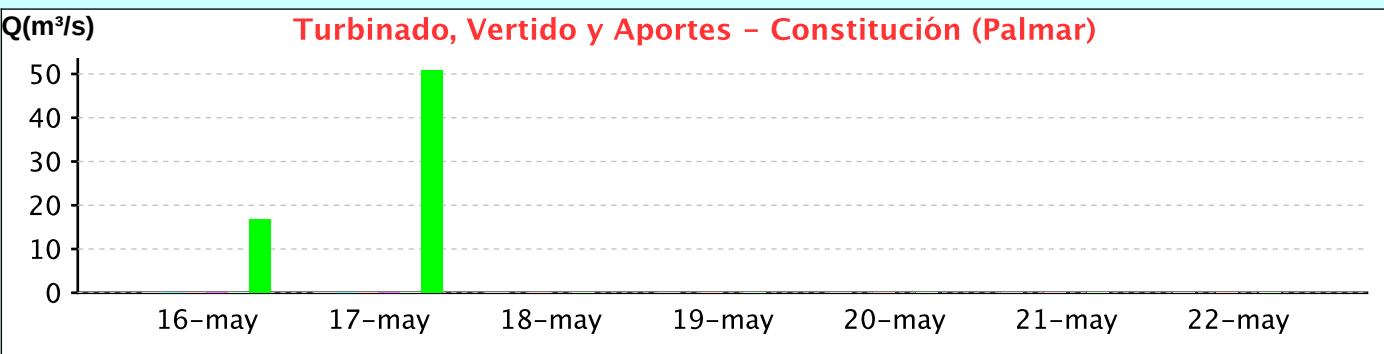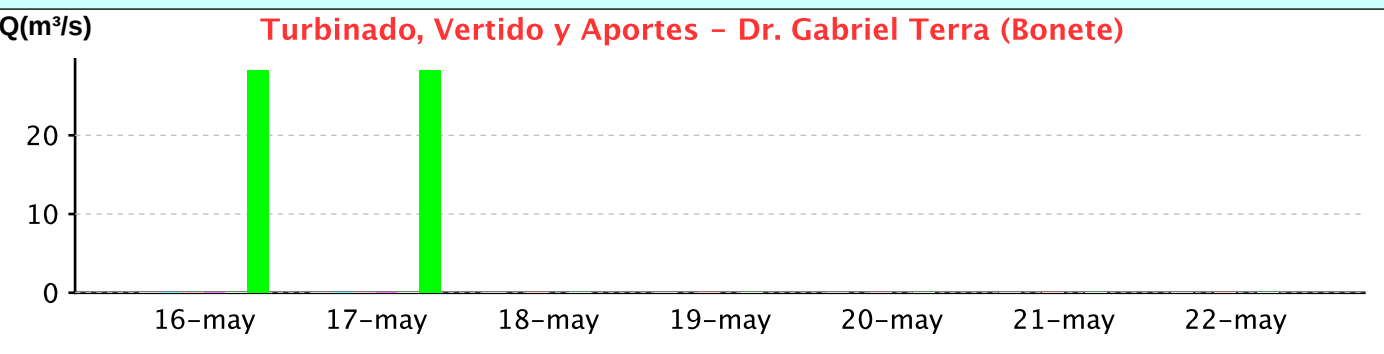

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

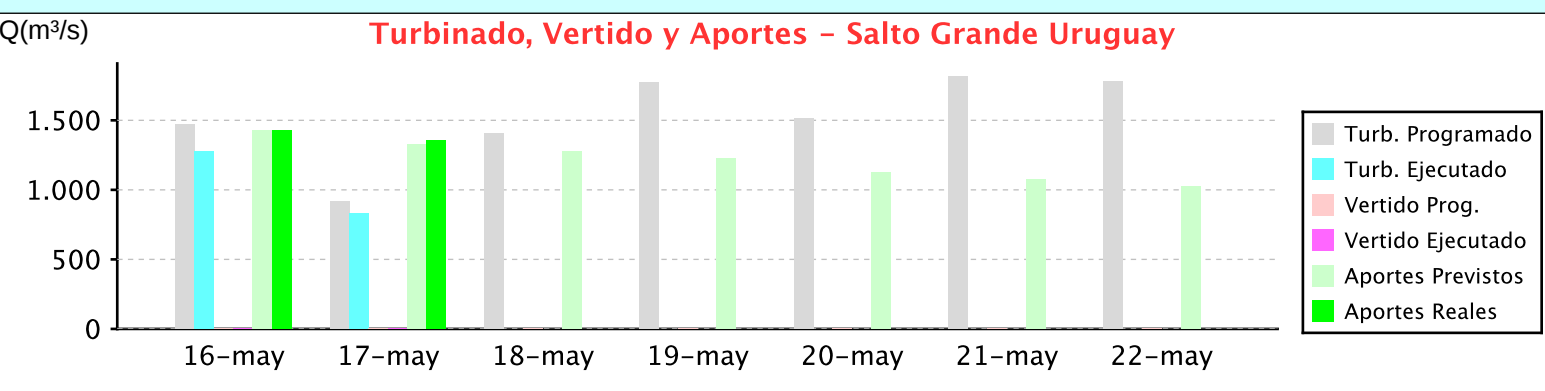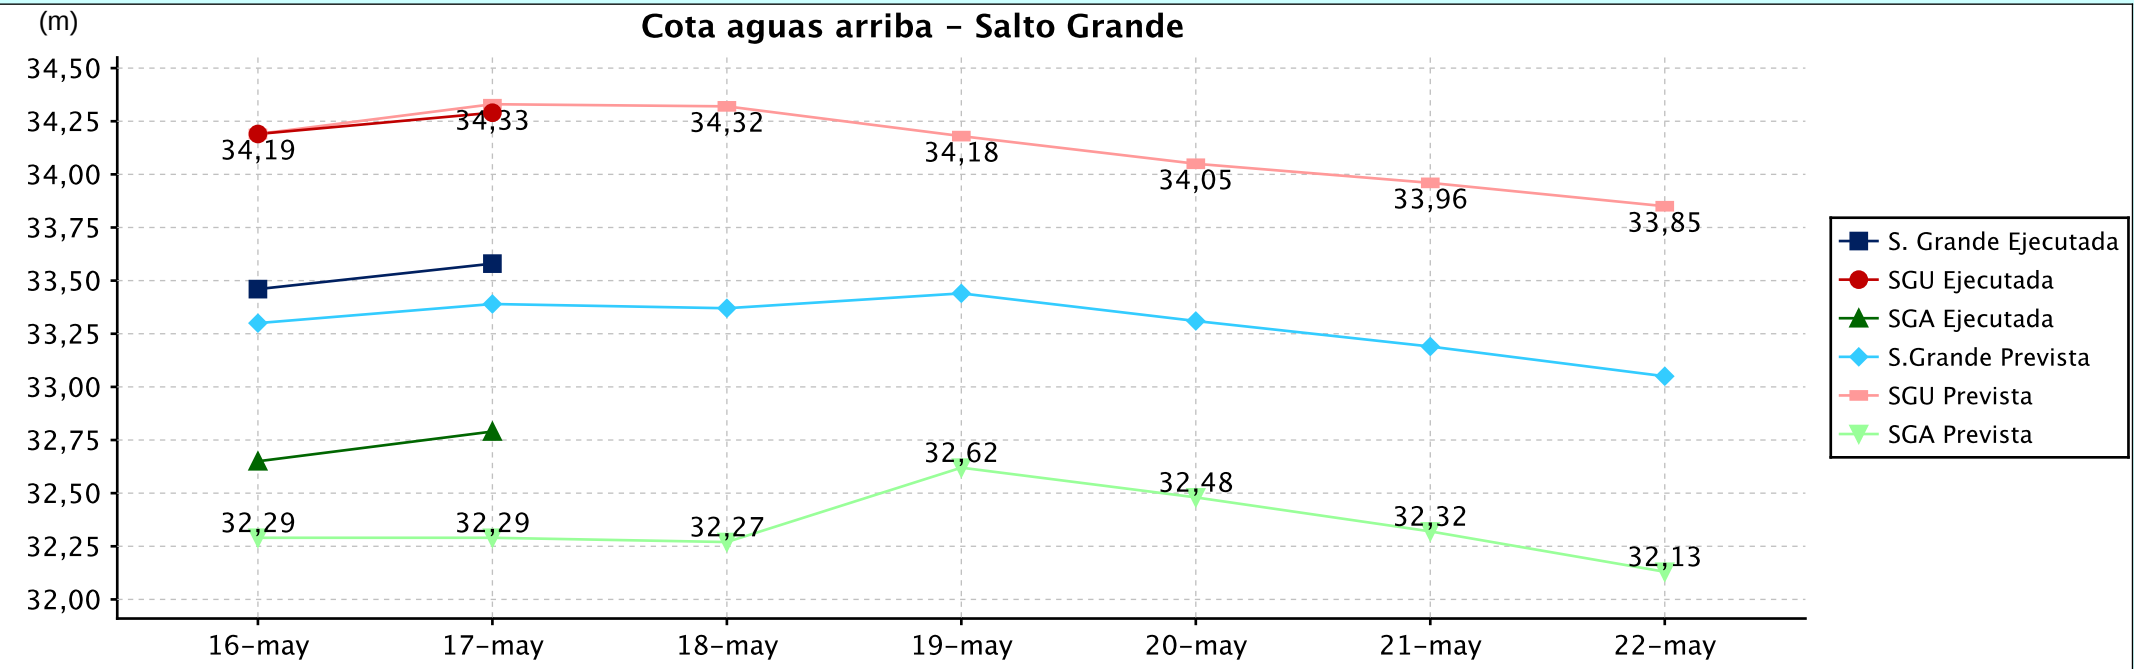

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,29
Cota Vista Arg	32,79
Cota real	33,58
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
29.086	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	917	830

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	28
Baygorria	0	19
Palmar	0	51
SGU	1.325	1.356

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
