




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

lunes 18 de mayo de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	1.197
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	1.201
Central La Tablada	-88
Central P. del Tigre	5.793
APR A	1.772
APR B	1.619
APR C	1.516
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	-0
C. Baygorria	-6
C. Palmar	0
C. Salto Grande	7.662
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	6.806
TOTAL Generación	26.271

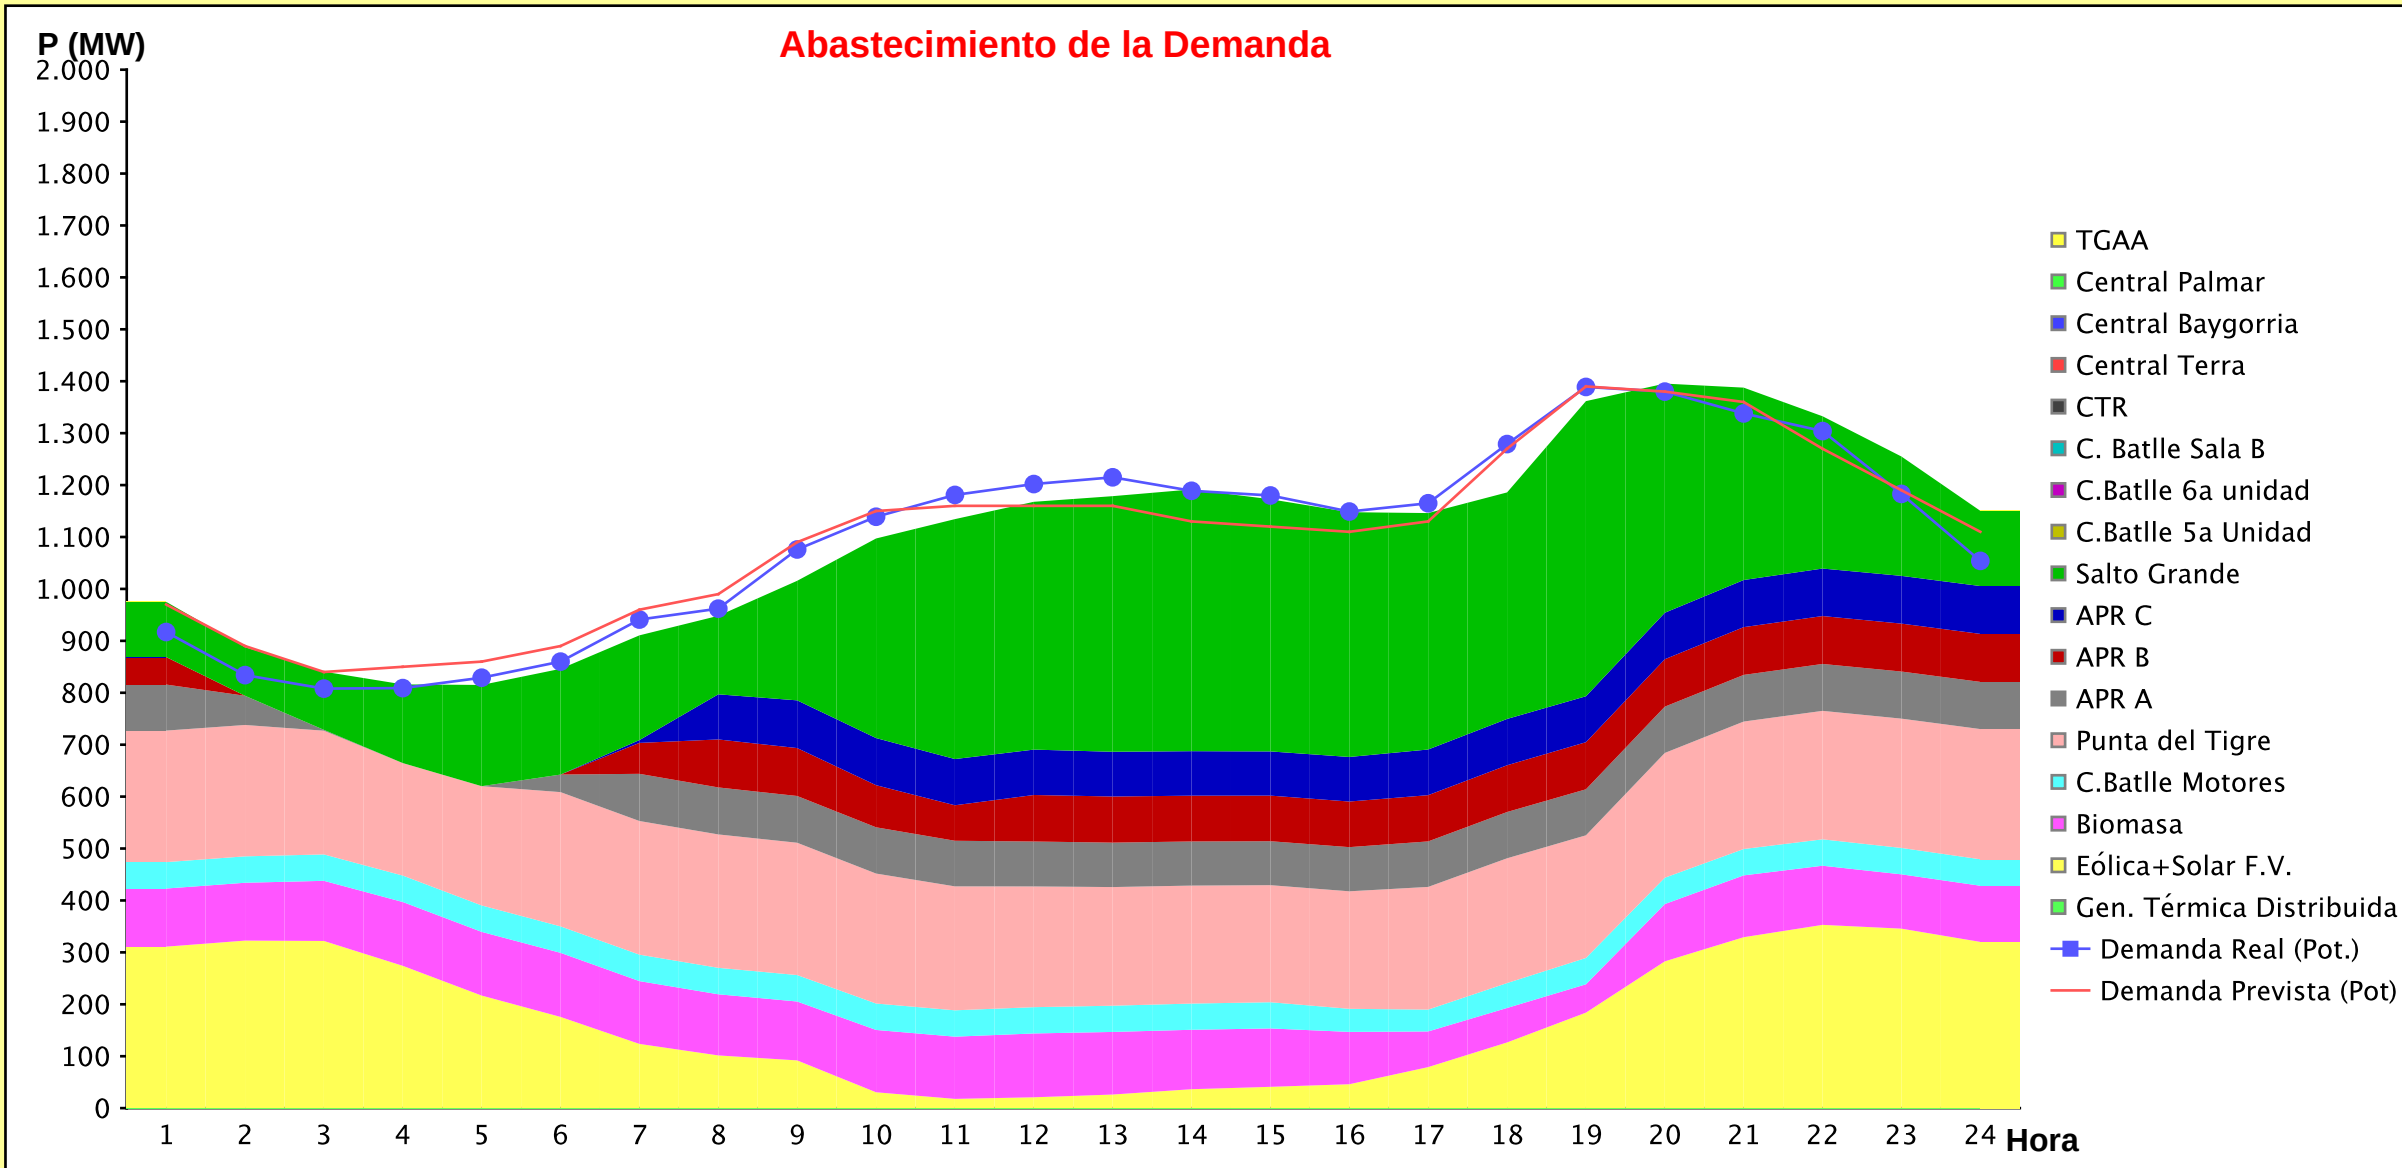

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	26.271
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	


Demanda Programada (MWh)	26.430
Diferencia (MWh)	-159
Ejecutada - Programada	-0,60 %

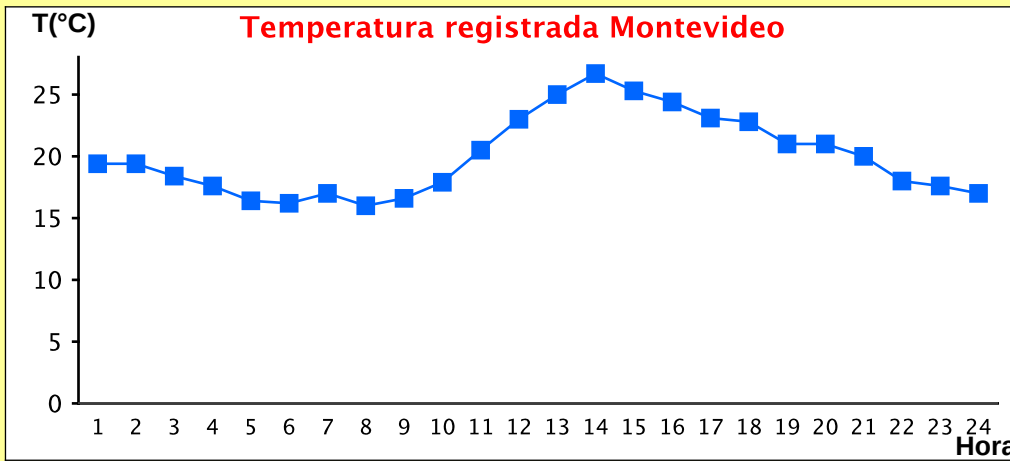

Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1228,92 Hora 13:12
Potencia mínima:	810,89 Hora 03:40
Pico noche:	1407,92 Hora 18:44



Generación Media (MW)	
Eólica	174,9
Biomasa	109,6
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

Composición de la Demanda S.I.N.

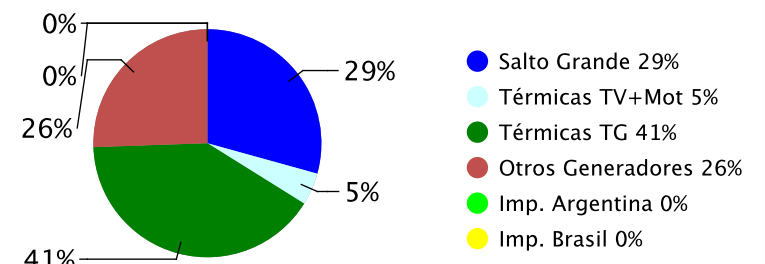



Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

Generación (Demanda + Exportación)

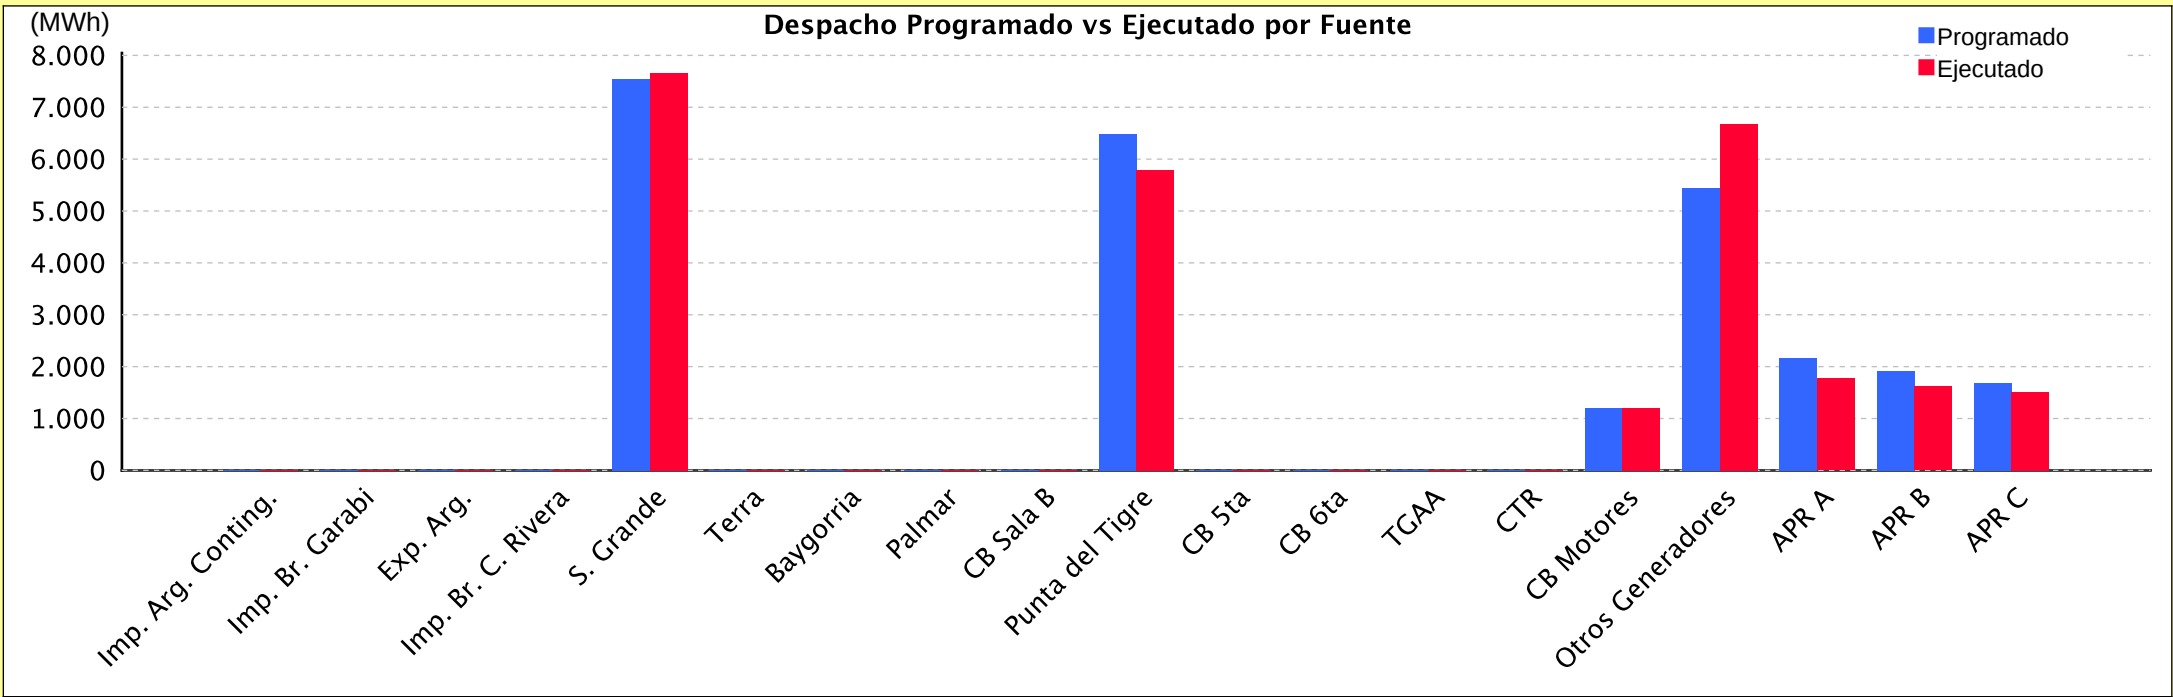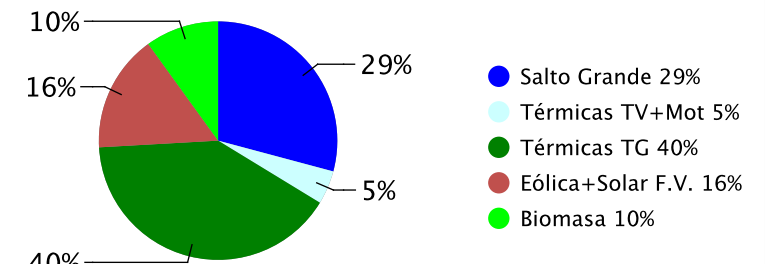



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

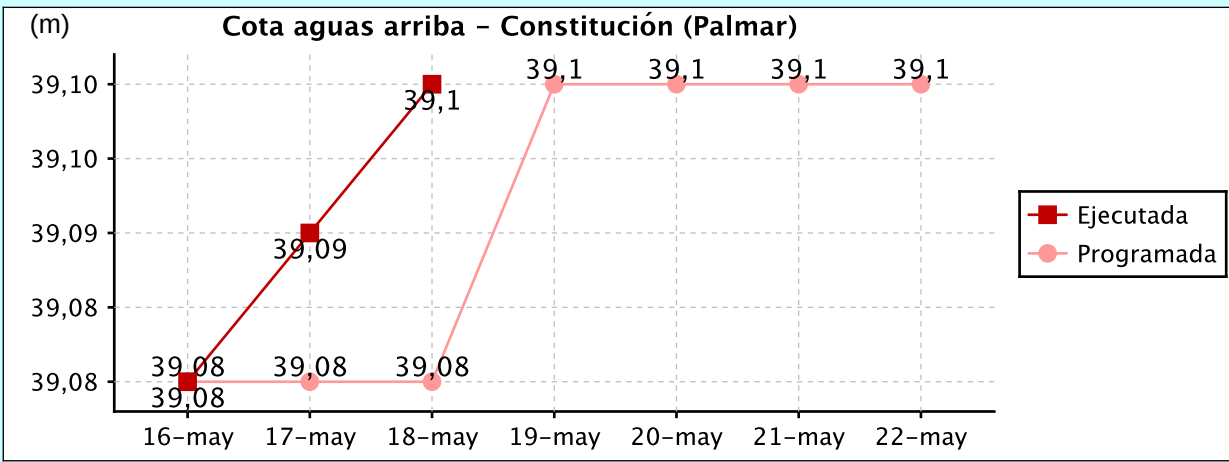
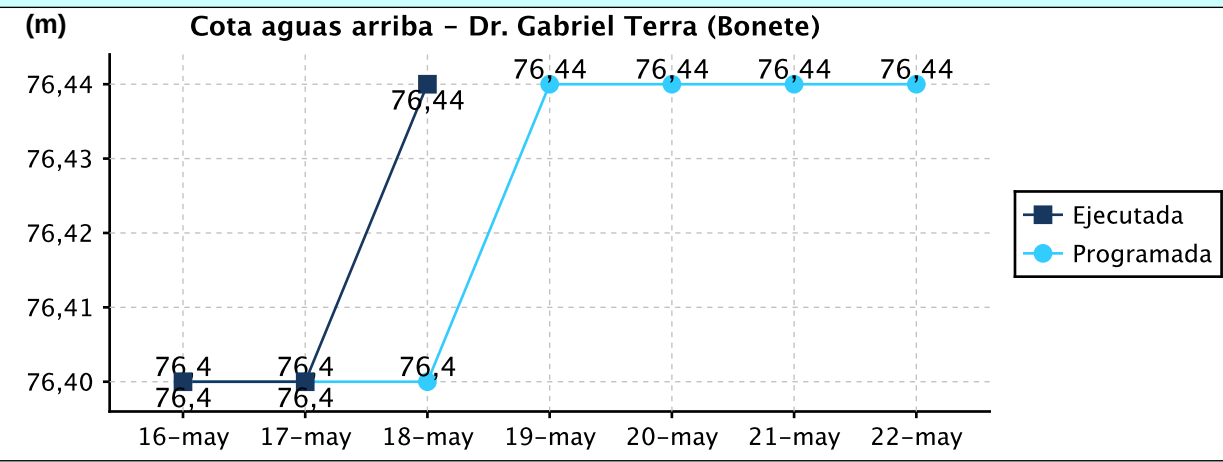


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,40	76,44
Baygorria	53,98	53,94
Palmar	39,08	39,1
SGU	34,32	34,29

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

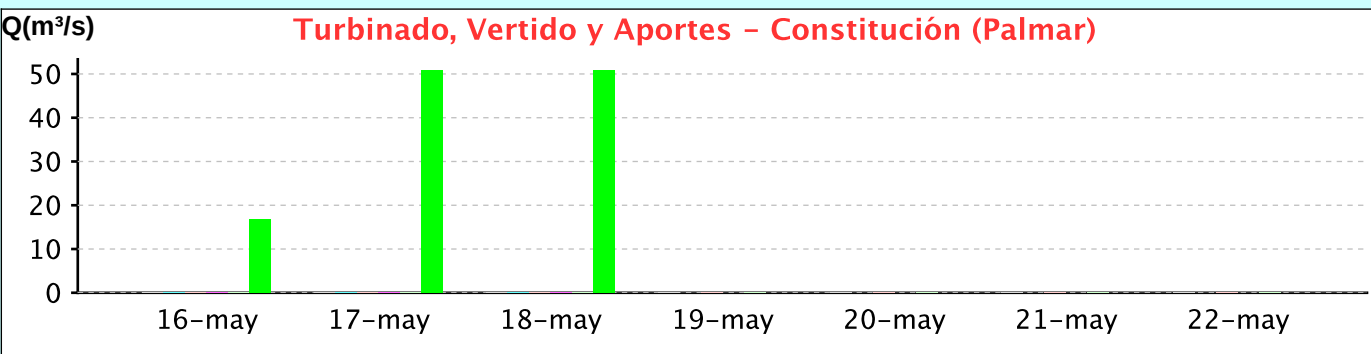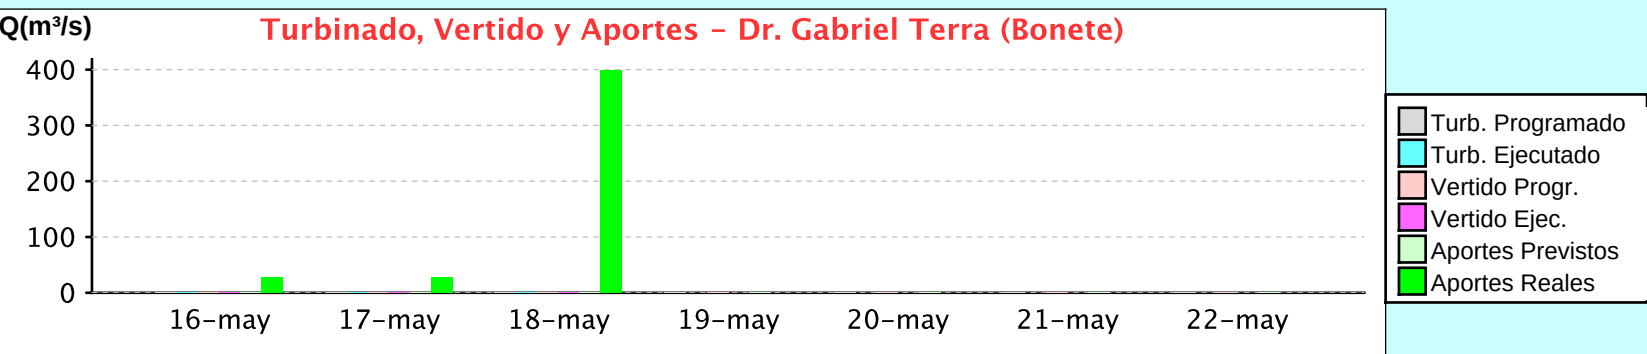

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

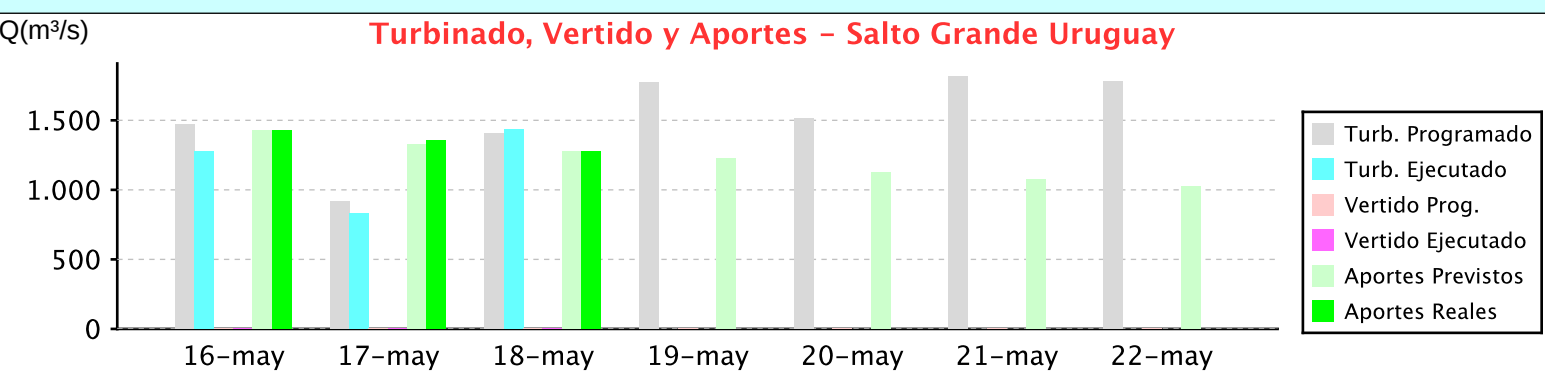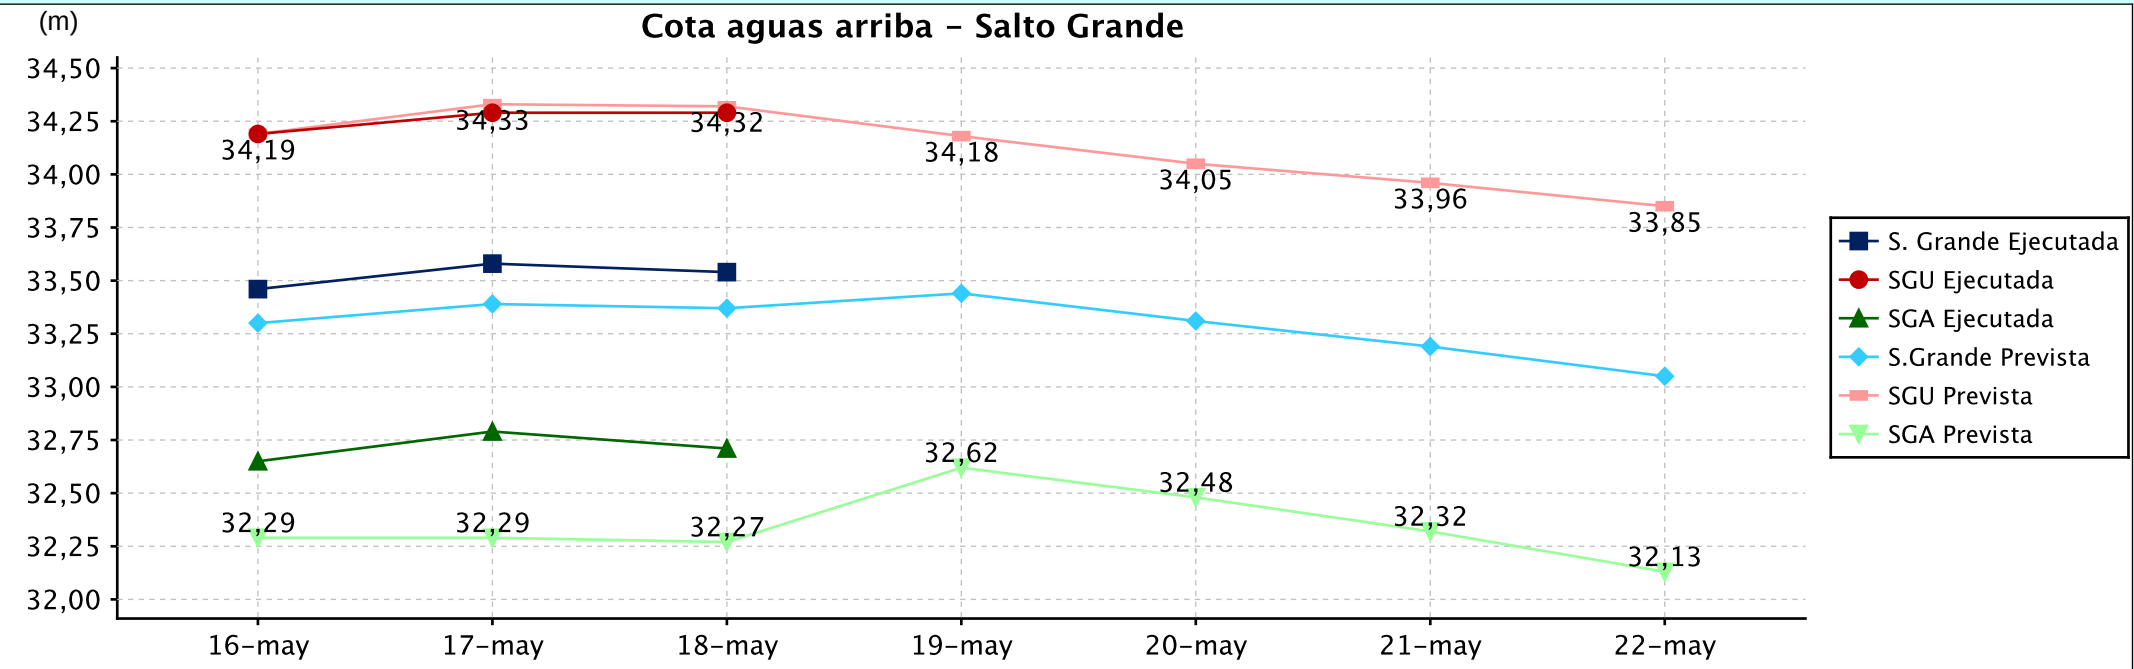

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,29
Cota Vista Arg	32,71
Cota real	33,54
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
30.520	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	1.409	1.432

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	399
Baygorria	0	-4
Palmar	0	51
SGU	1.275	1.275

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
