




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


viernes 22 de mayo de 2015

Generación Térmica	
Central Battle	1.207
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	1.211
Central La Tablada	-84
Central P. del Tigre	5.859
APR A	1.800
APR B	1.628
APR C	1.206
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	24
C. Baygorria	-6
C. Palmar	0
C. Salto Grande	8.866
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	7.521
TOTAL Generación	28.020



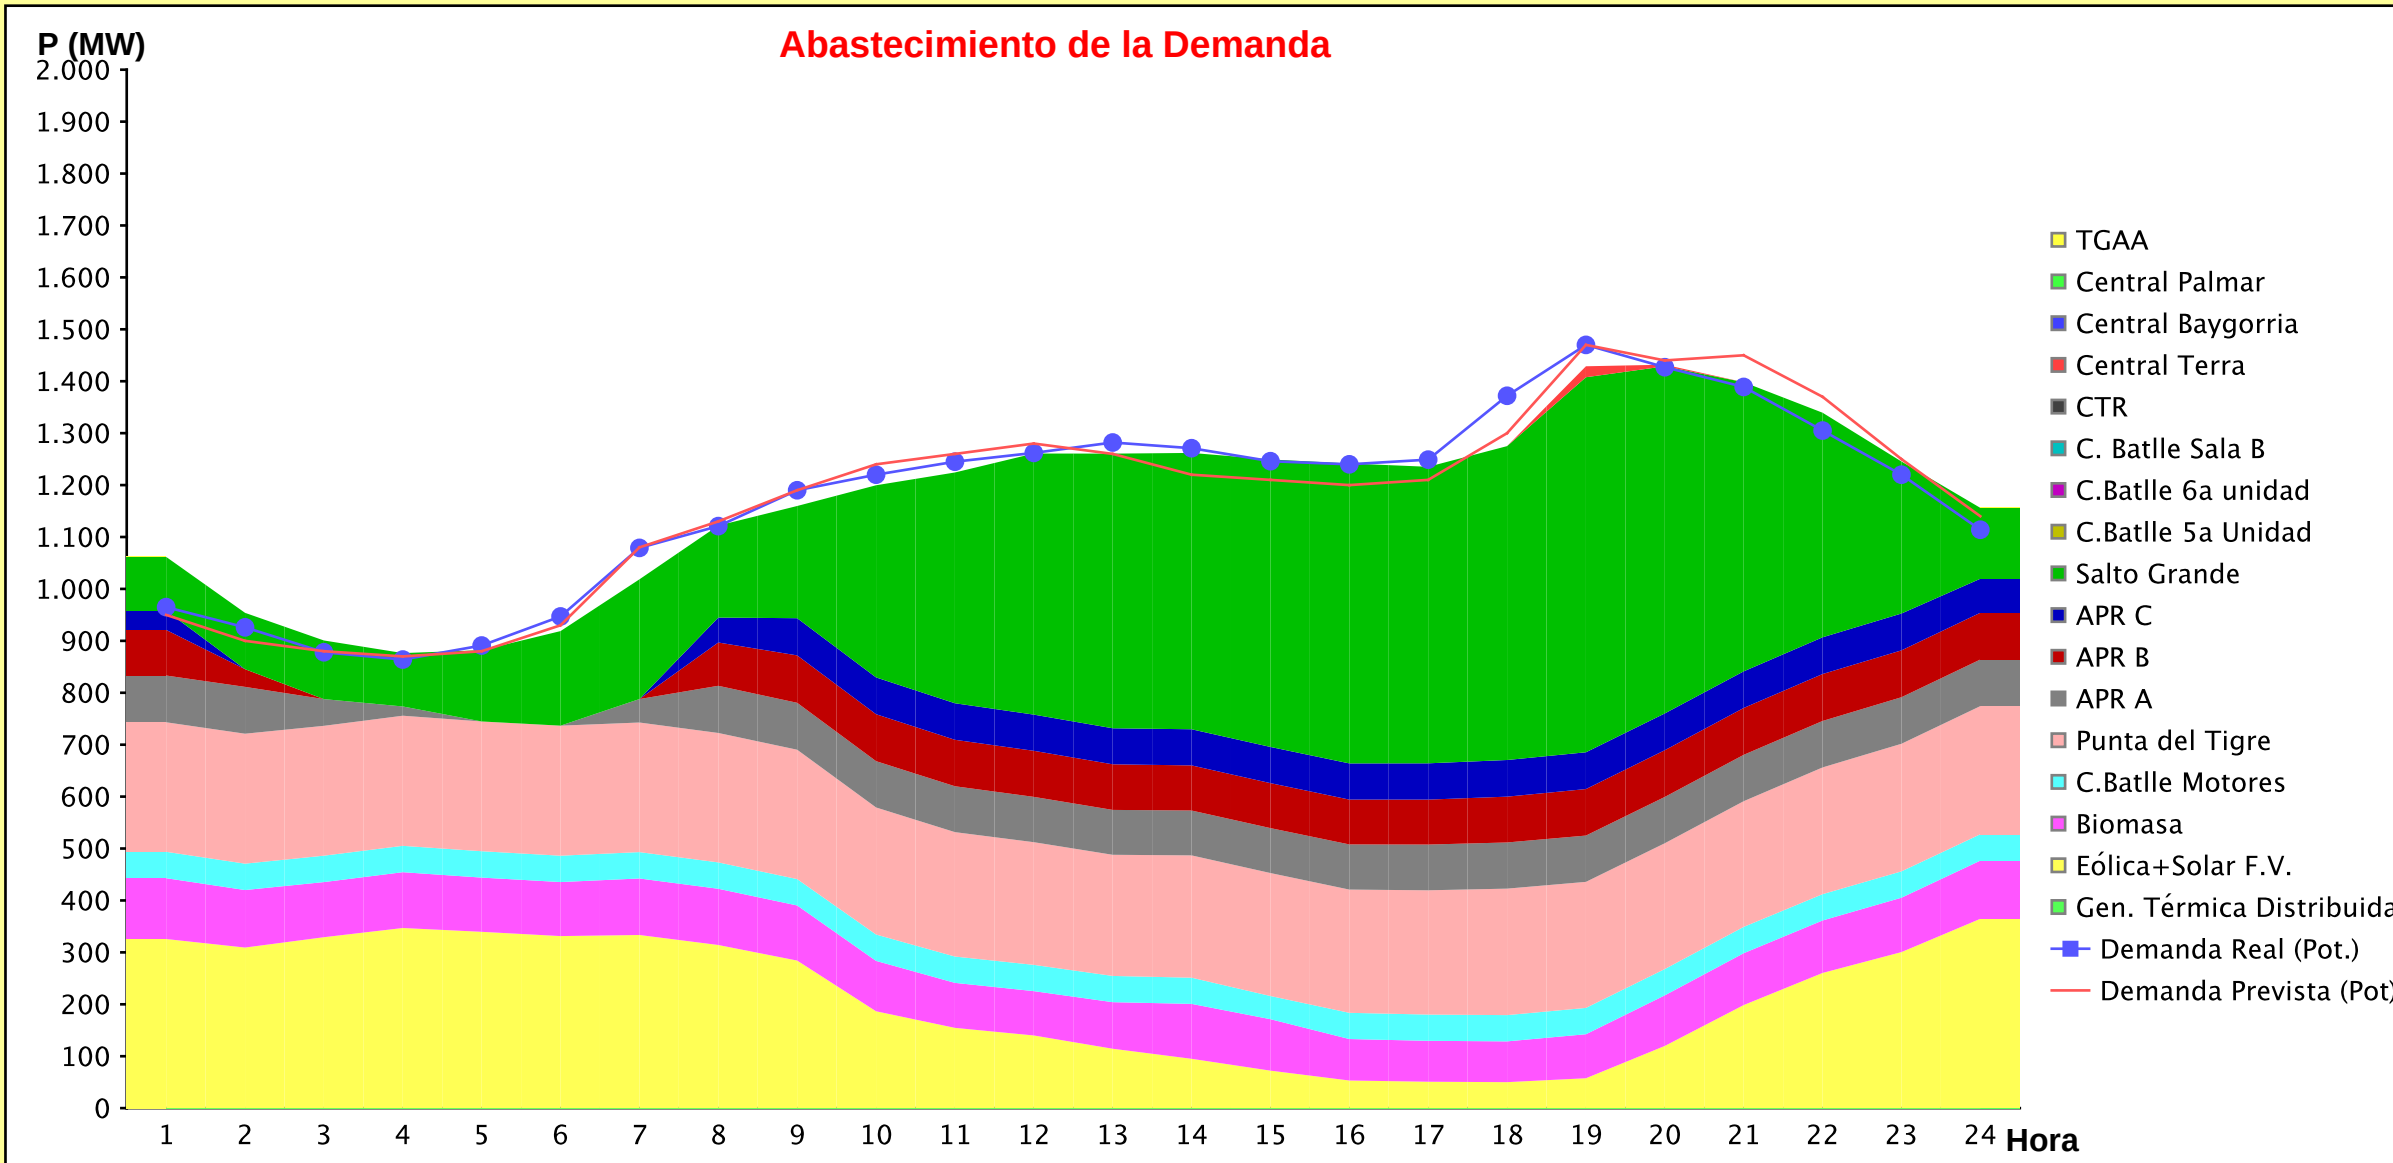


Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	28.020
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	28.110
Diferencia (MWh)	-90
Ejecutada - Programada	-0,32 %


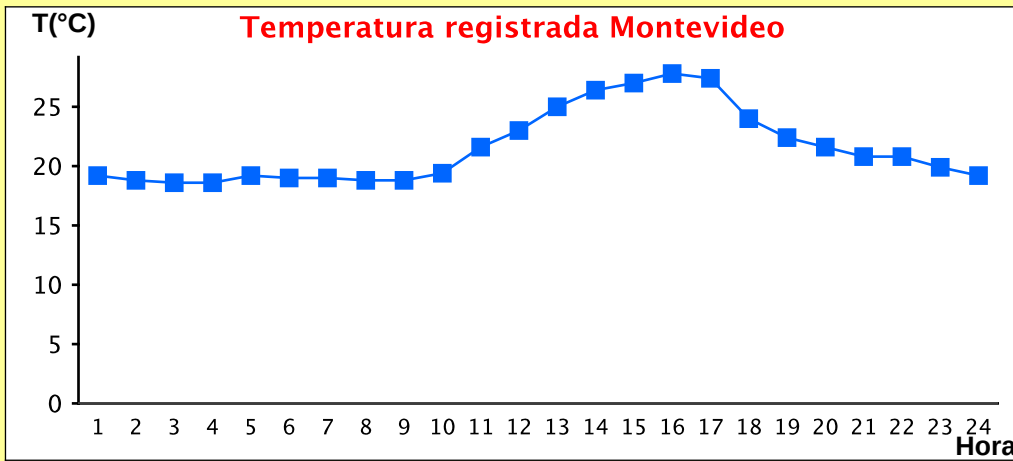


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1299 Hora 11:53
Potencia mínima:	851 Hora 04:02
Pico noche:	1462 Hora 18:48
Generación Media (MW)	
Eólica	214,4
Biomasa	99,0
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

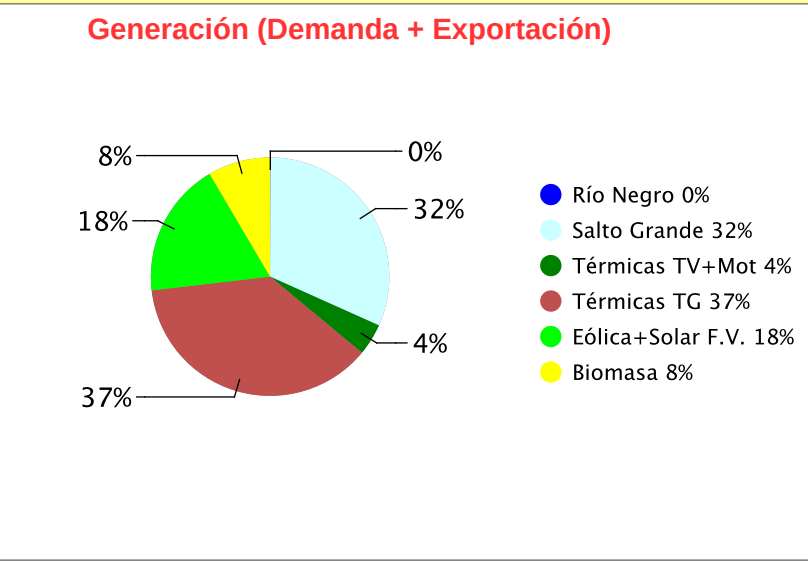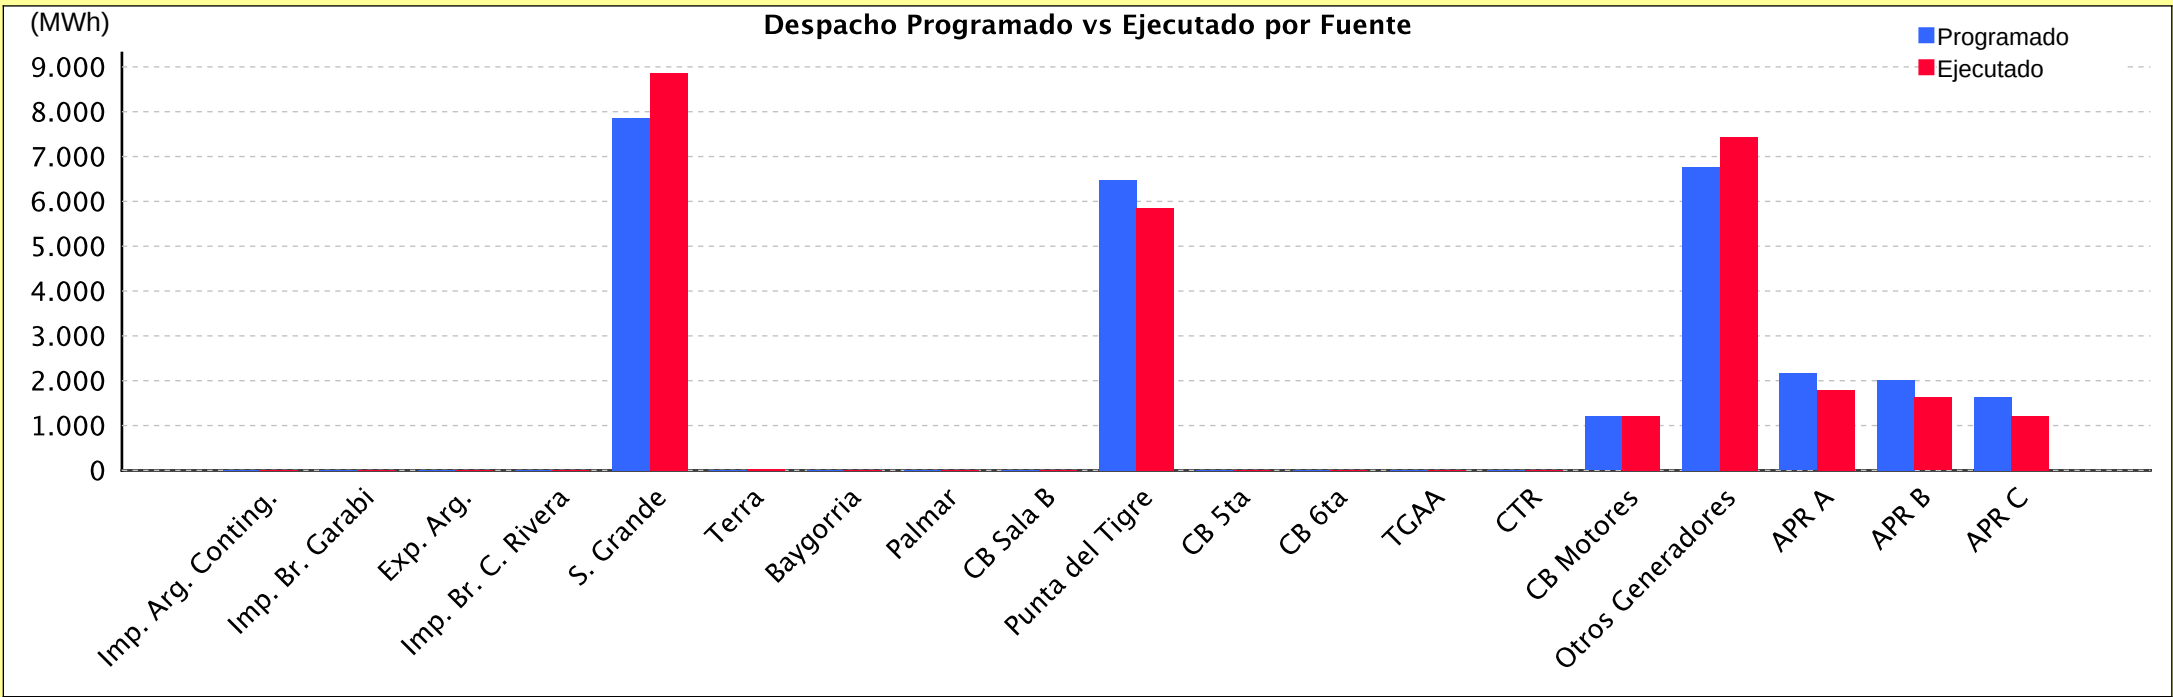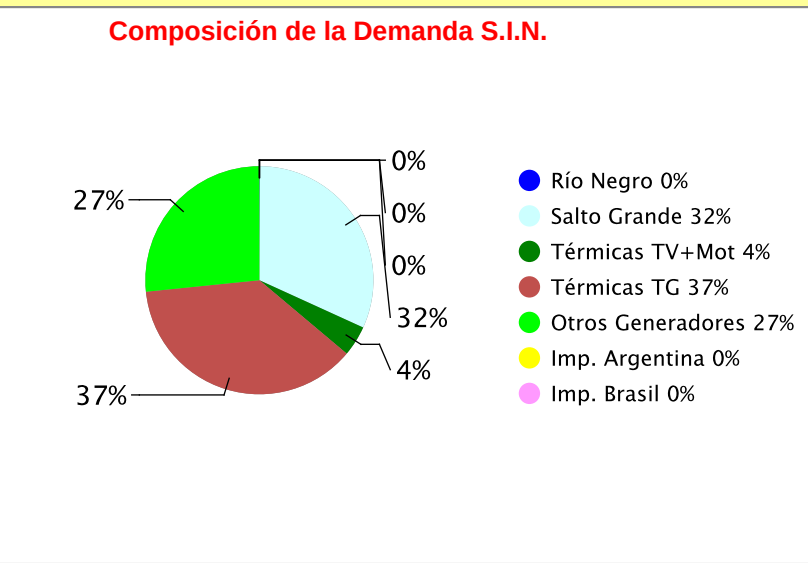



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

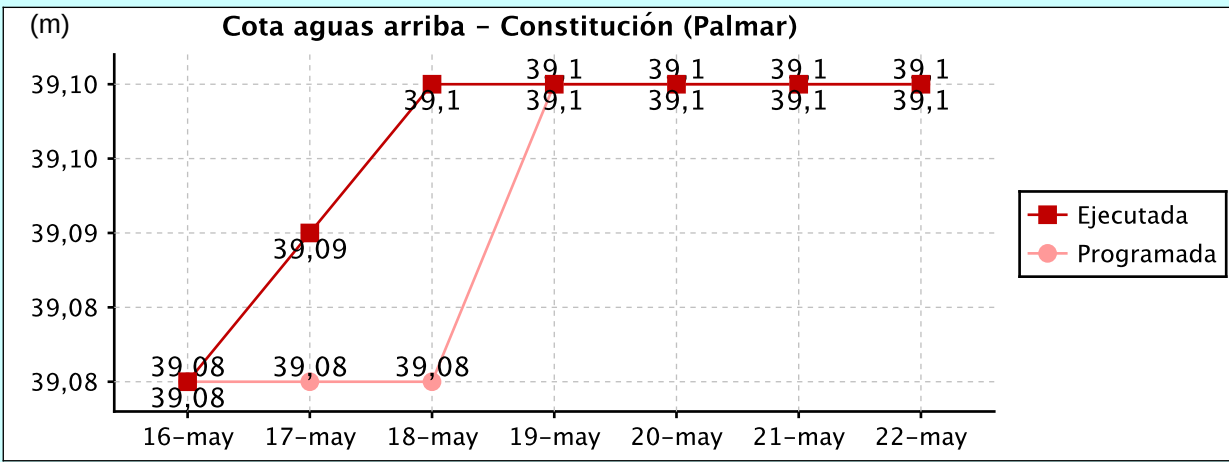
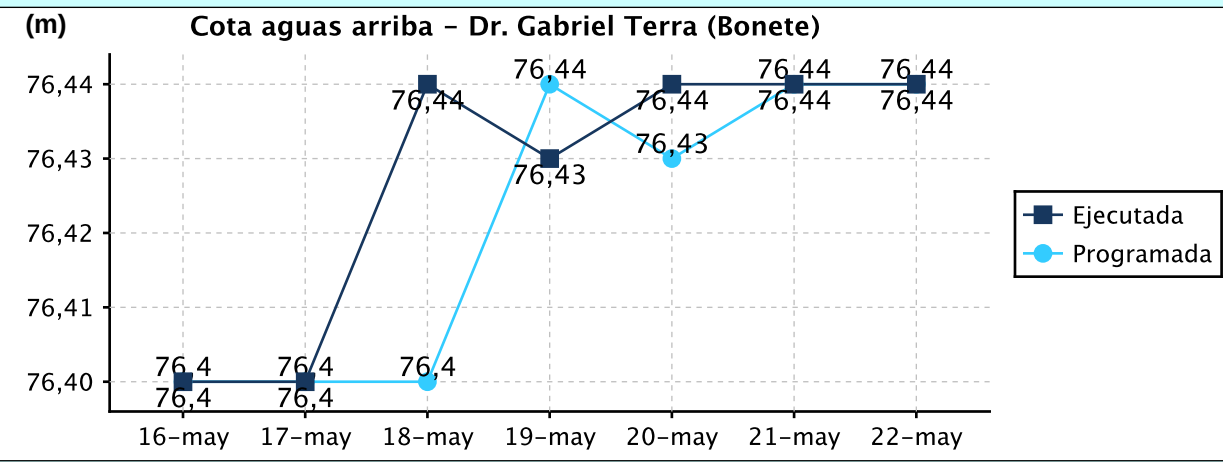


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,44	76,44
Baygorria	53,95	53,96
Palmar	39,10	39,1
SGU	33,84	33,81

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

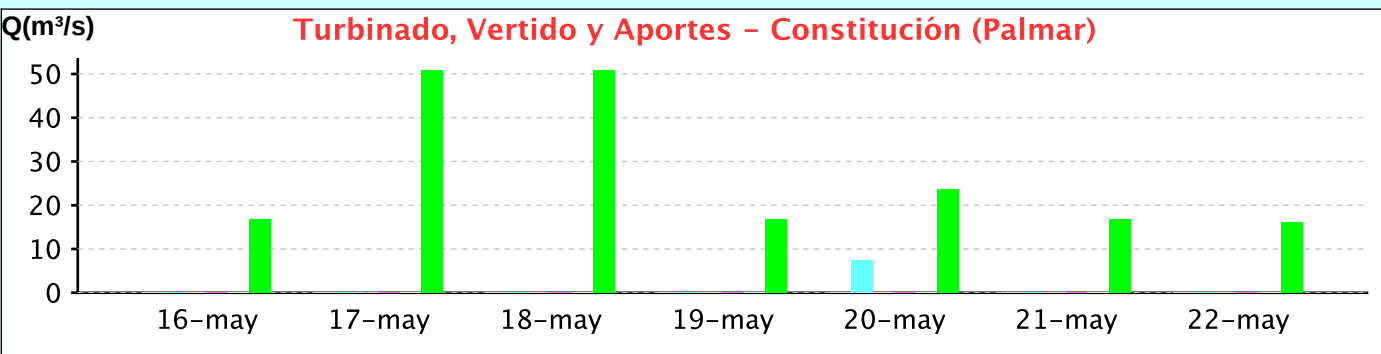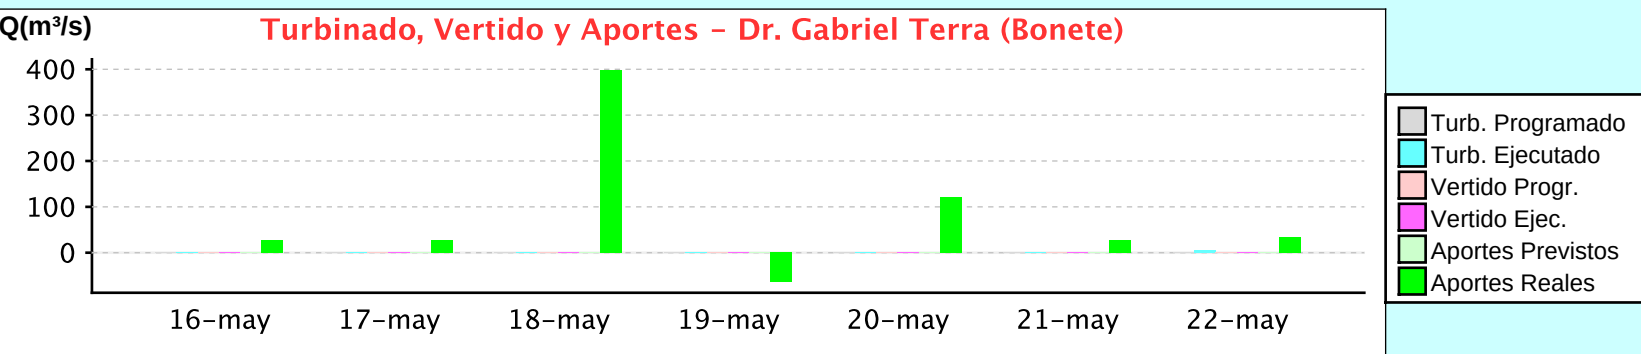

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

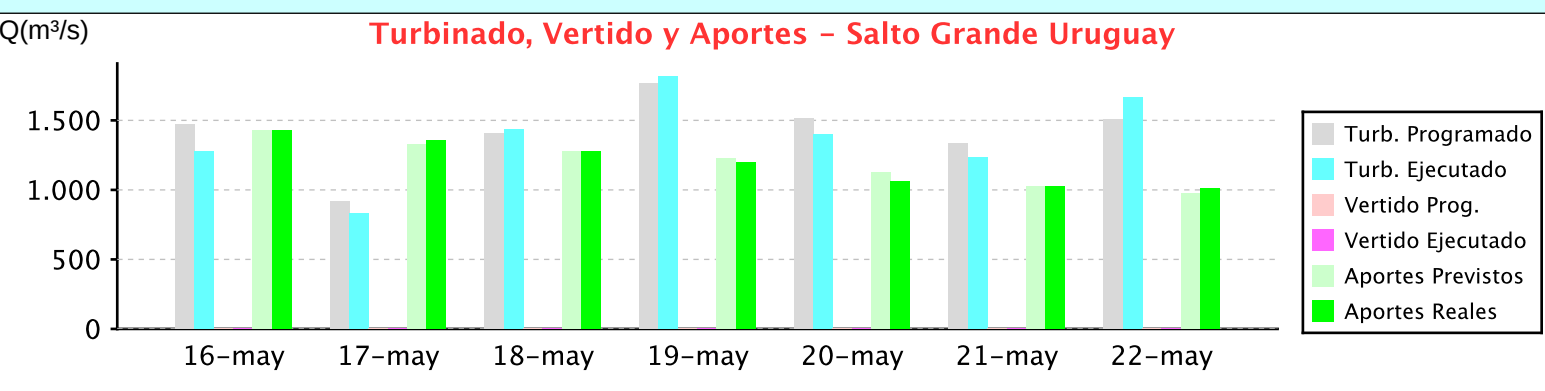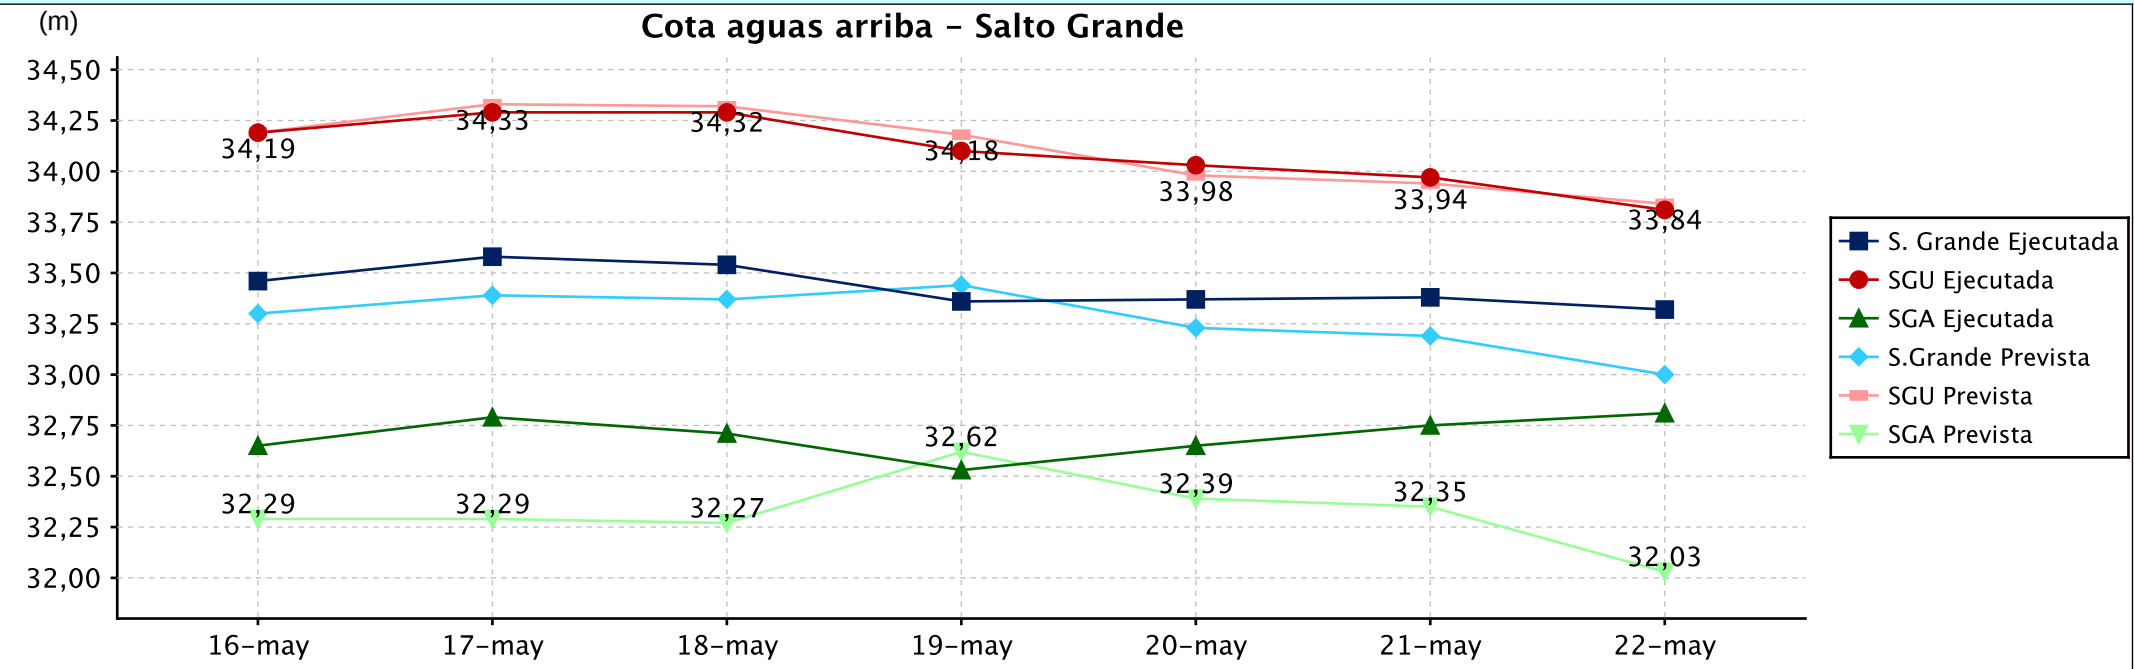

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	33,81
Cota Vista Arg	32,81
Cota real	33,32
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	18.712

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	6
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	1.508	1.668

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	34
Baygorria	0	25
Palmar	0	16
SGU	975	1.012

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
