




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

lunes 25 de mayo de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	1.218
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	1.222
Central La Tablada	-76
Central P. del Tigre	6.235
APR A	2.197
APR B	2.172
APR C	2.101
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	-0
C. Baygorria	-7
C. Palmar	0
C. Salto Grande	10.333
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	4.434
TOTAL Generación	28.608

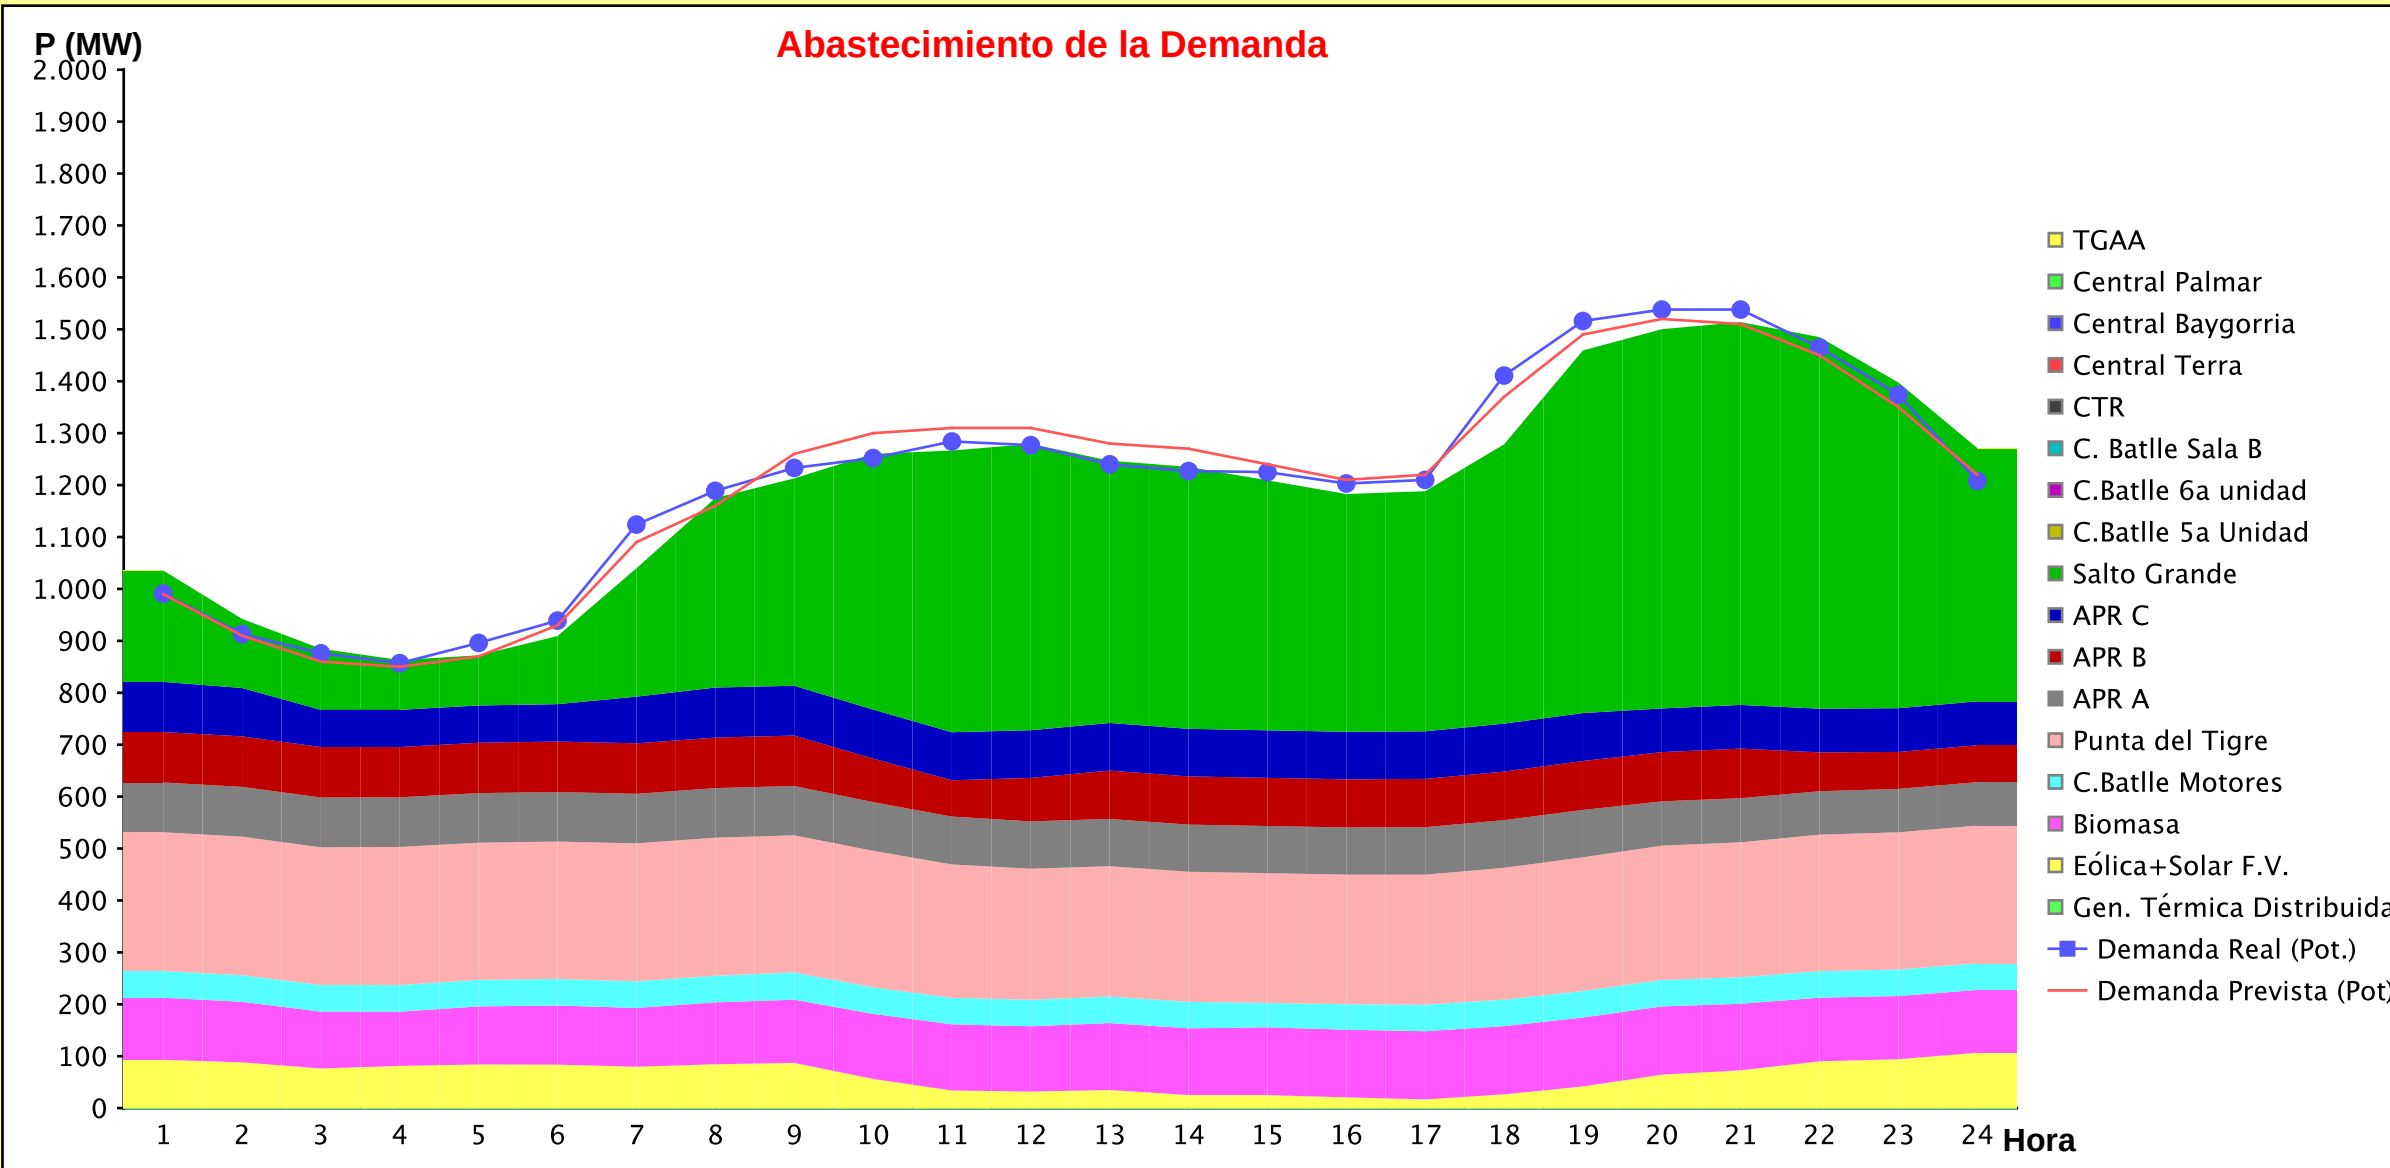

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	28.608
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	28.970
Diferencia (MWh)	-362
Ejecutada - Programada	-1,25 %

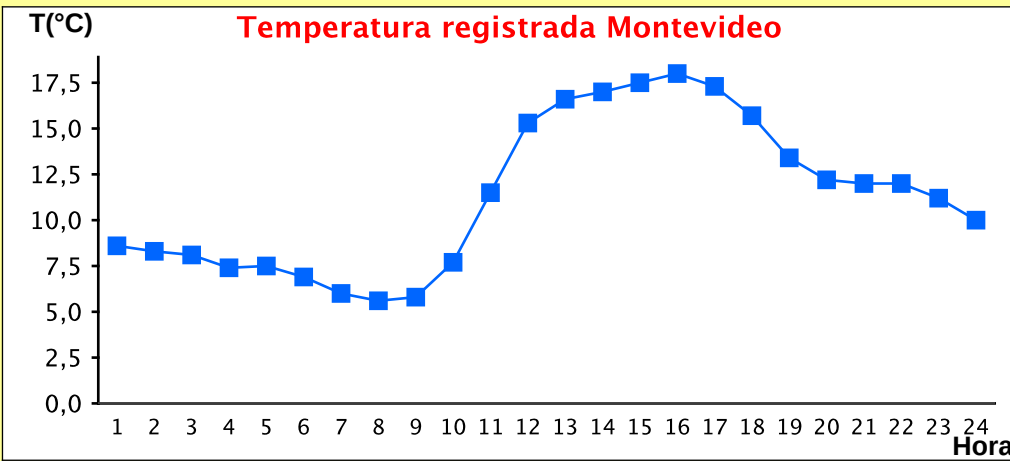



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1295 Hora 11:46
Potencia mínima:	848 Hora 03:34
Pico noche:	1526 Hora 20:36

Generación Media (MW)	
Eólica	64,2
Biomasa	122,8
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

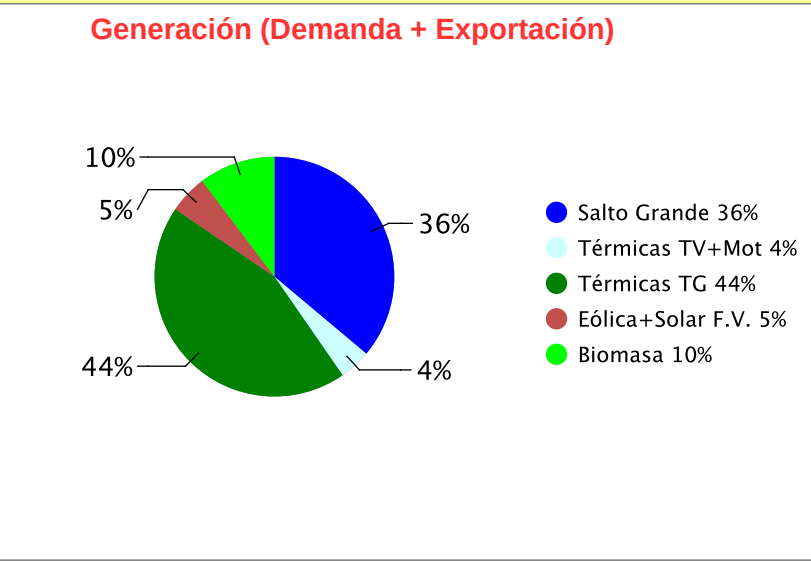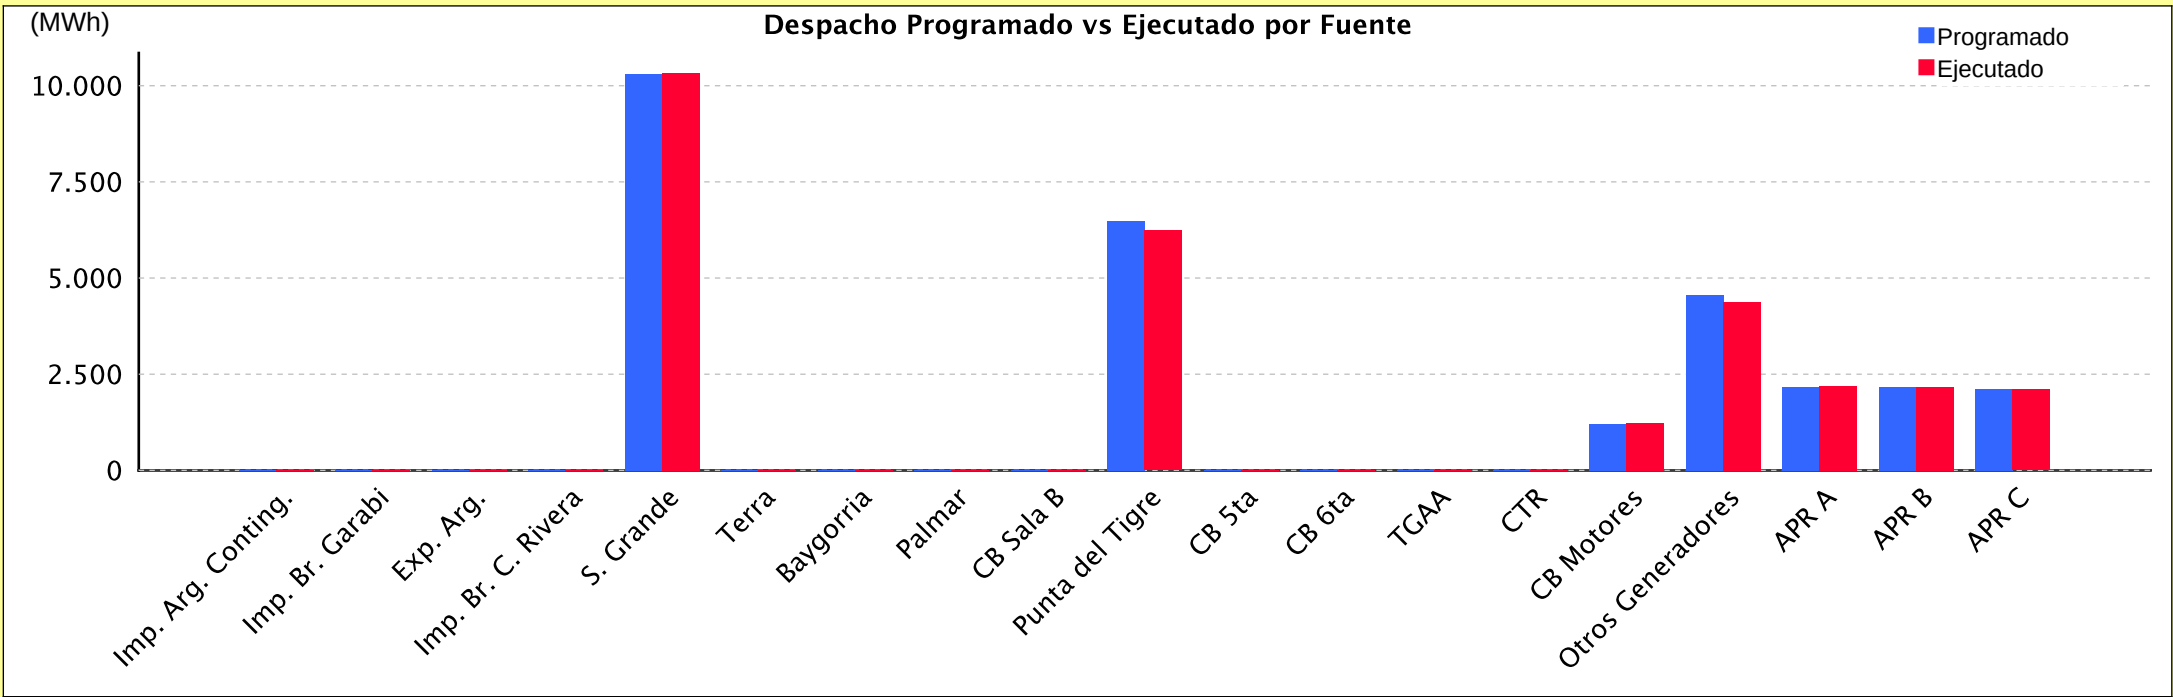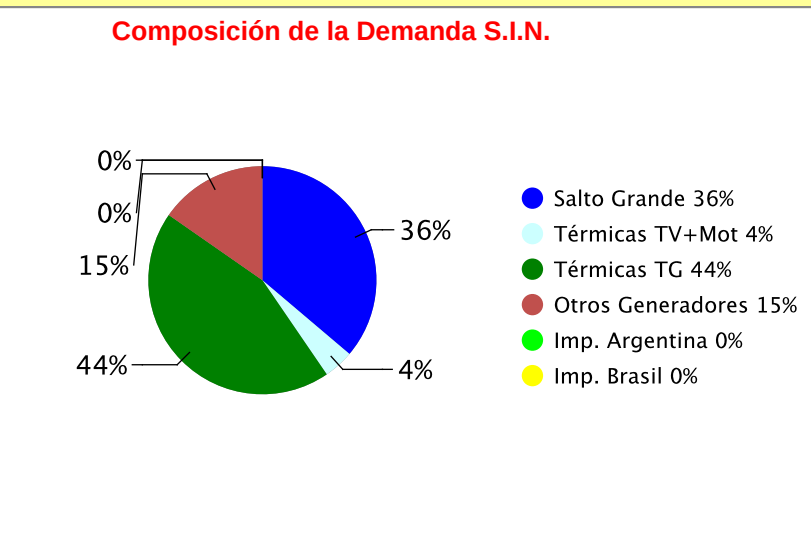



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

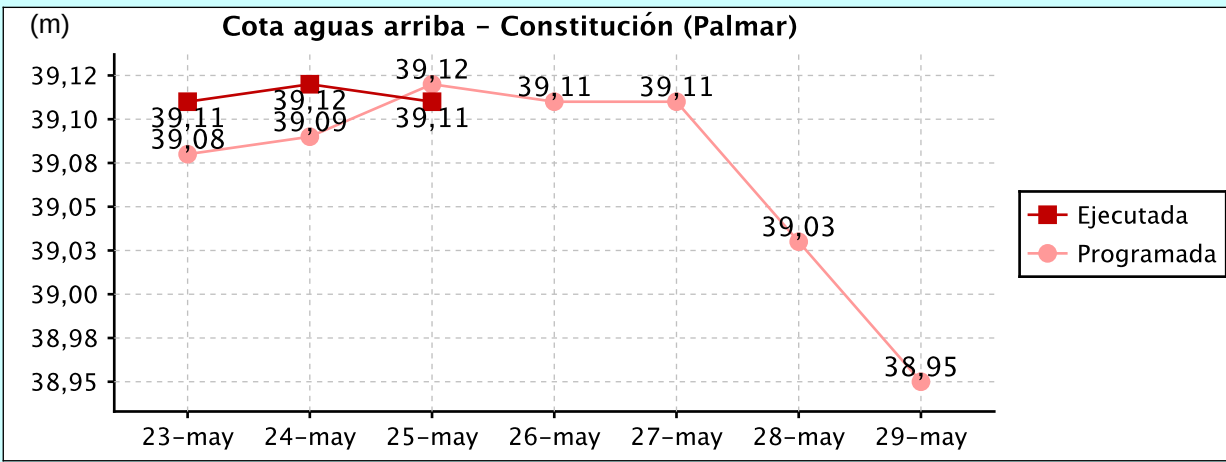
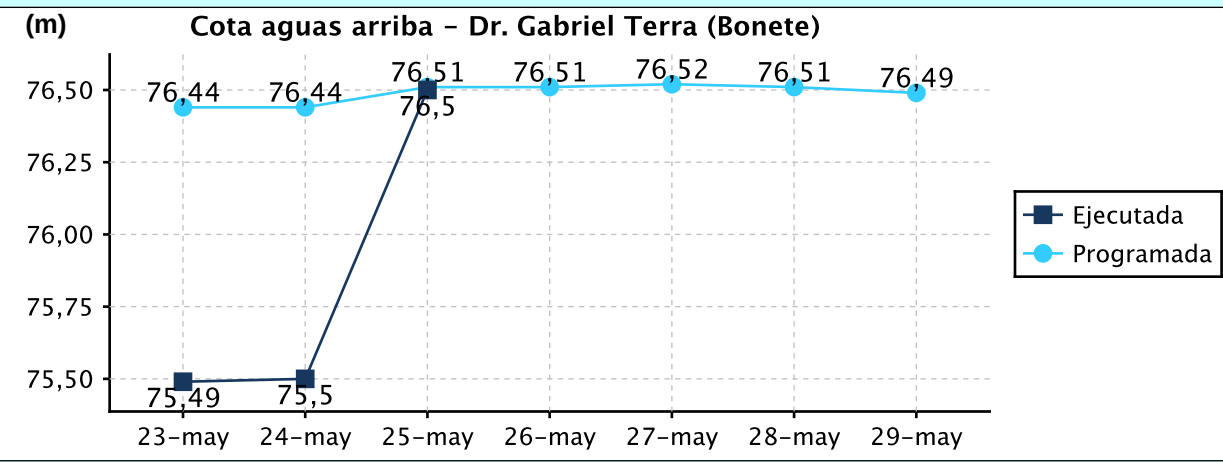


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,51	76,5
Baygorria	53,97	53,97
Palmar	39,12	39,11
SGU	33,47	33,64

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

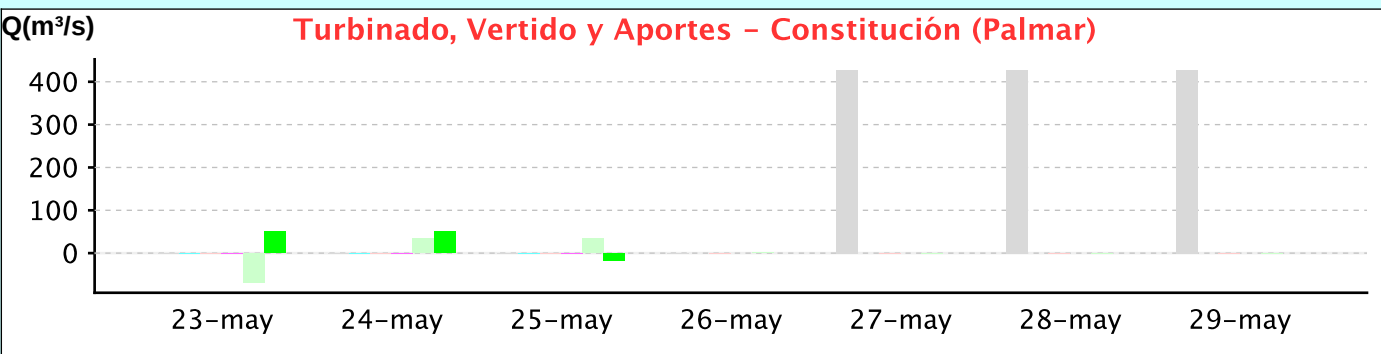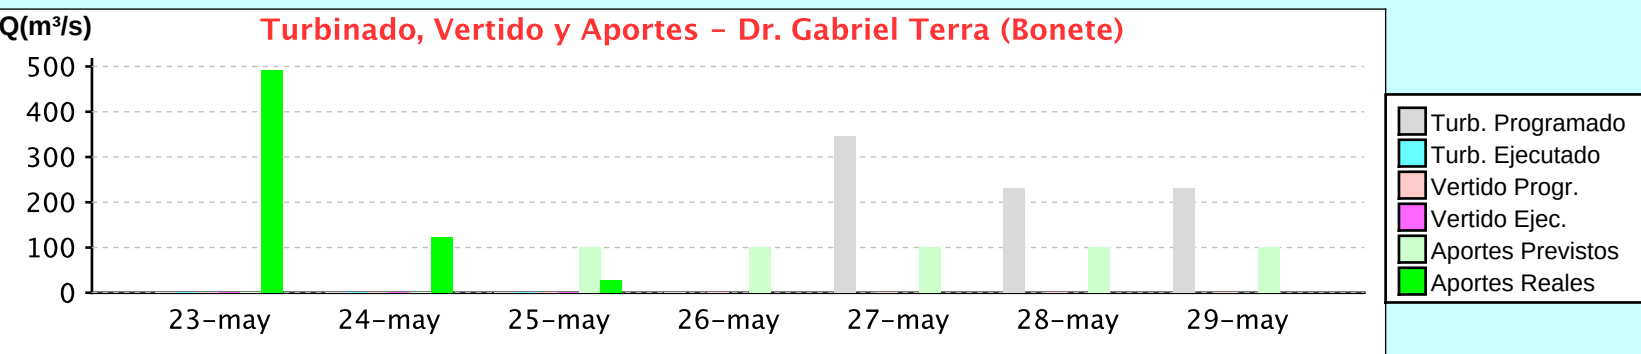

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

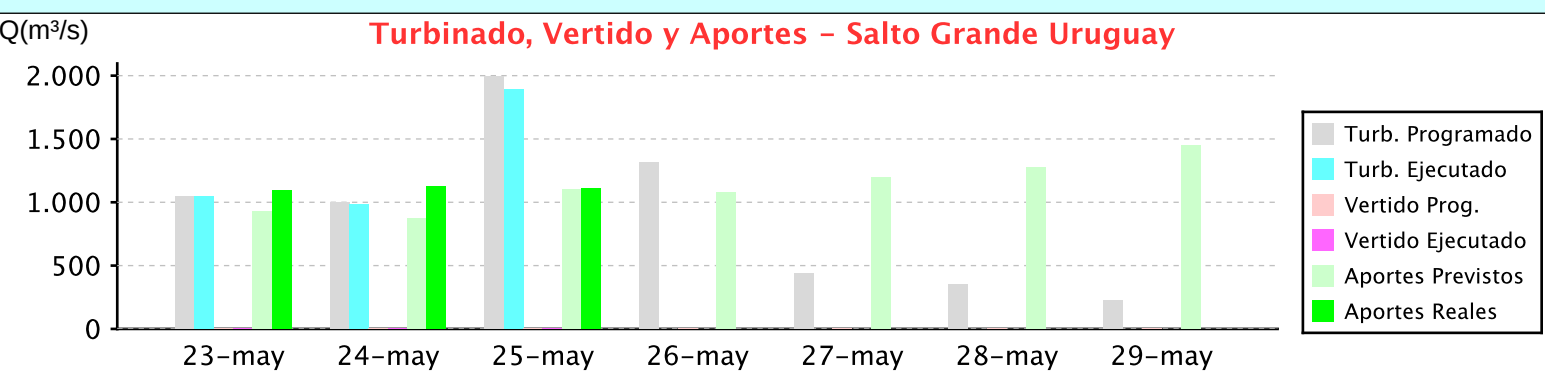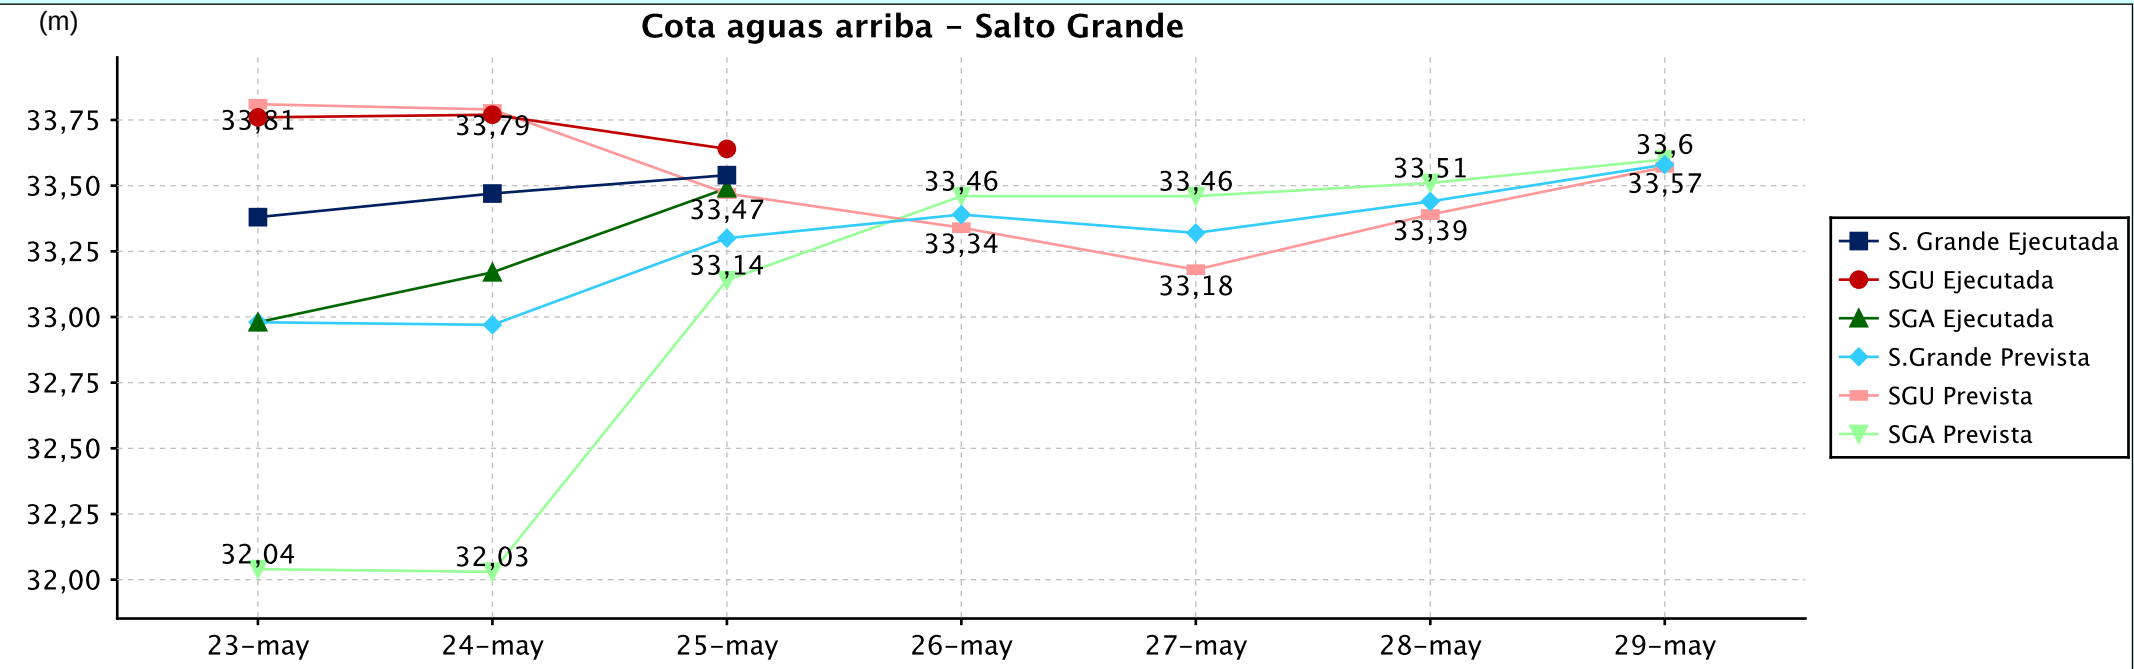

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	33,64
Cota Vista Arg	33,49
Cota real	33,54
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
2.792	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	1.996	1.892

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	100	28
Baygorria	0	19
Palmar	35	-18
SGU	1.100	1.110

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
