




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

martes 26 de mayo de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	1.226
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	1.230
Central La Tablada	-86
Central P. del Tigre	5.868
APR A	1.970
APR B	1.485
APR C	2.034
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	-1
C. Baygorria	-8
C. Palmar	0
C. Salto Grande	11.663
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	5.809
TOTAL Generación	29.960

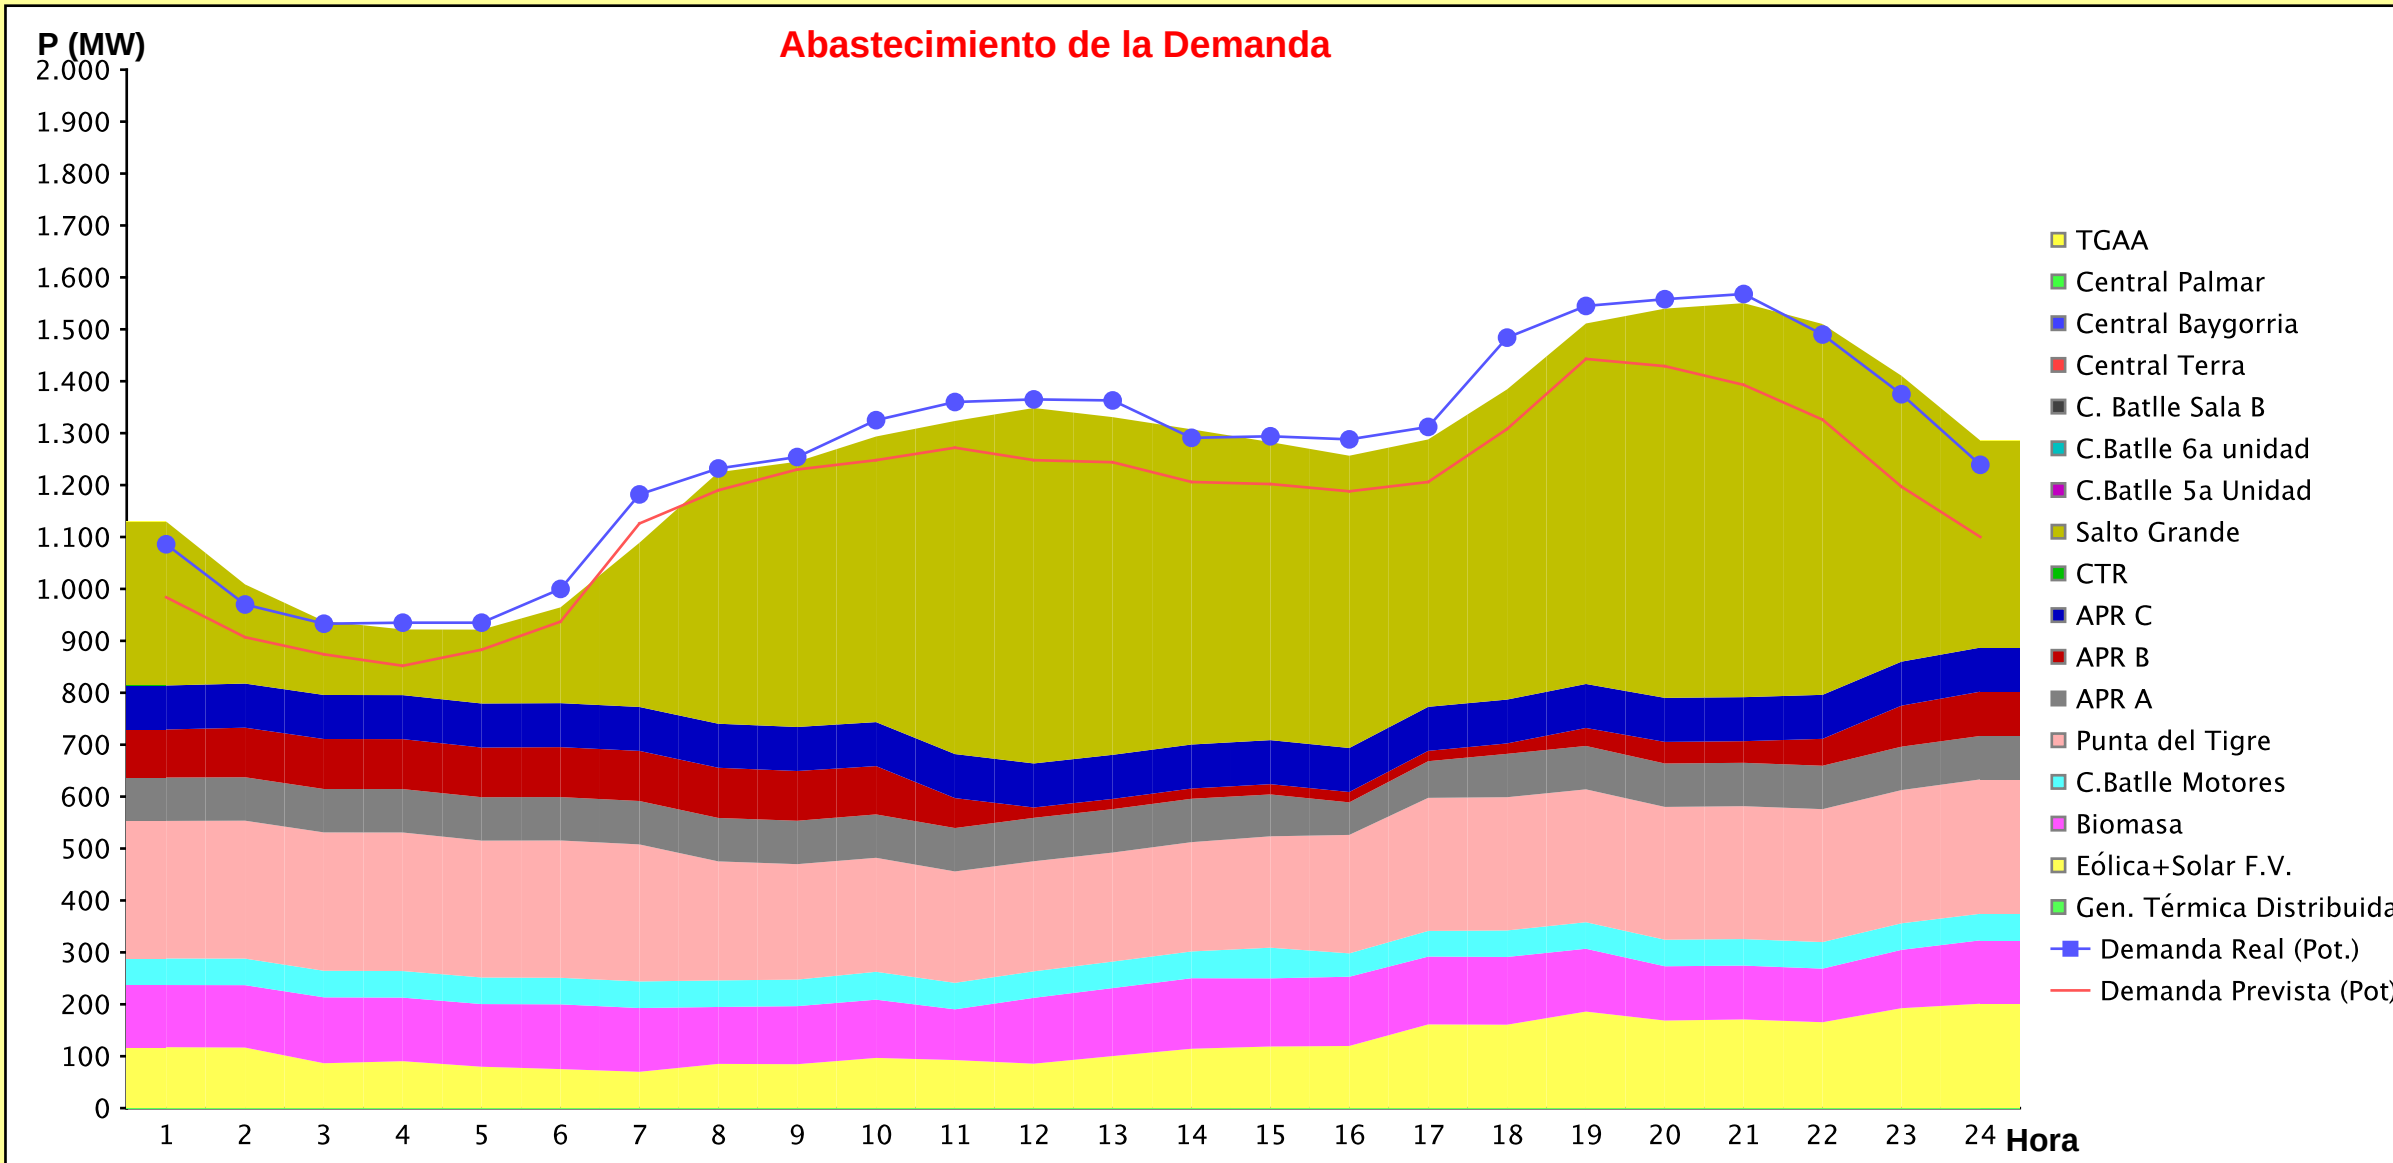

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0



DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	29.960
(en bormes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	27.993
Diferencia (MWh)	1.967
Ejecutada - Programada	7,03 %

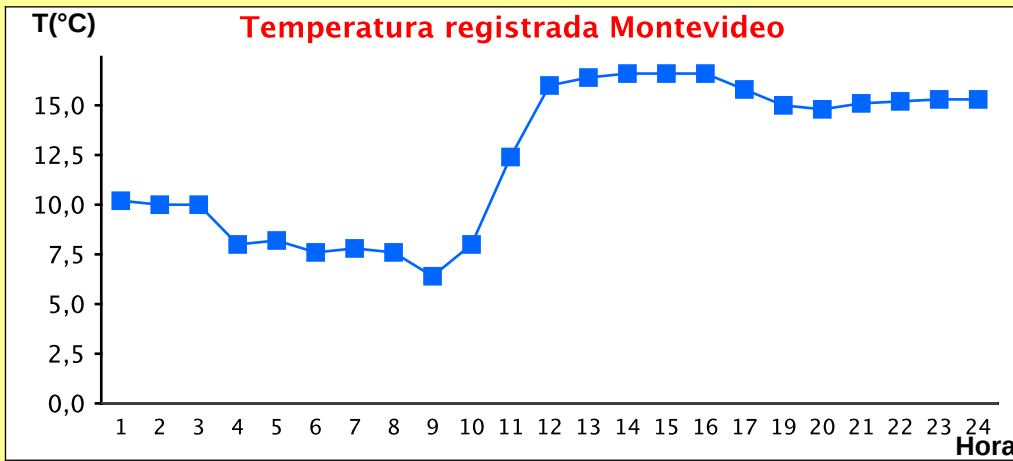


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1372 Hora 11:33
Potencia mínima:	911 Hora 03:56
Pico noche:	1574 Hora 20:35

Generación Media (MW)	
Eólica	123,9
Biomasa	119,9
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

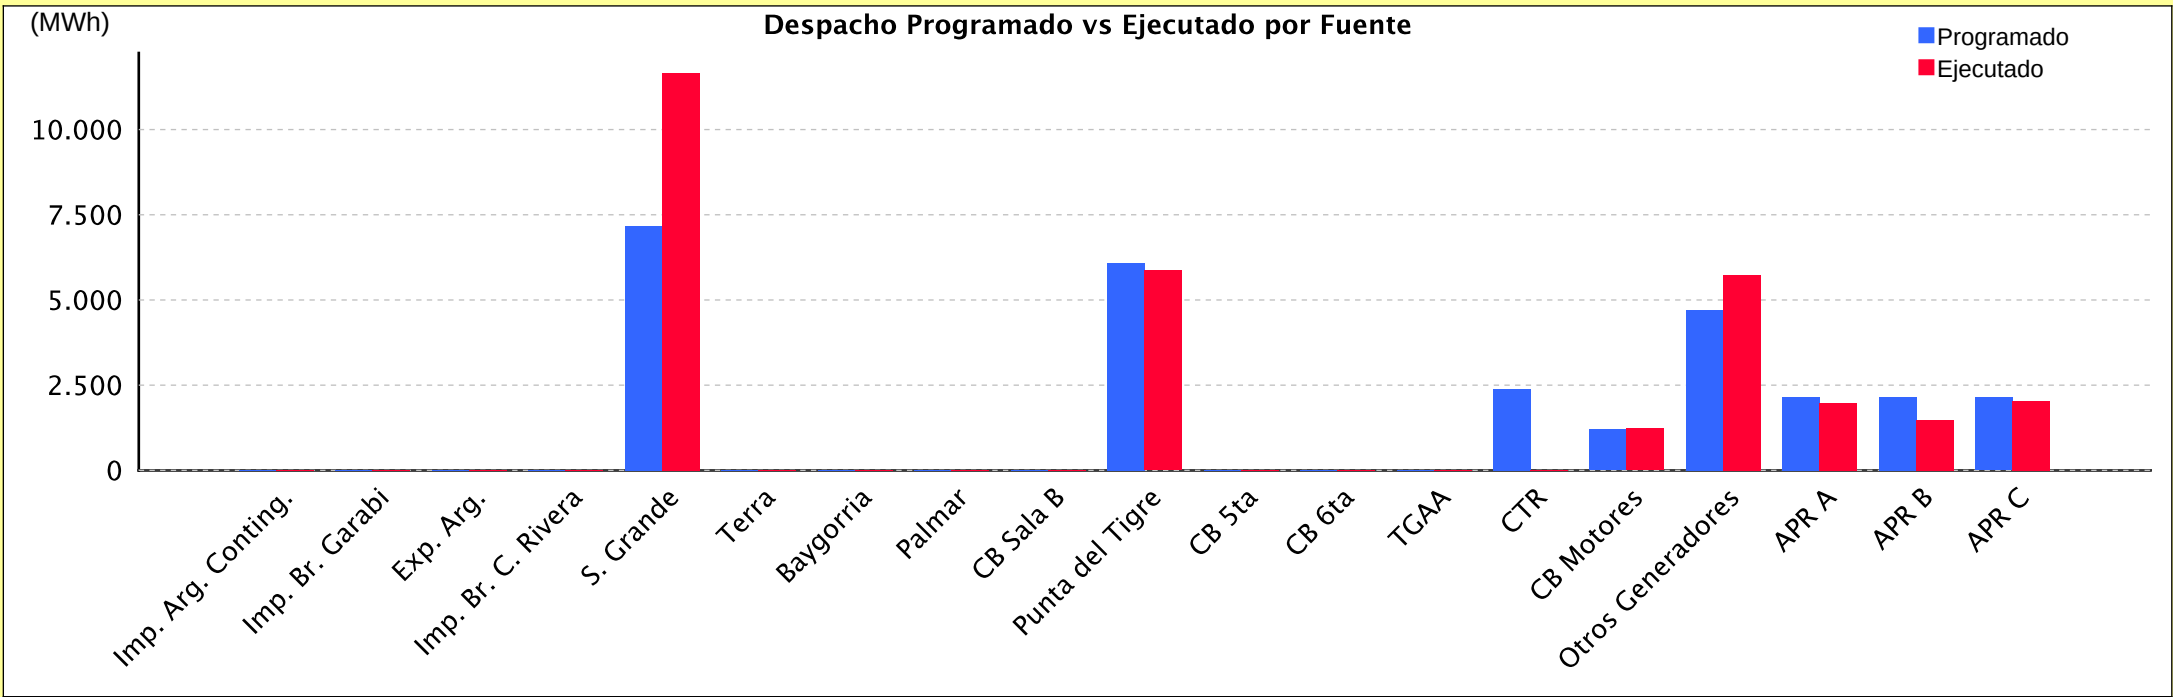
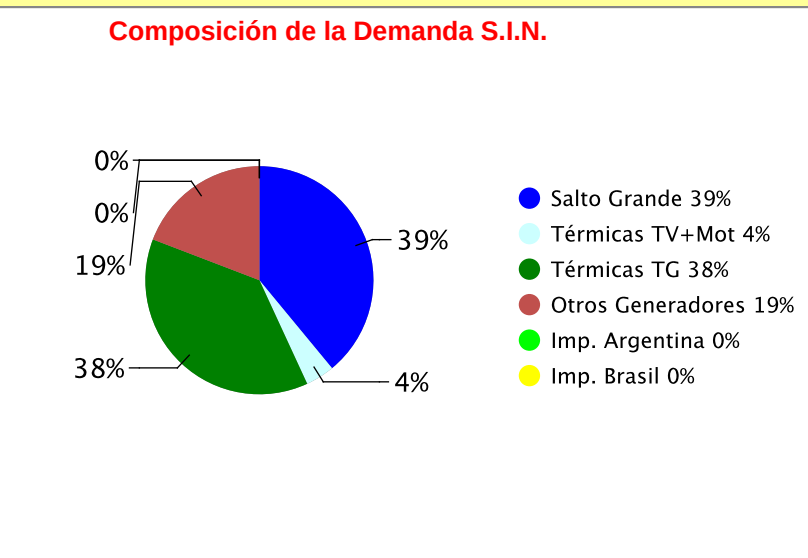


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

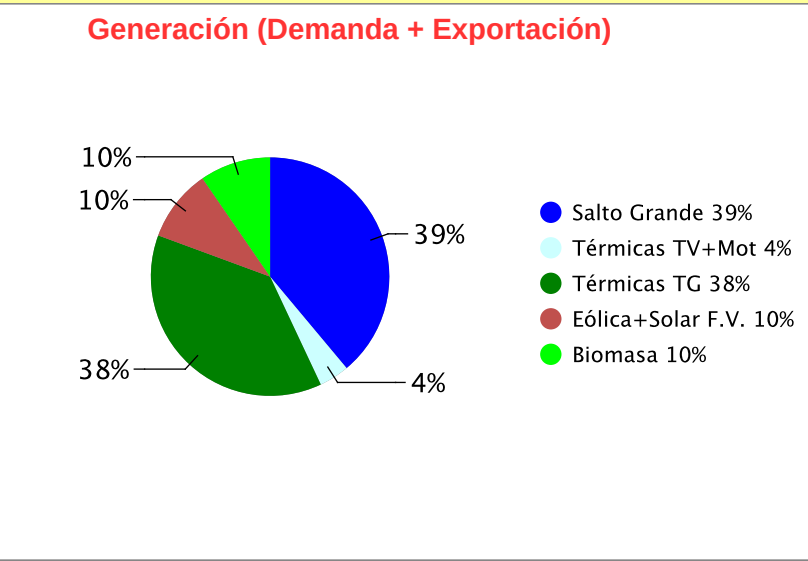



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

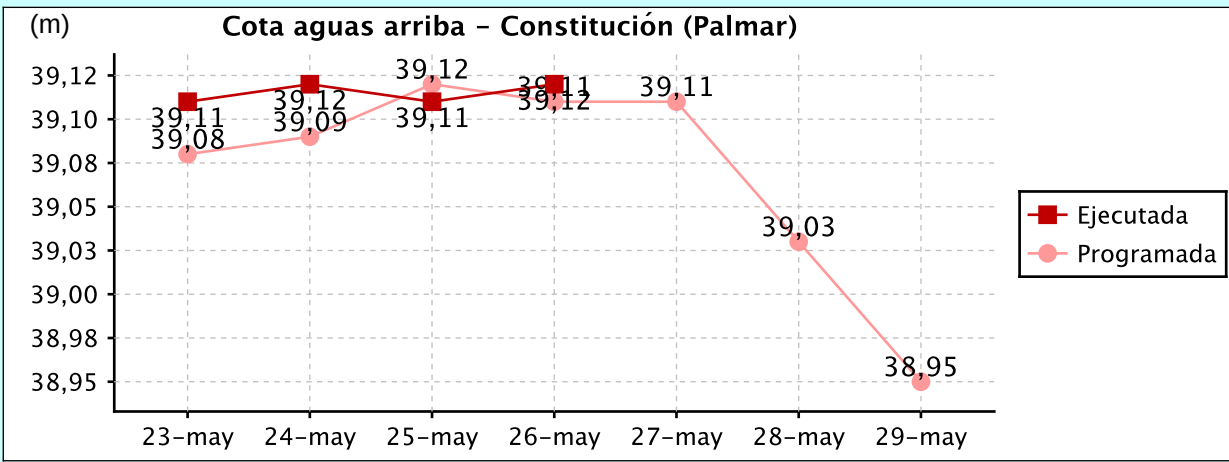
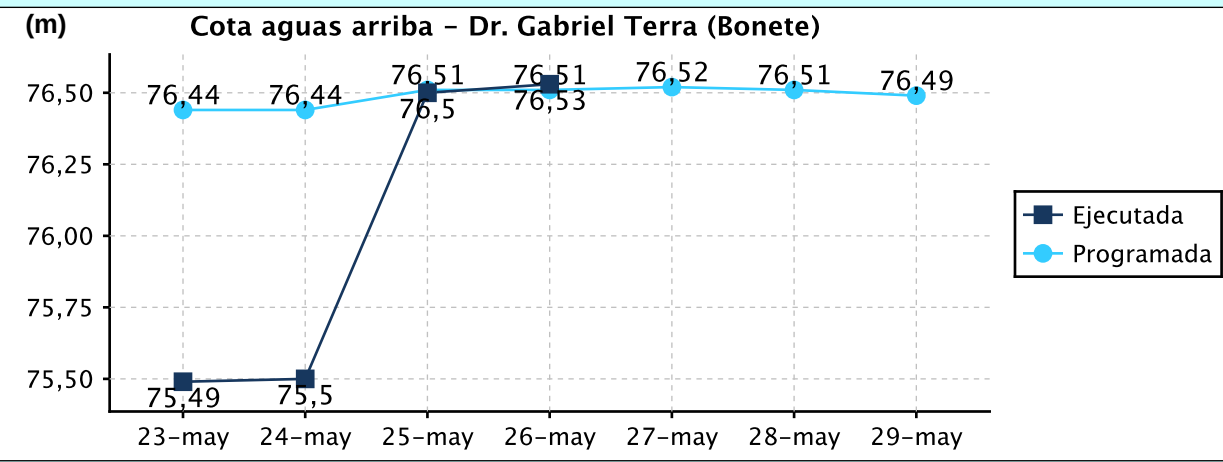


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,51	76,53
Baygorria	53,98	53,96
Palmar	39,11	39,12
SGU	33,34	33,28

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

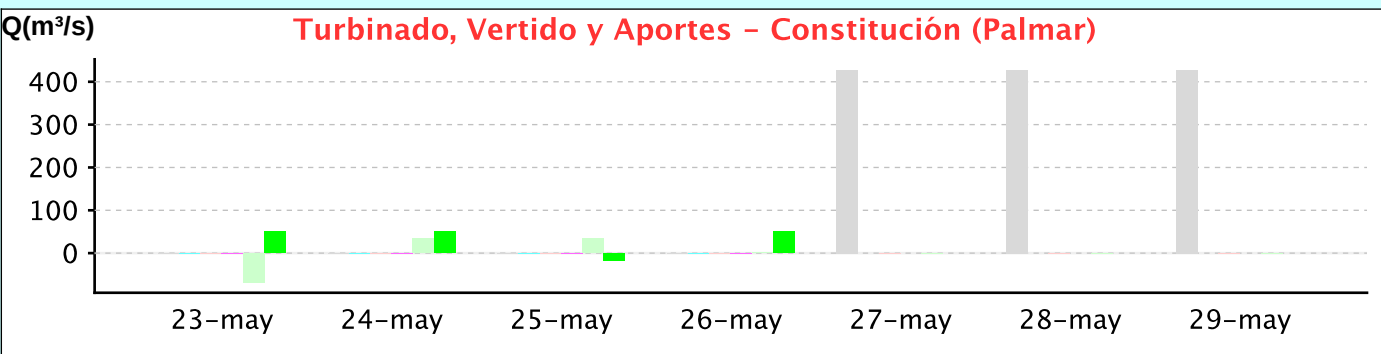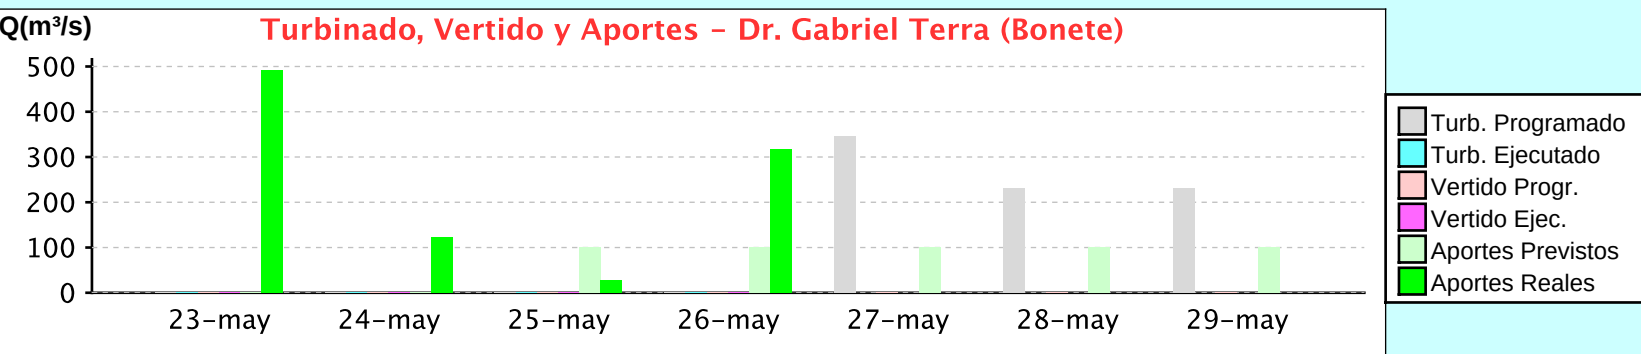

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

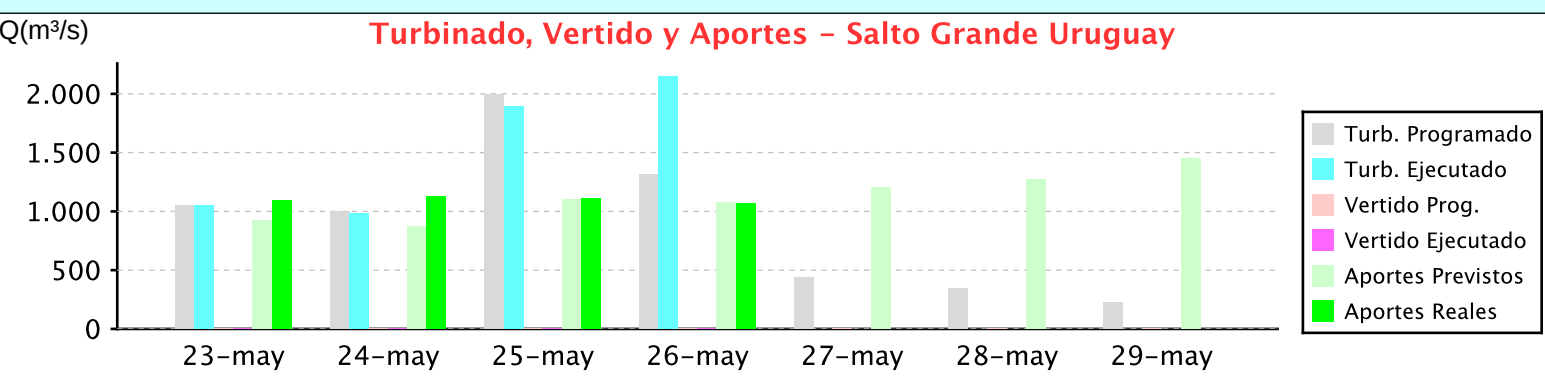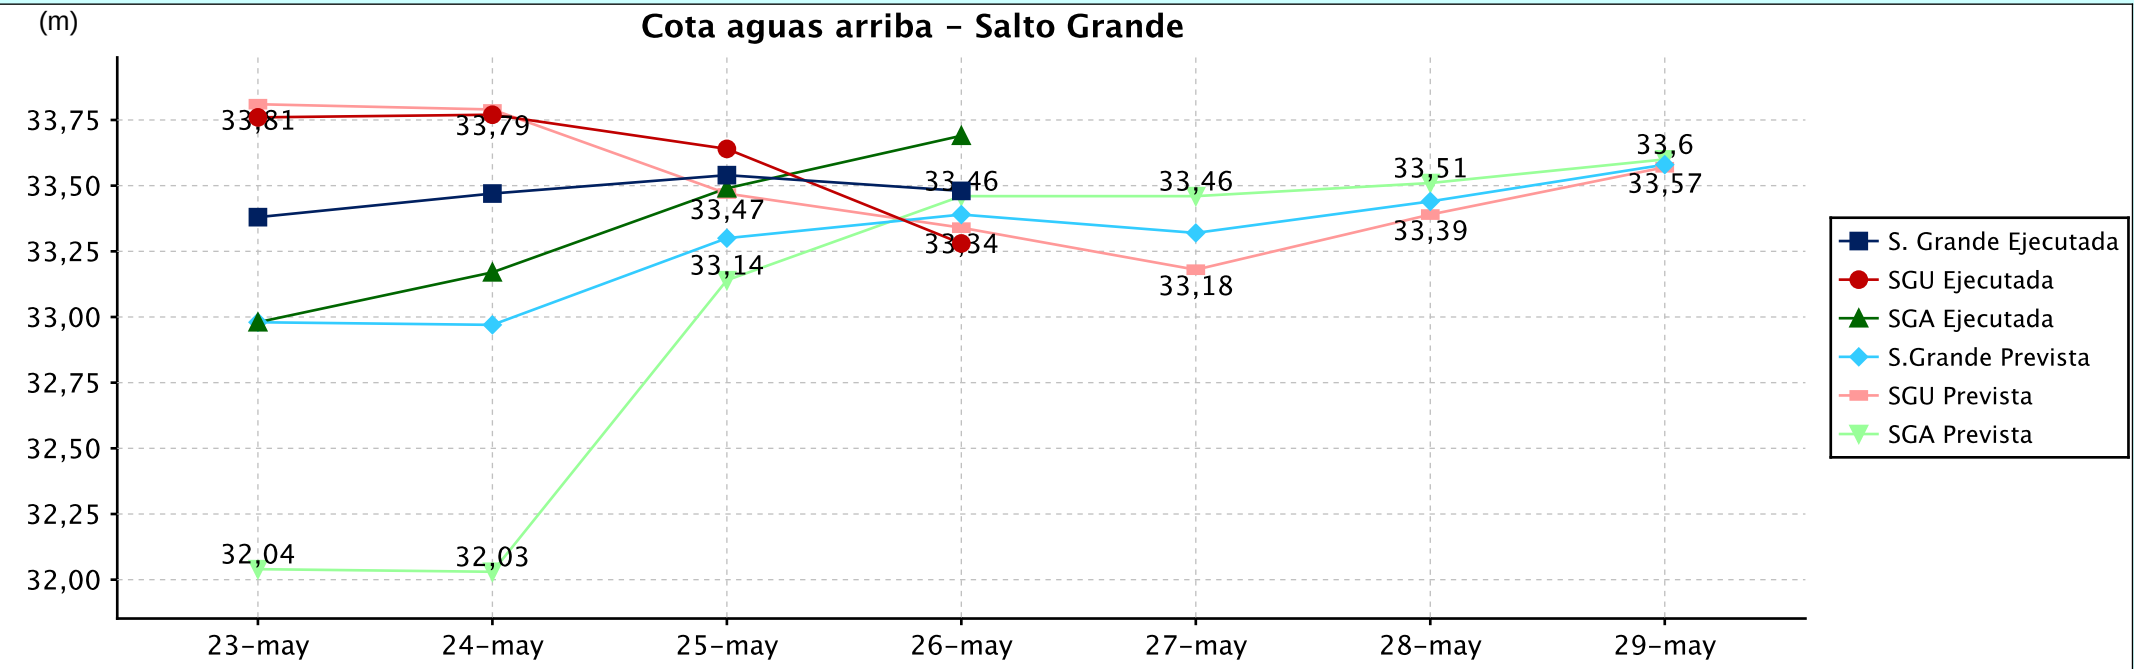

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	33,28
Cota Vista Arg	33,69
Cota real	33,48
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	-7.809

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	1.316	2.151

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	100	318
Baygorria	0	0
Palmar	1	51
SGU	1.075	1.064

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
