




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

miércoles 27 de mayo de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	1.323
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	1.327
Central La Tablada	-83
Central P. del Tigre	5.565
APR A	2.199
APR B	1.770
APR C	1.849
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	-0
C. Baygorria	-8
C. Palmar	0
C. Salto Grande	8.991
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	8.285
TOTAL Generación	29.891

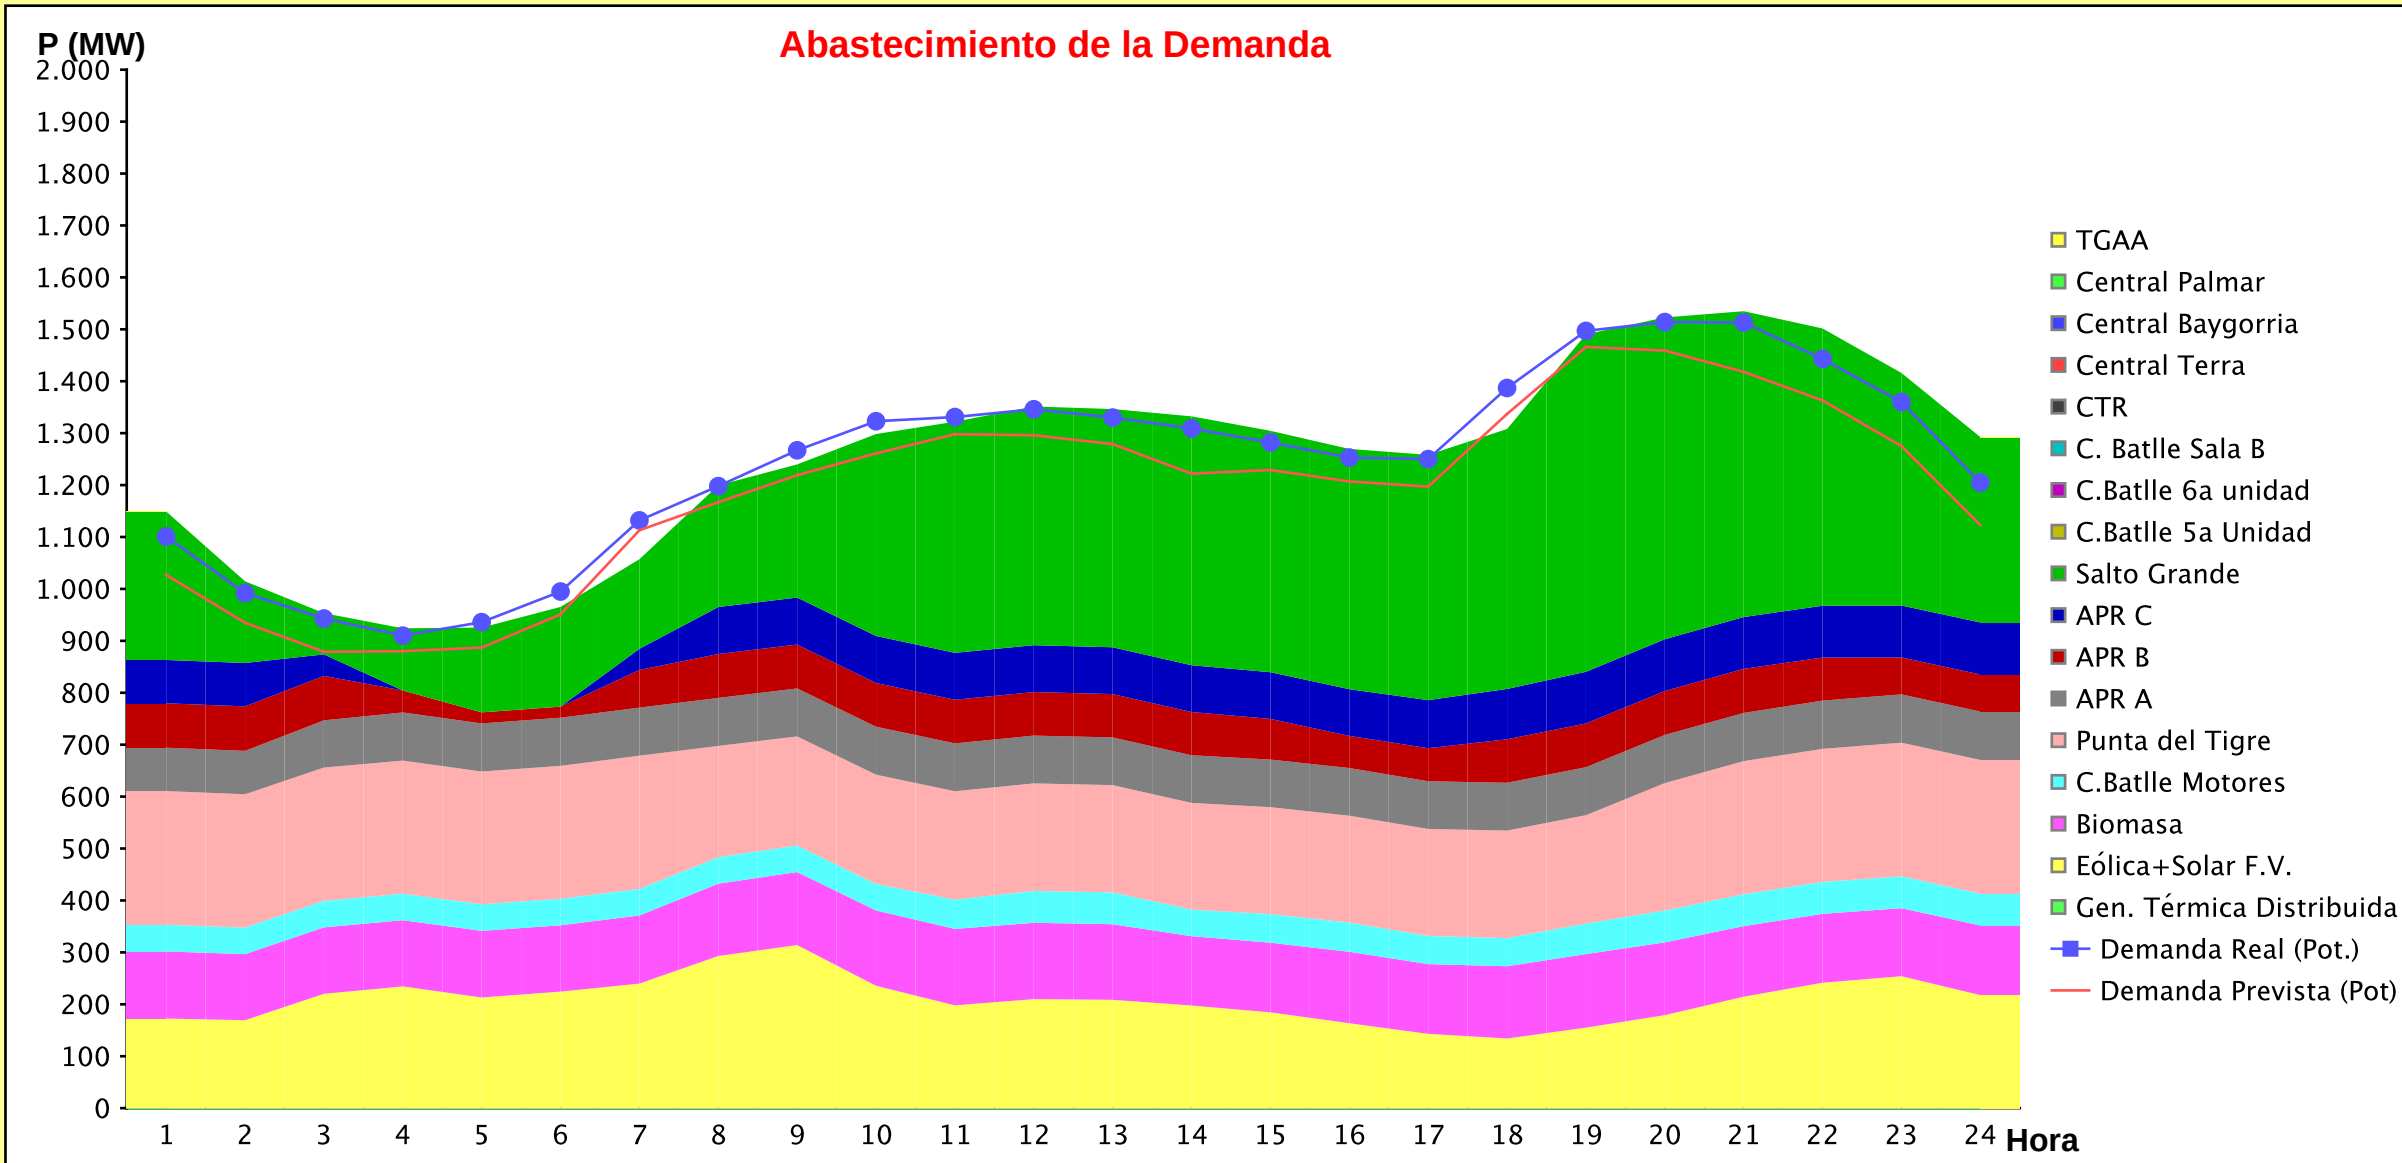

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	29.891
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	28.488
Diferencia (MWh)	1.403
Ejecutada - Programada	4,92 %

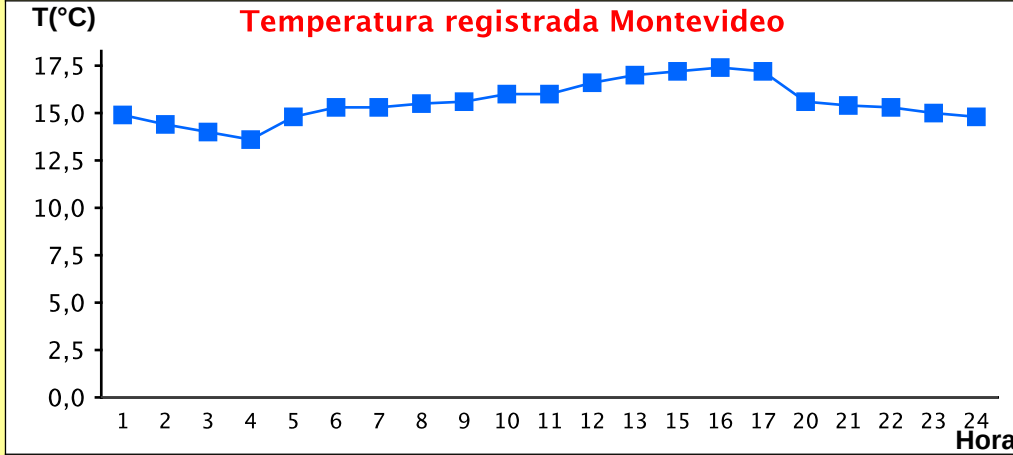



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1351 Hora 11:48
Potencia mínima:	904 Hora 03:51
Pico noche:	1532 Hora 20:40

Generación Media (MW)	
Eólica	209,6
Biomasa	135,8
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

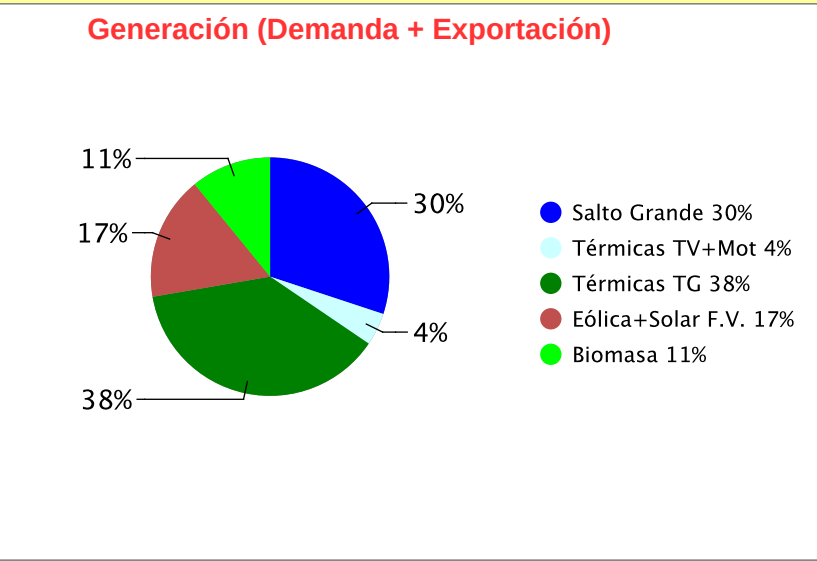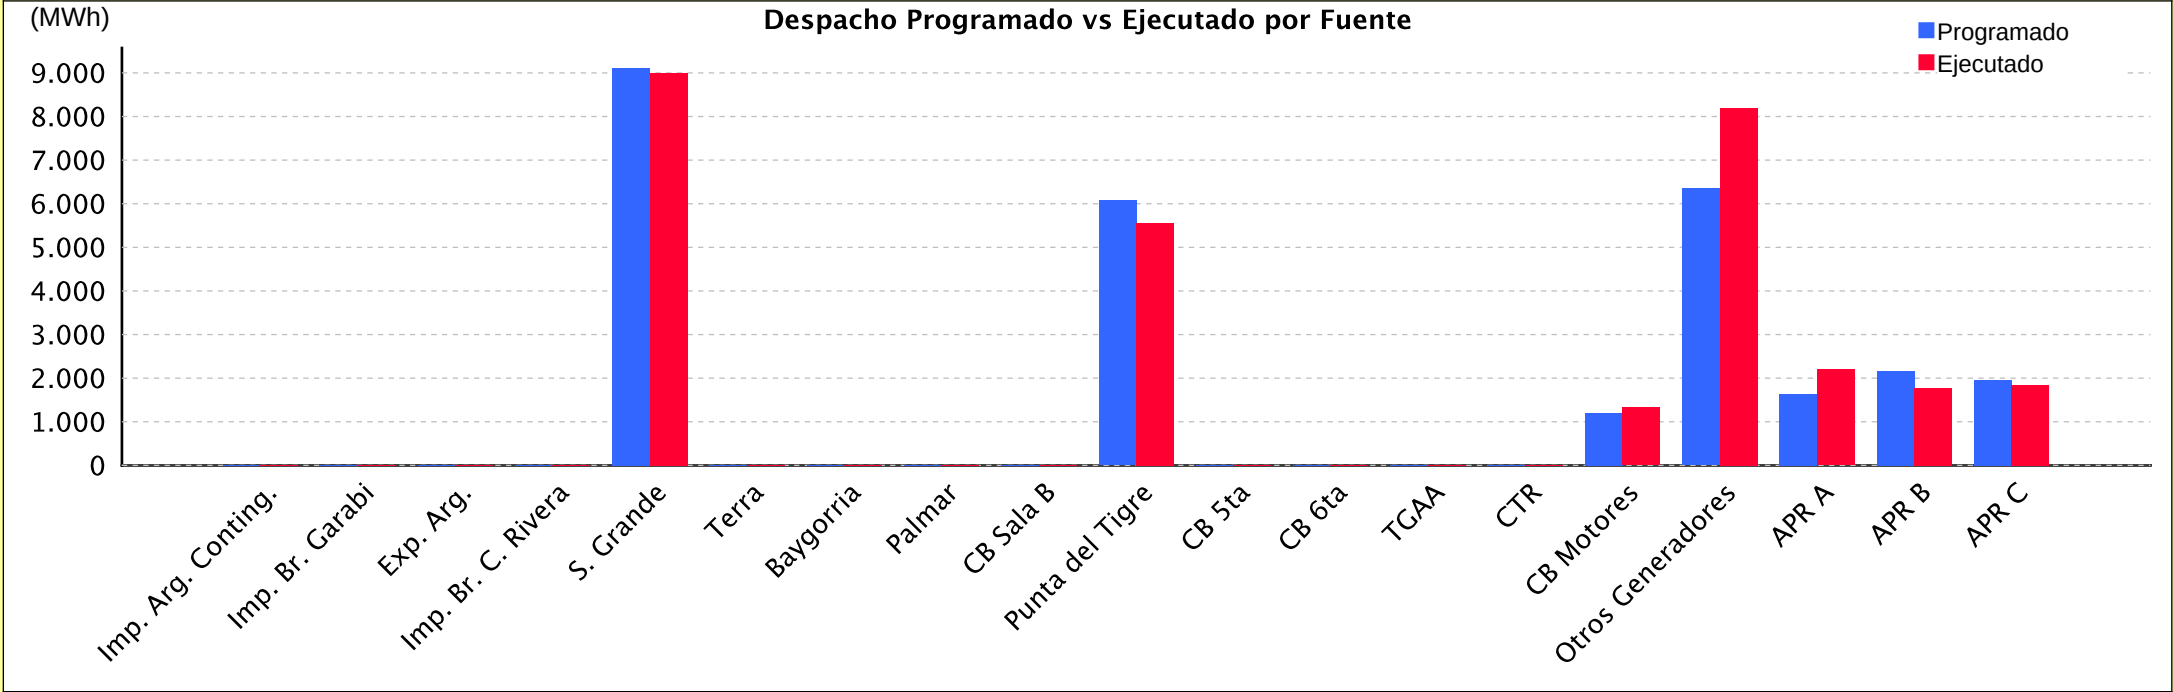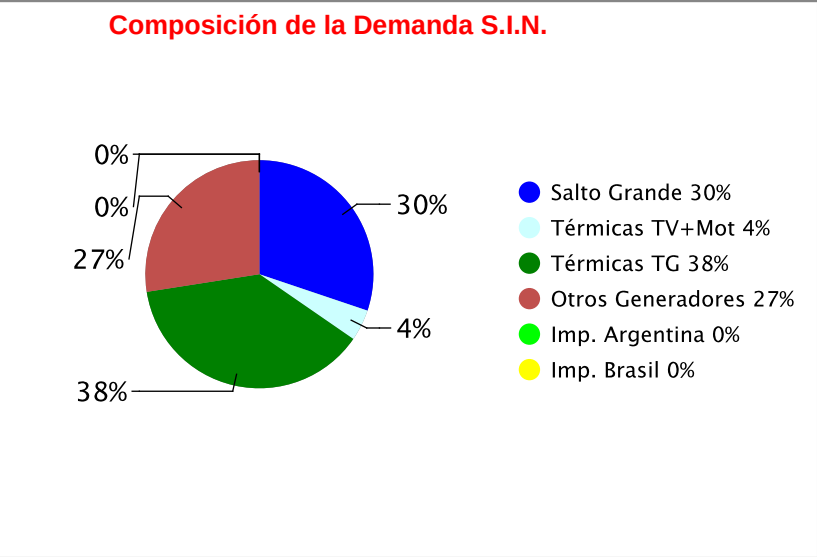



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

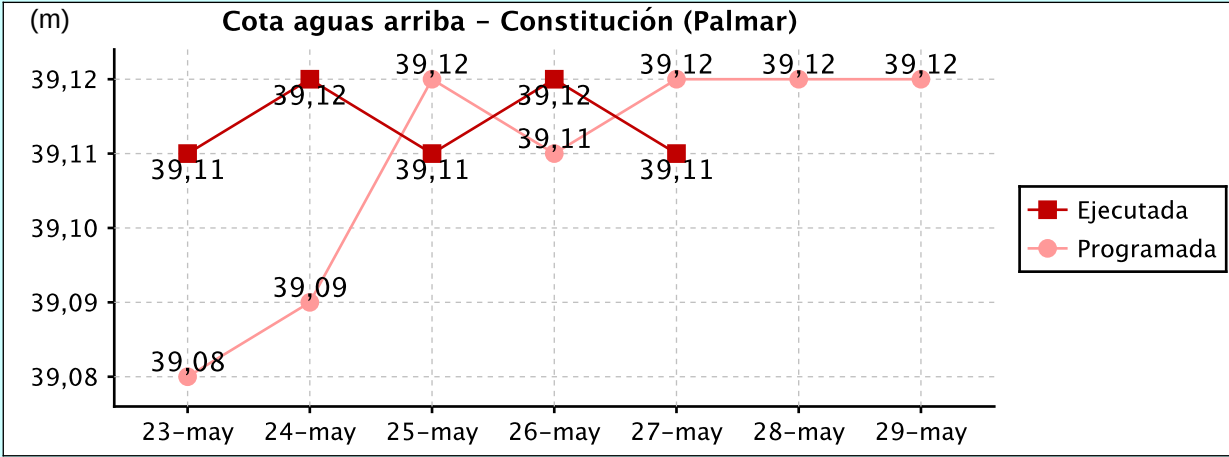
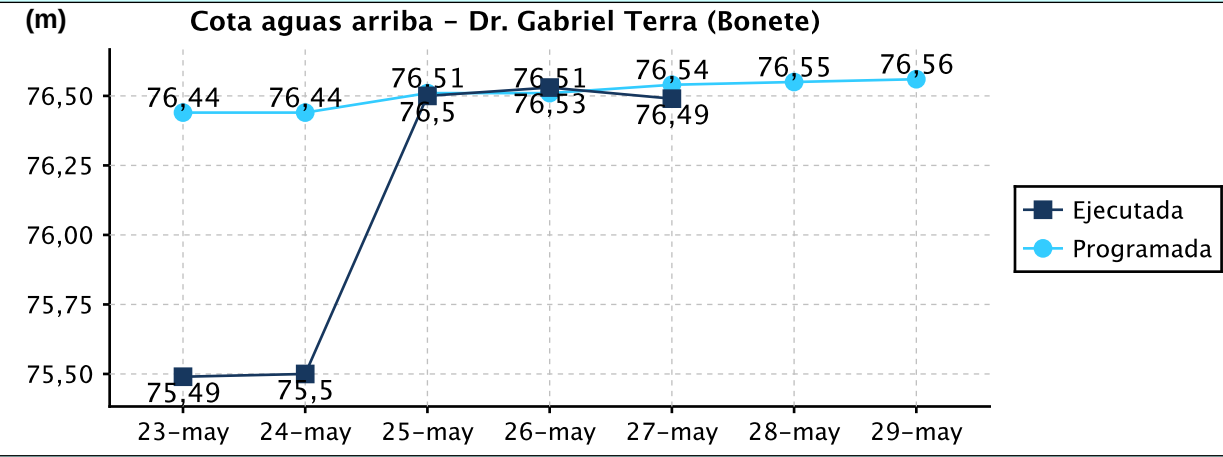


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,54	76,49
Baygorria	53,97	53,96
Palmar	39,12	39,11
SGU	33,09	33,13

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

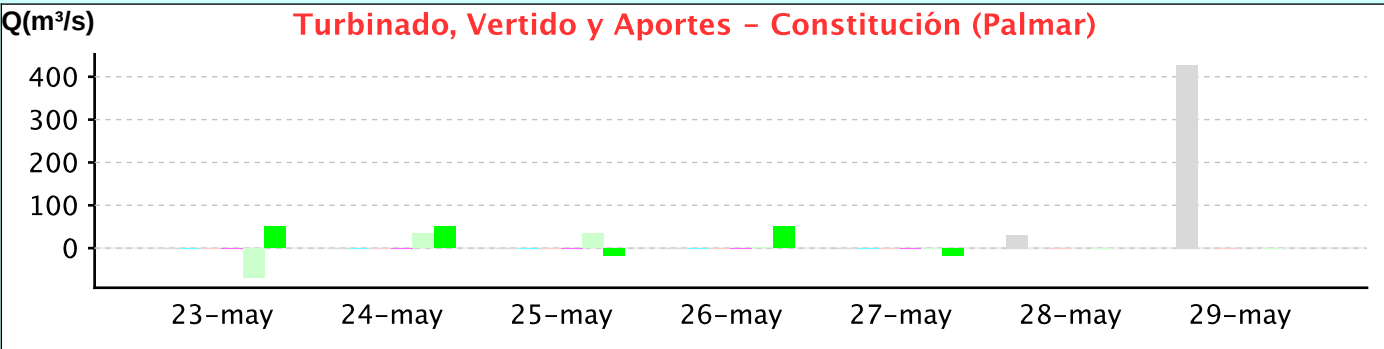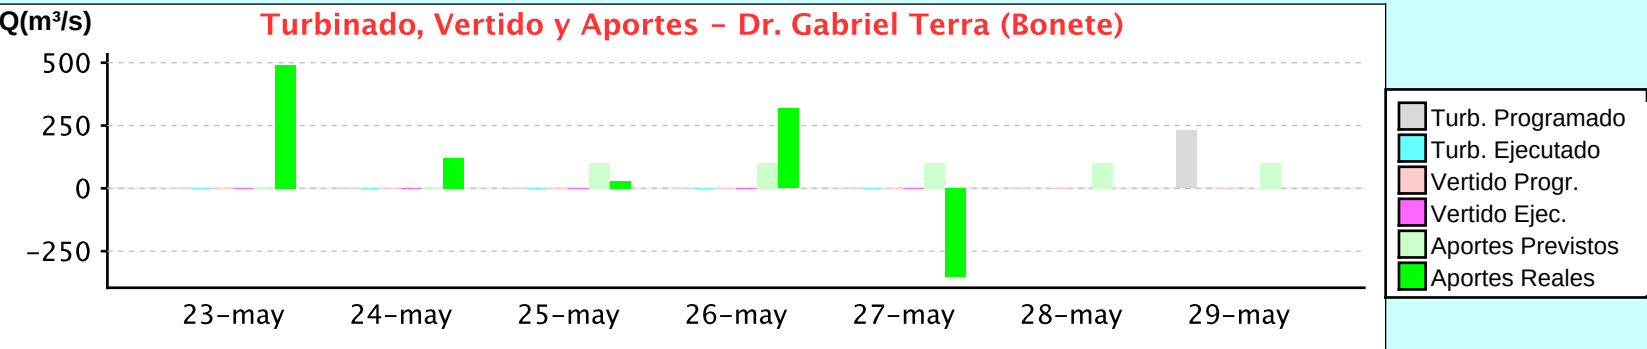

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

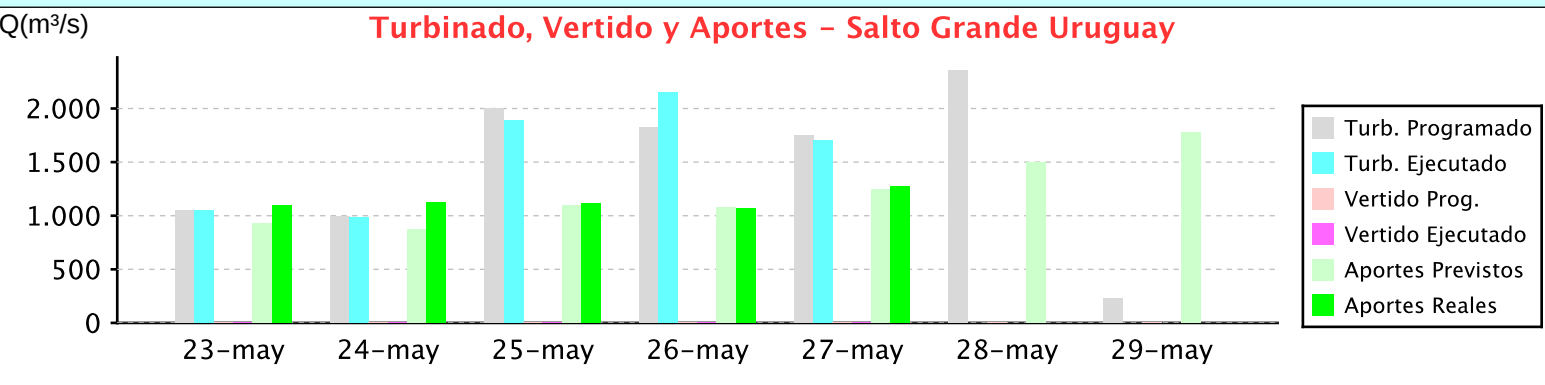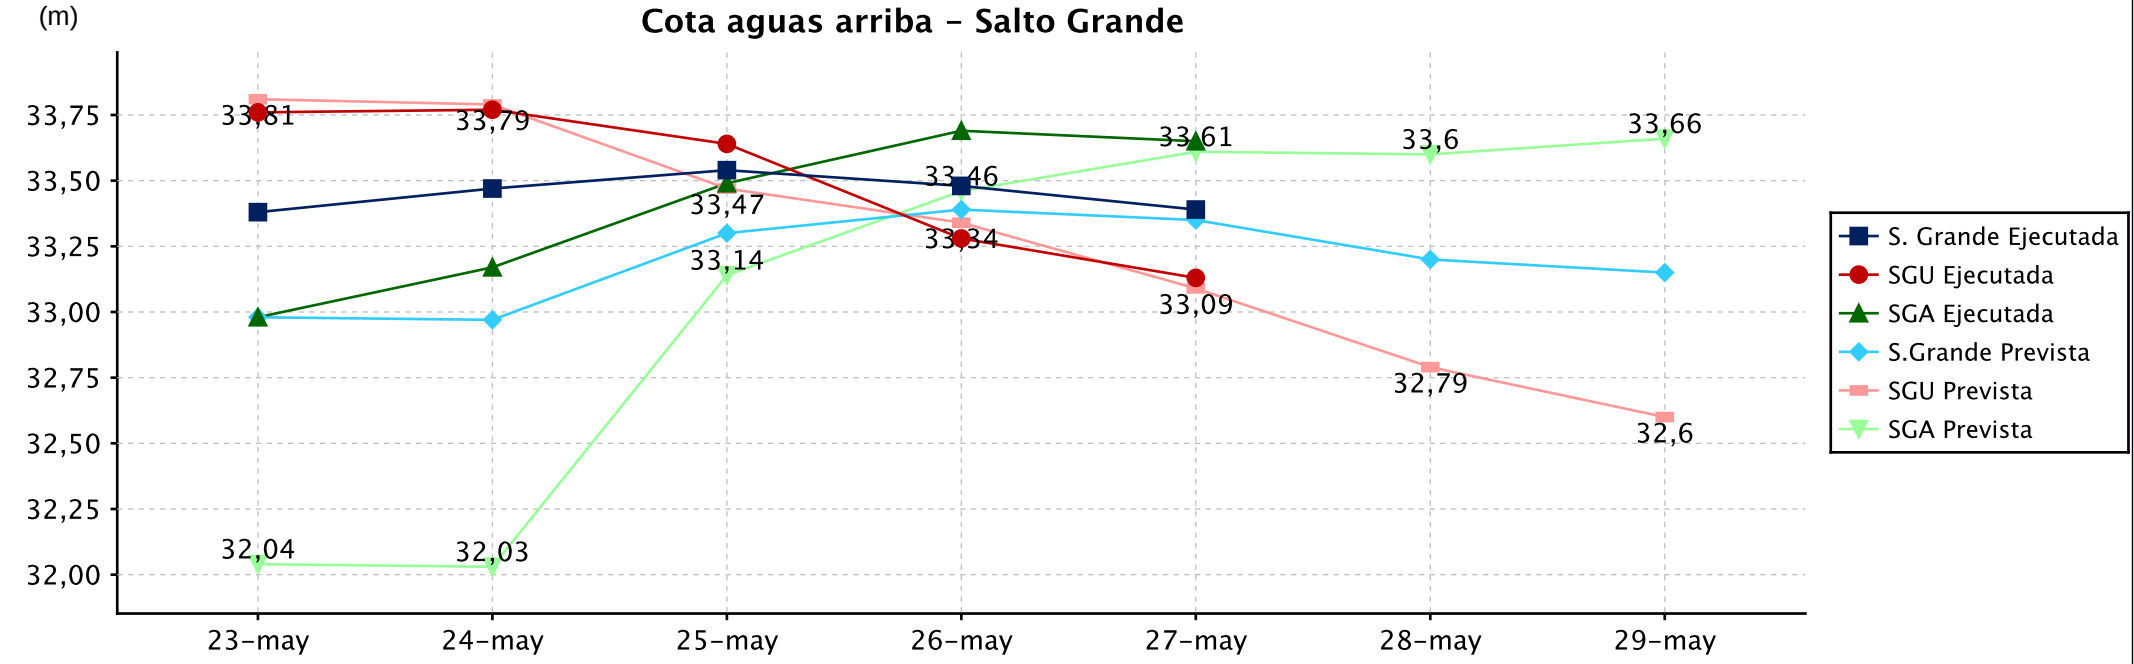

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	33,13
Cota Vista Arg	33,65
Cota real	33,39

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	-9.695
------------------------------------	--------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	1.748	1.701

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	100	-353
Baygorria	0	8
Palmar	0	-18
SGU	1.250	1.273

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
