




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

jueves 28 de mayo de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	1.373
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	1.377
Central La Tablada	-83
Central P. del Tigre	5.459
APR A	1.849
APR B	1.687
APR C	2.119
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	-1
C. Baygorria	74
C. Palmar	0
C. Salto Grande	11.014
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	5.763
TOTAL Generación	29.255

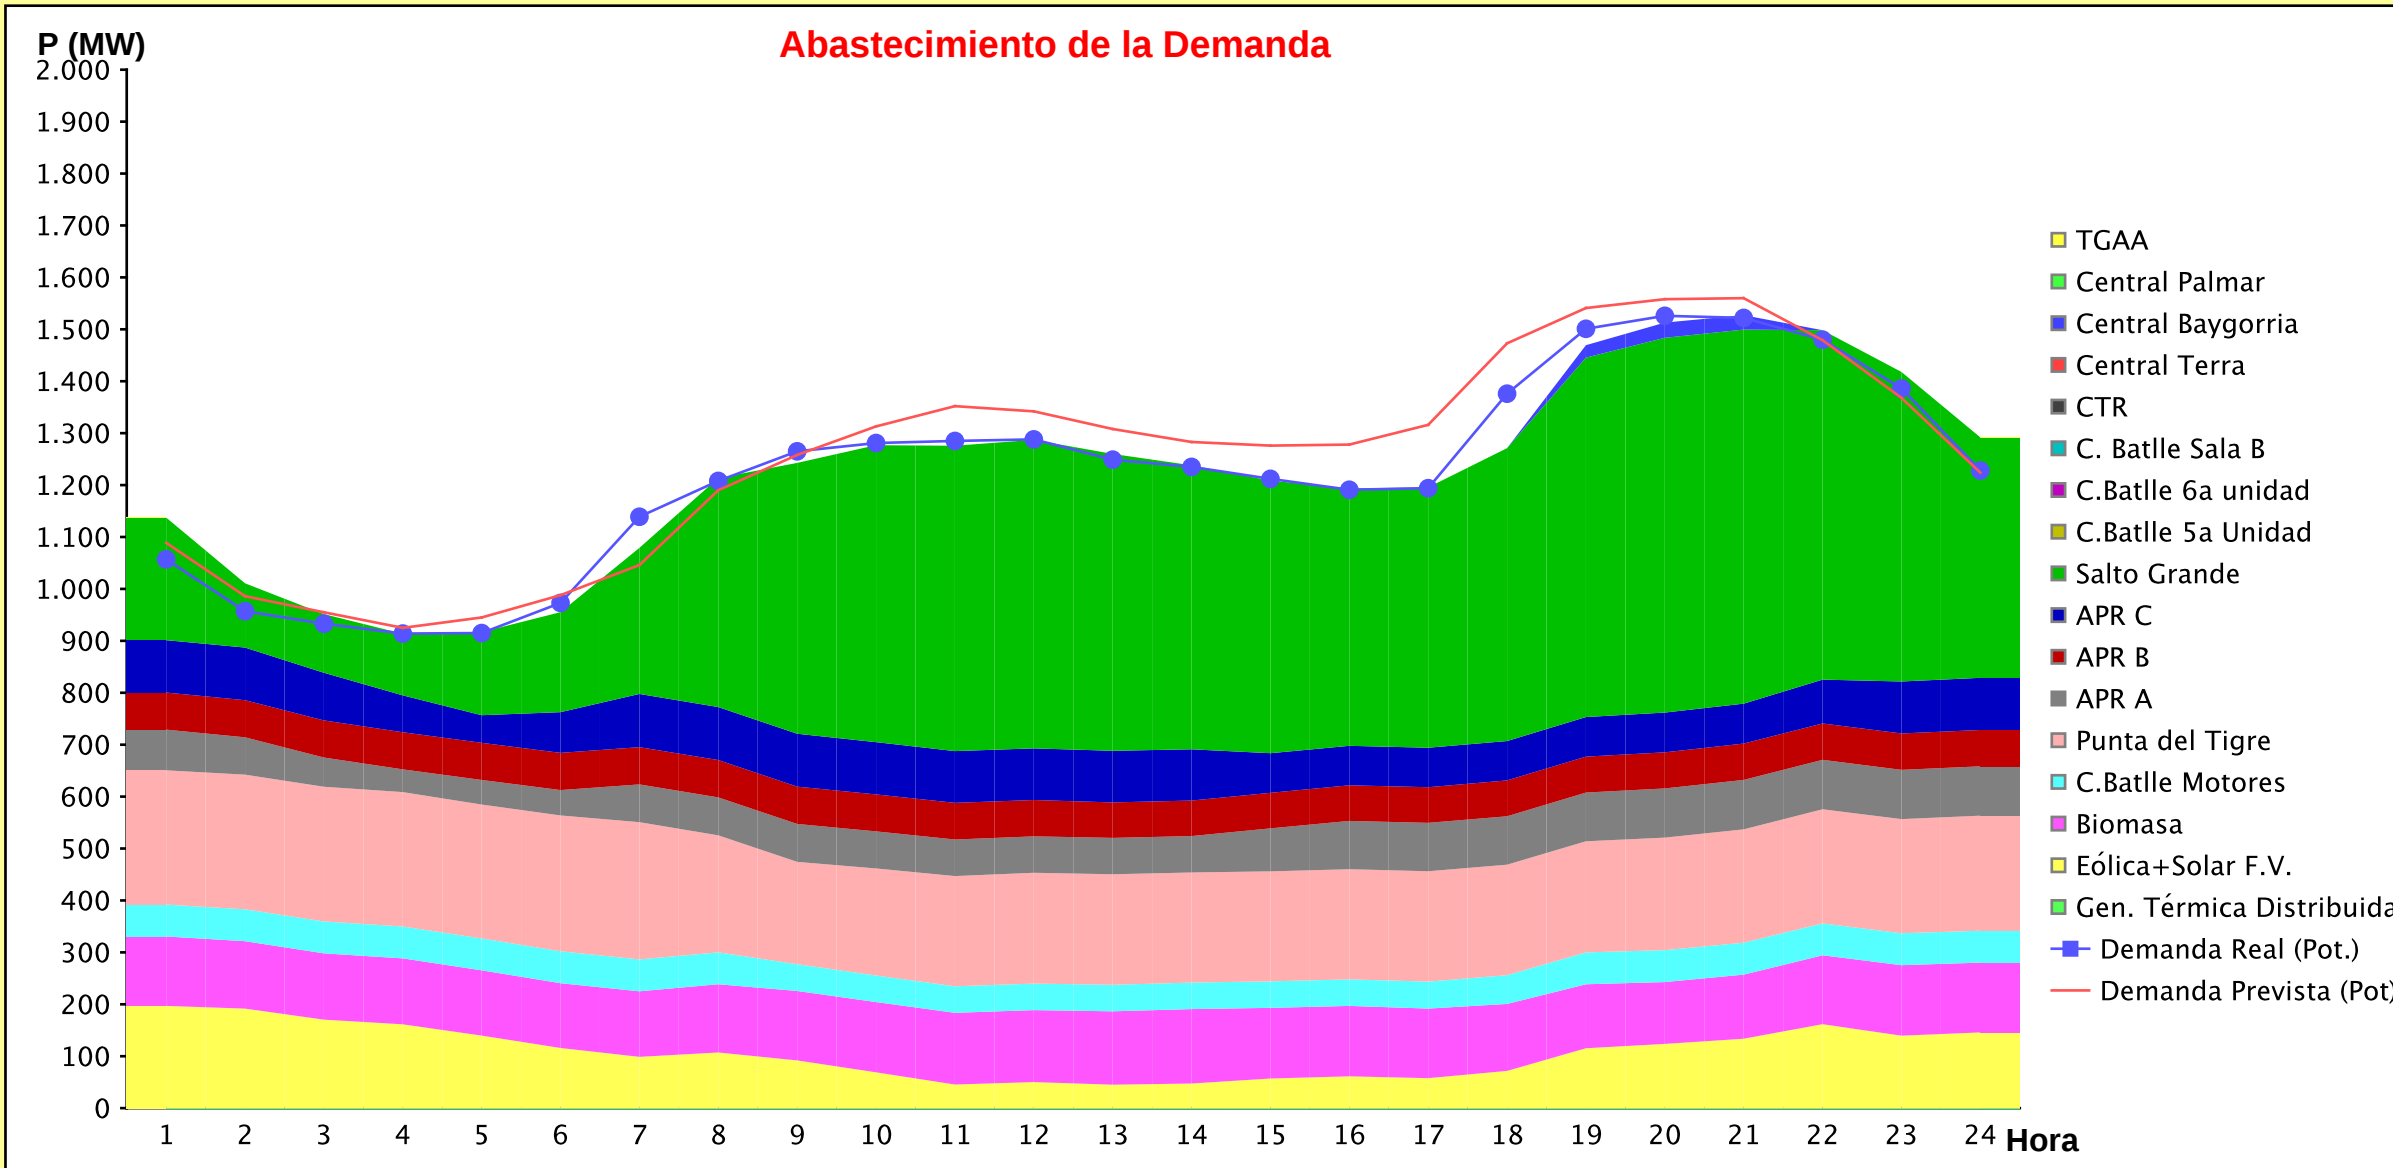

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	29.255
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	30.053
Diferencia (MWh)	-798
Ejecutada - Programada	-2,66 %

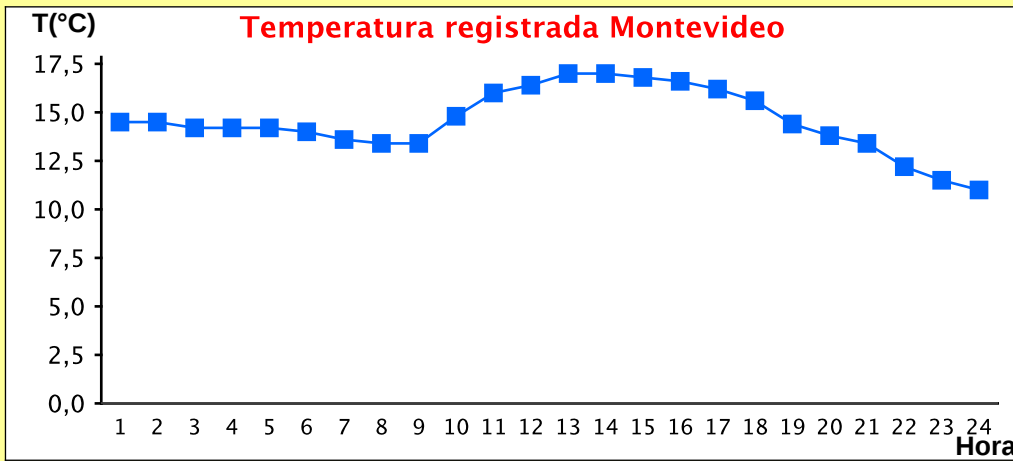



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1295 Hora 11:25
Potencia mínima:	870 Hora 03:49
Pico noche:	1530 Hora 20:37

Generación Media (MW)	
Eólica	109,0
Biomasa	131,7
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

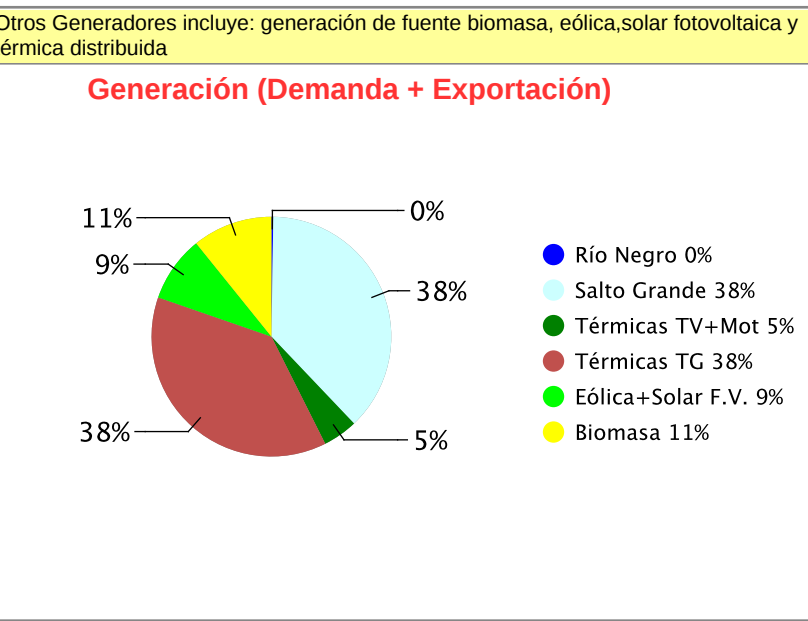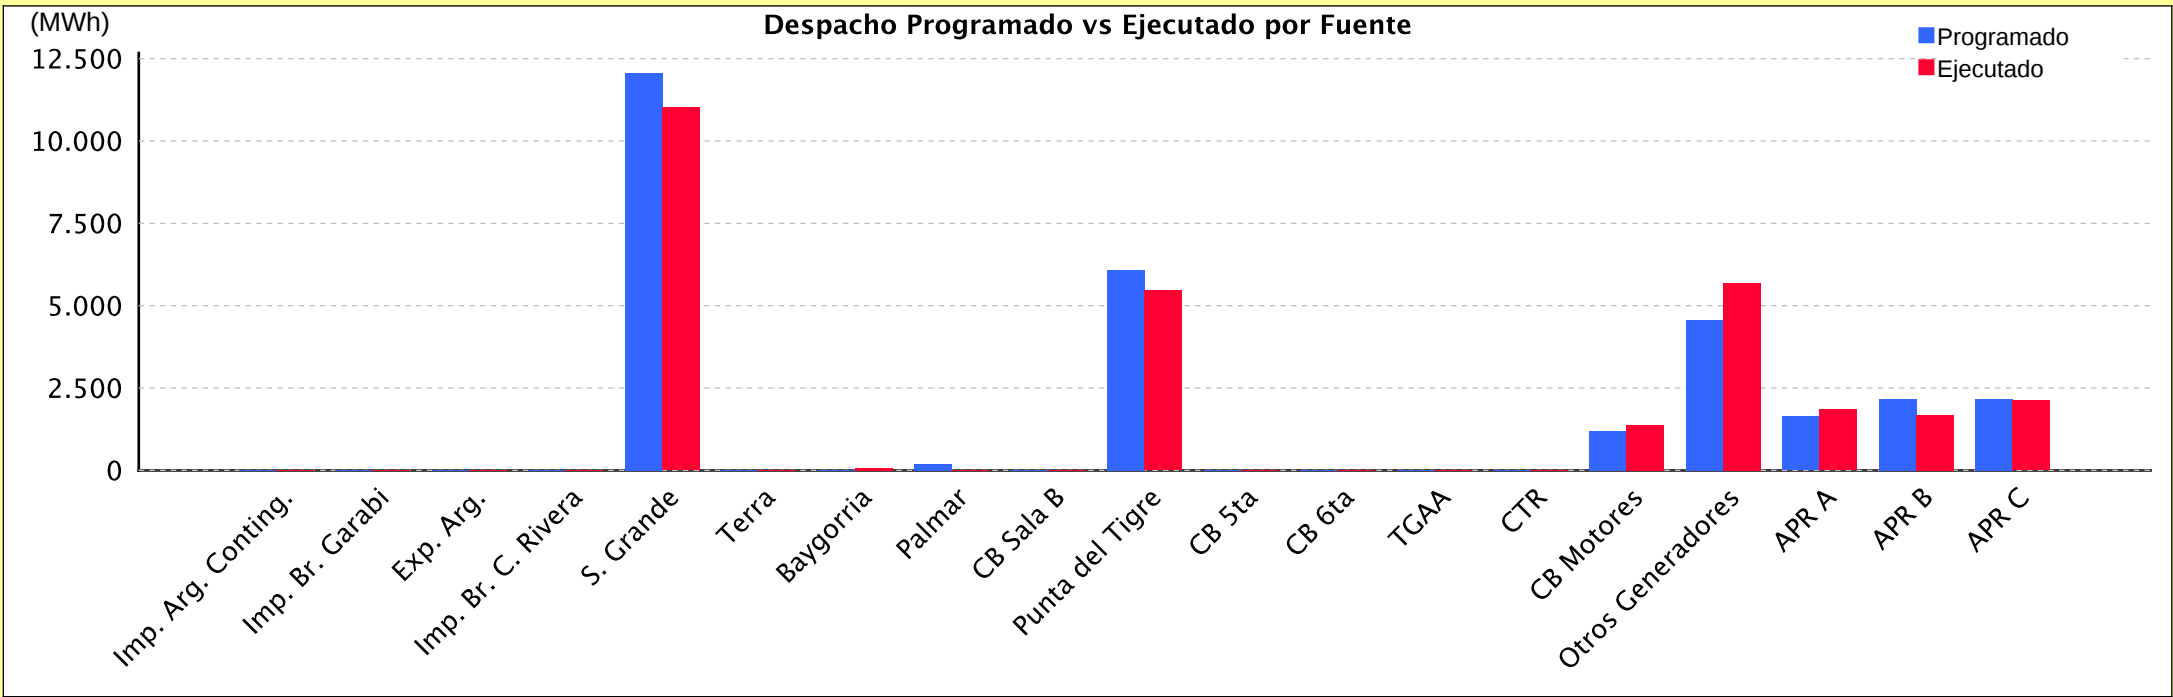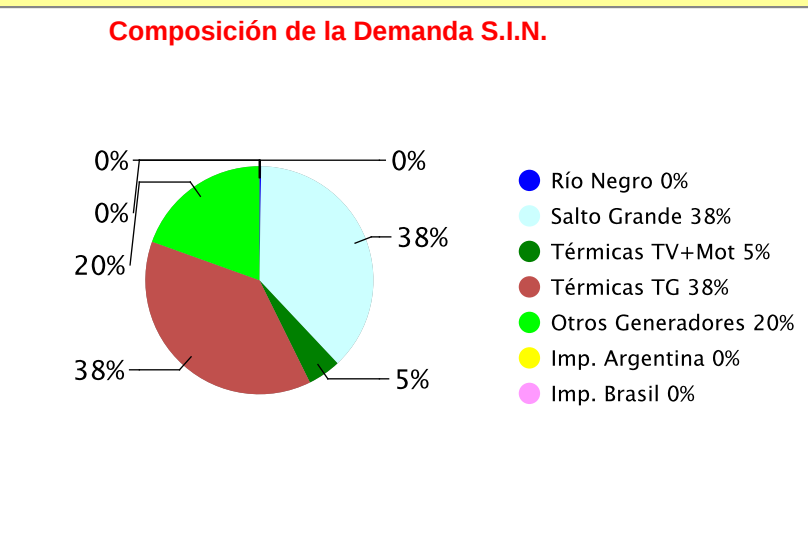



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

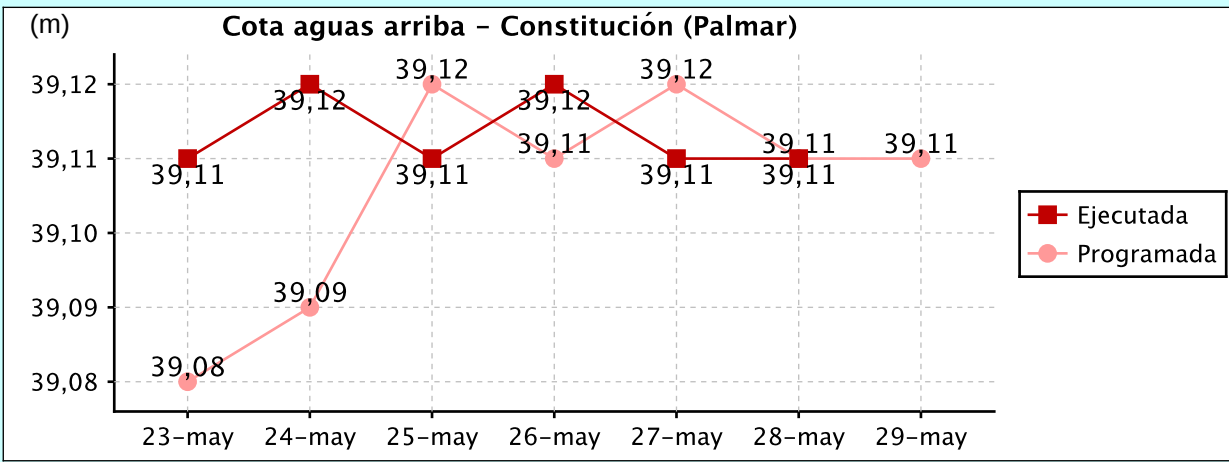
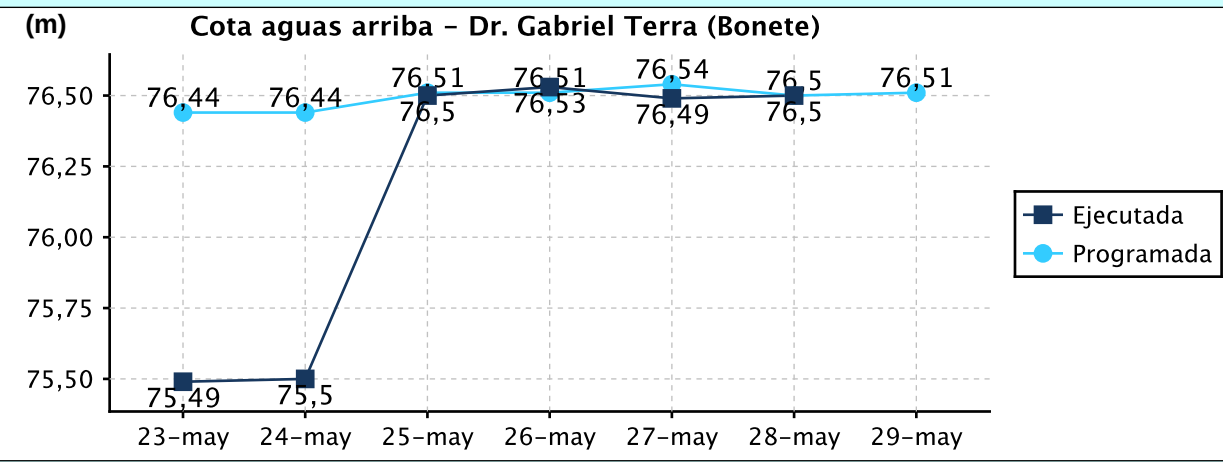


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,50	76,5
Baygorria	53,97	53,95
Palmar	39,11	39,11
SGU	32,84	33

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

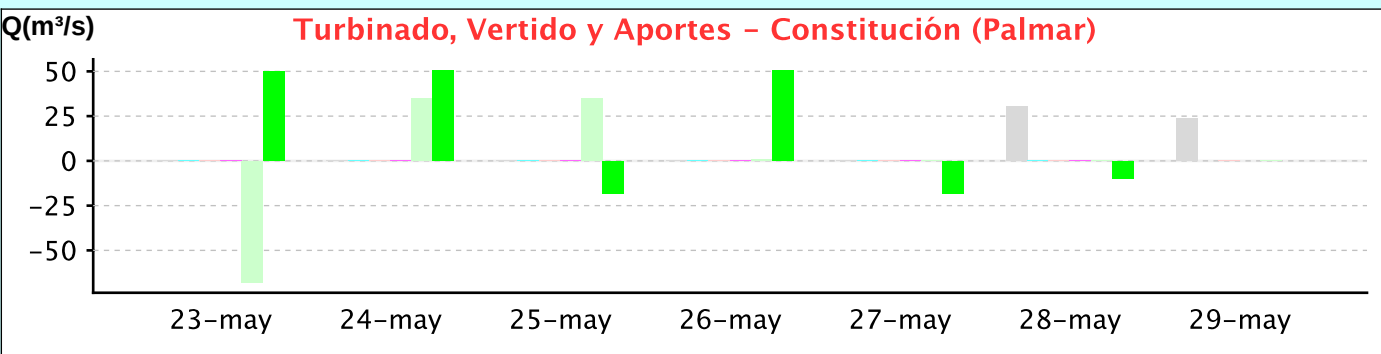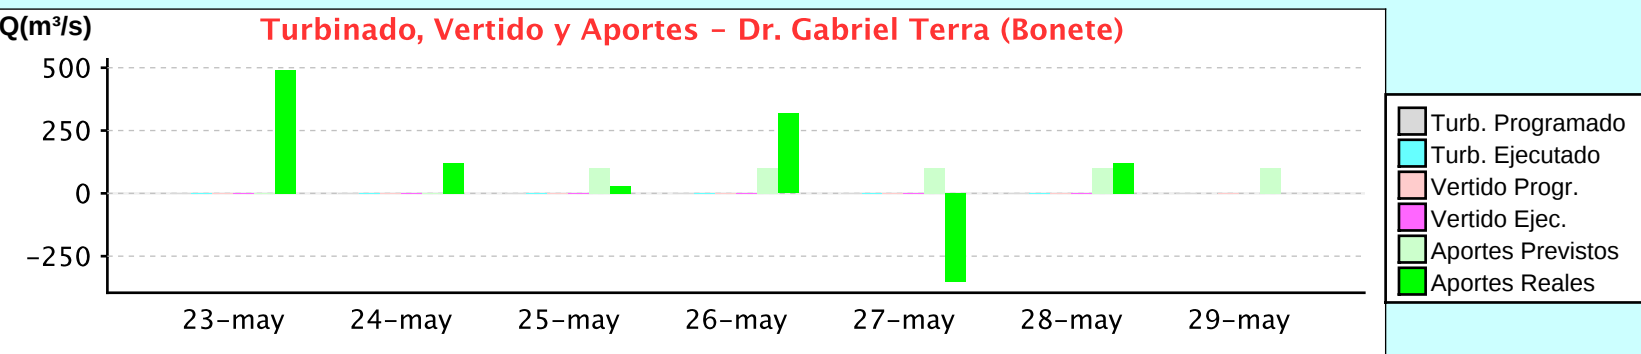

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

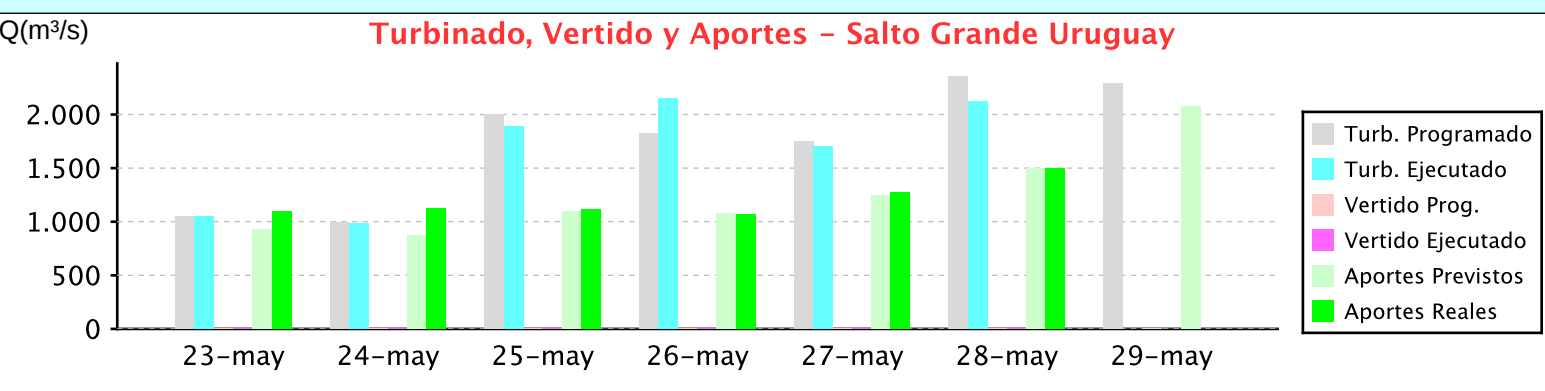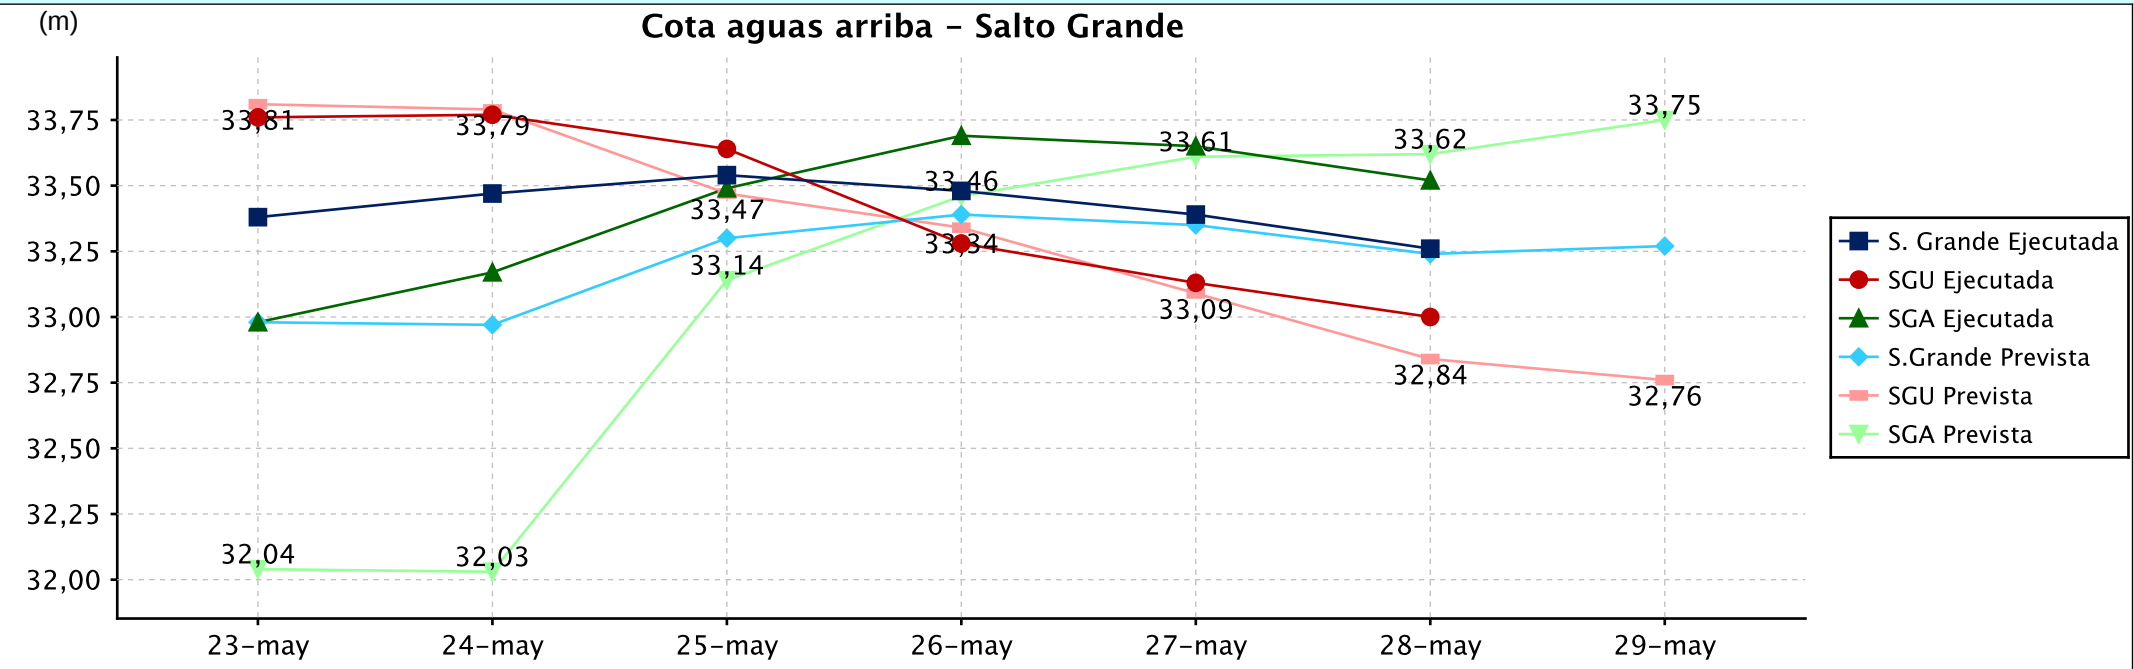

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	33,00
Cota Vista Arg	33,52
Cota real	33,26
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	-9.732

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	27
Palmar	30	0
SGU	2.358	2.122

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	100	122
Baygorria	0	23
Palmar	0	-10
SGU	1.500	1.499

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
