




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

viernes 29 de mayo de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	1.416
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	1.420
Central La Tablada	-82
Central P. del Tigre	5.644
APR A	945
APR B	850
APR C	1.100
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	712
C. Baygorria	768
C. Palmar	1.365
C. Salto Grande	13.872
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	3.333
TOTAL Generación	29.922

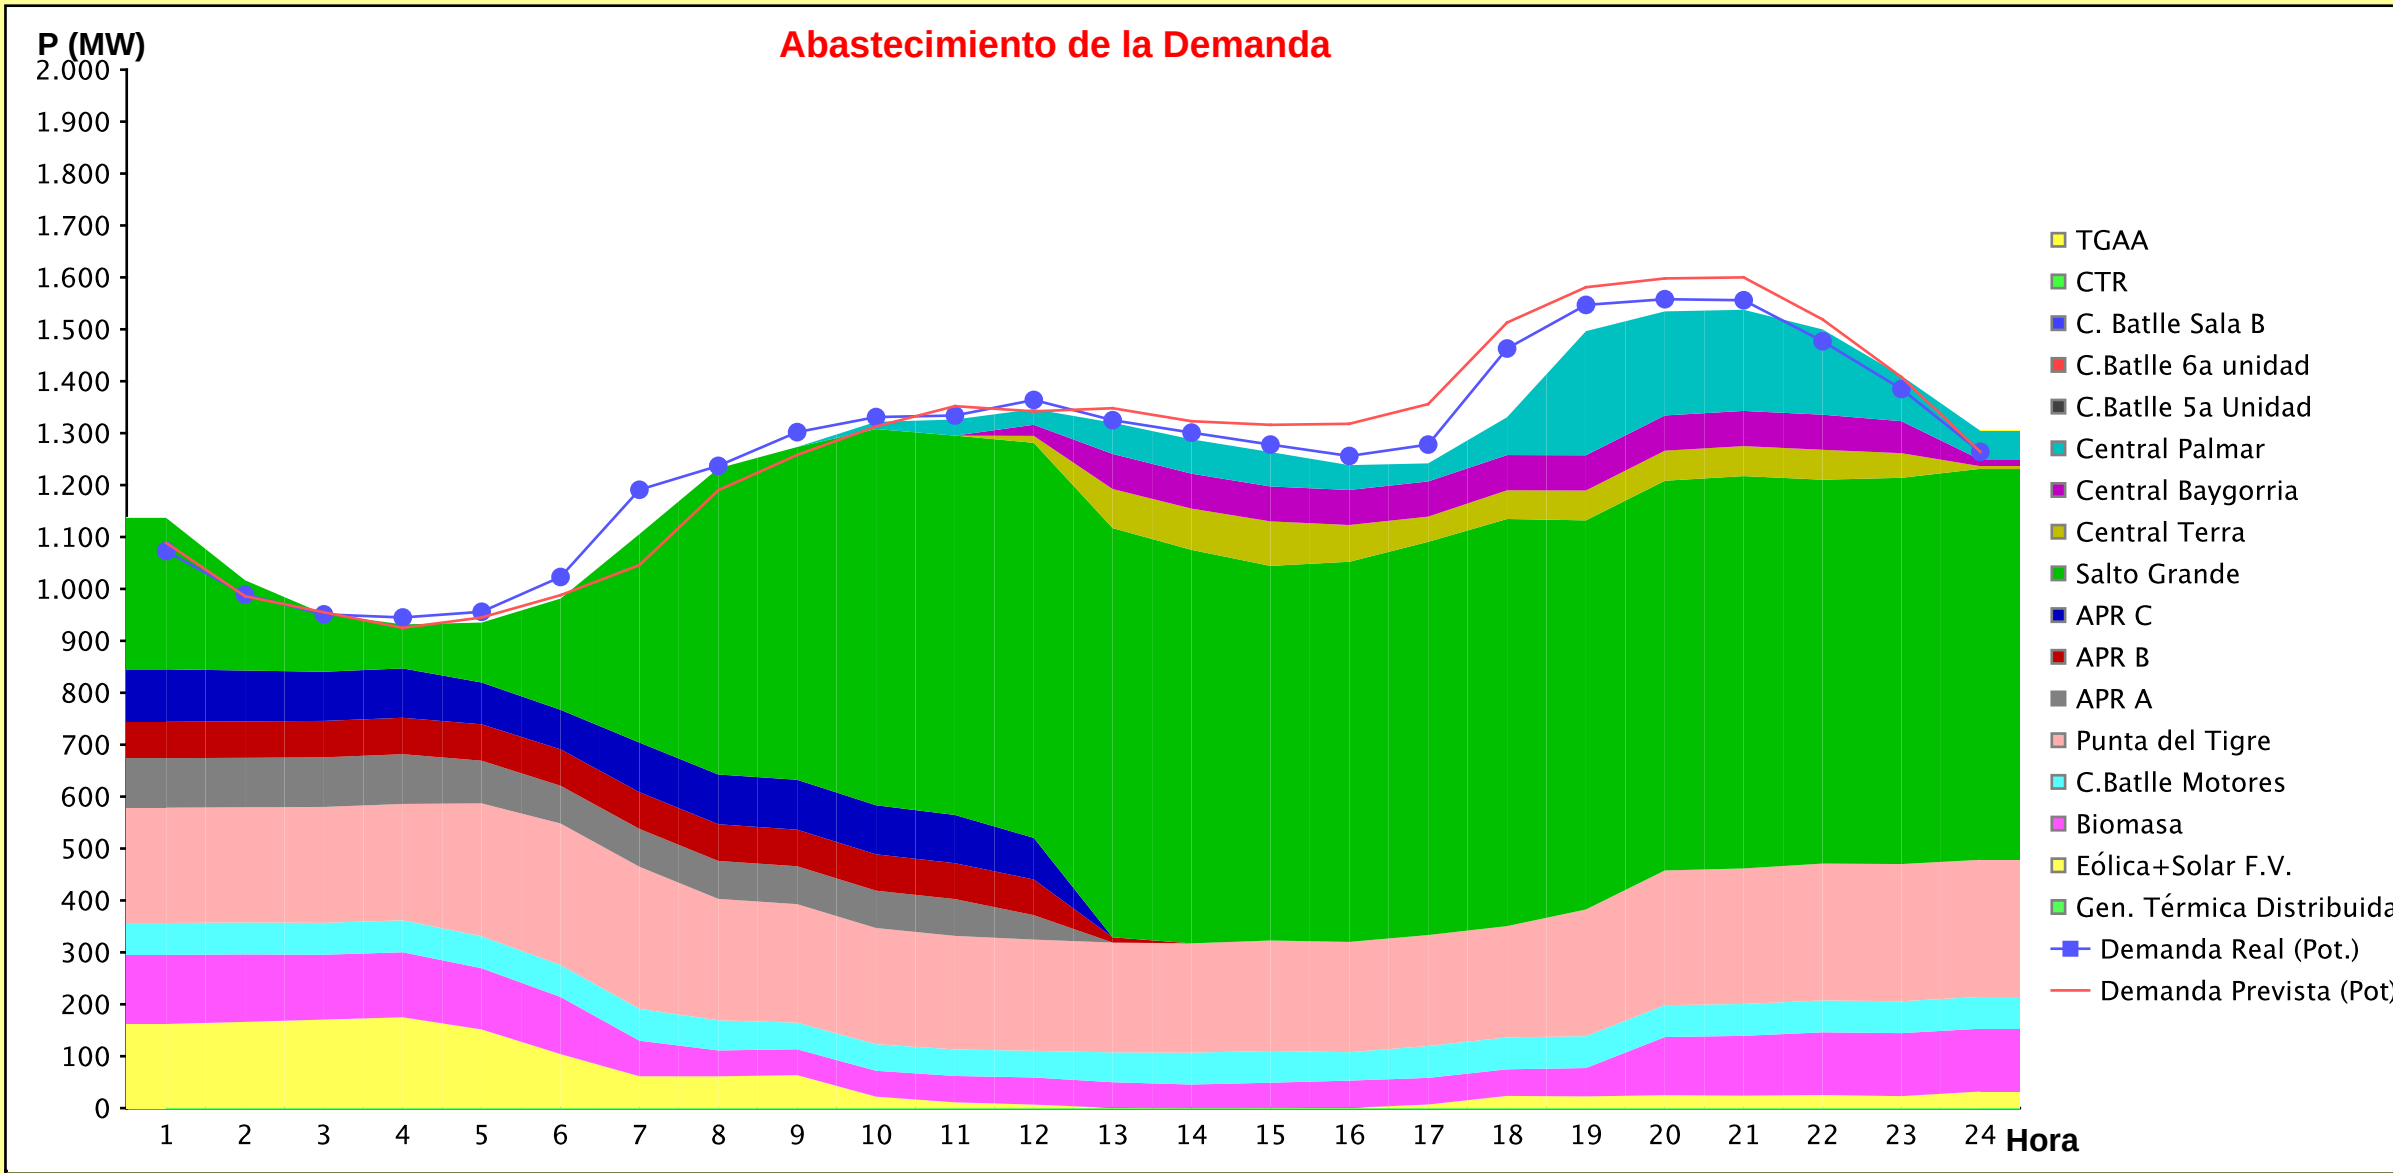

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0



DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	29.922
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	30.533
Diferencia (MWh)	-611
Ejecutada - Programada	-2,00 %

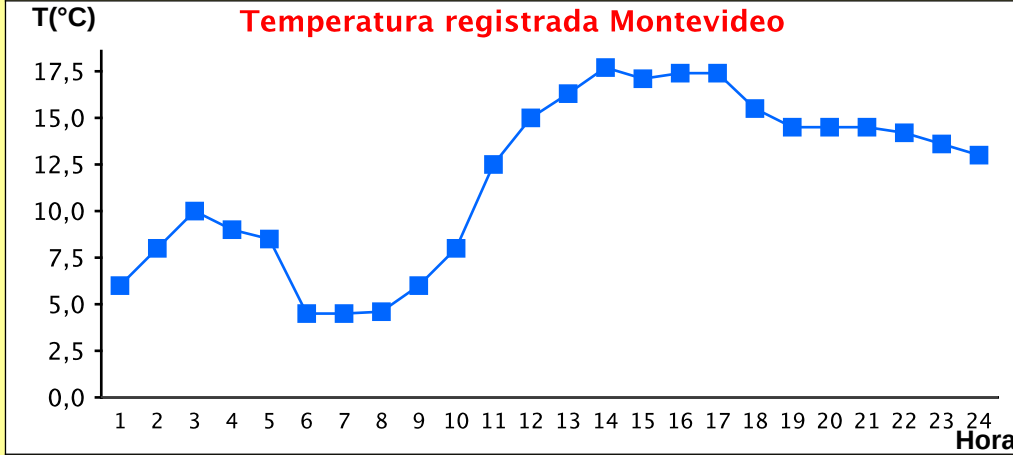


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1362 Hora 11:39
Potencia mínima:	911 Hora 03:49
Pico noche:	1559 Hora 19:45

Generación Media (MW)	
Eólica	57,3
Biomasa	83,7
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

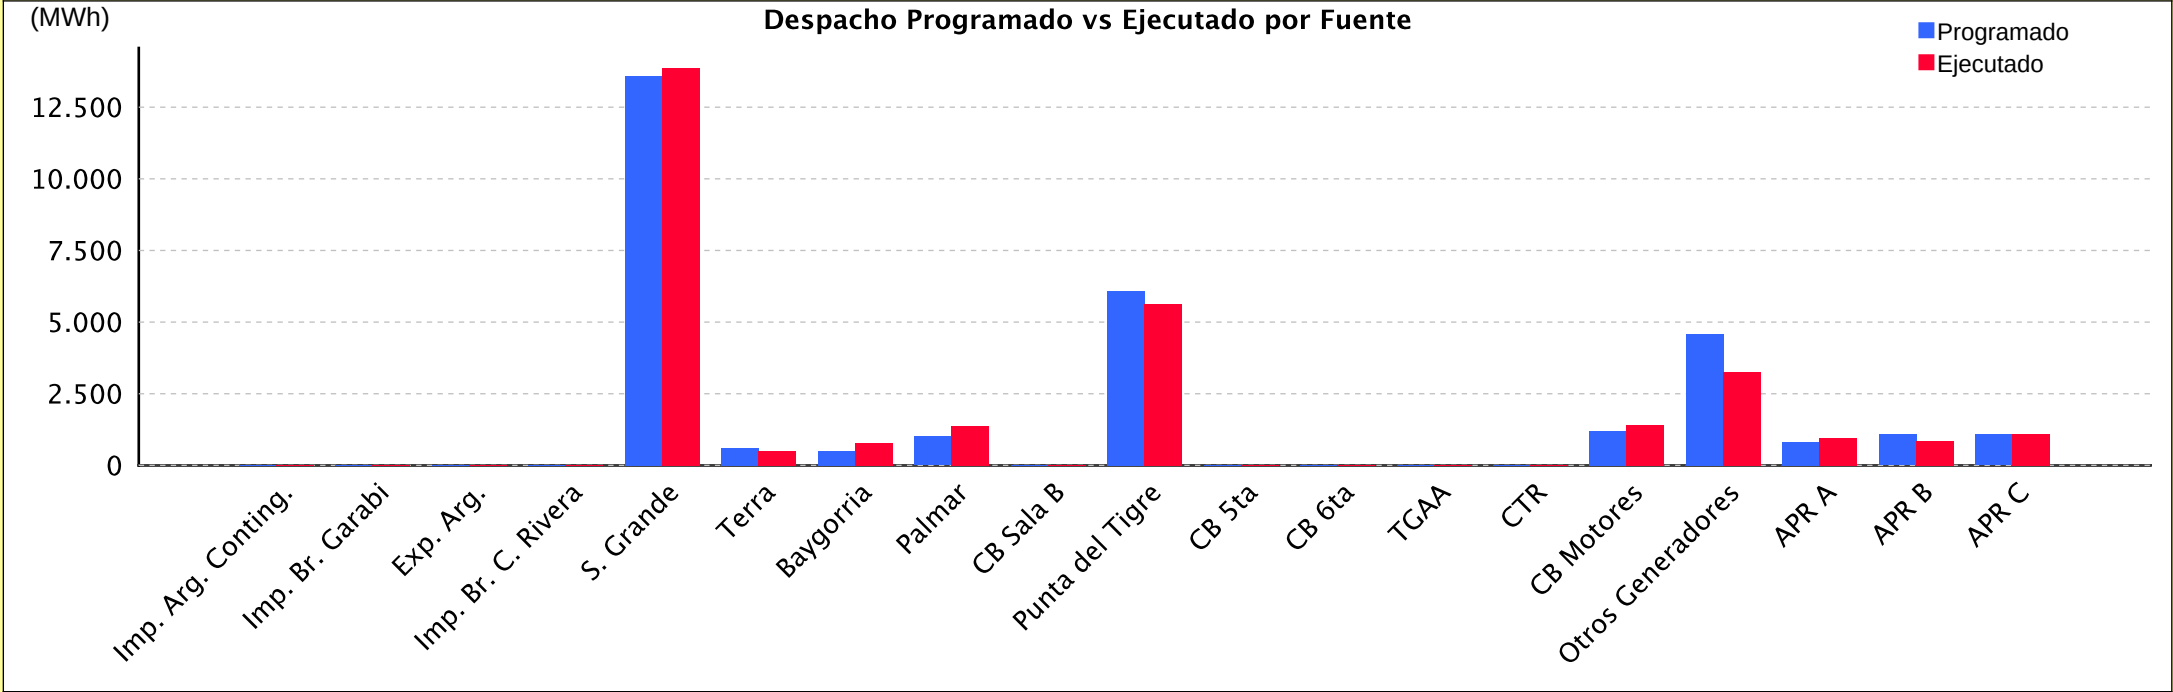
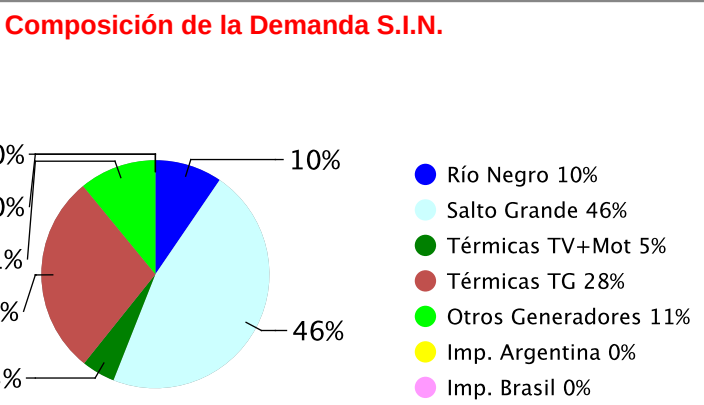


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

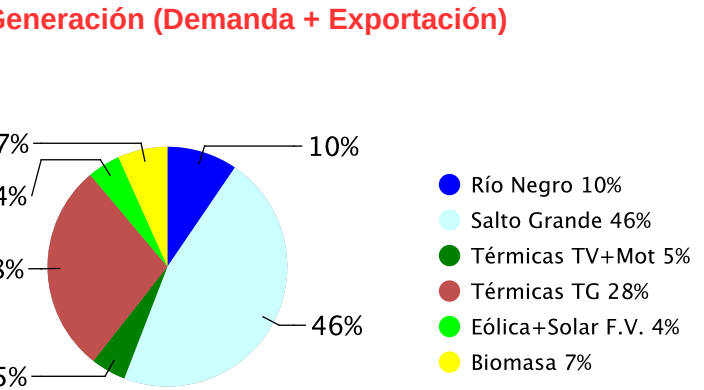



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

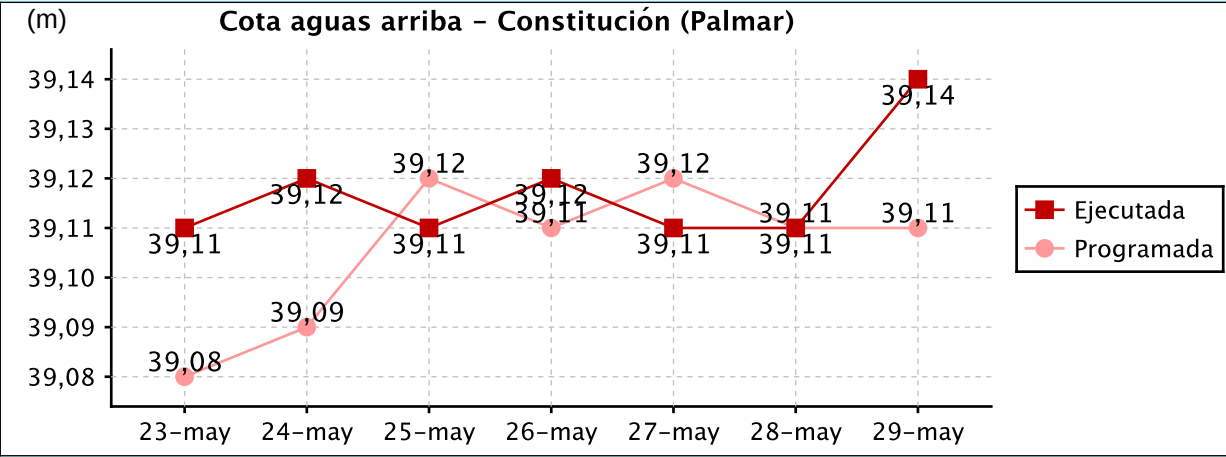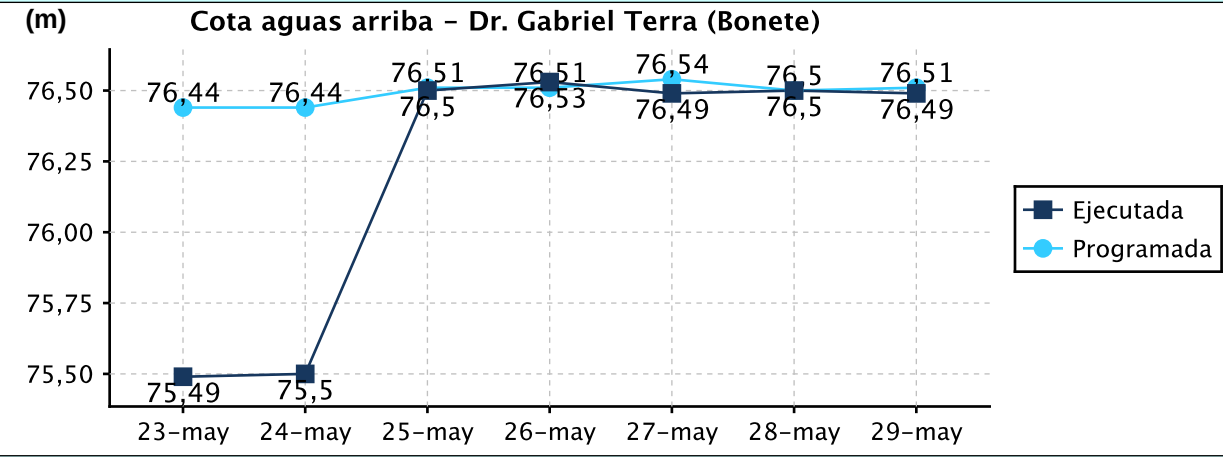


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,51	76,49
Baygorria	53,96	53,84
Palmar	39,11	39,14
SGU	32,93	32,82

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

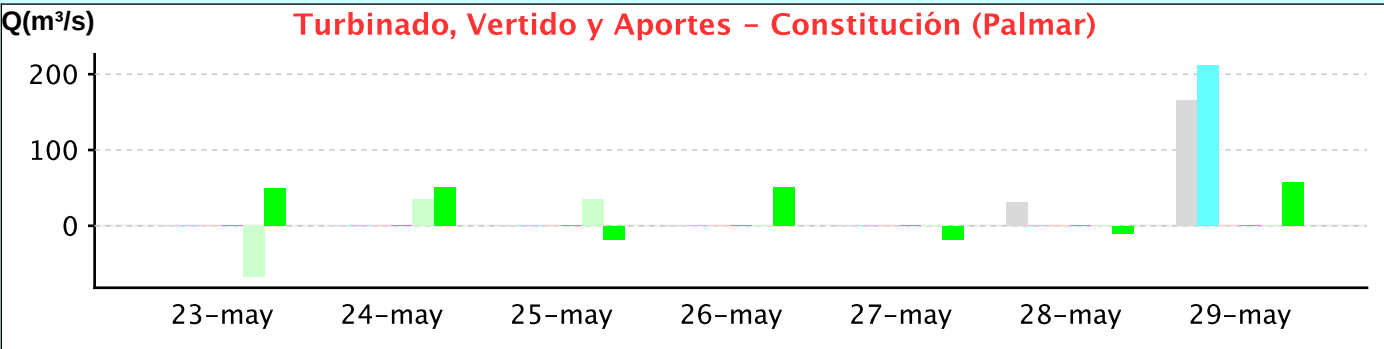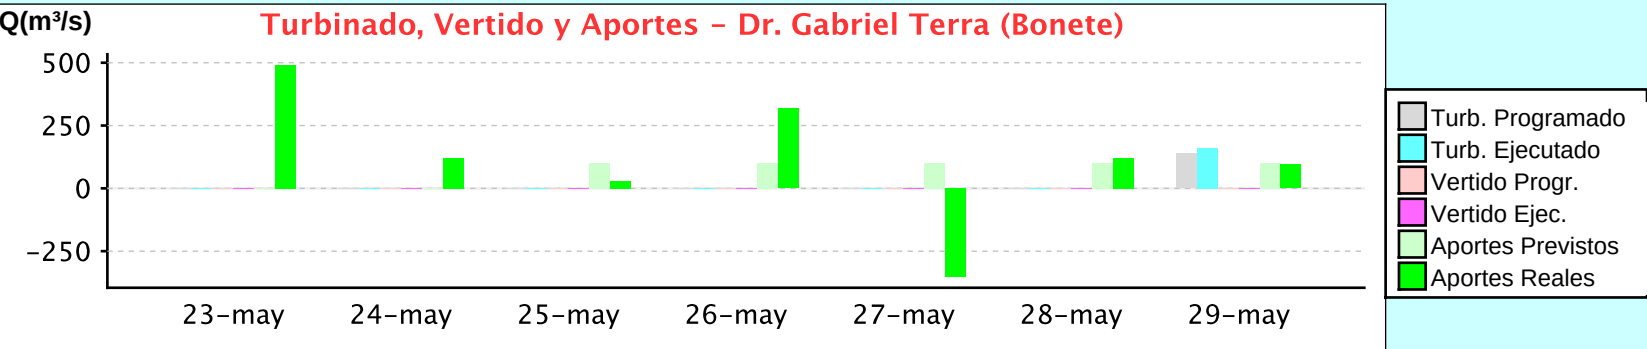

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

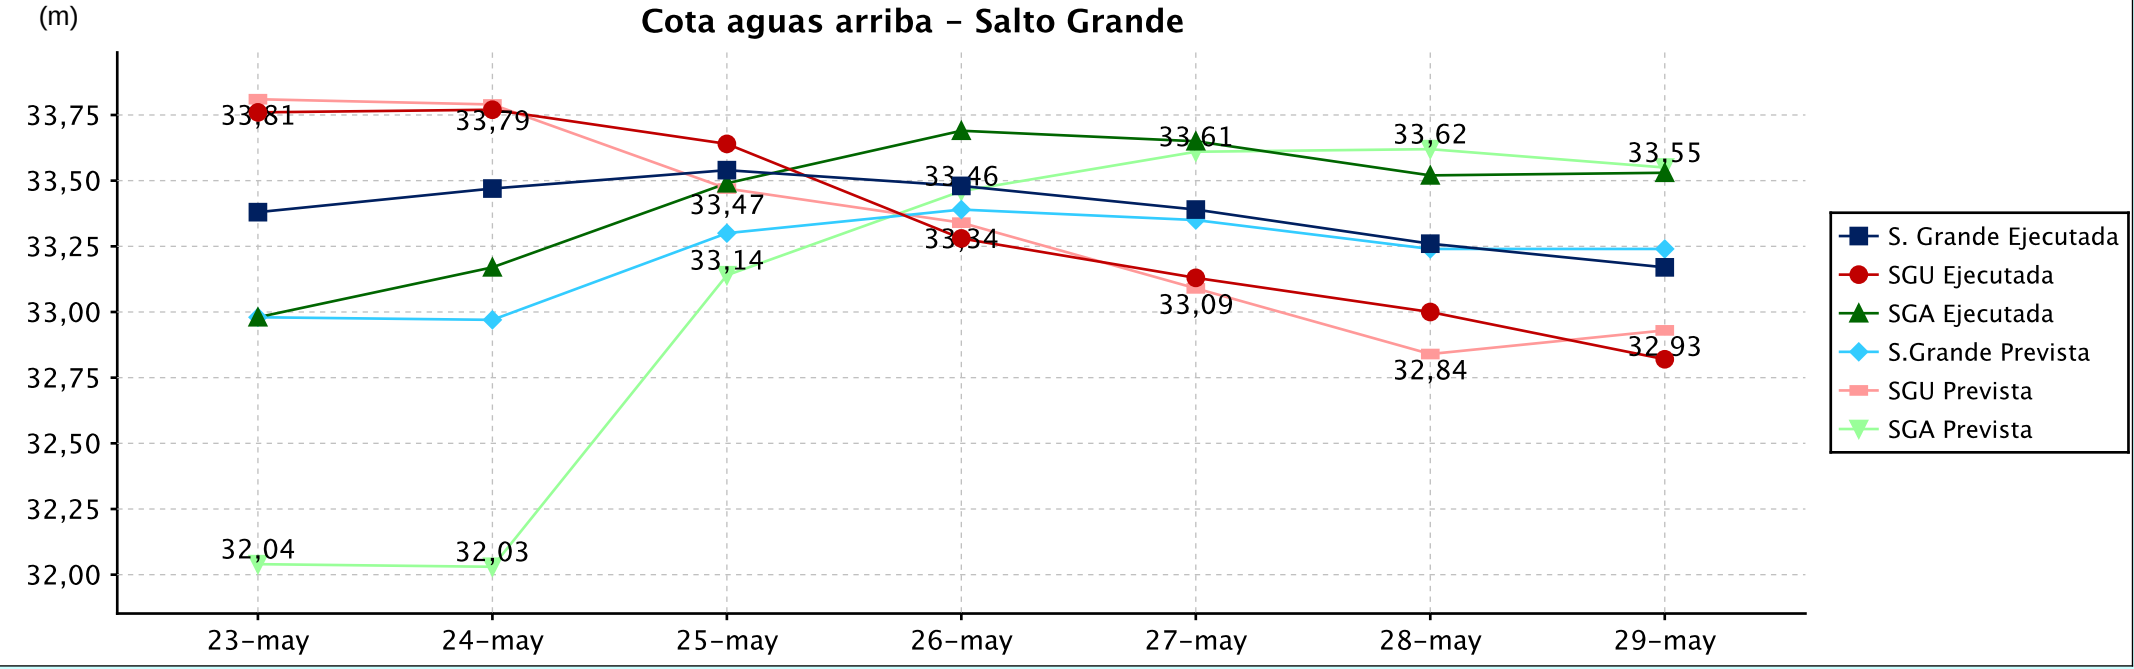


TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	138	159
Baygorria	163	263
Palmar	166	212
SGU	2.644	2.712

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	100	95
Baygorria	0	-16
Palmar	0	58
SGU	2.075	2.075

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

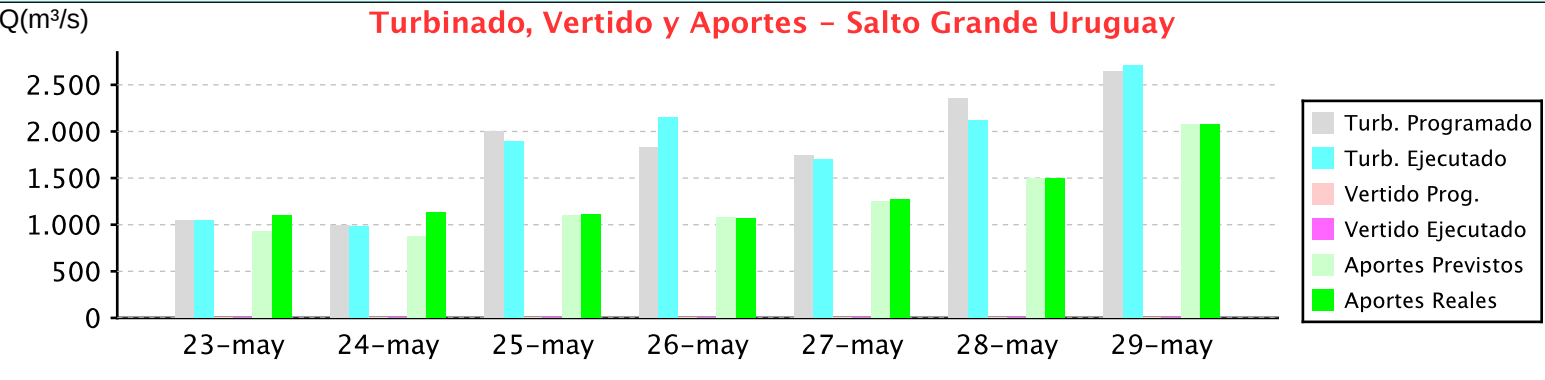

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	32,82
Cota Vista Arg	33,53
Cota real	33,17
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
25.148	

OBSERVACIONES
