




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

domingo 31 de mayo de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	1.458
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	1.462
Central La Tablada	-89
Central P. del Tigre	6.299
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	298
C. Baygorria	39
C. Palmar	0
C. Salto Grande	14.471
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	3.499
TOTAL Generación	25.970

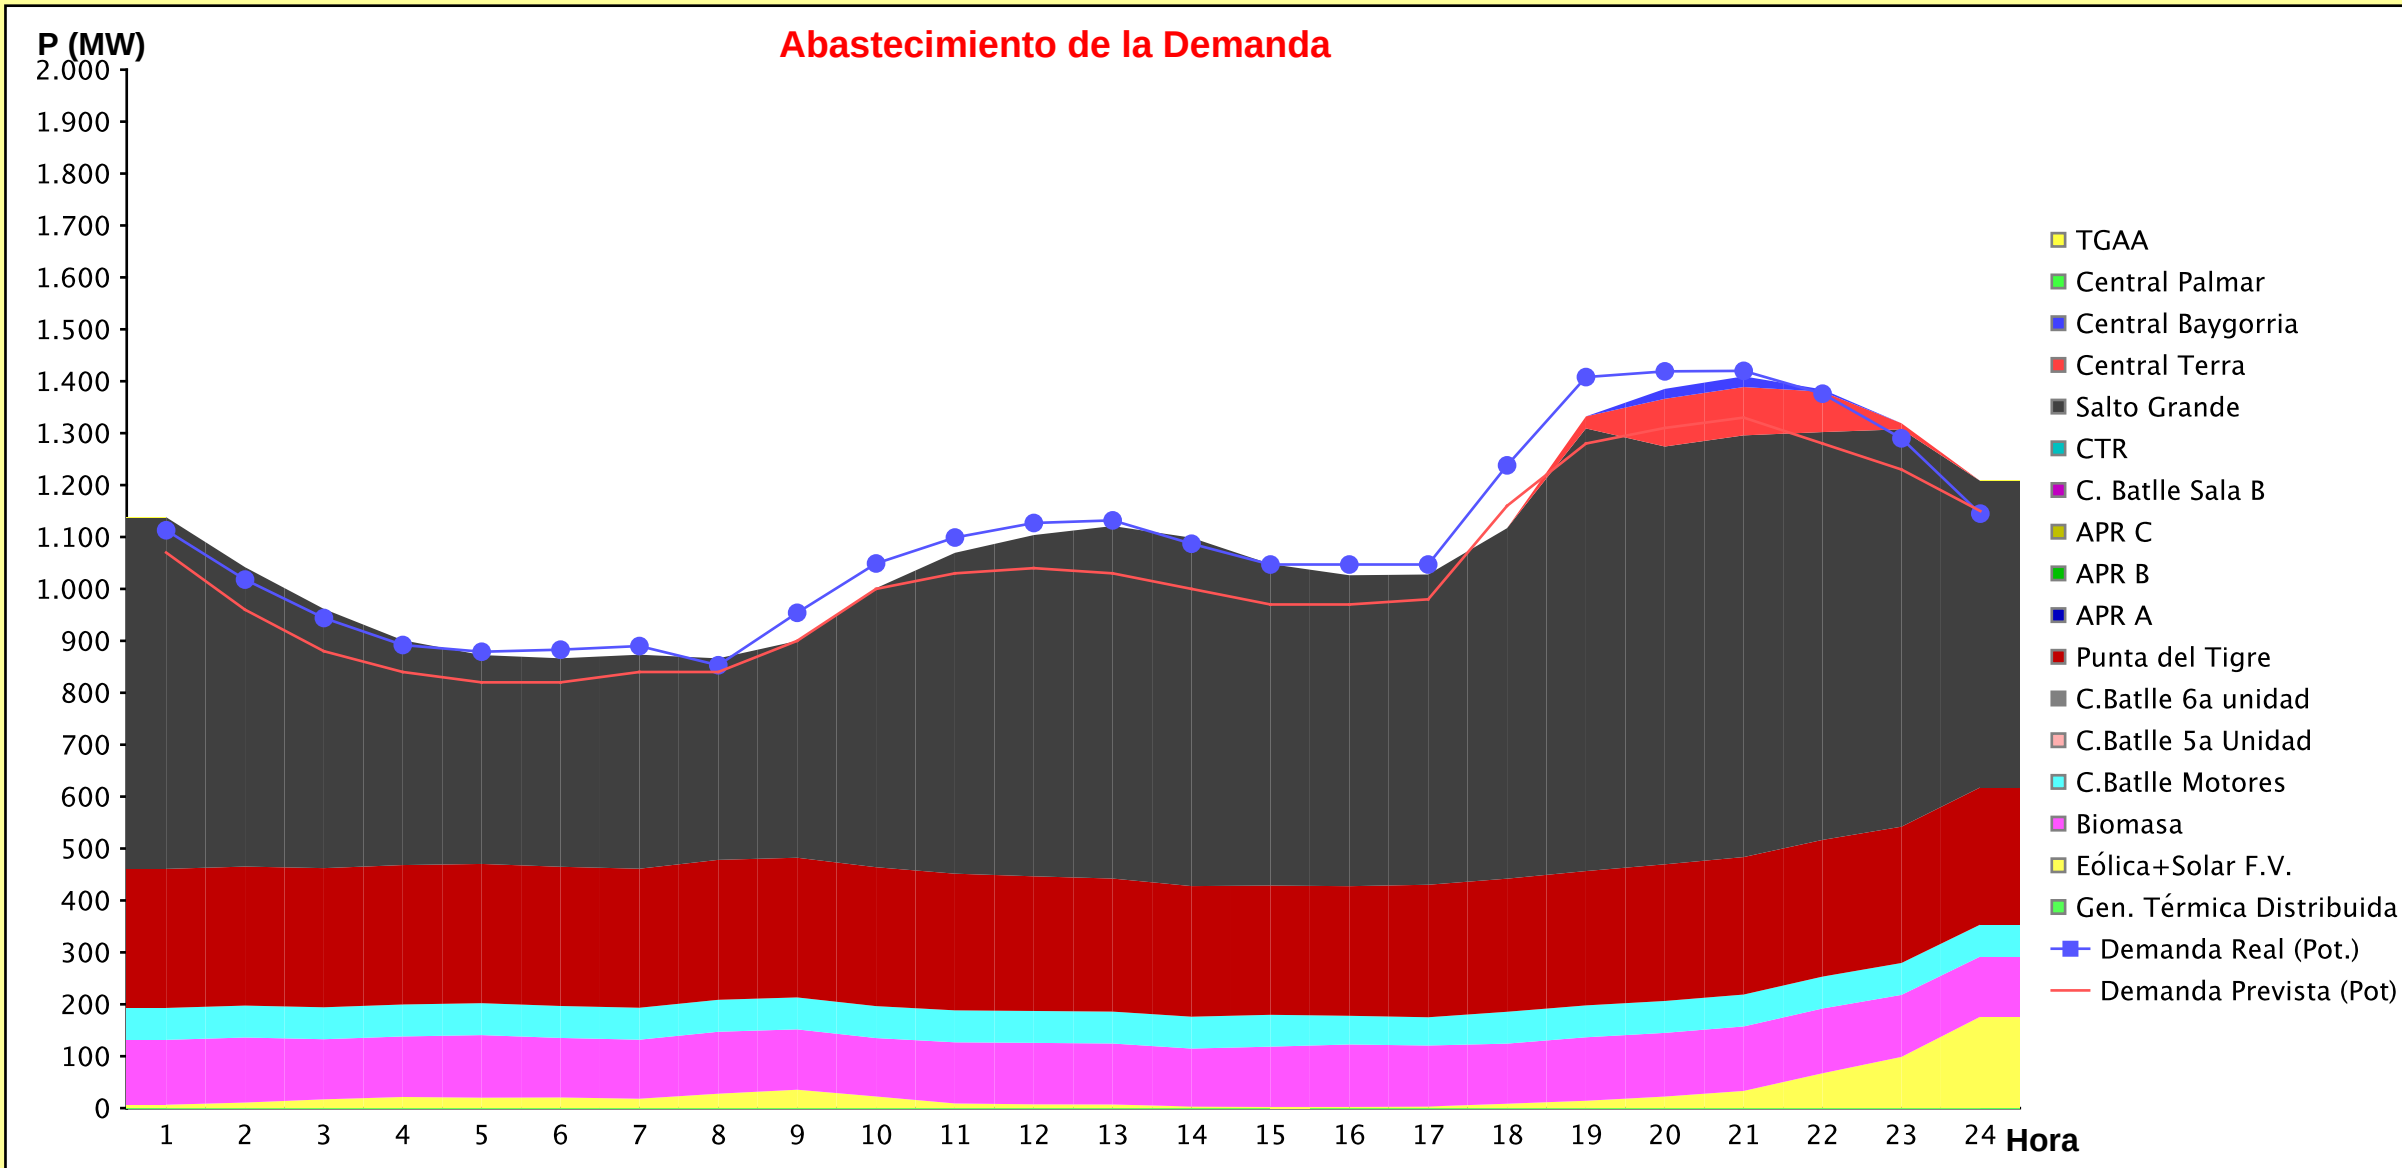

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0


DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	25.970
(en borses de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	24.730
Diferencia (MWh)	1.240
Ejecutada - Programada	5,02 %

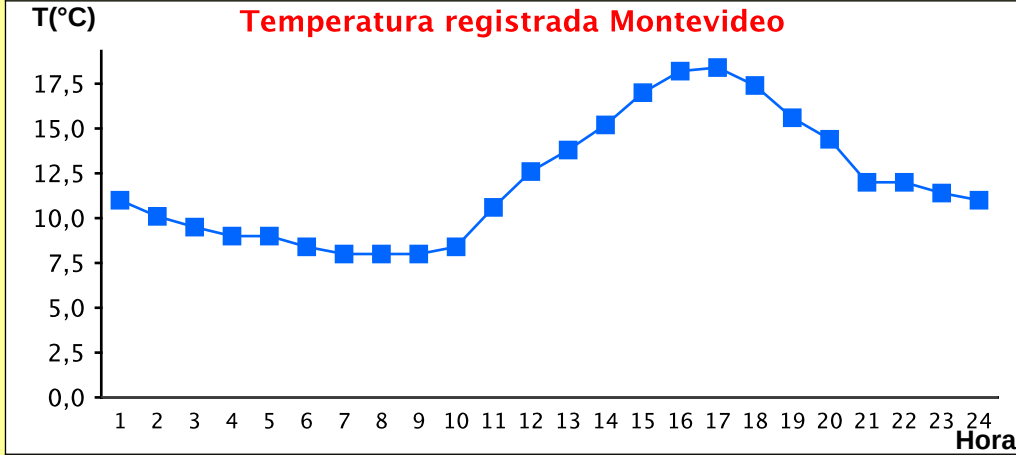


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1130 Hora 12:32
Potencia mínima:	848 Hora 07:53
Pico noche:	1424 Hora 20:39

Generación Media (MW)	
Eólica	28,4
Biomasa	118,9
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0


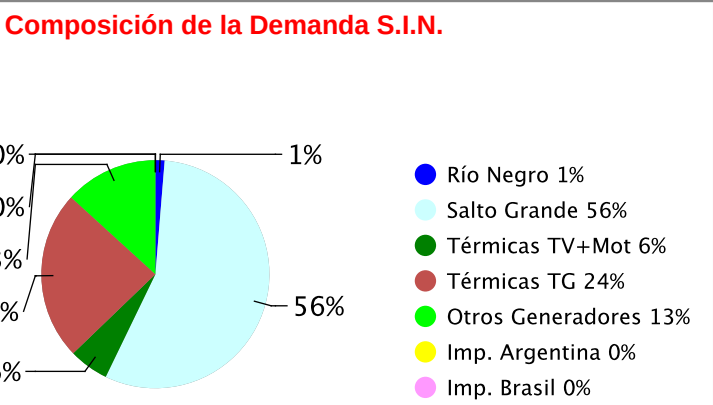


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

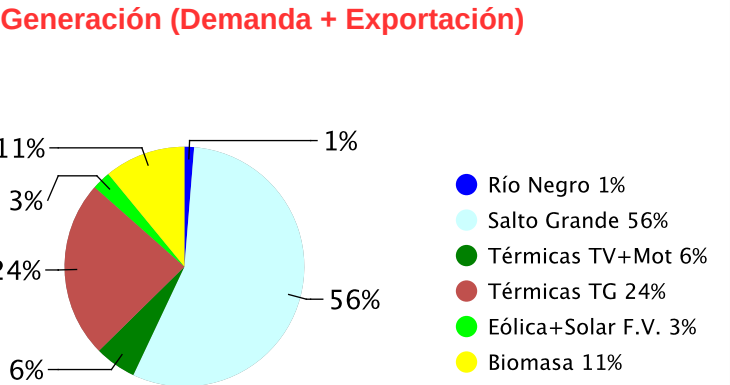



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

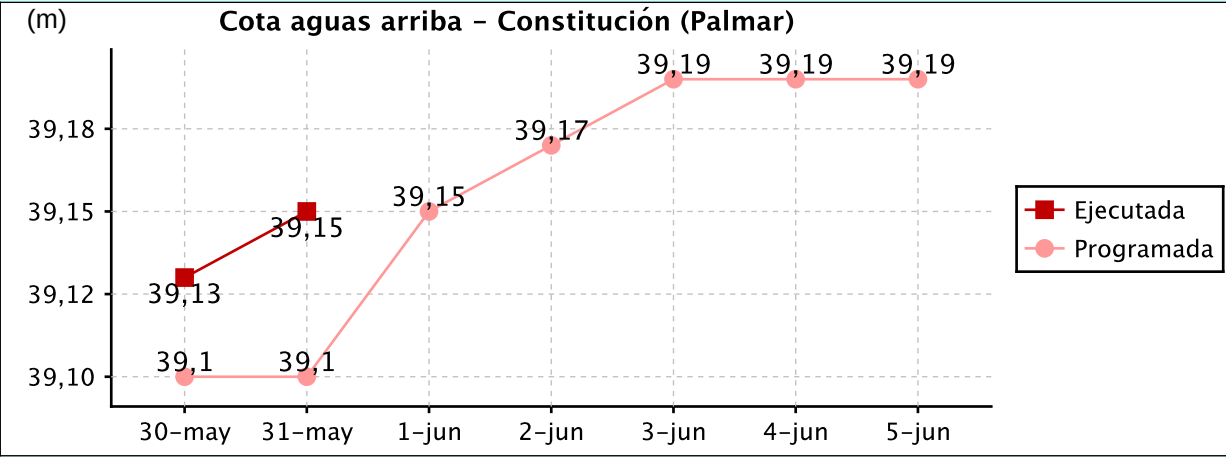
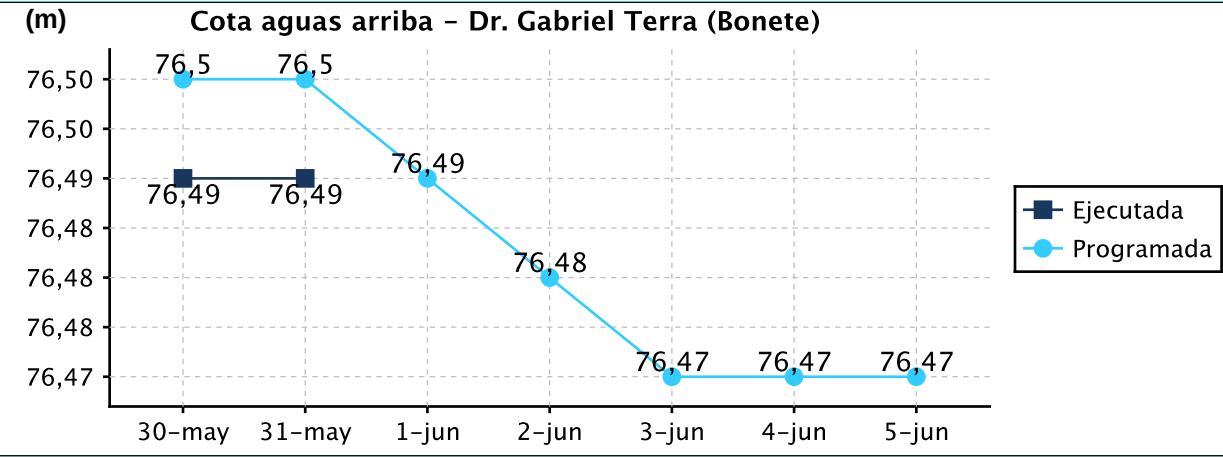


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,50	76,49
Baygorria	53,96	53,94
Palmar	39,10	39,15
SGU	33,28	33,28

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

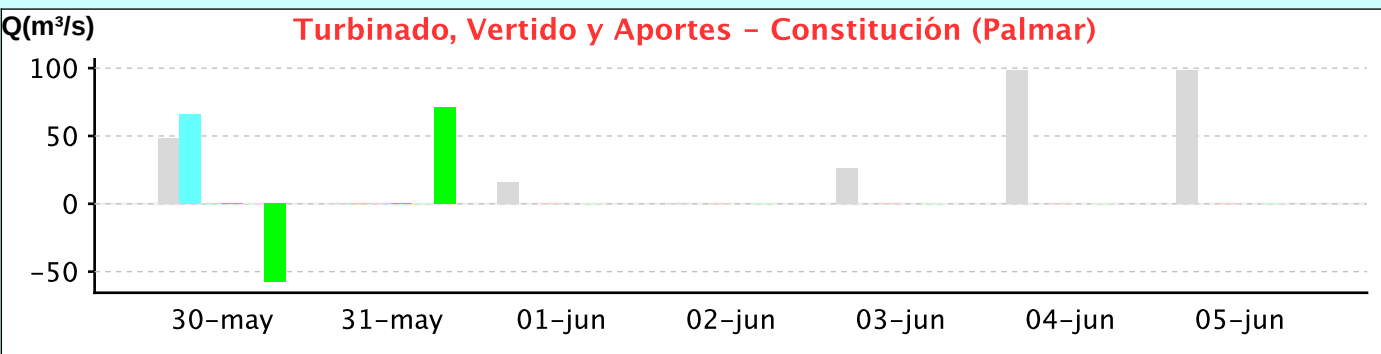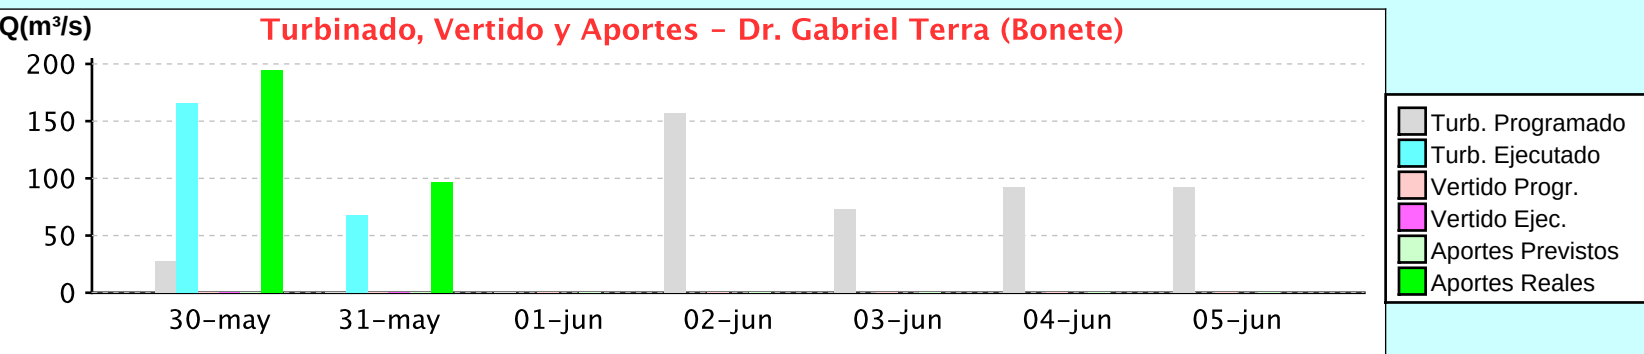

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

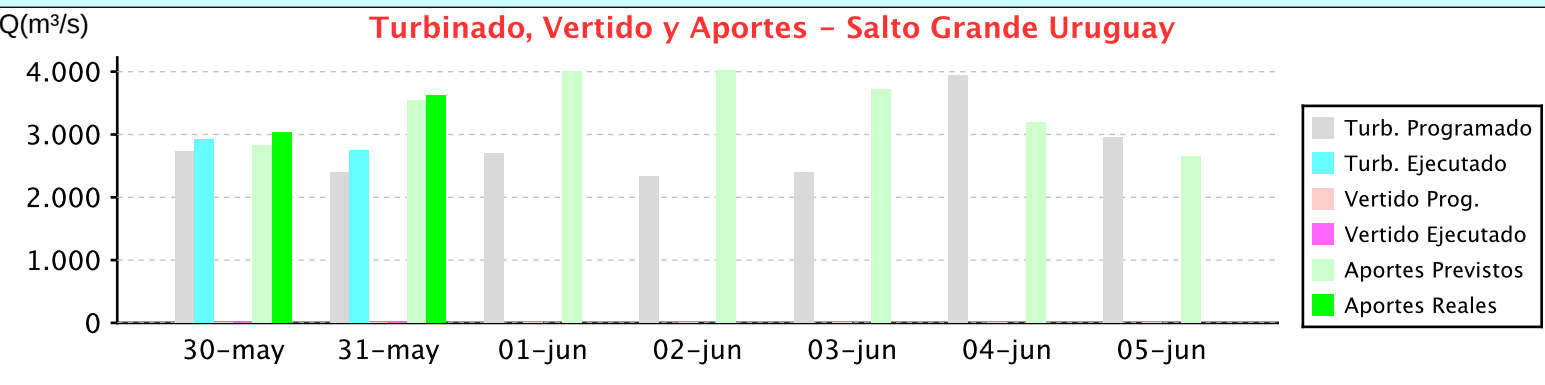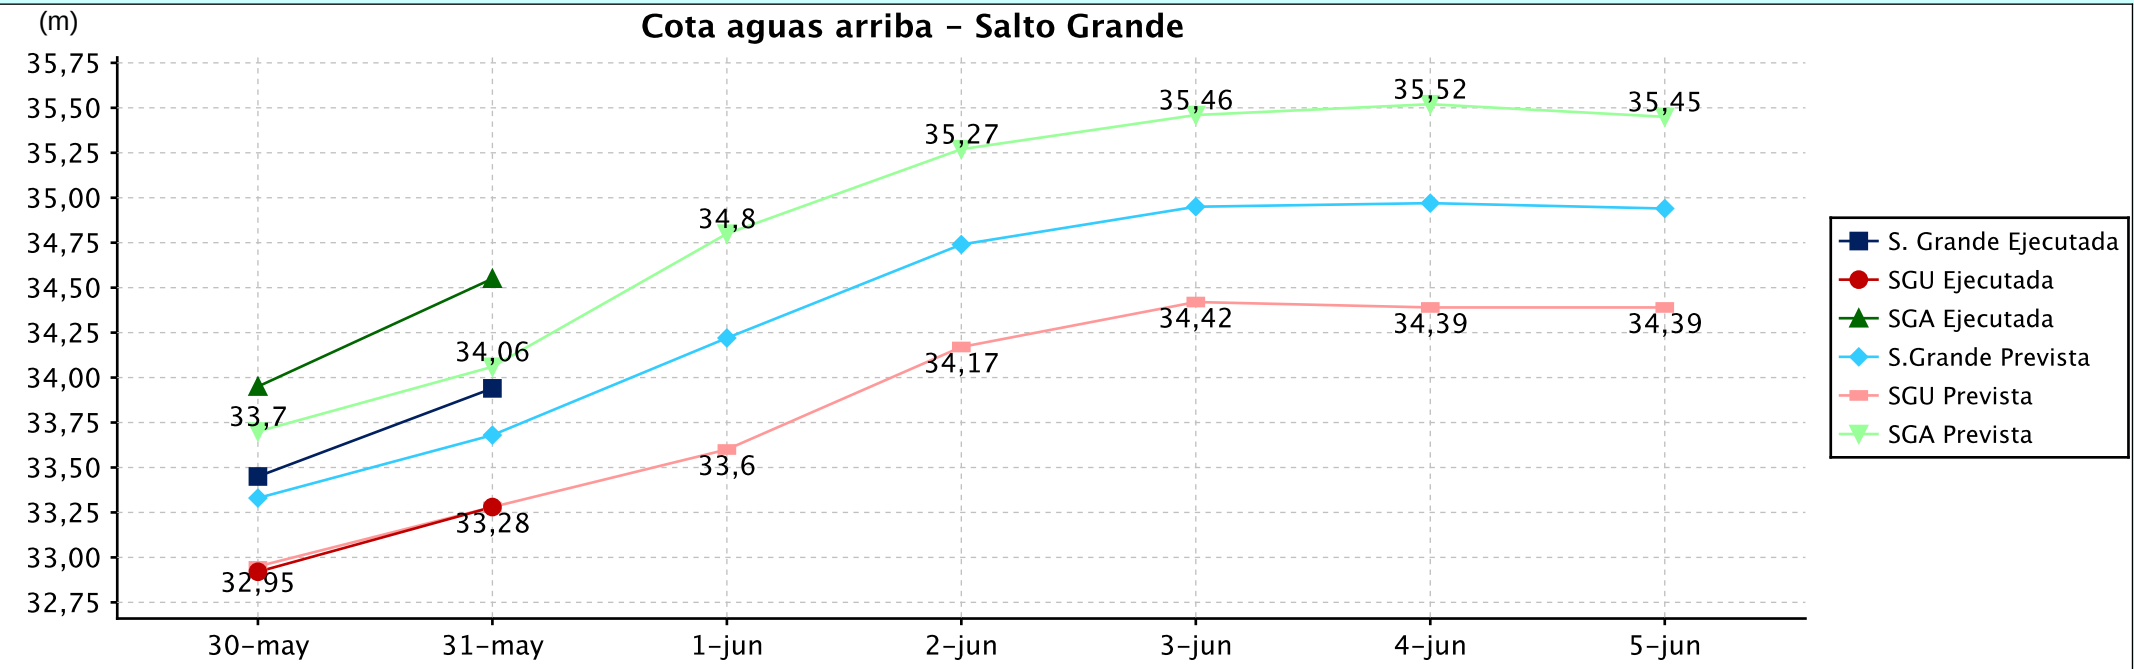

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	33,28
Cota Vista Arg	34,55
Cota real	33,94
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	-26.130

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	68
Baygorria	0	15
Palmar	0	0
SGU	2.391	2.740

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	97
Baygorria	0	-11
Palmar	0	71
SGU	3.550	3.628

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
