




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


miércoles 03 de junio de 2015

Generación Térmica	
Central Battlle	1.561
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	1.565
Central La Tablada	-78
Central P. del Tigre	5.370
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	265
C. Baygorria	309
C. Palmar	95
C. Salto Grande	11.759
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	10.291
TOTAL Generación	29.566



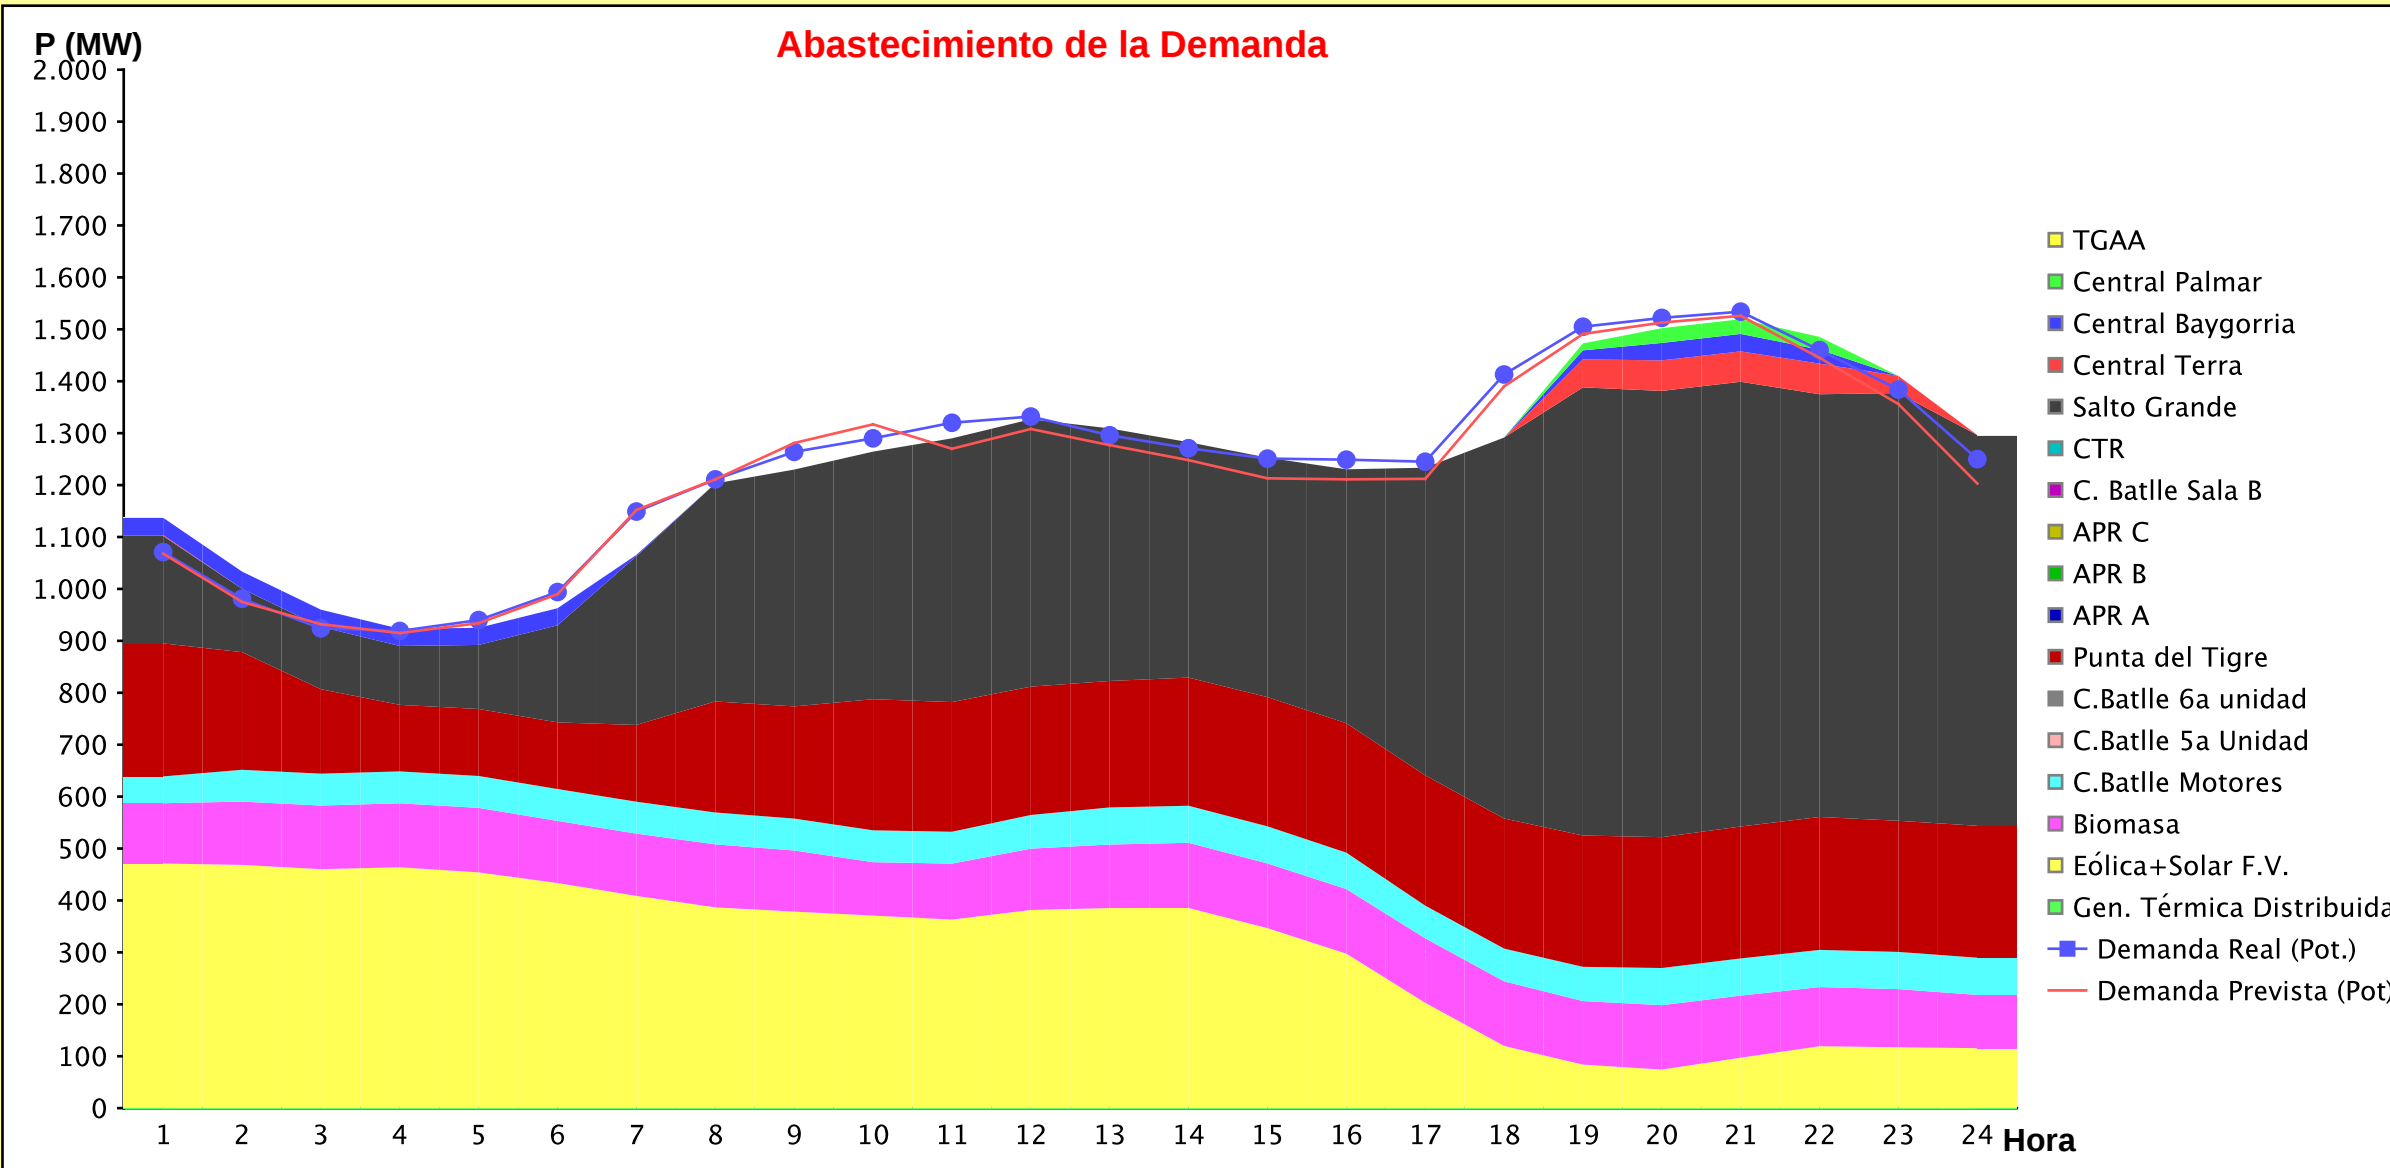


Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	29.566
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	29.438
Diferencia (MWh)	128
Ejecutada - Programada	0,44 %


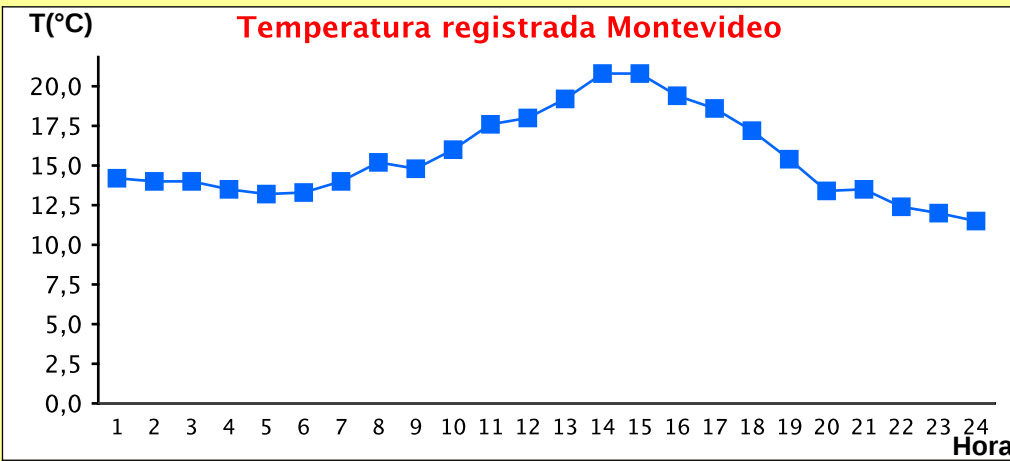


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1338 Hora 11:39
Potencia mínima:	896 Hora 03:41
Pico noche:	1534 Hora 20:29
Generación Media (MW)	
Eólica	308,1
Biomasa	119,3
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

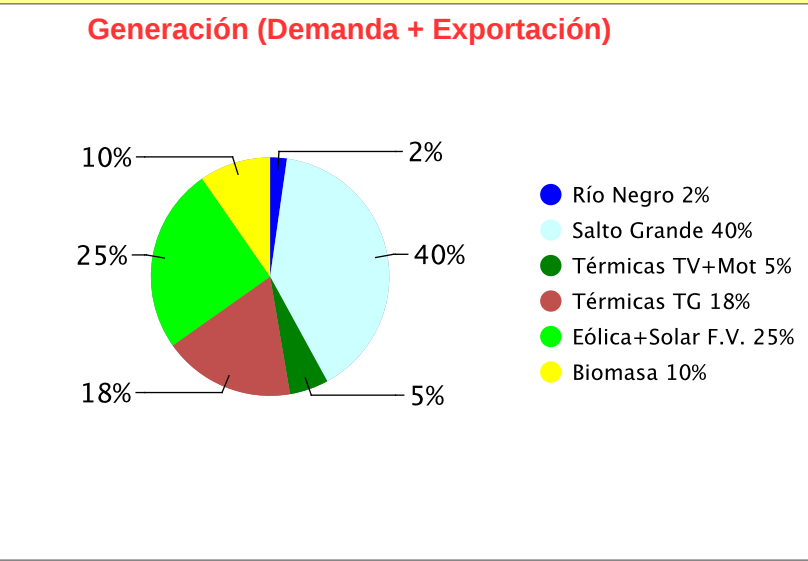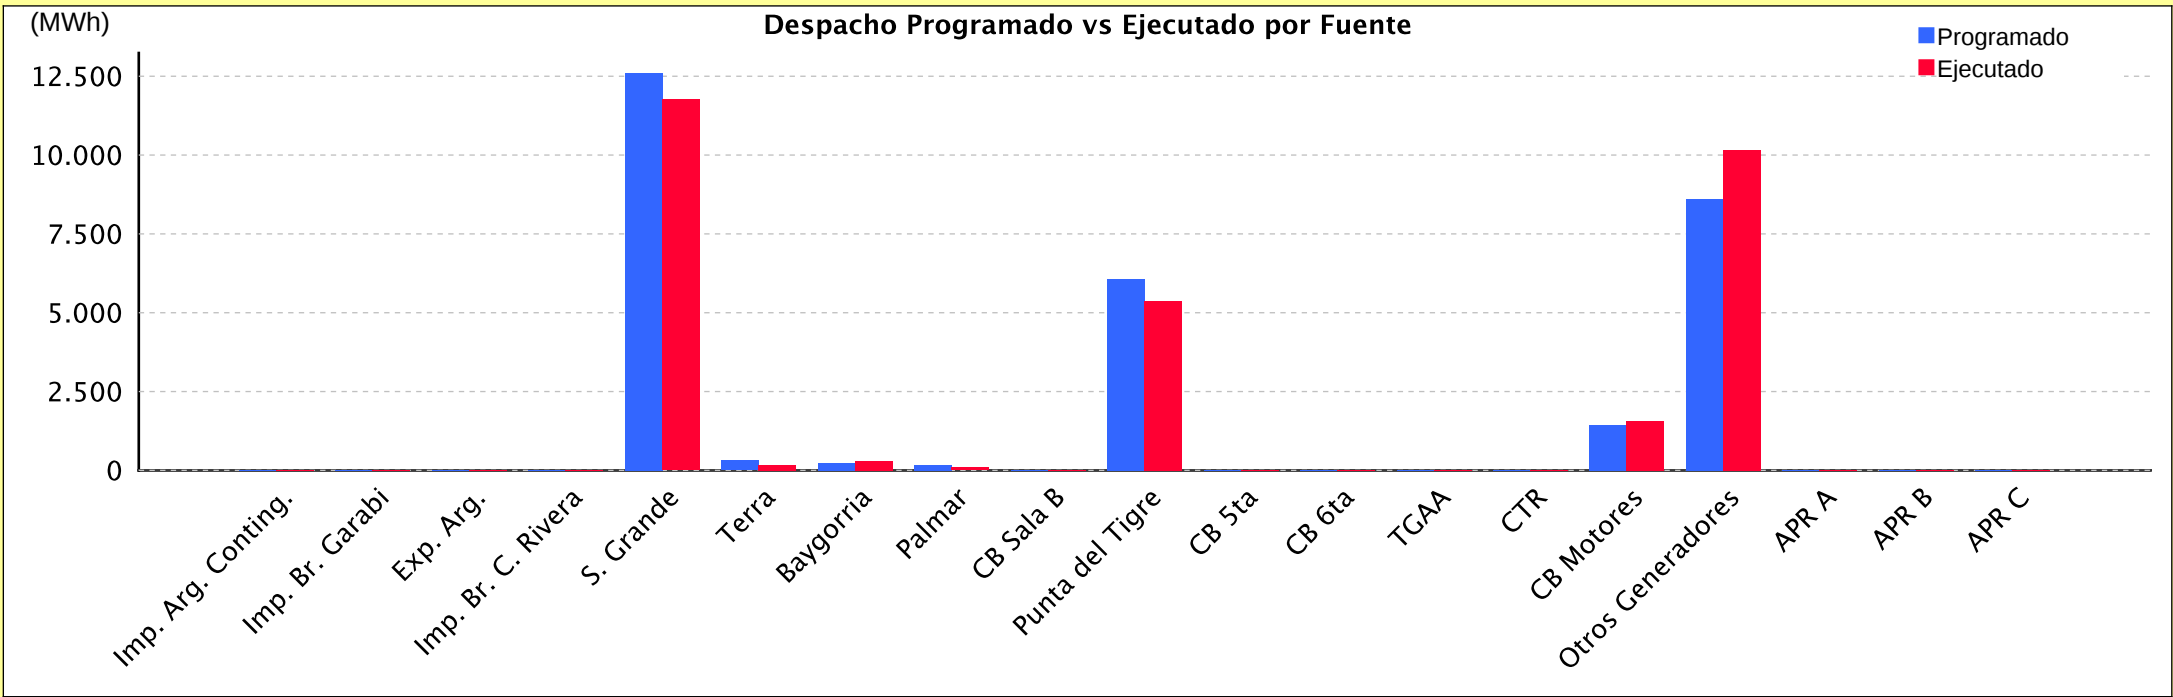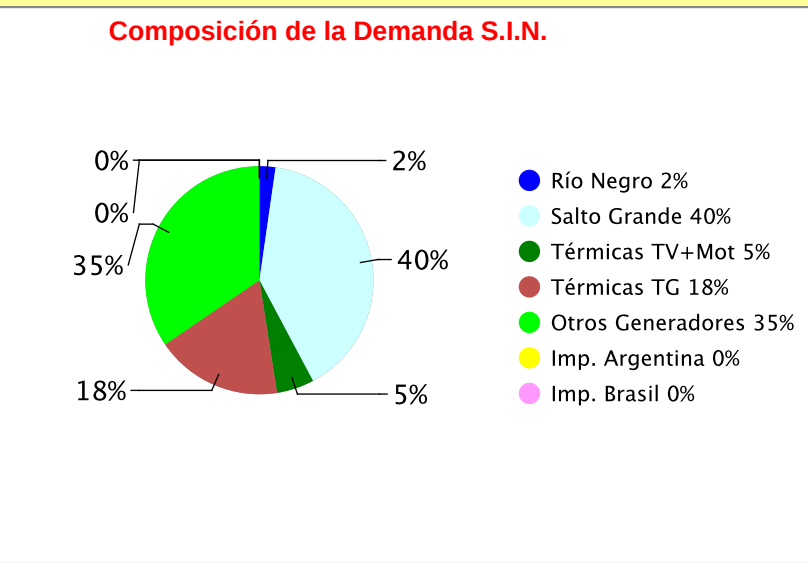



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

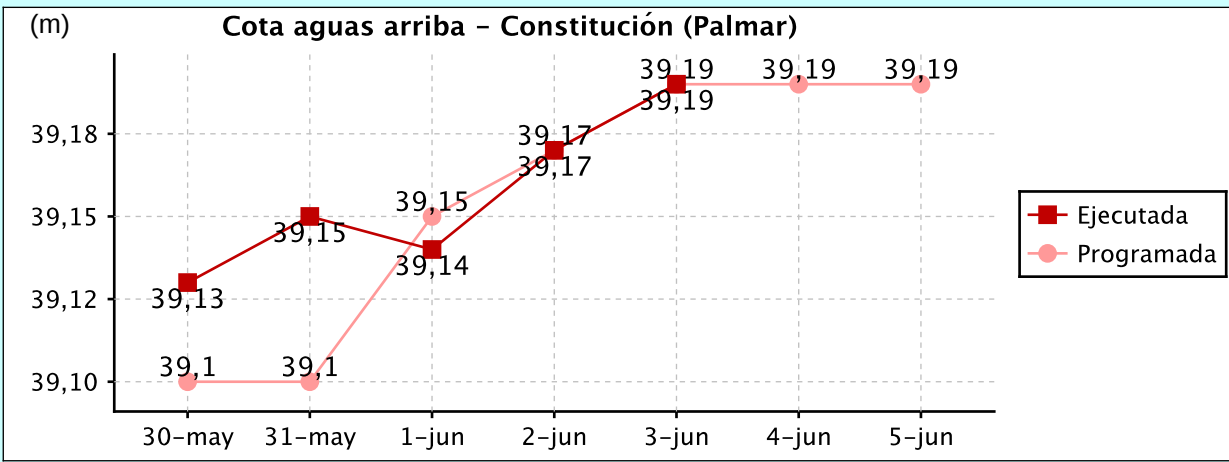
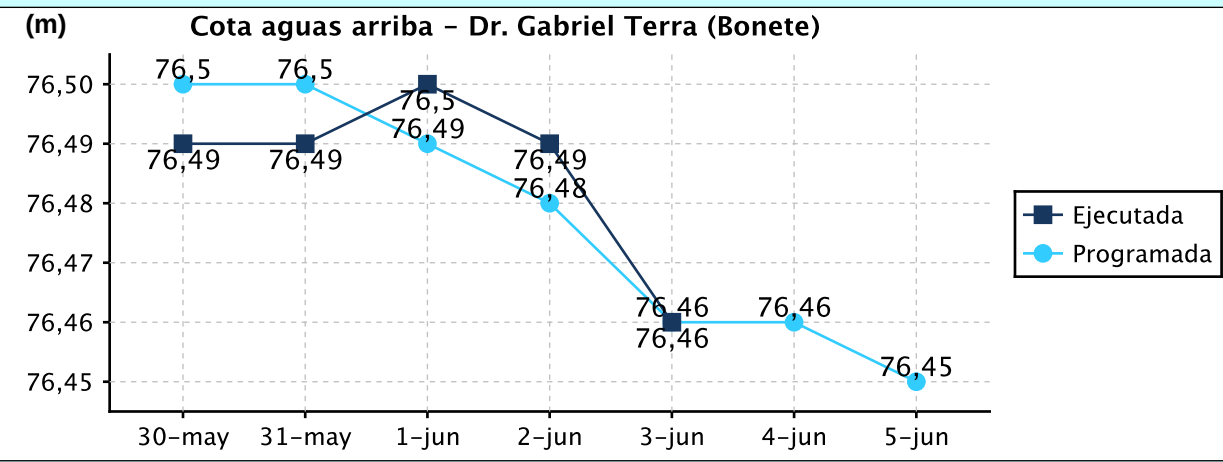


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,46	76,46
Baygorria	53,90	53,89
Palmar	39,19	39,19
SGU	34,71	34,68

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

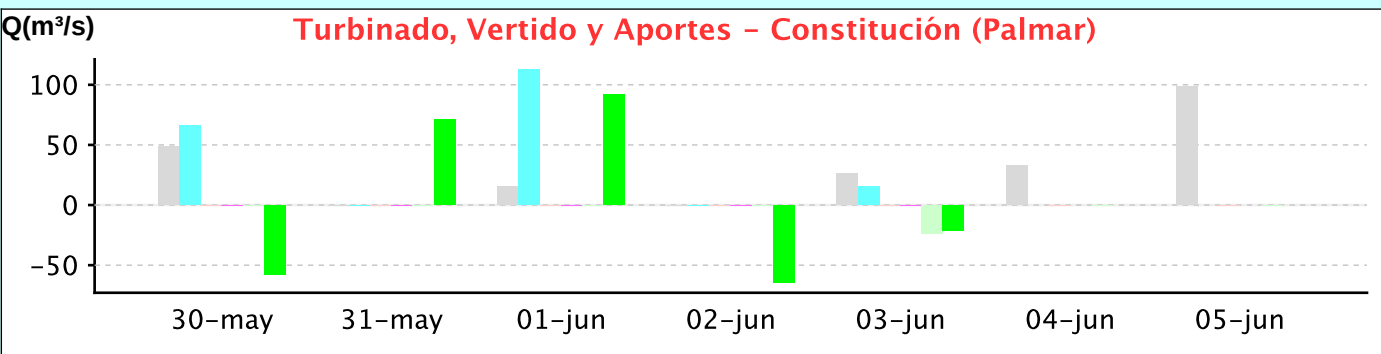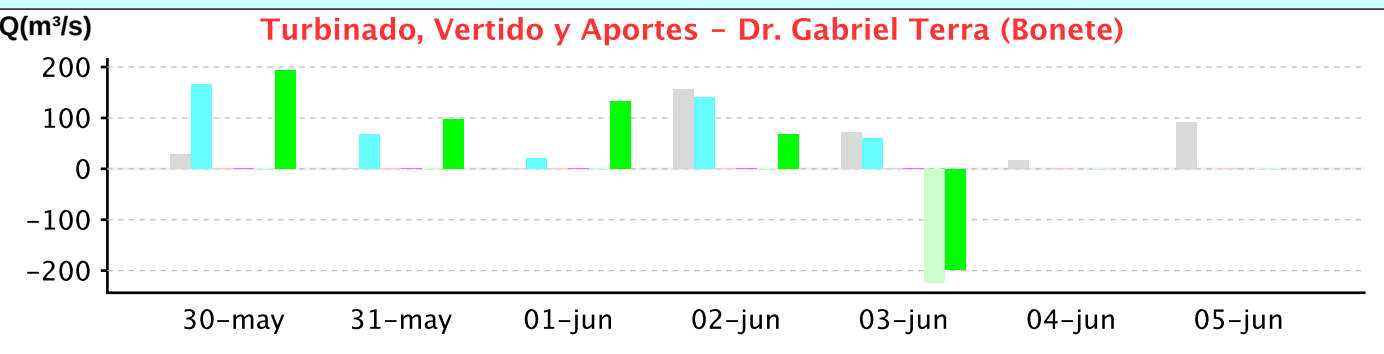

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

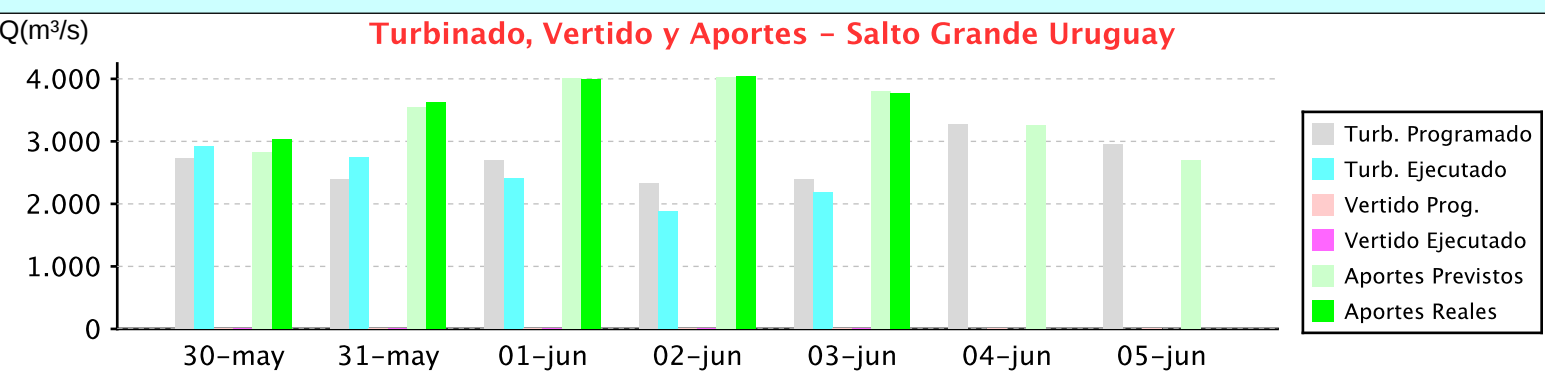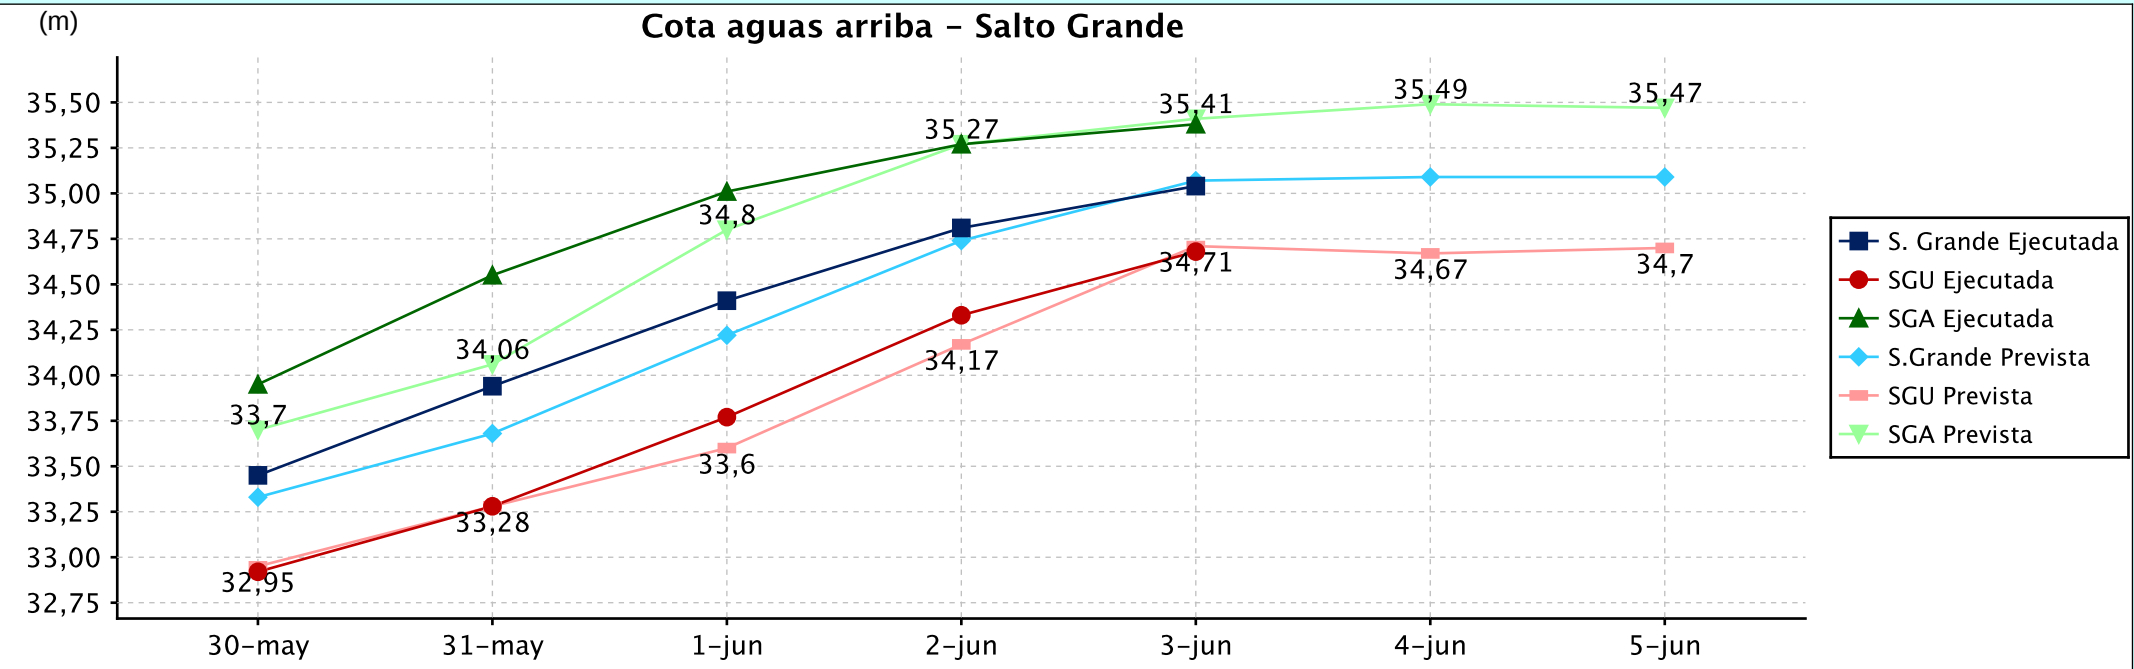

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,68
Cota Vista Arg	35,38
Cota real	35,04
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	-16.473

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	73	60
Baygorria	78	107
Palmar	26	15
SGU	2.396	2.177

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	-223	-197
Baygorria	-2	8
Palmar	-24	-21
SGU	3.797	3.762

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
