




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

martes 09 de junio de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	1.444
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	1.448
Central La Tablada	-79
Central P. del Tigre	5.740
APR A	34
APR B	-3
APR C	21
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	1.208
C. Baygorria	725
C. Palmar	2.925
C. Salto Grande	13.035
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	5.569
TOTAL Generación	30.621

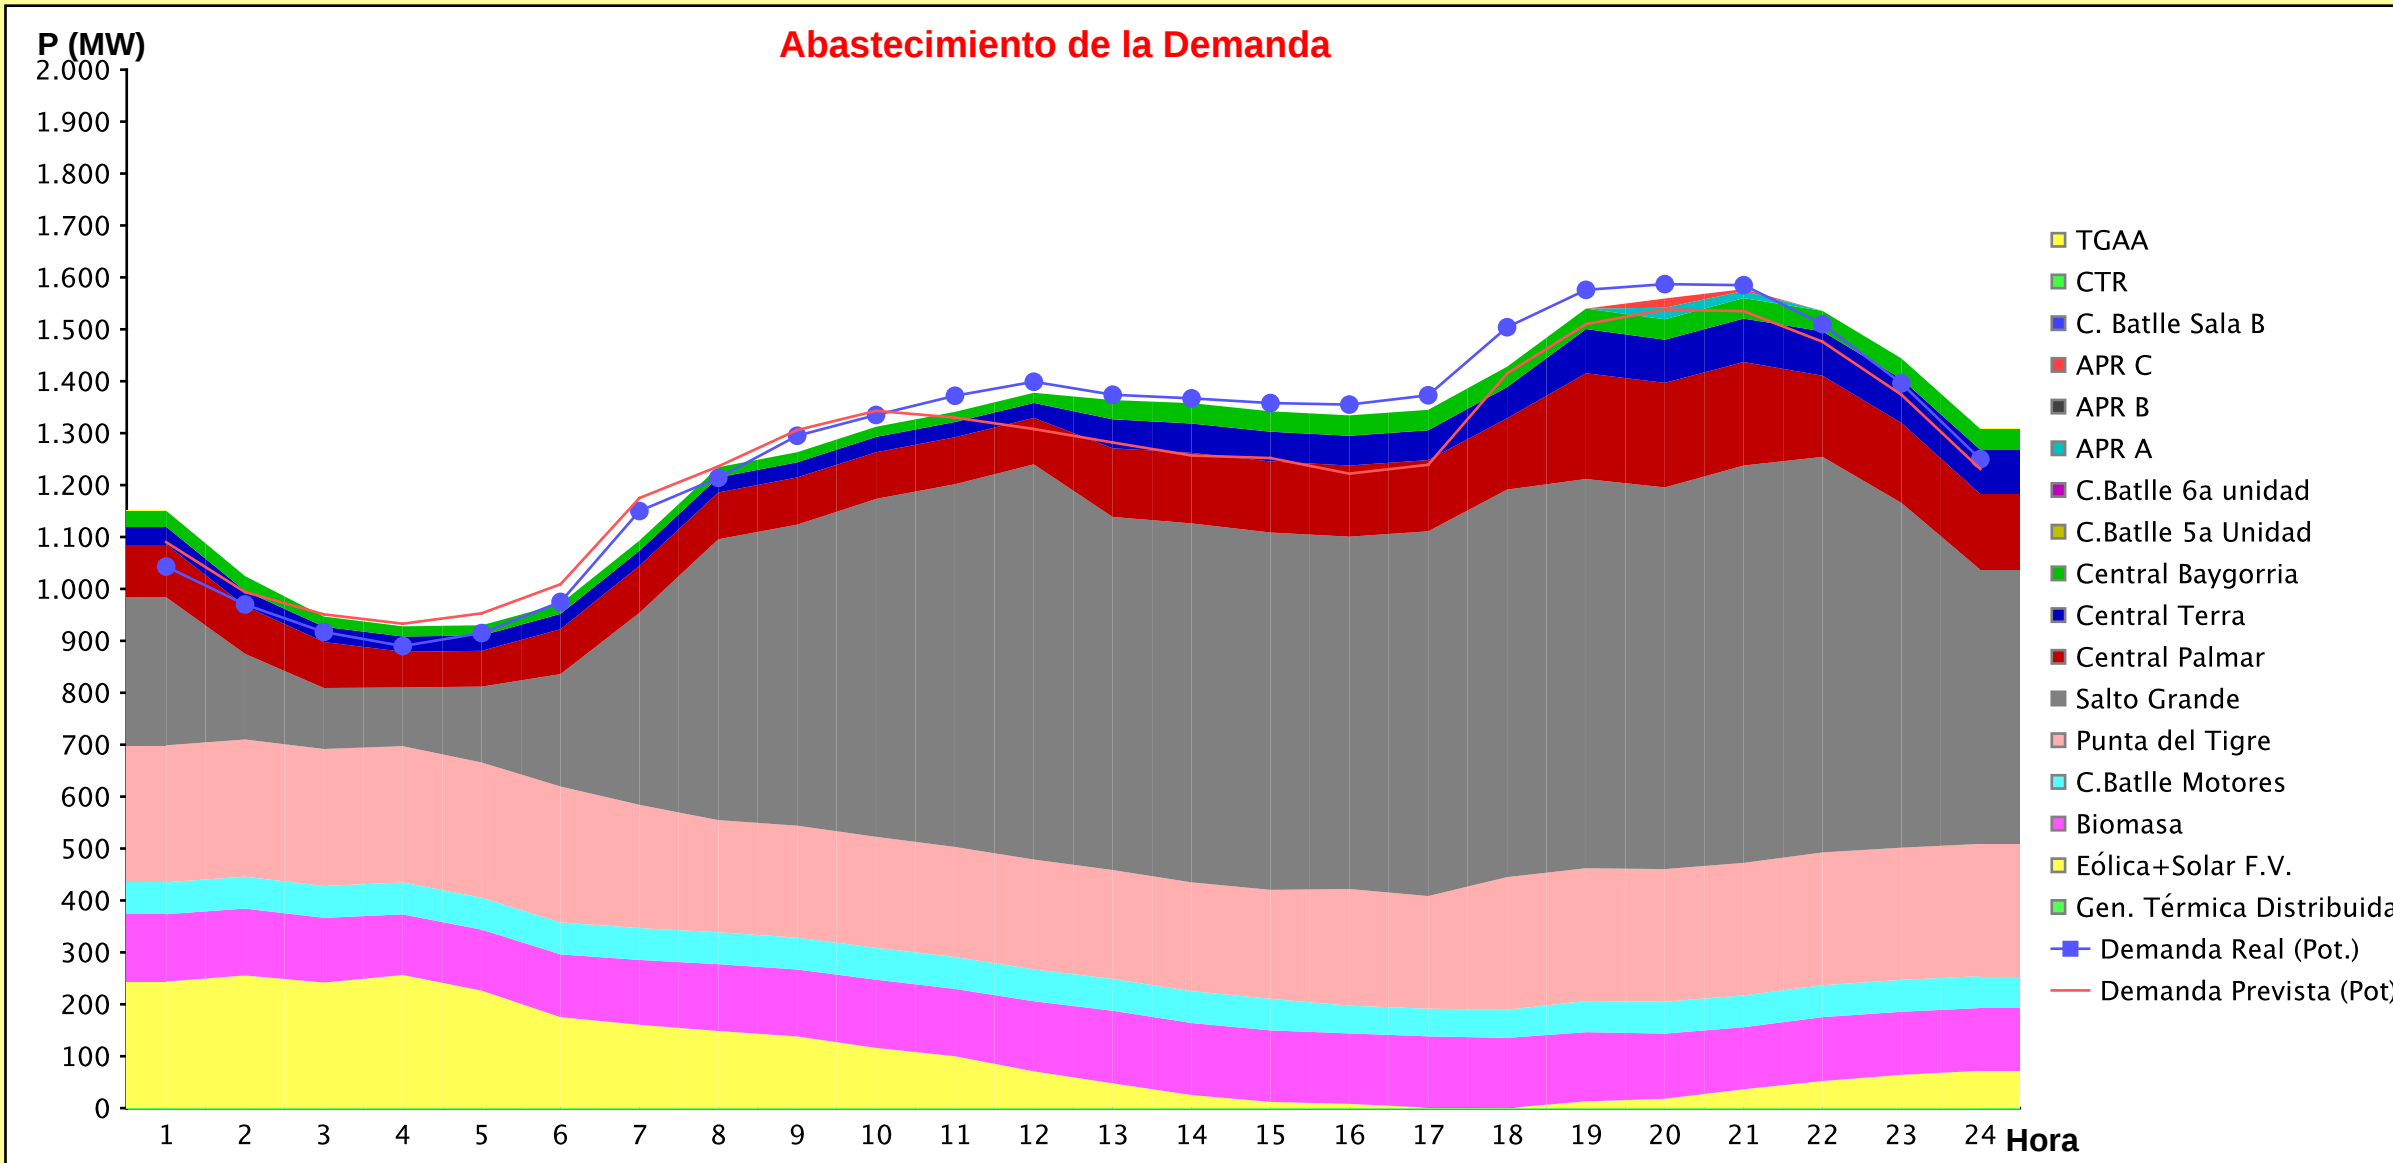

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	30.621
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	29.959
Diferencia (MWh)	662
Ejecutada - Programada	2,21 %

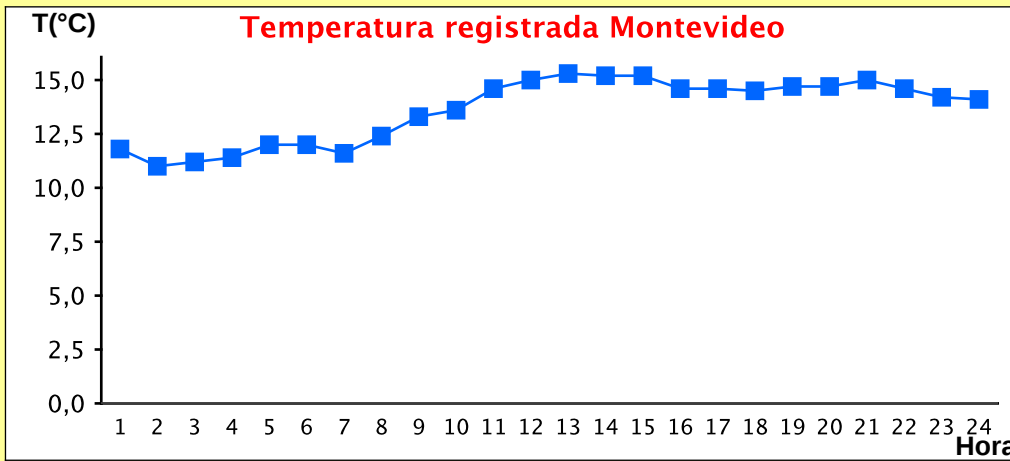



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1424 Hora 11:40
Potencia mínima:	909 Hora 03:57
Pico noche:	1612 Hora 20:17

Generación Media (MW)	
Eólica	104,7
Biomasa	128,6
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

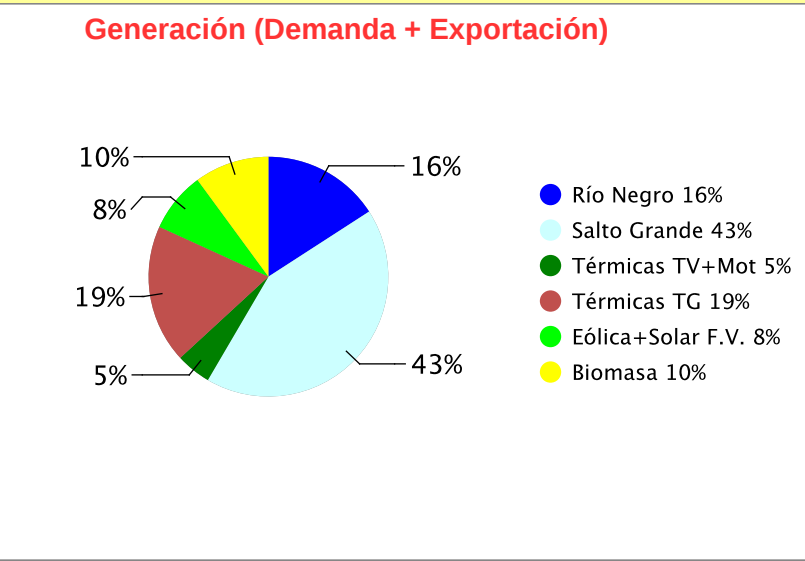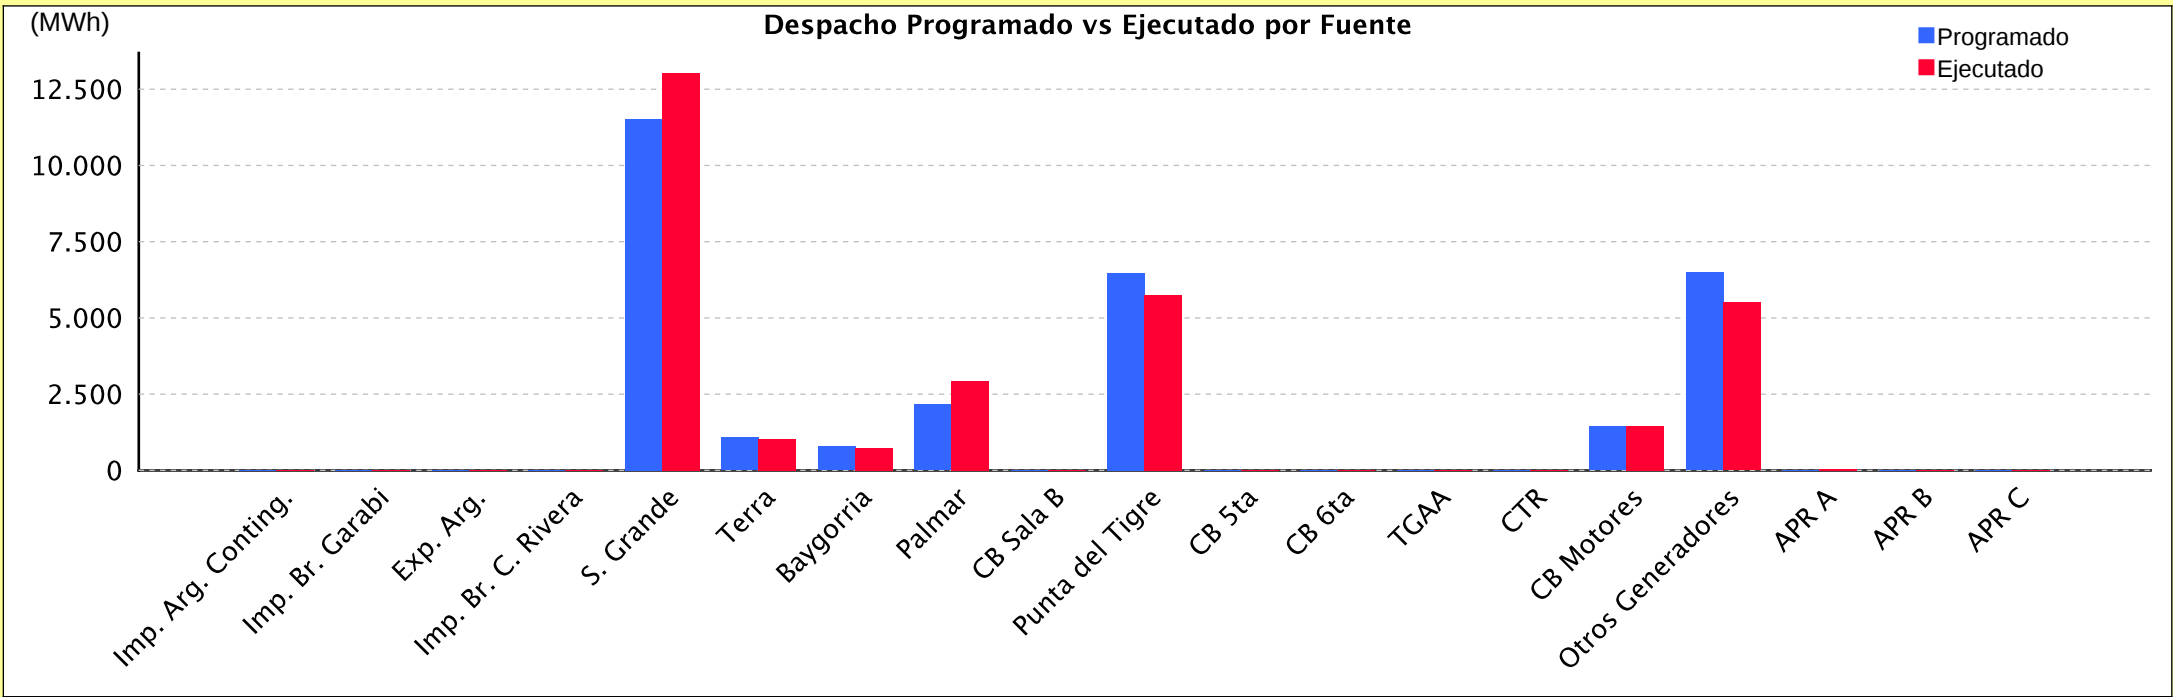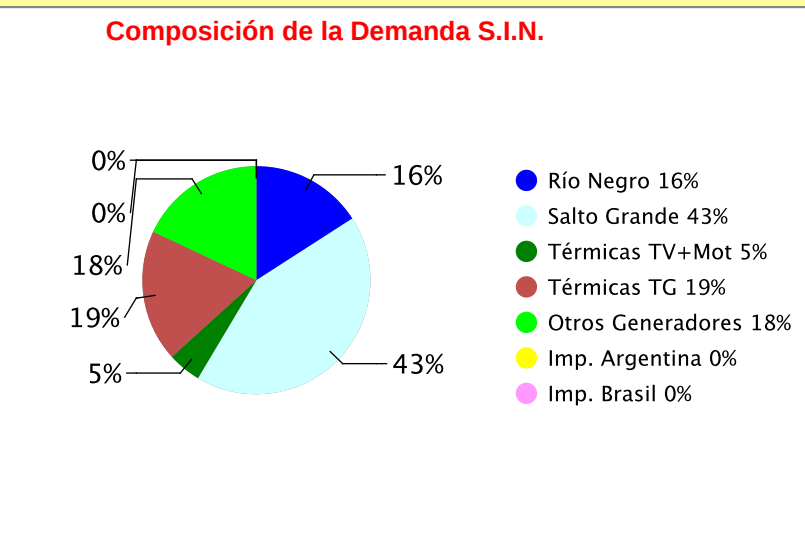



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

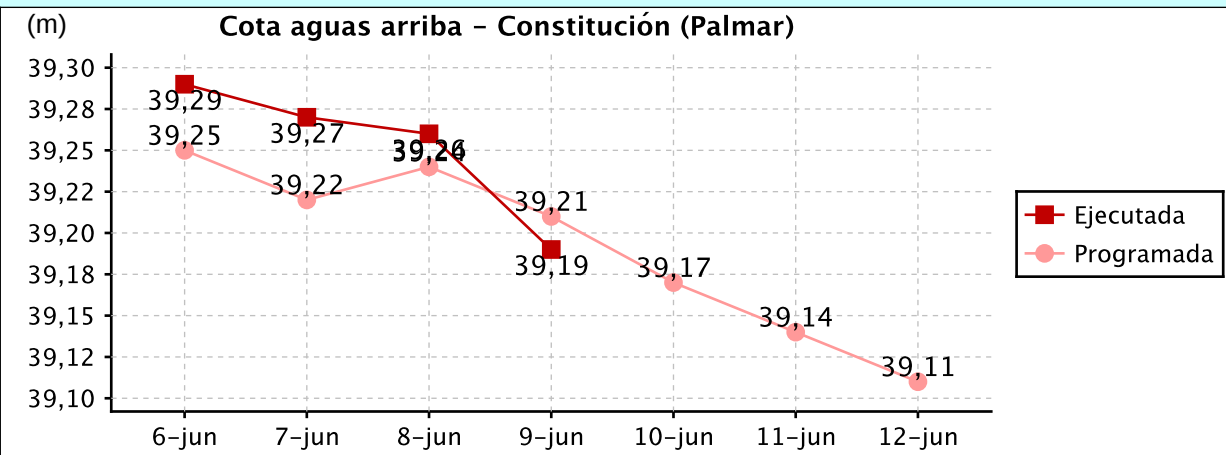
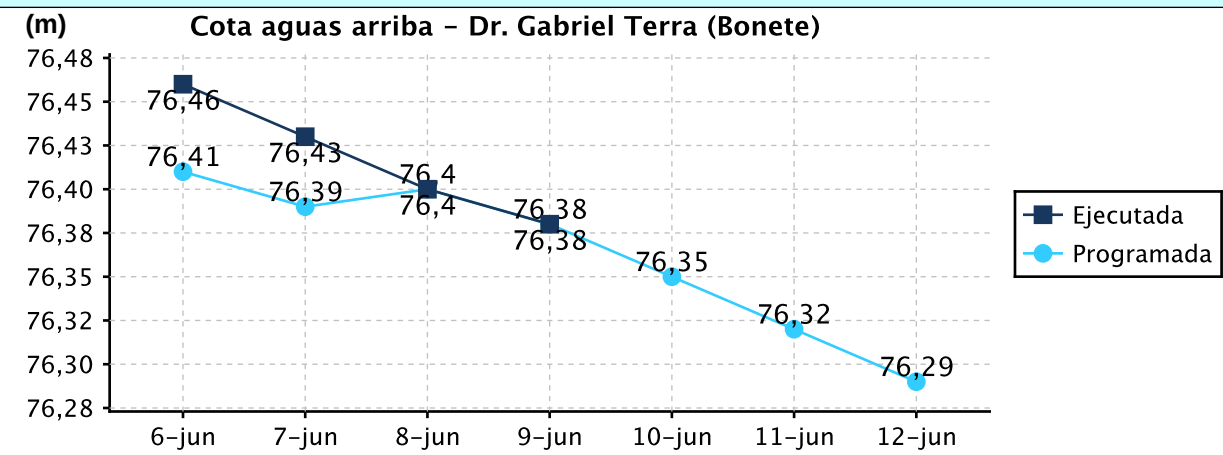


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,38	76,38
Baygorria	53,88	53,83
Palmar	39,21	39,19
SGU	34,81	34,86

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

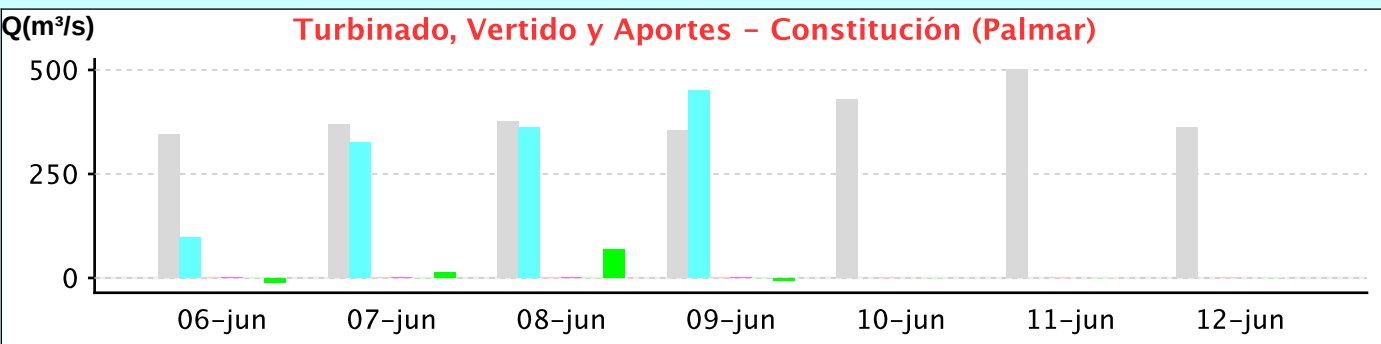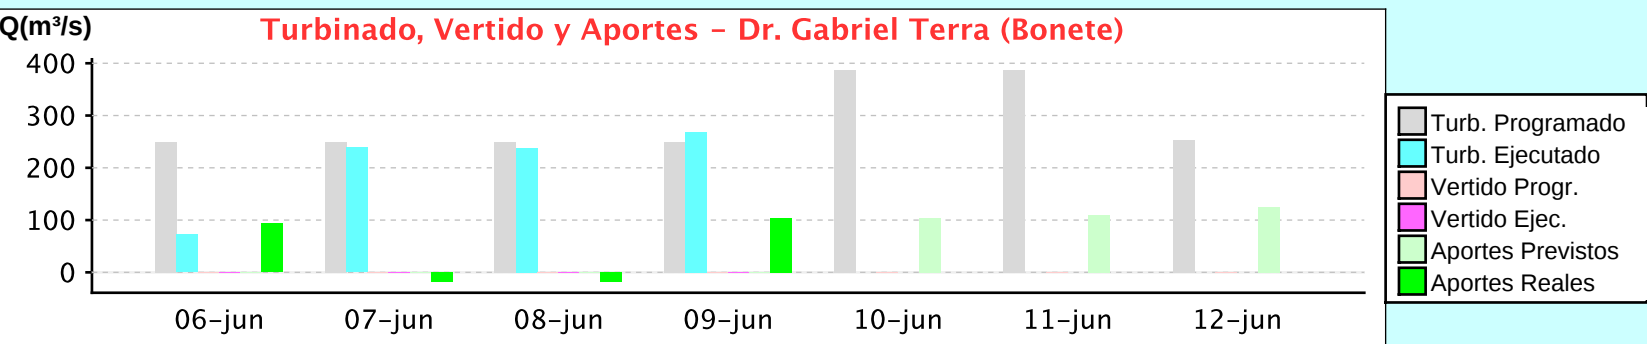

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

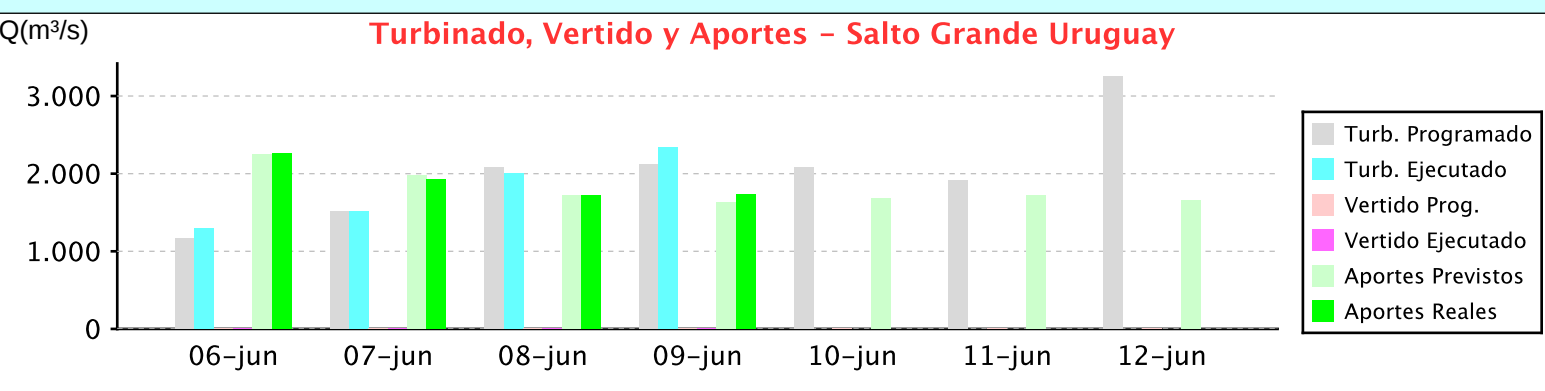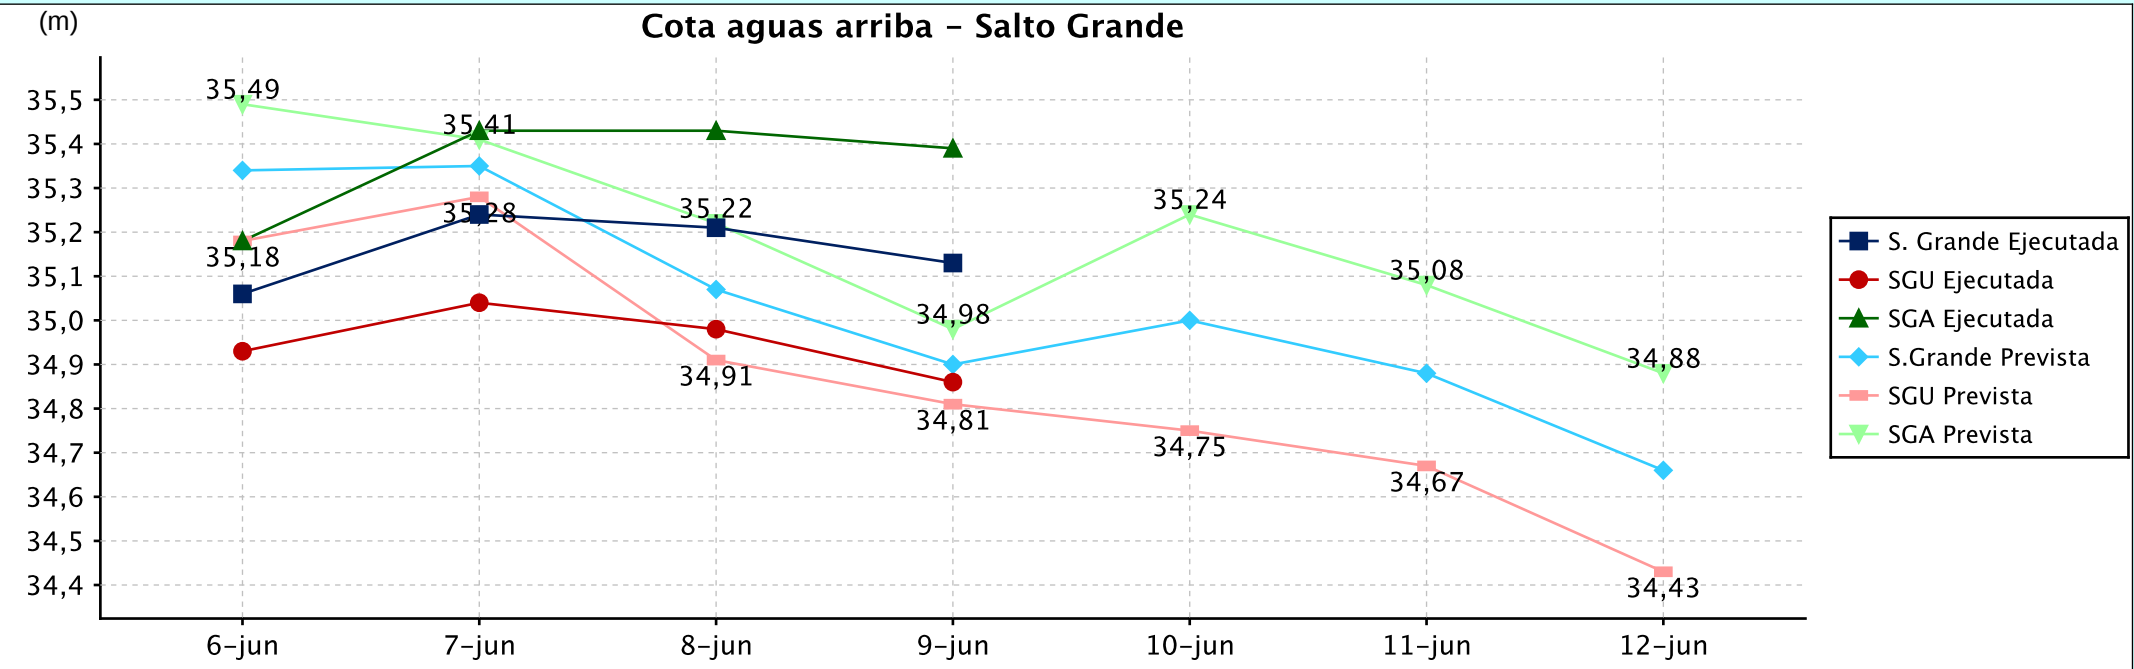

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,86
Cota Vista Arg	35,39
Cota real	35,13
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	-12.522

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	249	269
Baygorria	254	238
Palmar	355	450
SGU	2.114	2.334

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	104
Baygorria	0	-59
Palmar	0	-6
SGU	1.625	1.731

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
