




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

viernes 12 de junio de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	1.446
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	1.450
Central La Tablada	-80
Central P. del Tigre	5.286
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	1.683
C. Baygorria	1.240
C. Palmar	3.142
C. Salto Grande	13.591
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	6.174
TOTAL Generación	32.478

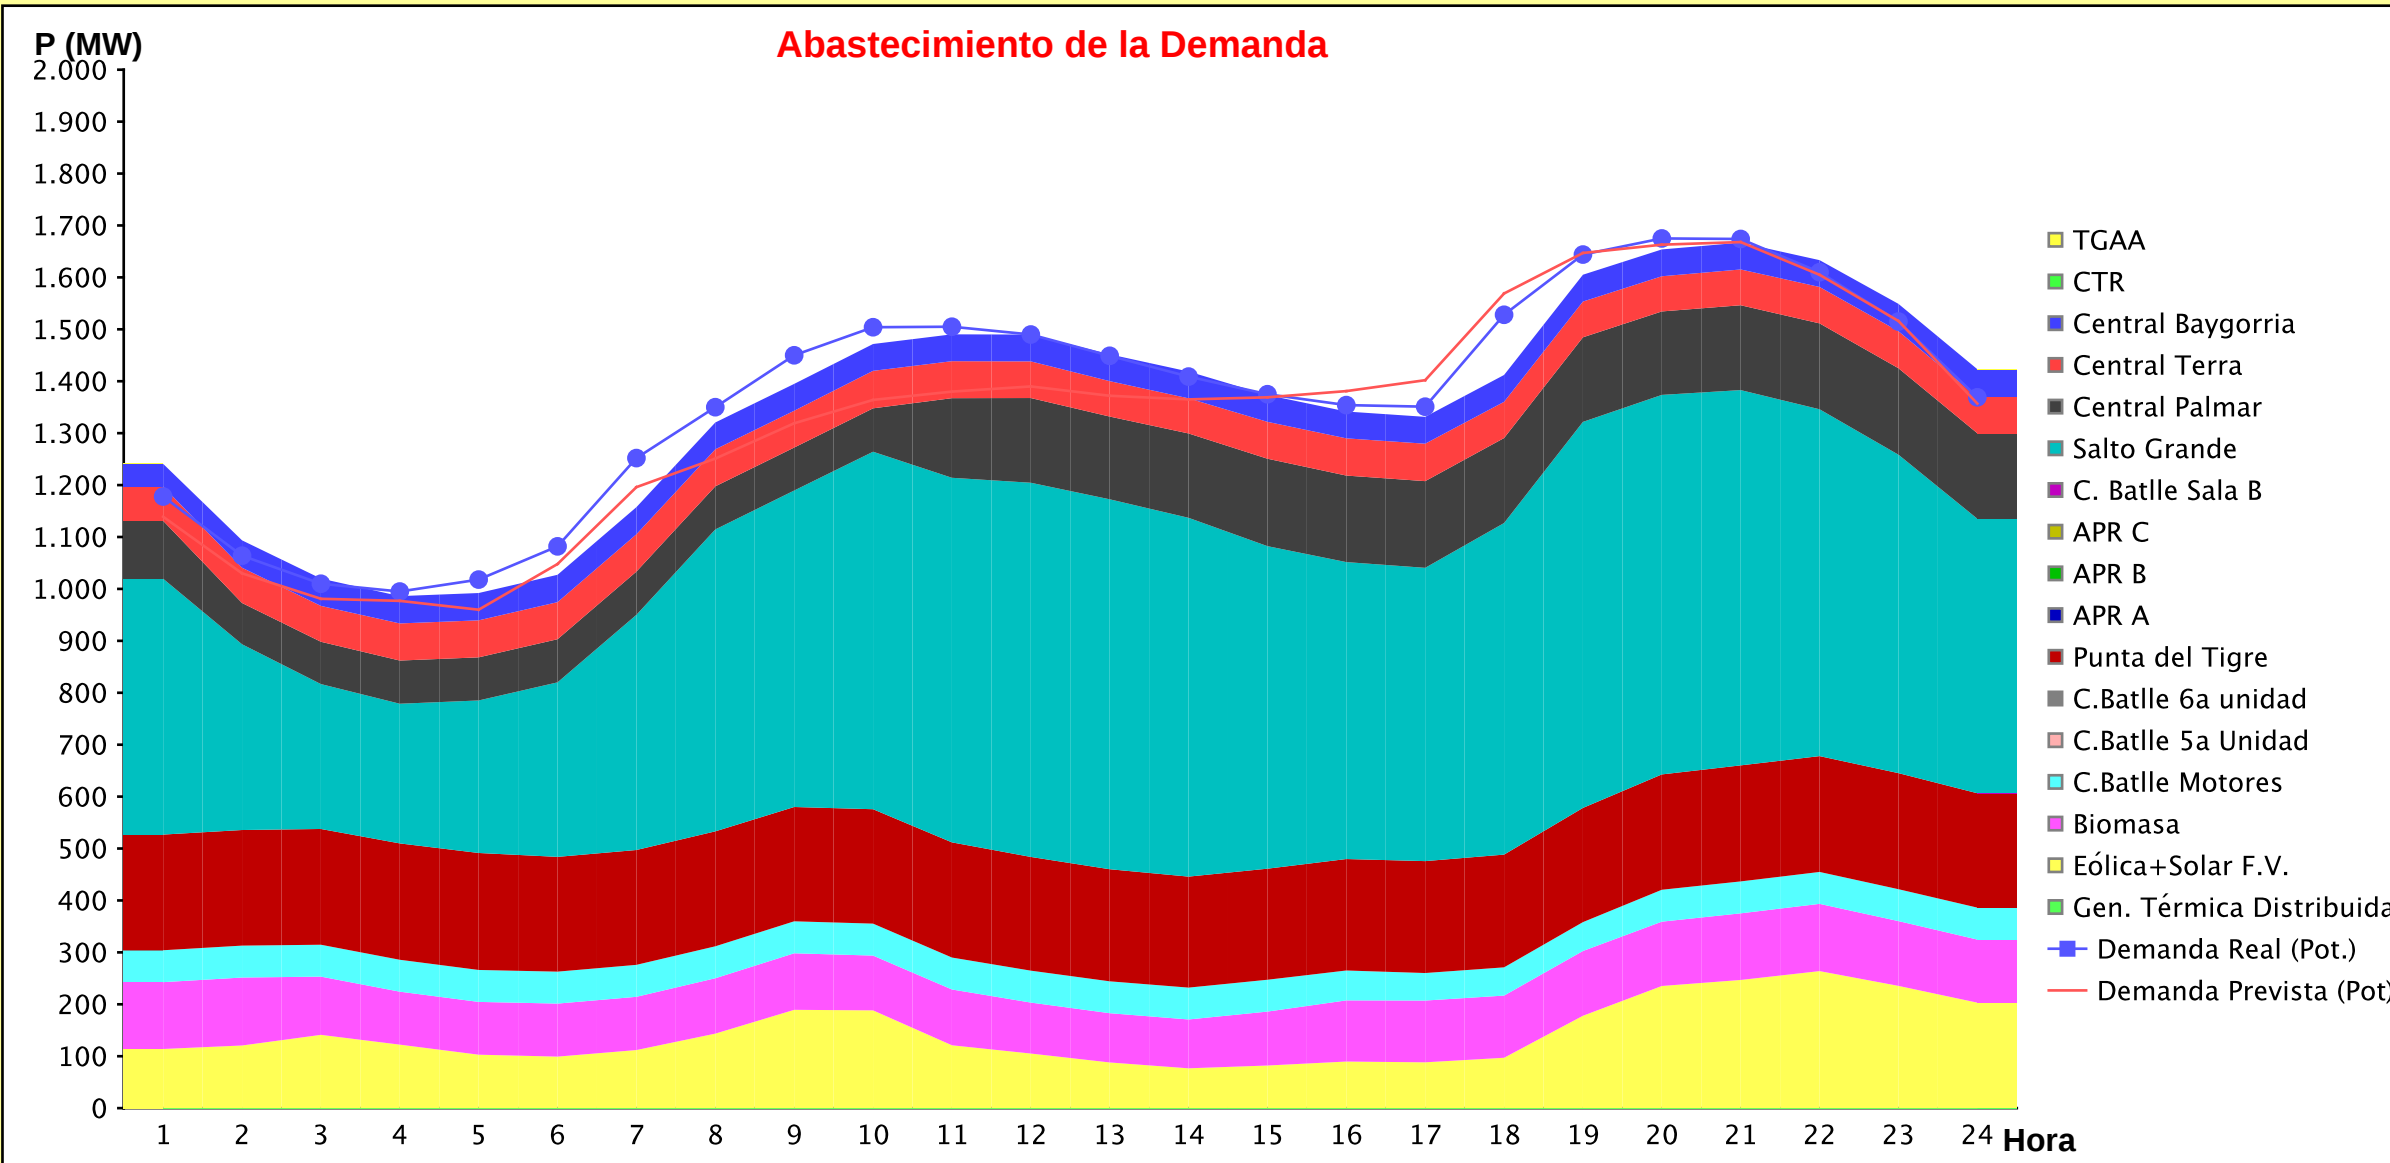

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0


DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	32.478
(en bormes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	31.949
Diferencia (MWh)	529
Ejecutada - Programada	1,65 %


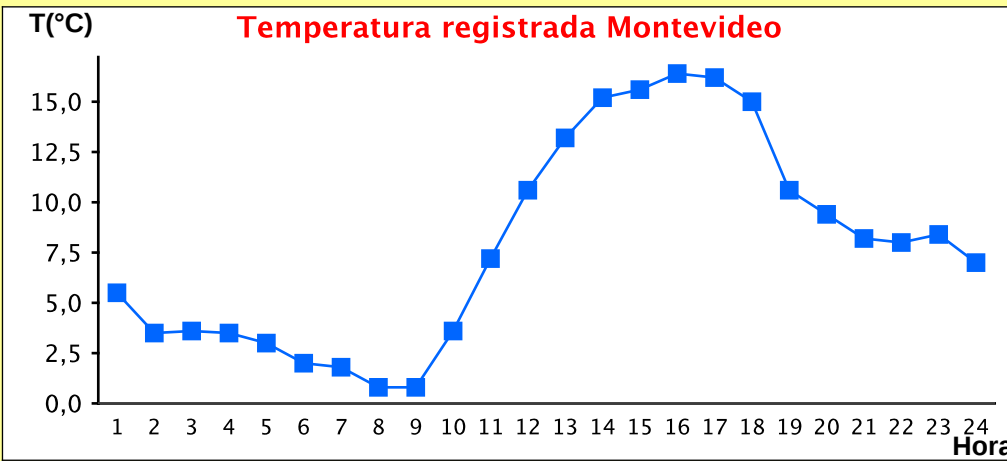


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	0 Hora 00:00
Potencia mínima:	0 Hora 00:00
Pico noche:	0 Hora 00:00

Generación Media (MW)	
Eólica	144,2
Biomasa	113,0
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0


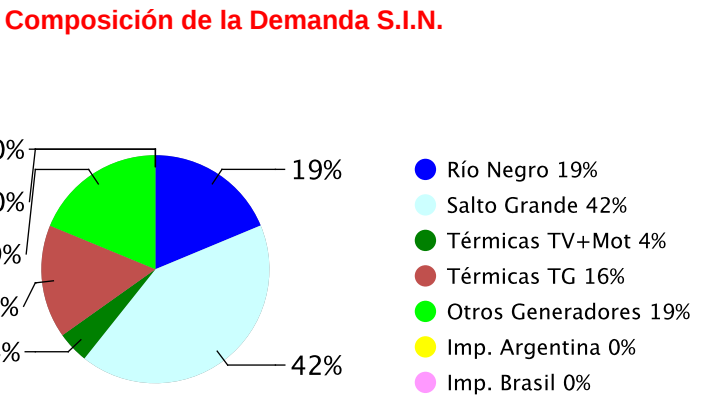


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

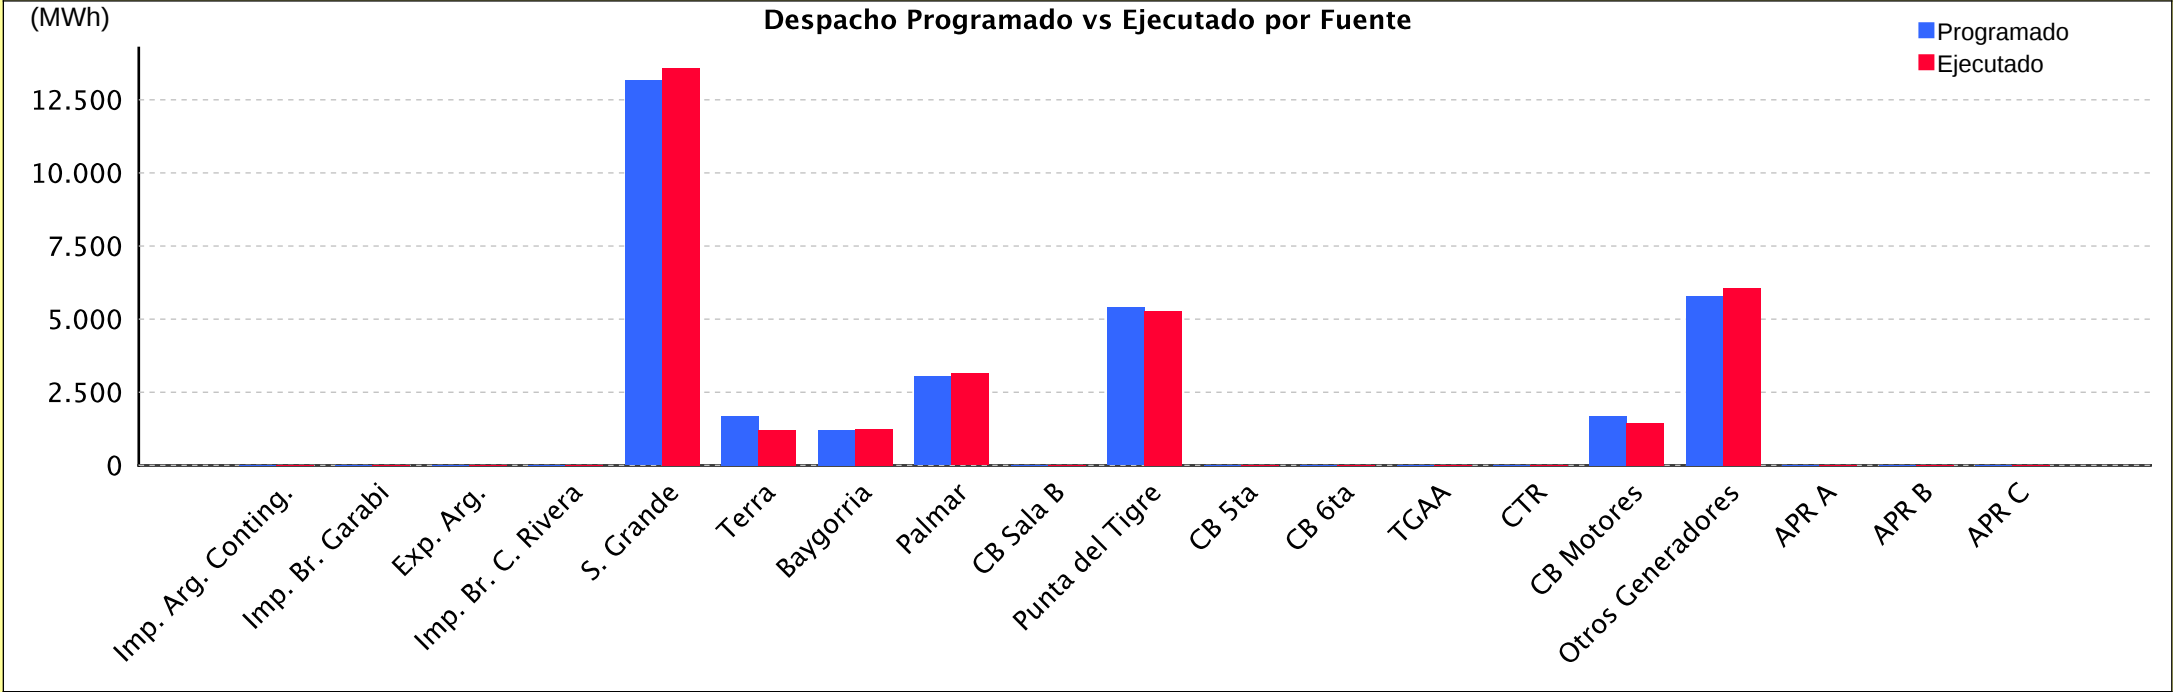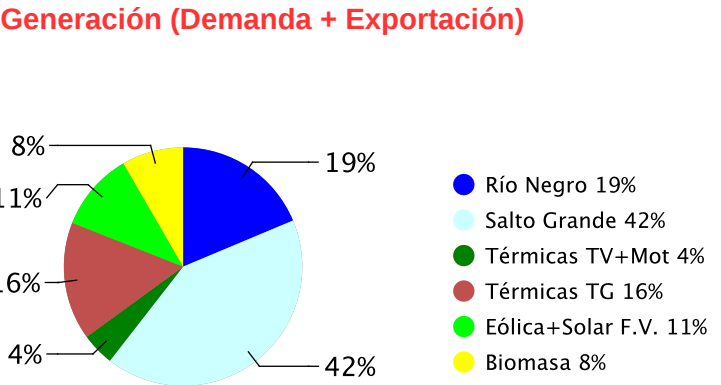



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

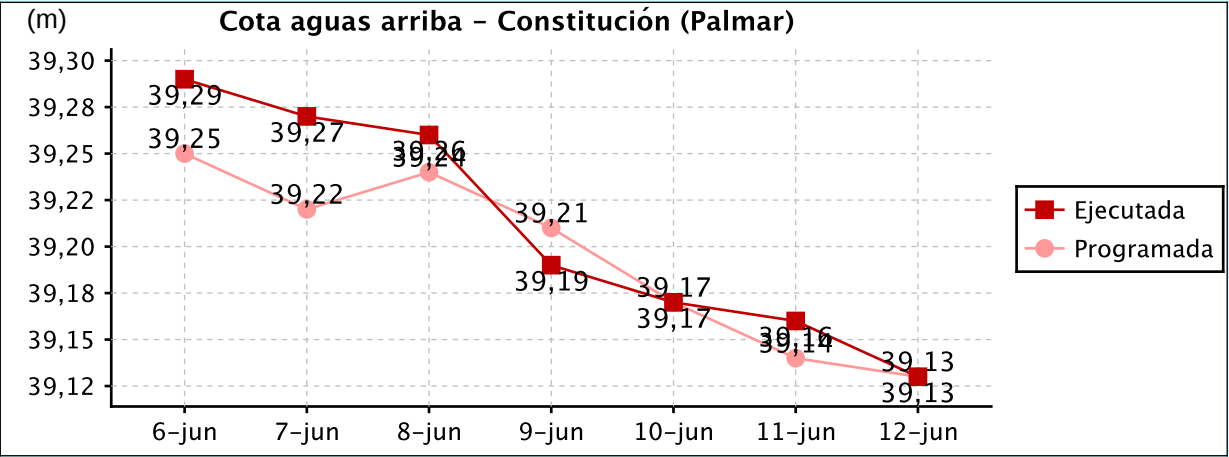
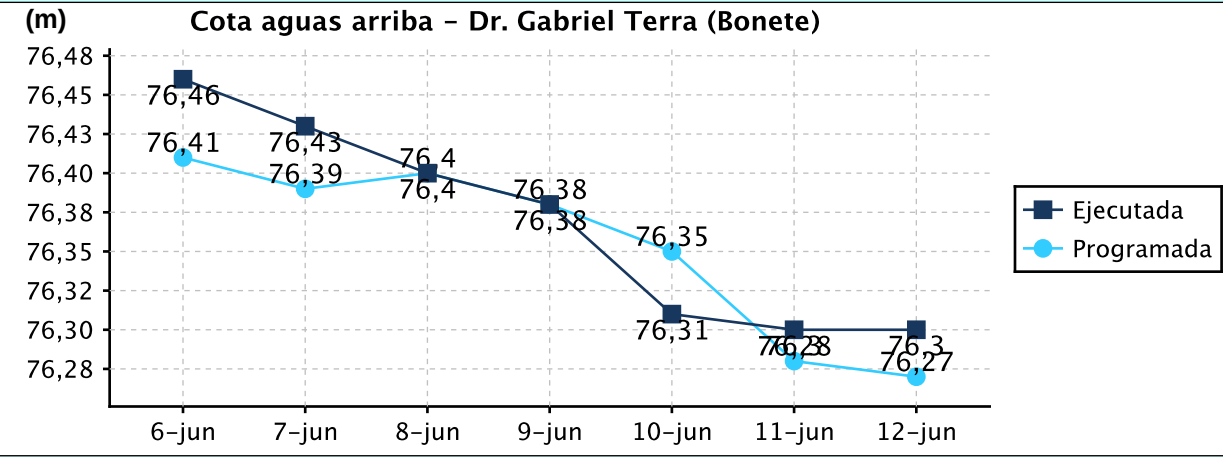


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,27	76,3
Baygorria	53,87	53,83
Palmar	39,13	39,13
SGU	34,76	34,69

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

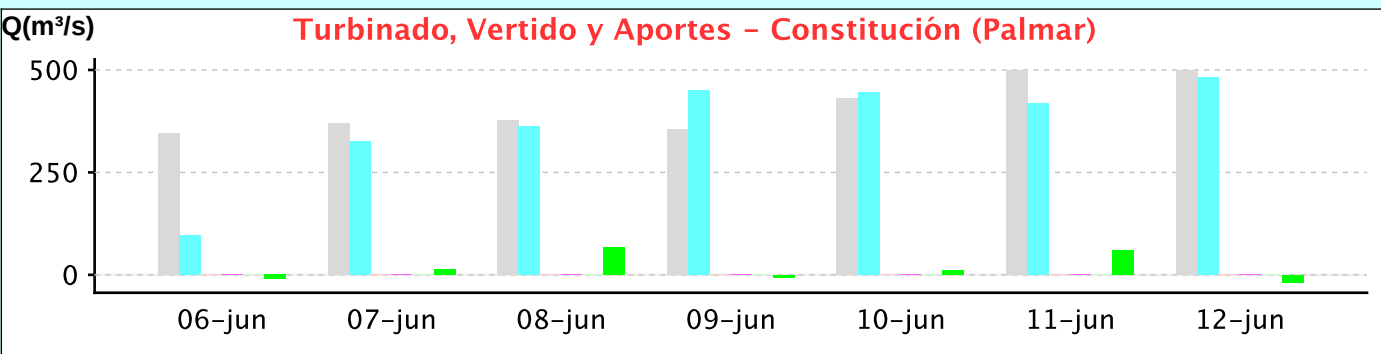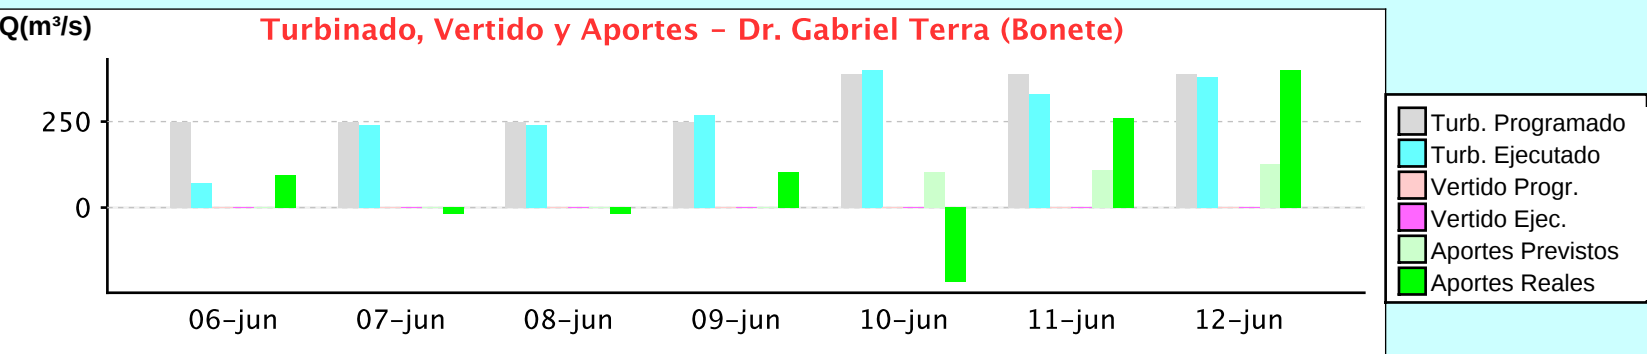

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

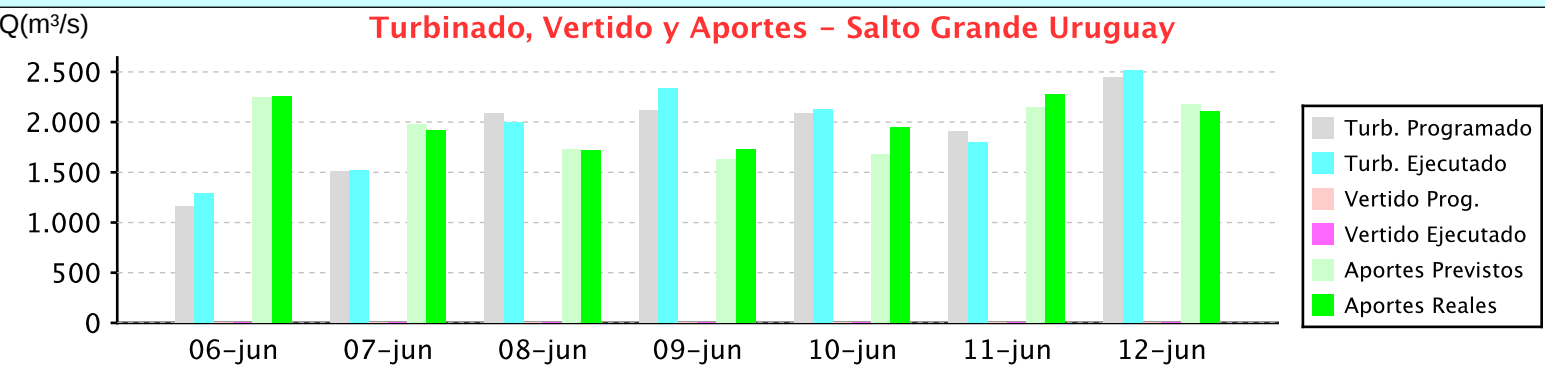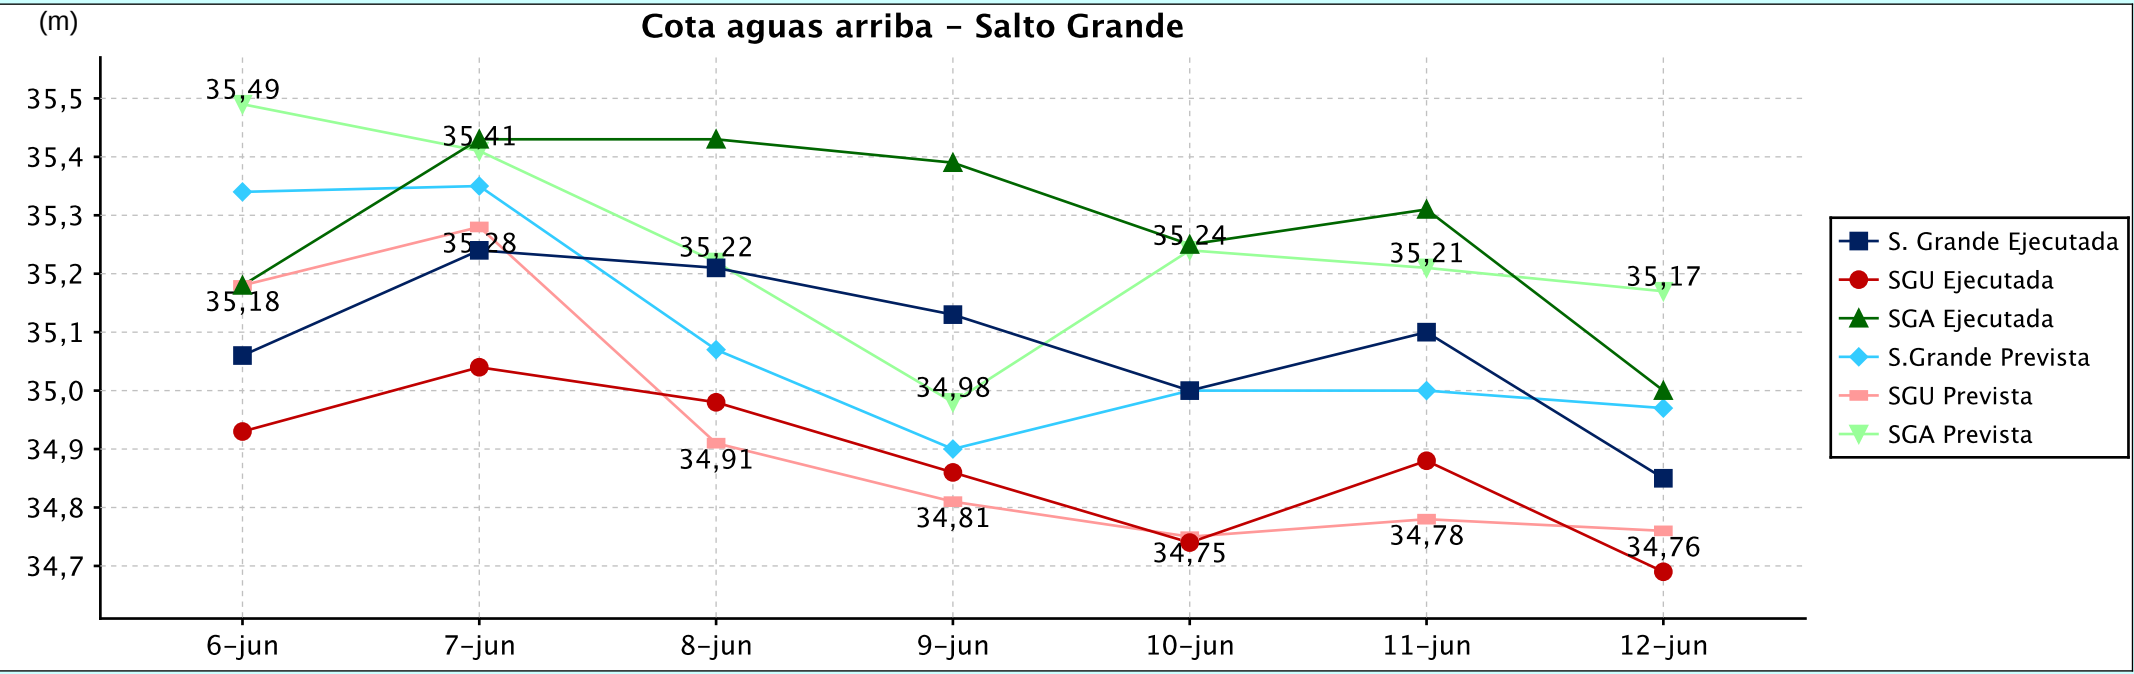

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,69
Cota Vista Arg	35,00
Cota real	34,85
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	2.820

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	387	379
Baygorria	391	409
Palmar	500	482
SGU	2.448	2.518

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	125	400
Baygorria	0	2
Palmar	0	-18
SGU	2.175	2.103

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
