




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

sábado 13 de junio de 2015


Generación Térmica	
Central Batlle	1.466
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	1.470
Central La Tablada	-81
Central P. del Tigre	5.270
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	762
C. Baygorria	607
C. Palmar	949
C. Salto Grande	17.300
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	4.932
TOTAL Generación	31.201

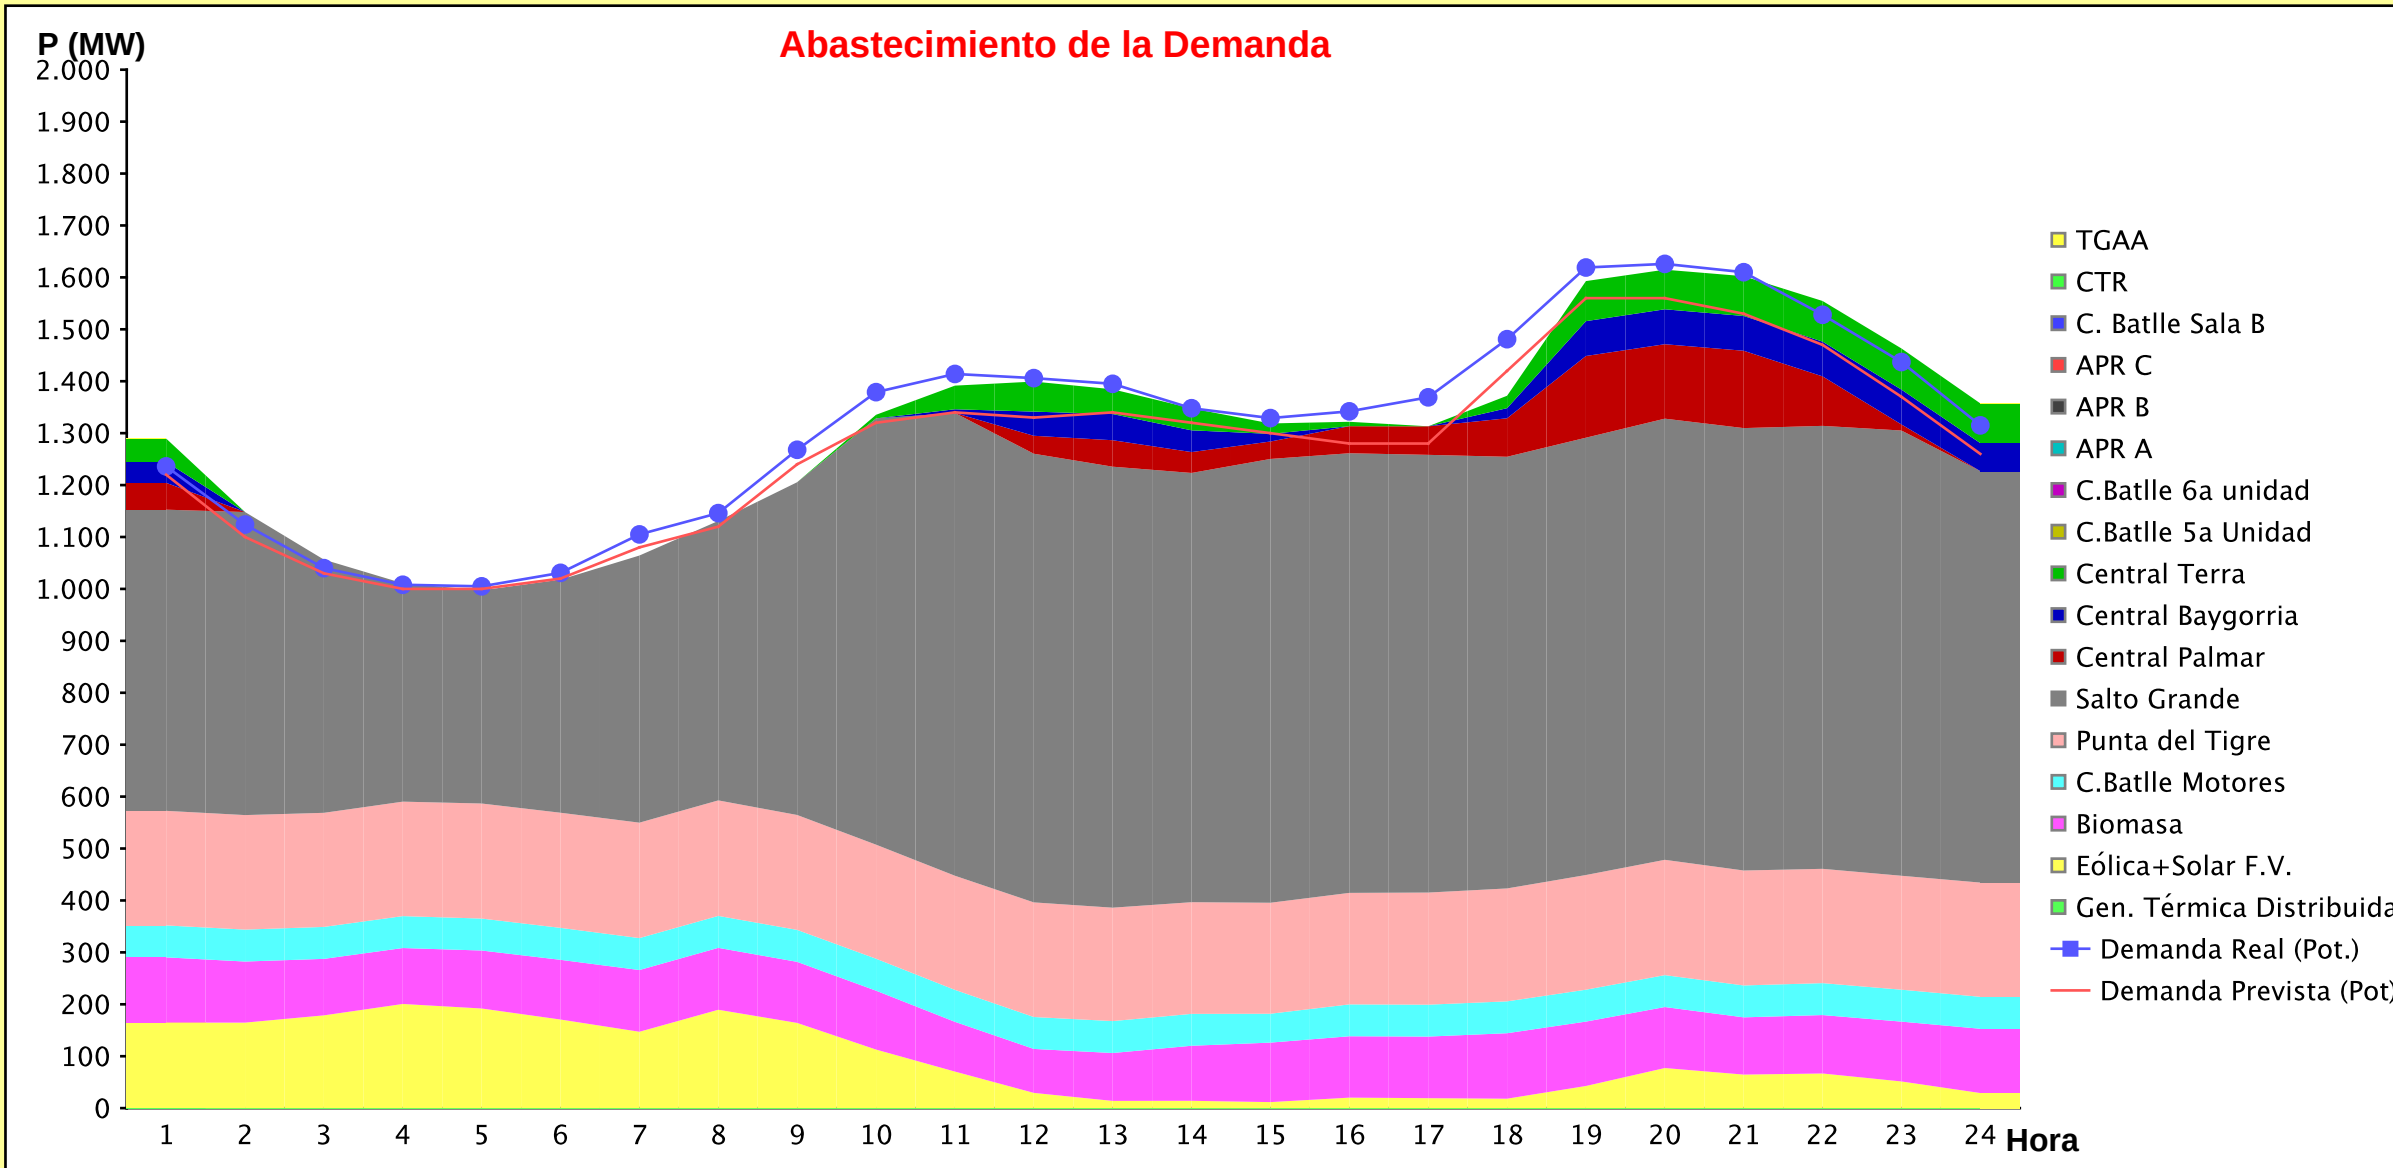

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	31.201
(en bormes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	30.490
Diferencia (MWh)	711
Ejecutada - Programada	2,33 %

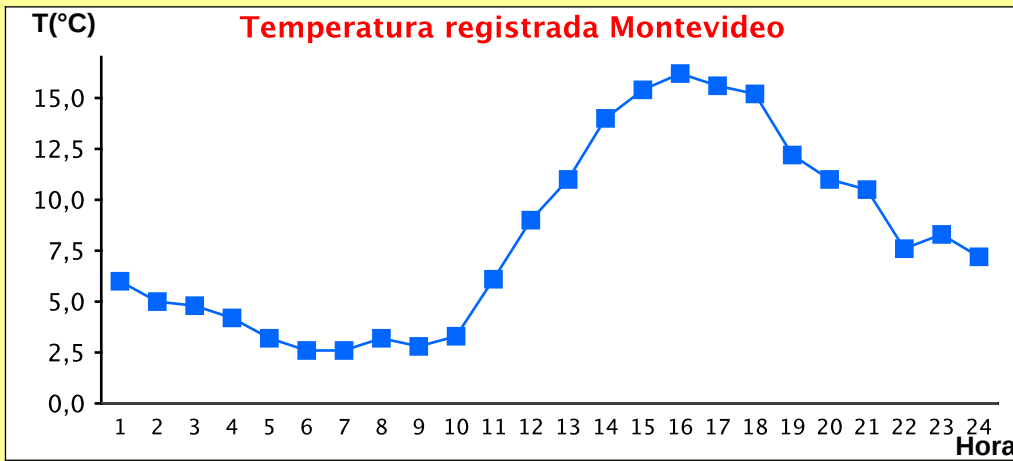



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	0 Hora 00:00
Potencia mínima:	0 Hora 00:00
Pico noche:	0 Hora 00:00

Generación Media (MW)	
Eólica	93,2
Biomasa	113,5
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

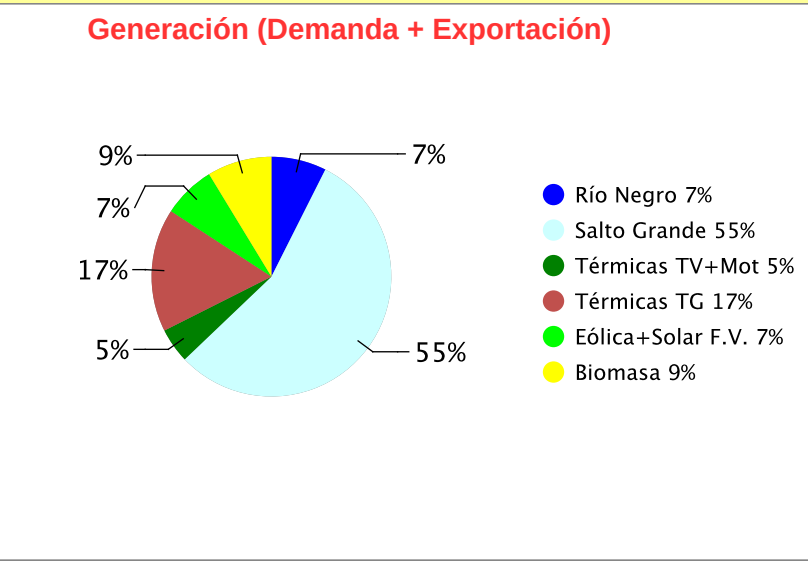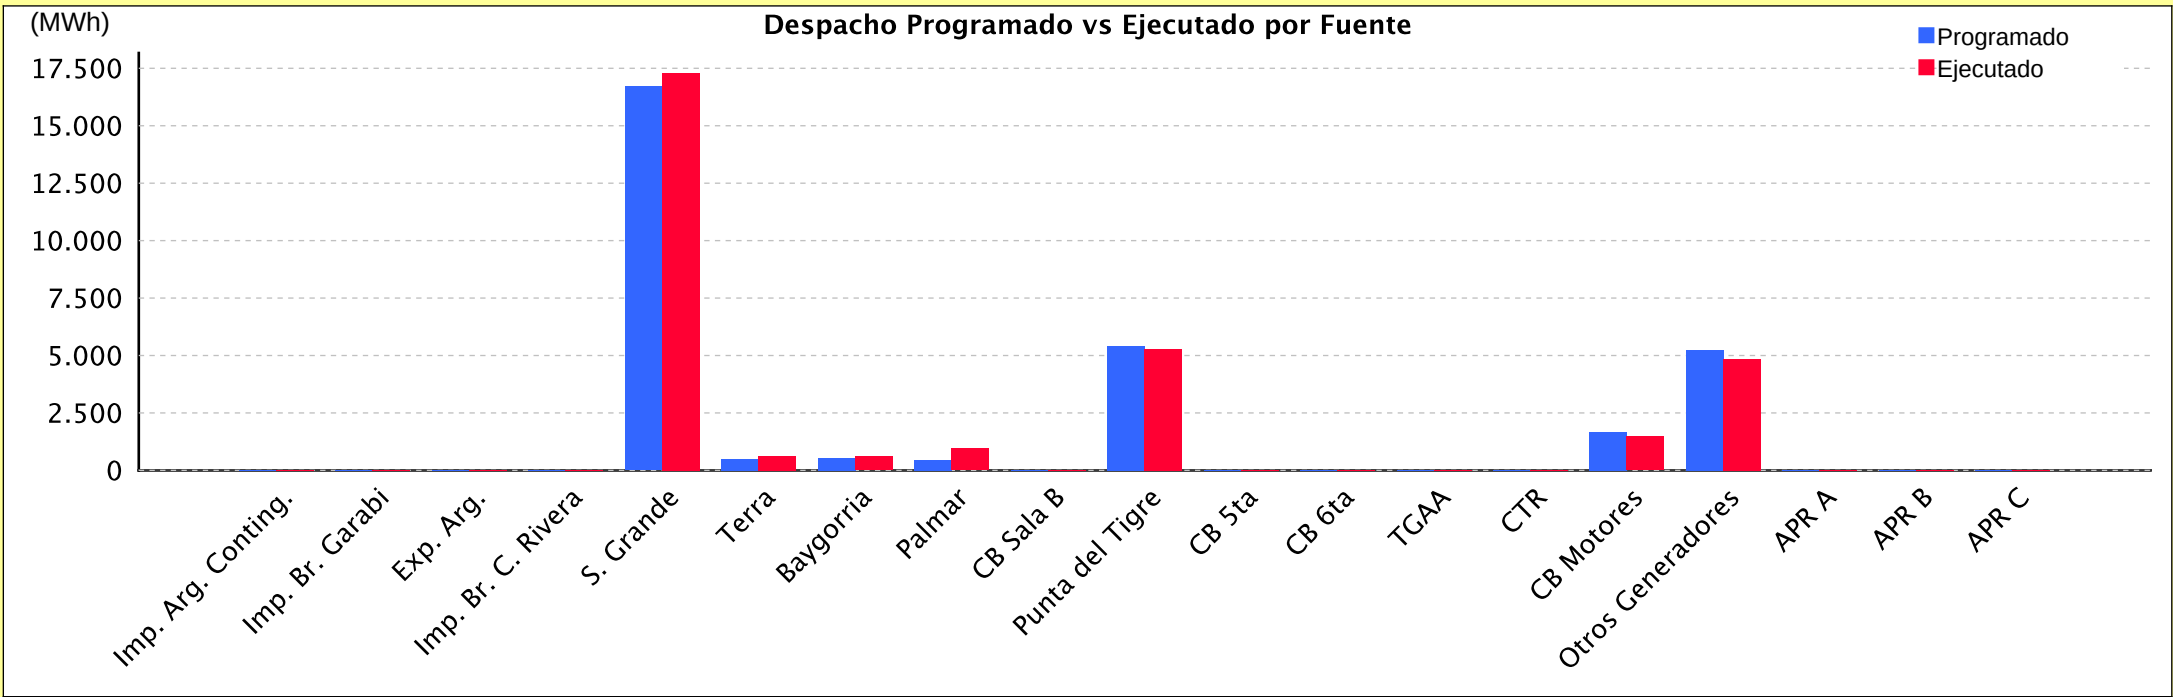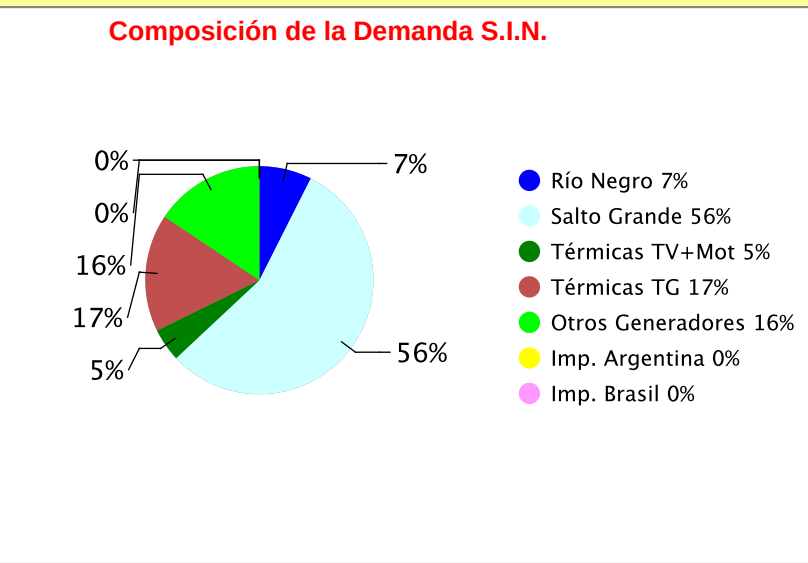



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

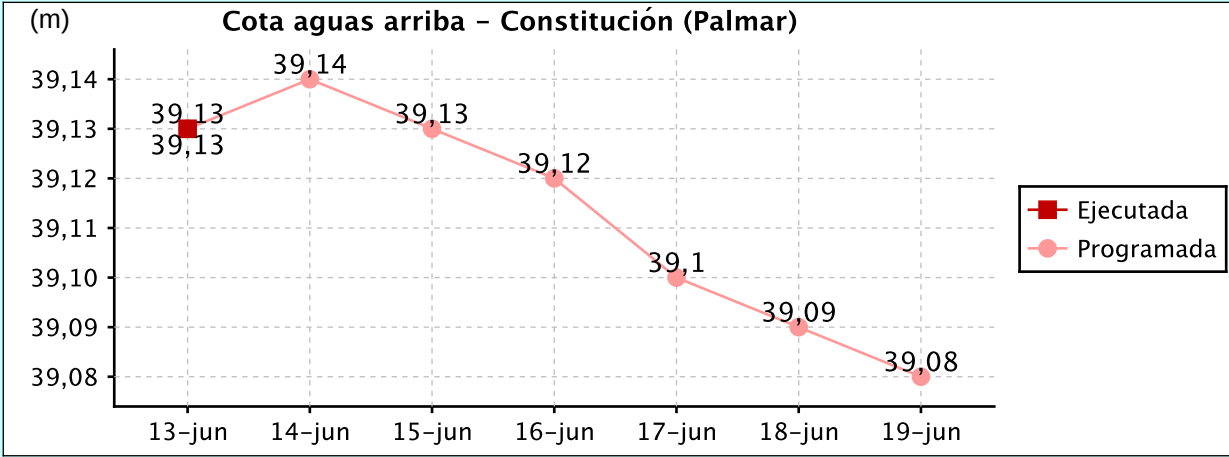
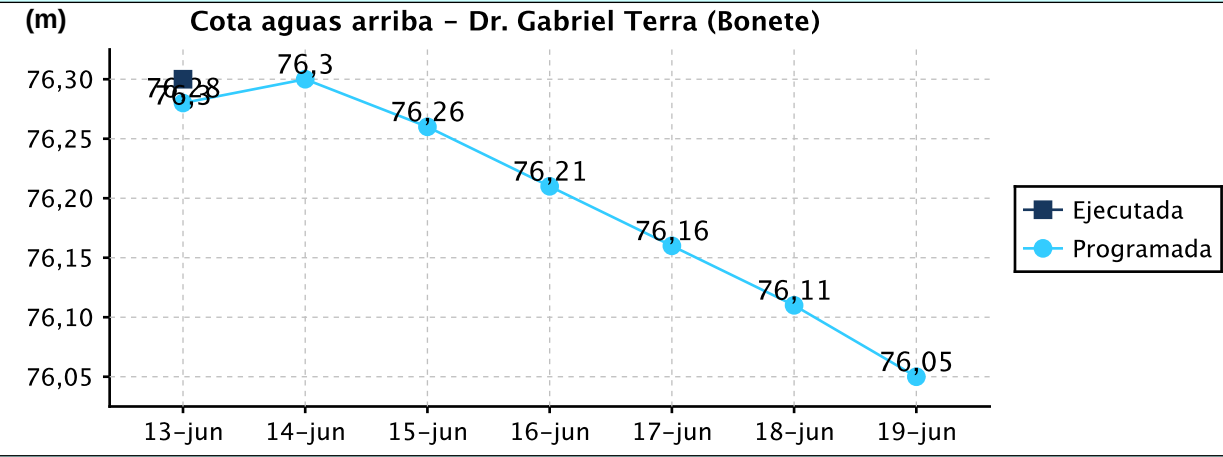


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,28	76,3
Baygorria	53,89	53,78
Palmar	39,13	39,13
SGU	34,38	34,25

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

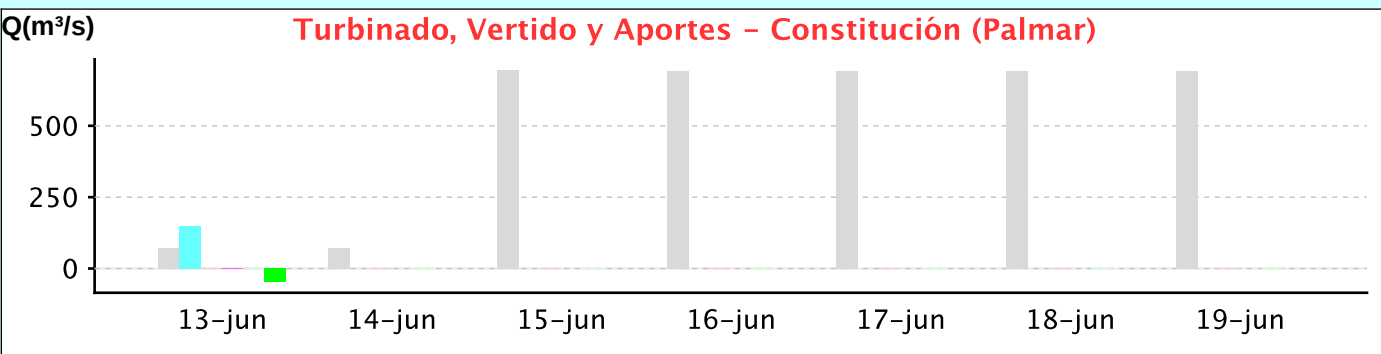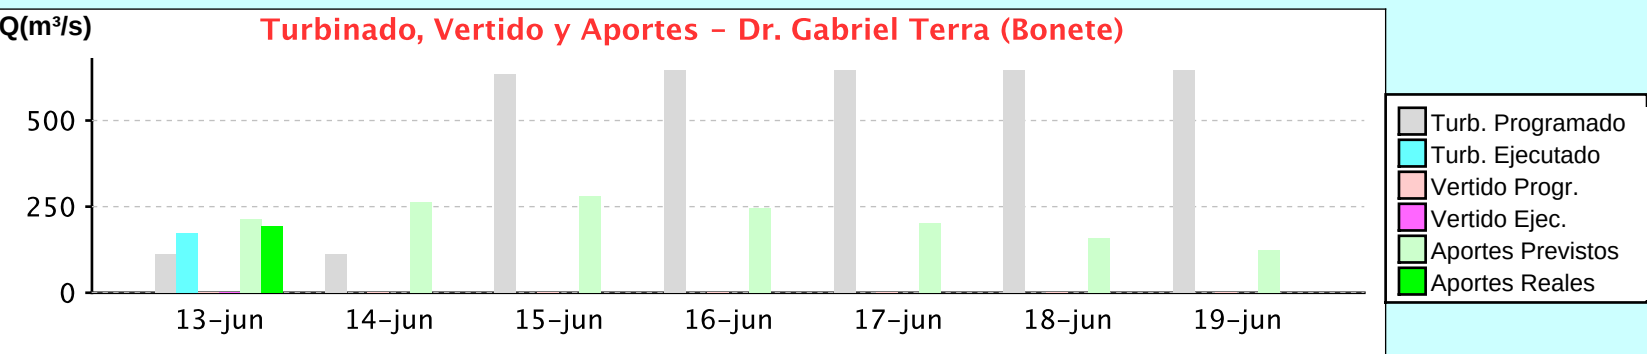

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

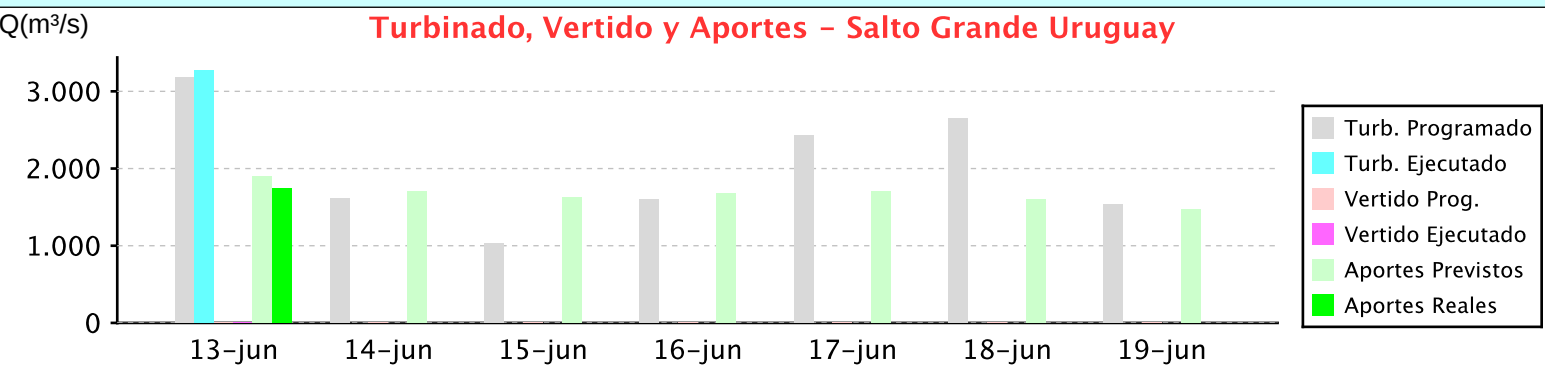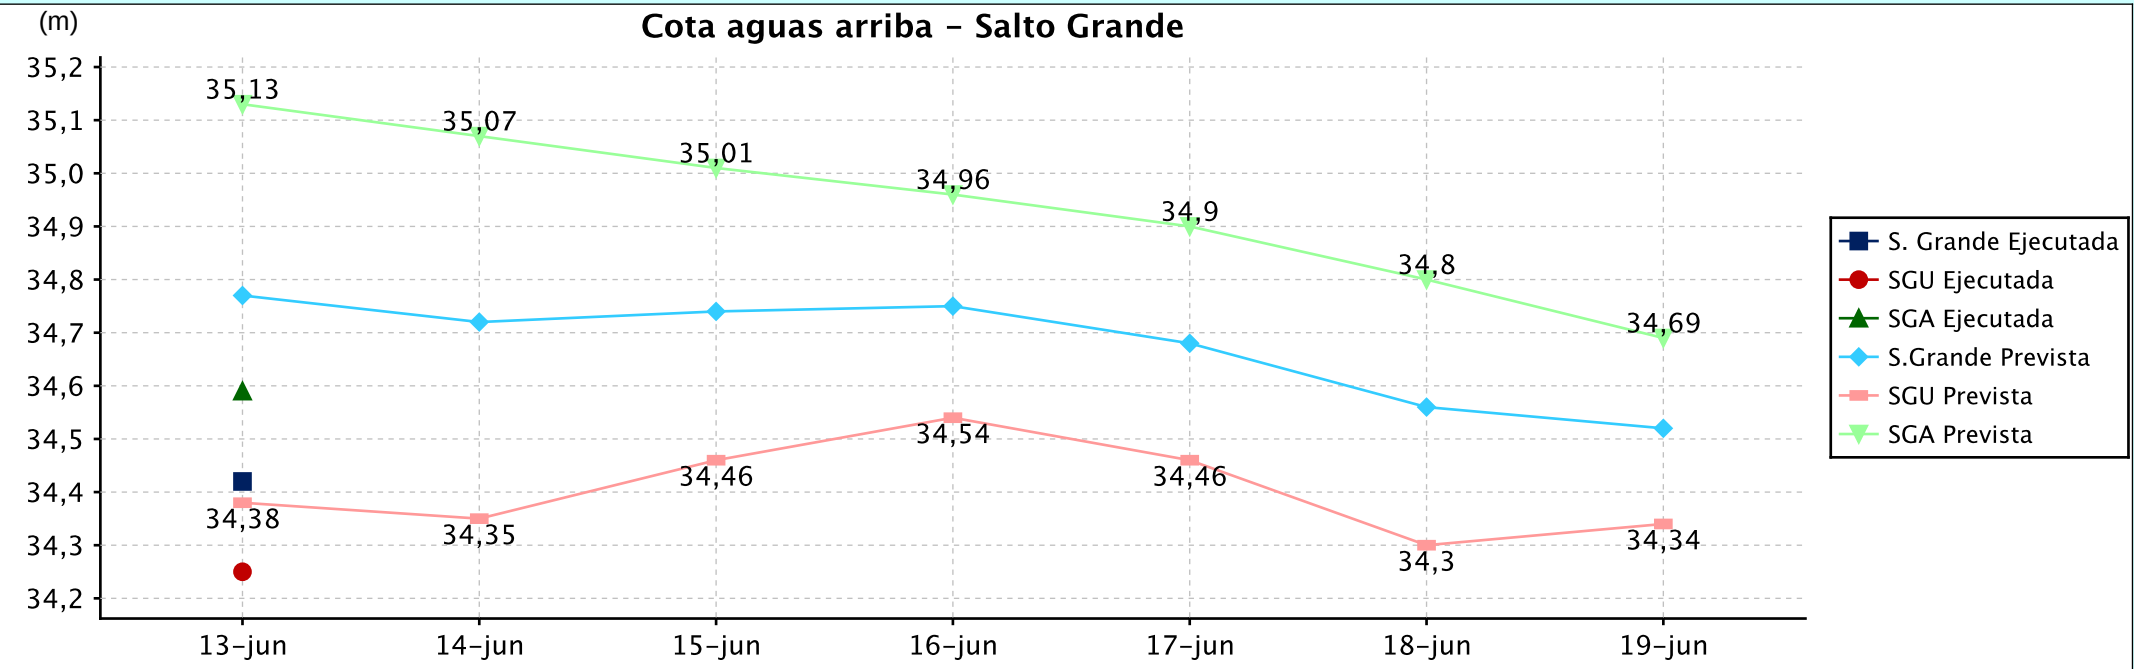

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,25
Cota Vista Arg	34,59
Cota real	34,42

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	-7.497
------------------------------------	--------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	113	172
Baygorria	176	209
Palmar	72	148
SGU	3.176	3.275

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	212	192
Baygorria	0	-14
Palmar	0	-48
SGU	1.900	1.738

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
