




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

Lunes 15 de junio de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	1.442
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	1.446
Central La Tablada	-80
Central P. del Tigre	-5
APR A	-2
APR B	-3
APR C	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	742
C. Baygorria	562
C. Palmar	783
C. Salto Grande	17.271
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	12.513
TOTAL Generación	33.223

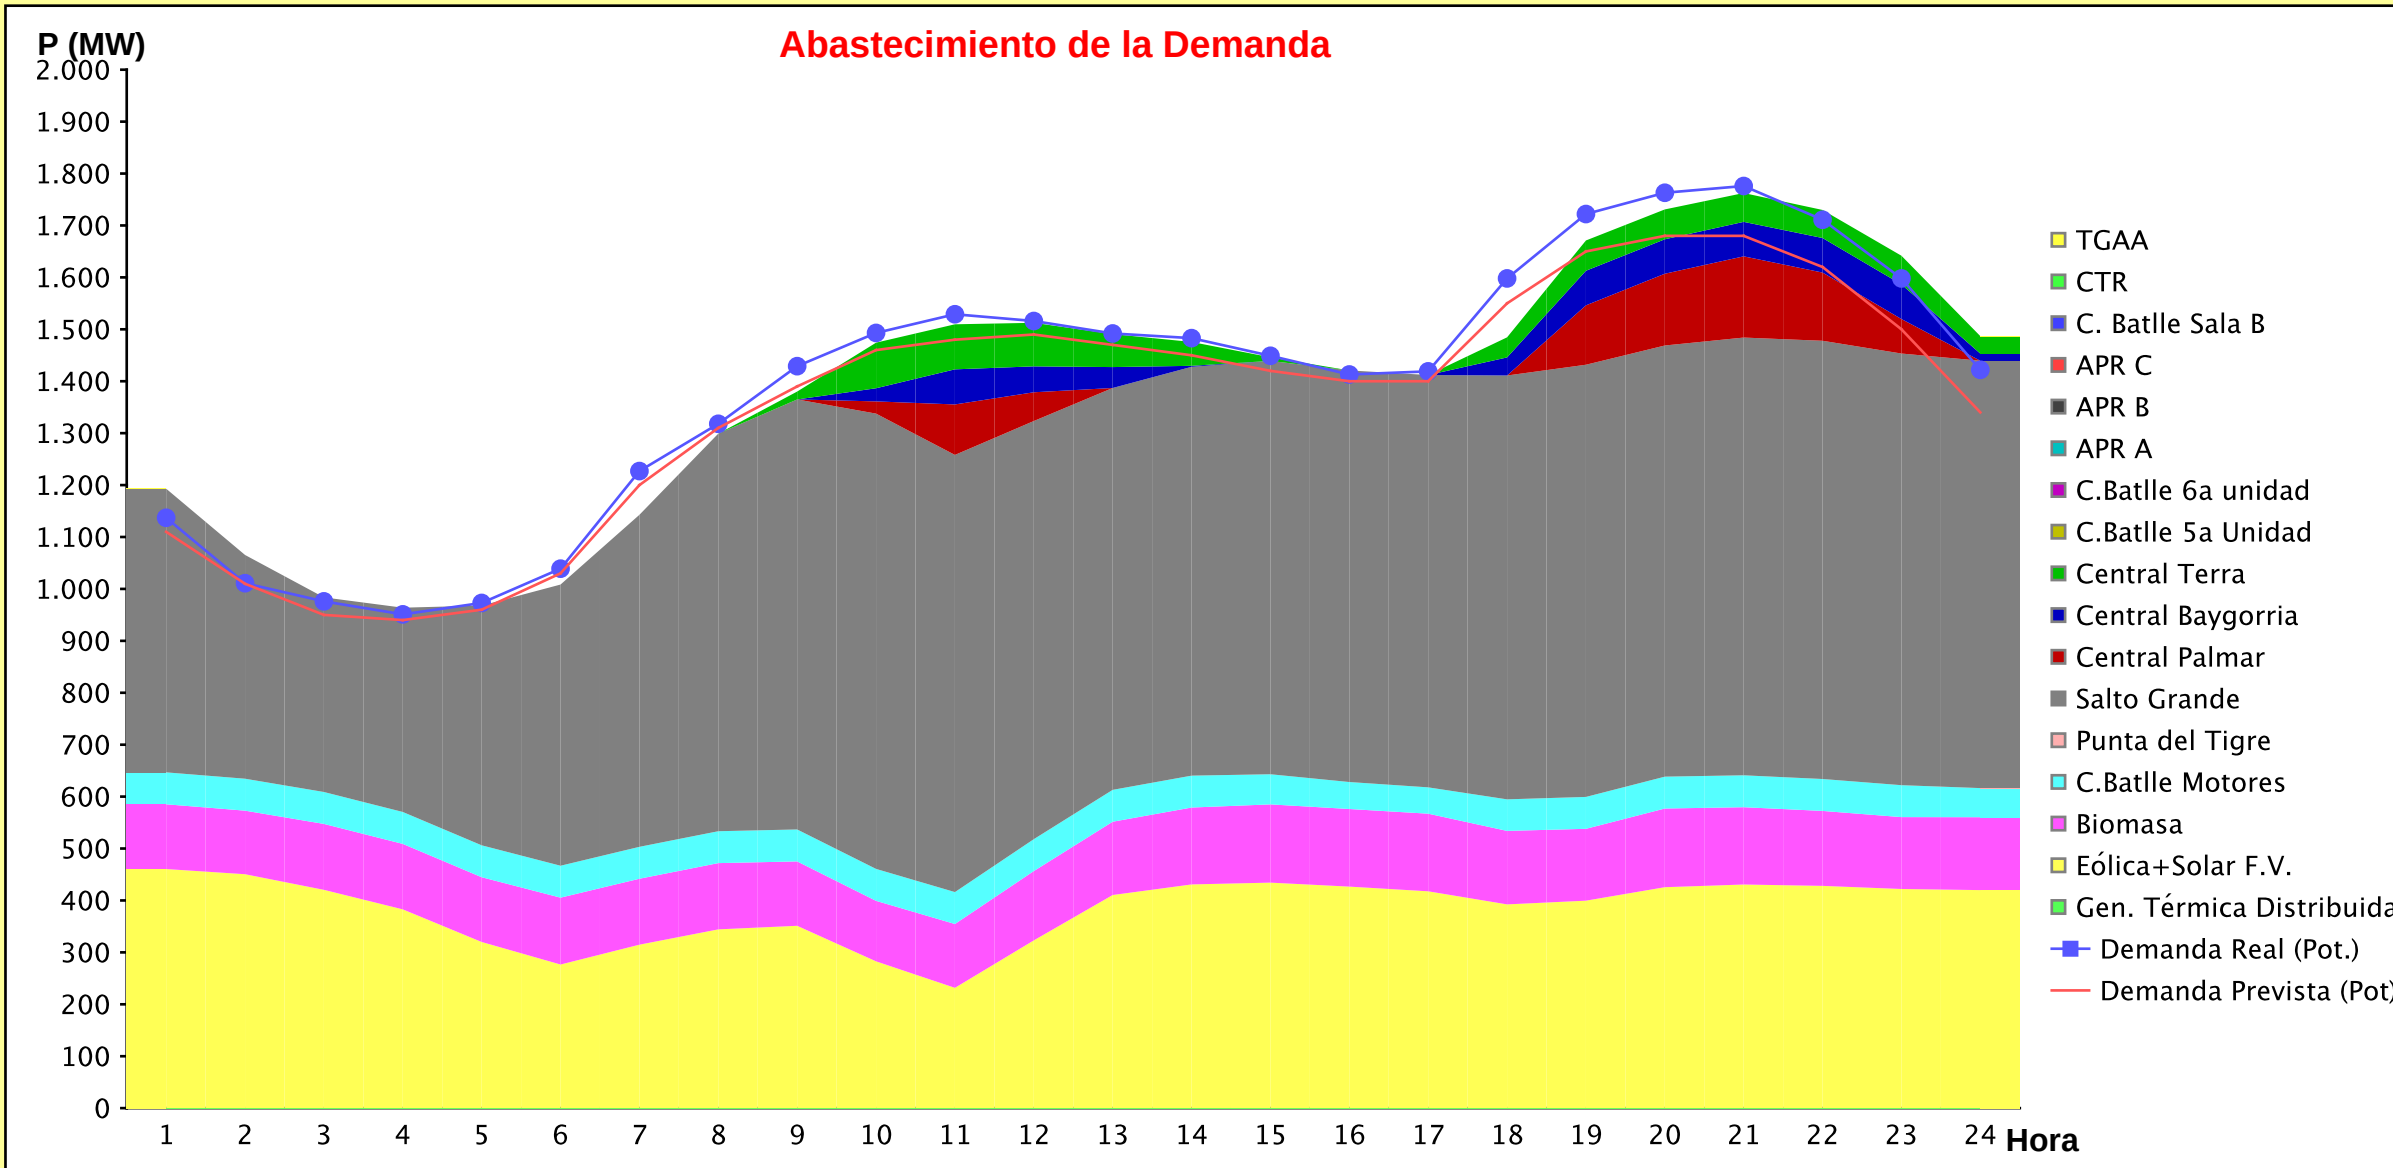

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	33.223
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	


Demanda Programada (MWh)	32.490
Diferencia (MWh)	733
Ejecutada - Programada	2,26 %

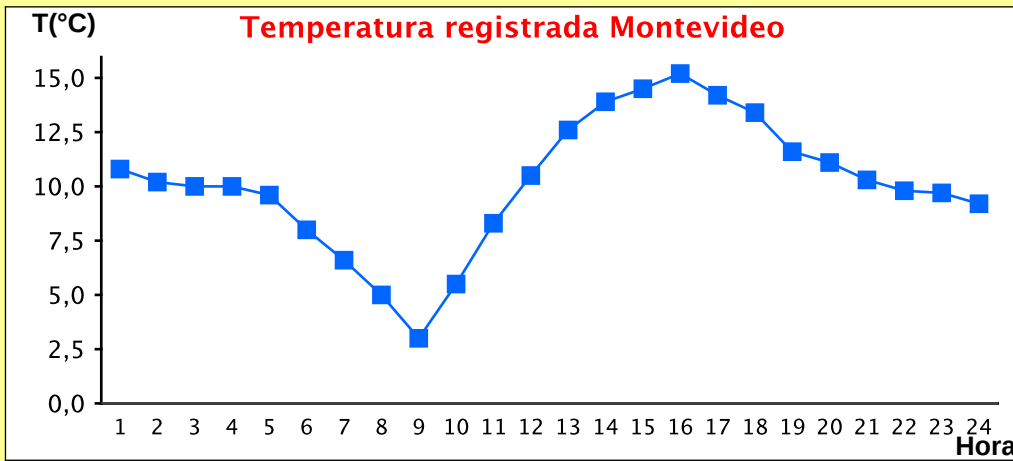

Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1543 Hora 11:49
Potencia mínima:	947 Hora 03:54
Pico noche:	1785 Hora 20:40



Generación Media (MW)	
Eólica	383,3
Biomasa	135,4
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

Composición de la Demanda S.I.N.

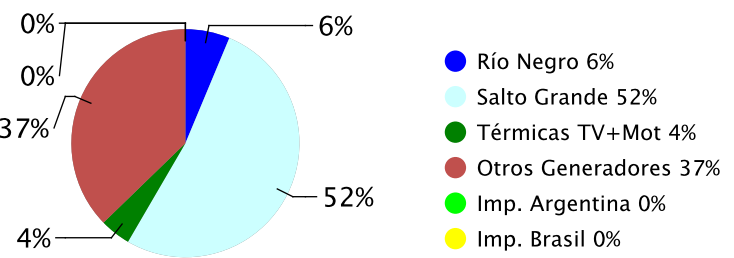



Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

Generación (Demanda + Exportación)

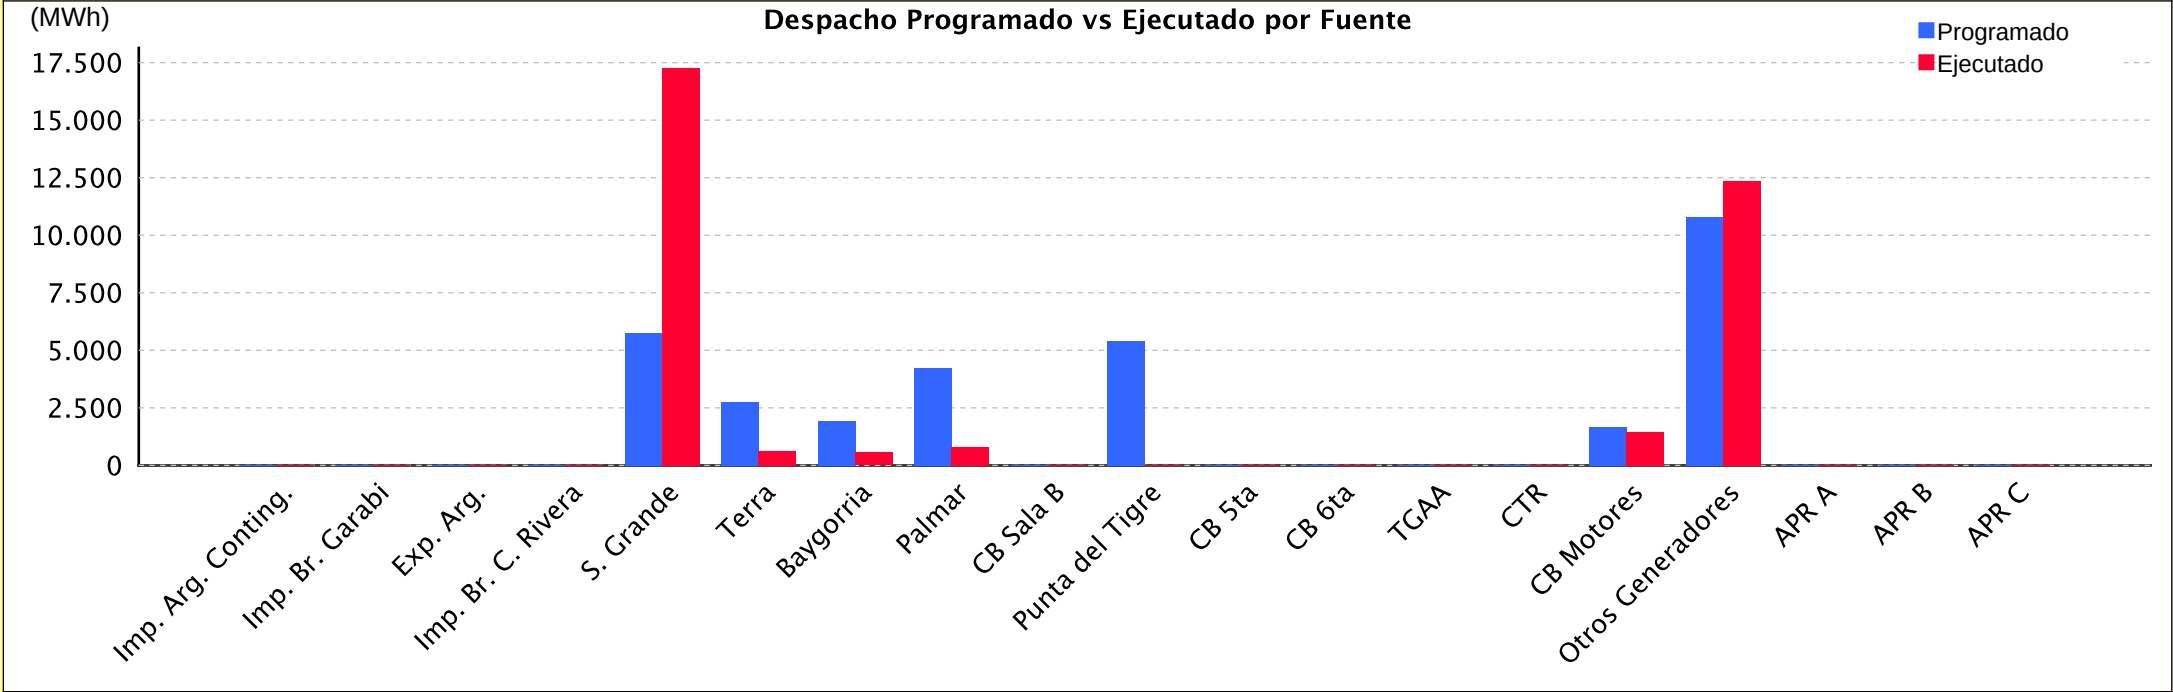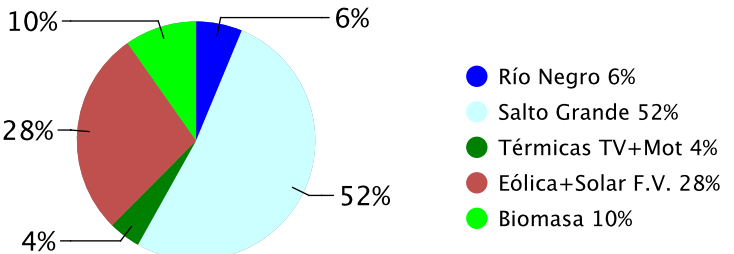



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

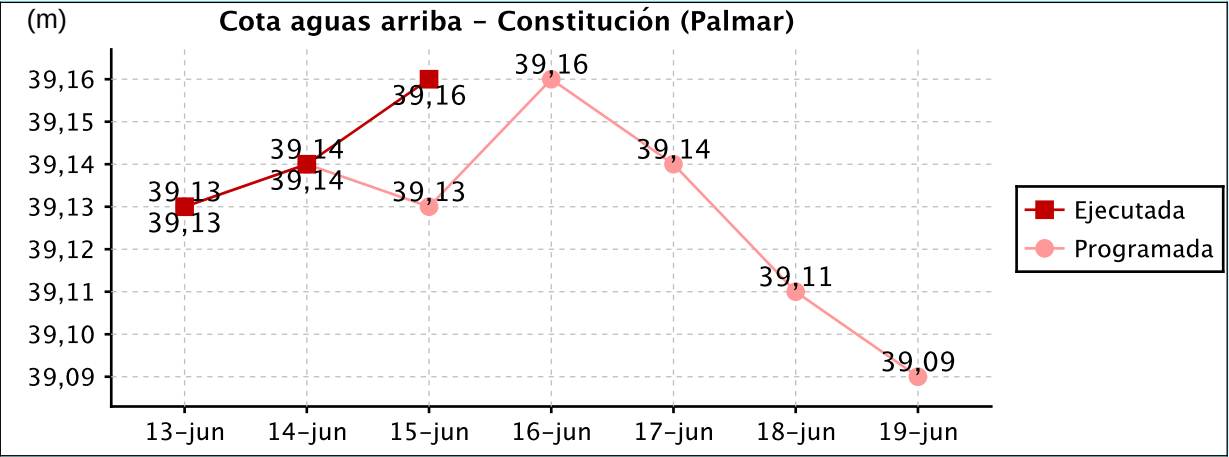
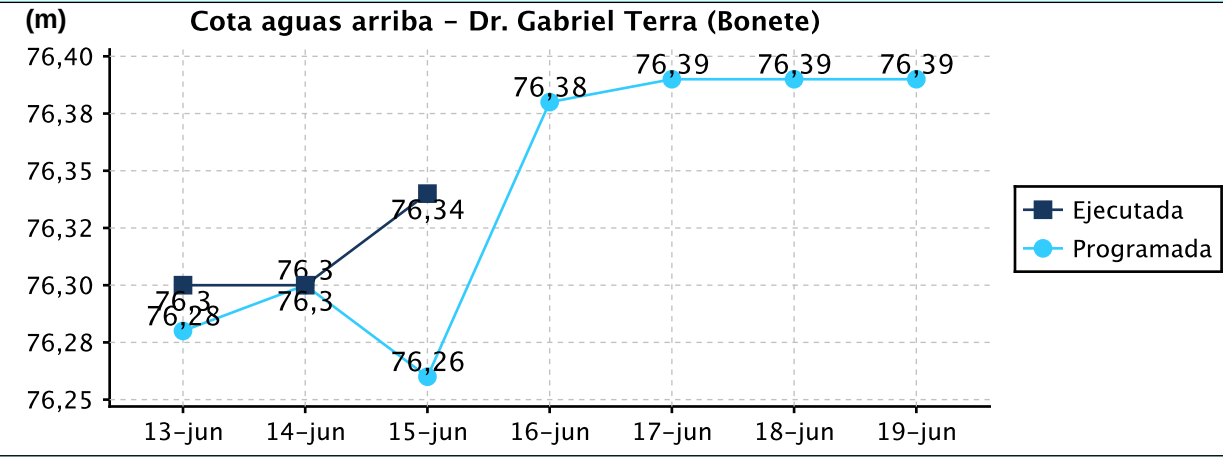


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,26	76,34
Baygorria	53,90	53,83
Palmar	39,13	39,16
SGU	34,46	33,5

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

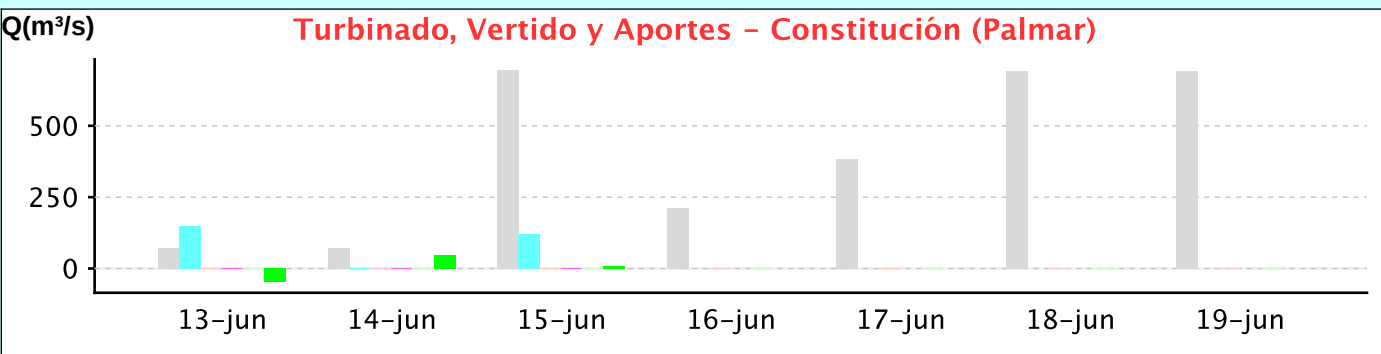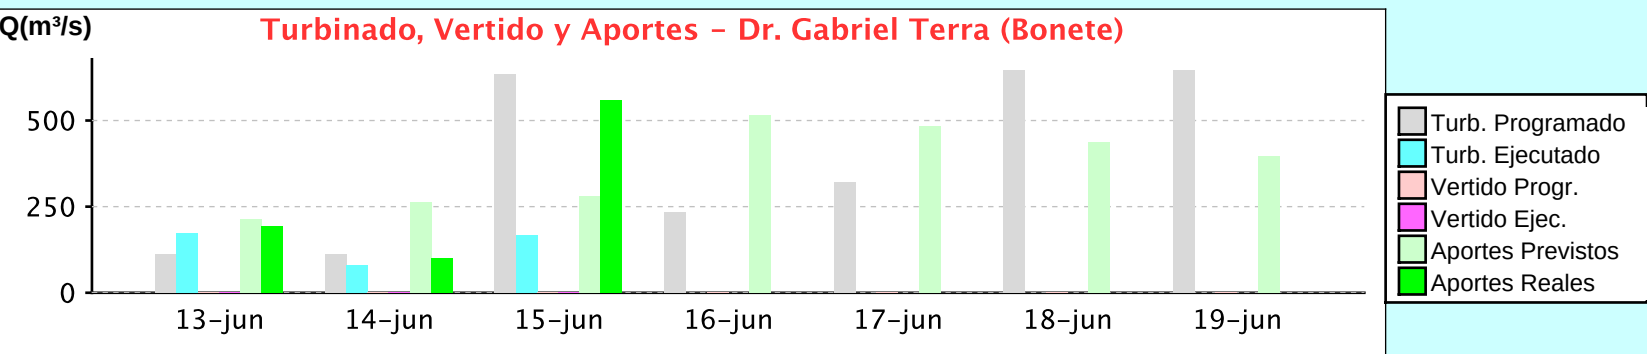

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

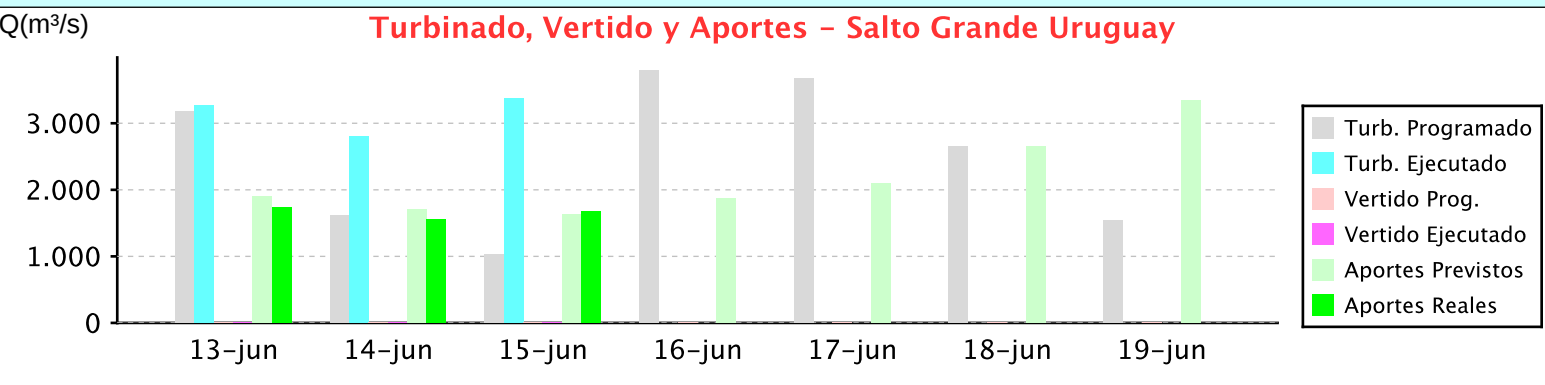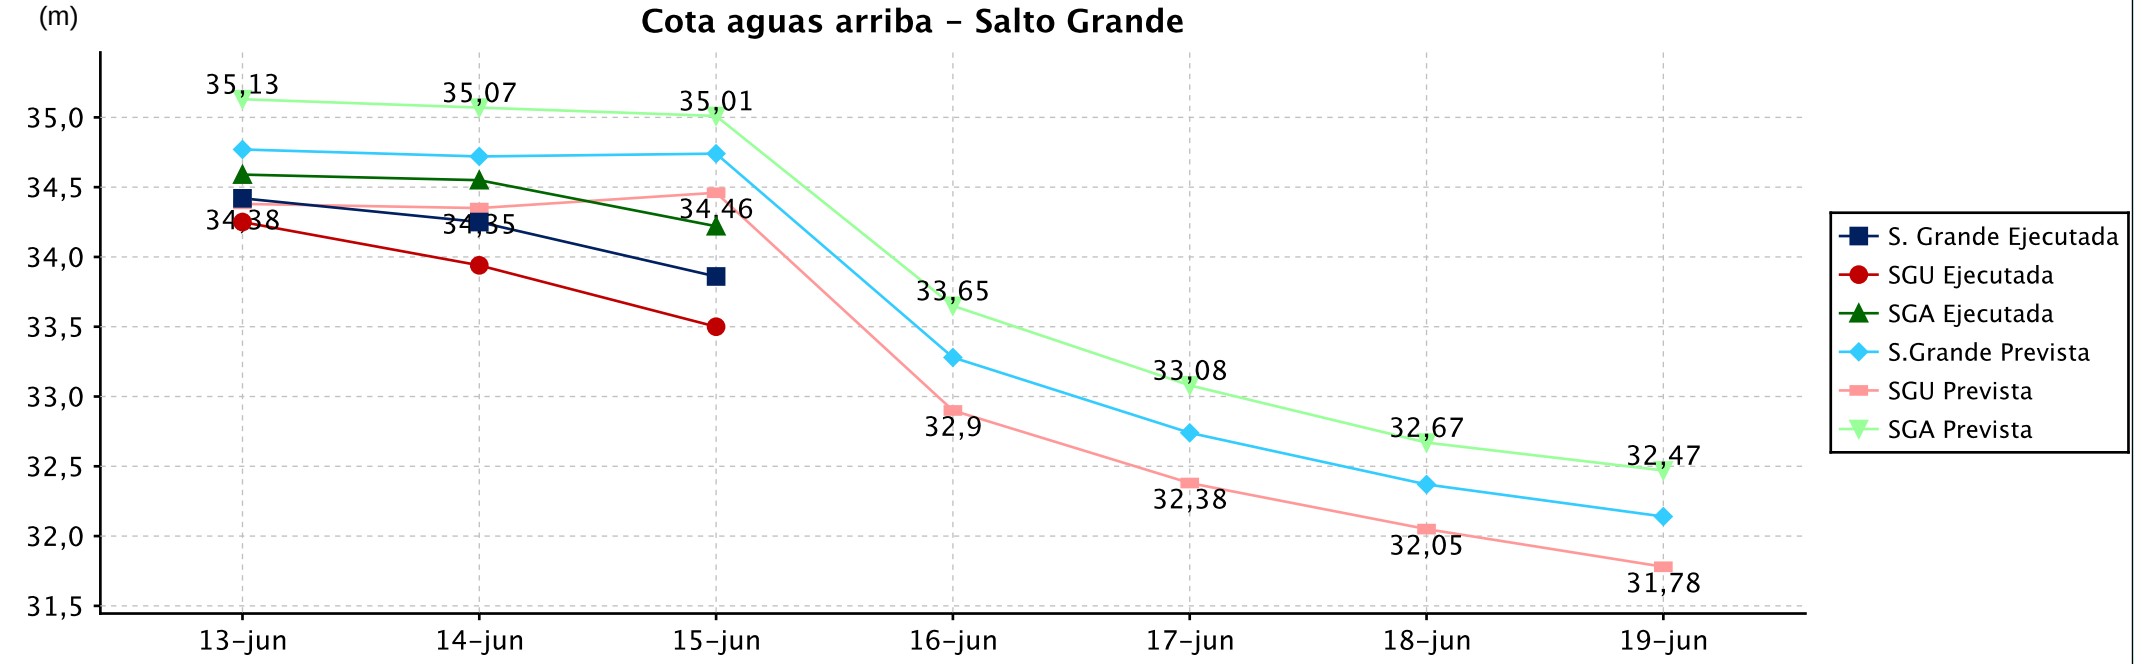

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	33,50
Cota Vista Arg	34,22
Cota real	33,86
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
-14.675	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	634	168
Baygorria	624	194
Palmar	696	121
SGU	1.033	3.377

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	280	558
Baygorria	0	10
Palmar	0	9
SGU	1.625	1.668

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
