




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO  
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


martes 16 de junio de 2015

| Generación Térmica    |        |
|-----------------------|--------|
| Central Battle        | 961    |
| Sala B                | -4     |
| 5ta.                  | 0      |
| 6ta.                  | 0      |
| Motores               | 965    |
| Central La Tablada    | -74    |
| Central P. del Tigre  | -2     |
| APR A                 | -2     |
| APR B                 | -2     |
| APR C                 | 0      |
| Central Maldonado     | 0      |
| Generación Hidráulica |        |
| C.G.Terra             | 619    |
| C. Baygorria          | 364    |
| C. Palmar             | 676    |
| C. Salto Grande       | 17.120 |
| Importación (MWh)     |        |
| Argentina             | 0      |
| Contingente           | 0      |
| Brasil                | 0      |
| Rivera                | 0      |
| SADI                  | 0      |
| Otros Generadores     |        |
| Otros Generadores     | 13.144 |
| TOTAL Generación      | 32.805 |

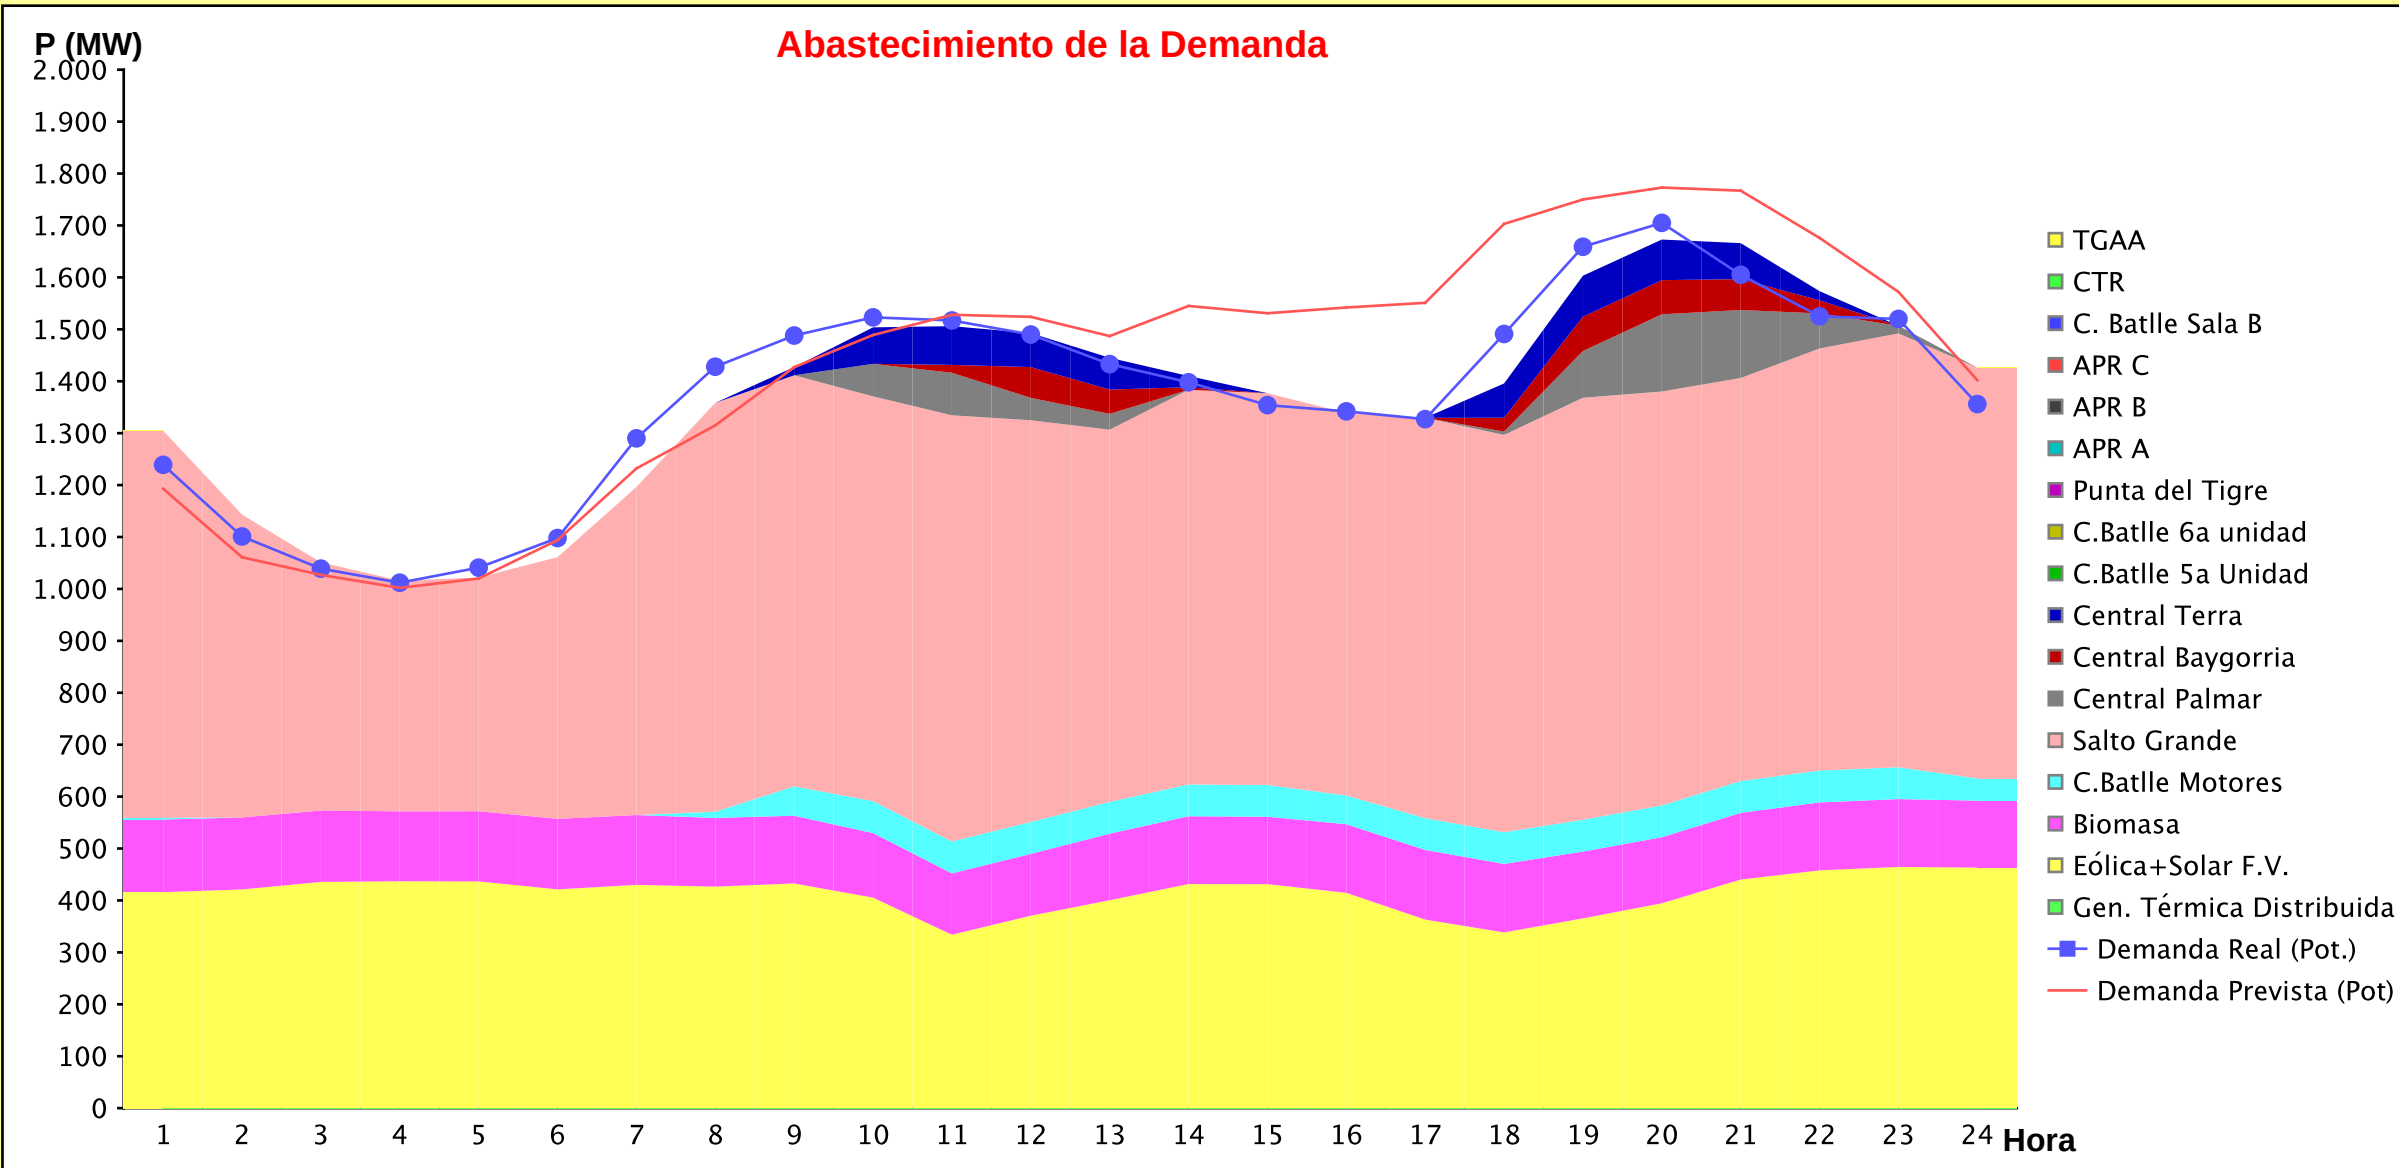




| Exportación (MWh)       |   |
|-------------------------|---|
| Exportación a Arg.      | 0 |
| Hidráulica              | 0 |
| Térmica                 | 0 |
| Exportación a Brasil    | 0 |
| TOTAL Exportación (MWh) | 0 |

|                                                       |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)                              | 32.805  |
| (en bornes de generación, incluye pérdidas en la red) |         |
| Diferencia (MWh)                                      | -1.406  |
| Ejecutada - Programada                                | -4,11 % |

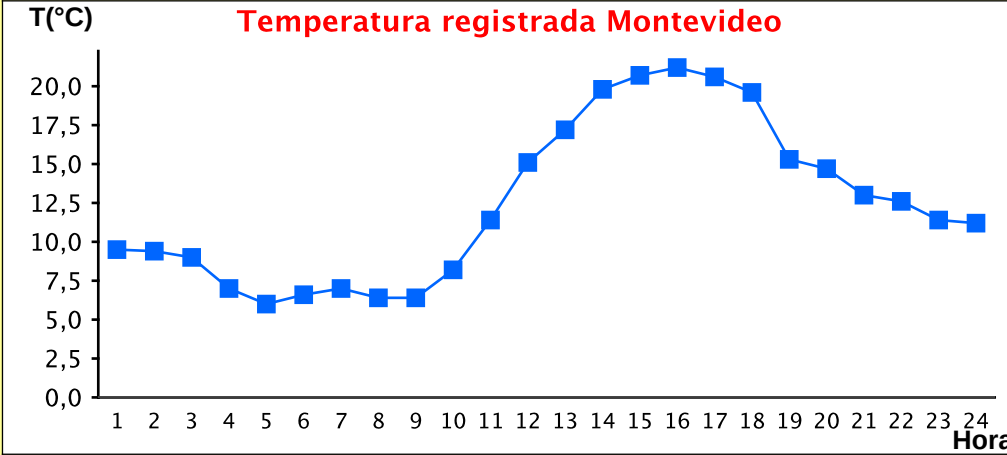



| Picos de Potencia (MW) |                 |
|------------------------|-----------------|
| Pico mediodía:         | 1530 Hora 10:08 |
| Potencia mínima:       | 1003 Hora 03:40 |
| Pico noche:            | 1719 Hora 20:19 |

| Generación Media (MW)  |       |
|------------------------|-------|
| Eólica                 | 414,0 |
| Biomasa                | 131,0 |
| Solar fotovoltaica     | 0,1   |
| Térmica distribuida    | 0,0   |
| Imp. Brasil Conversora | 0,0   |
| Imp. Argentina         | 0,0   |

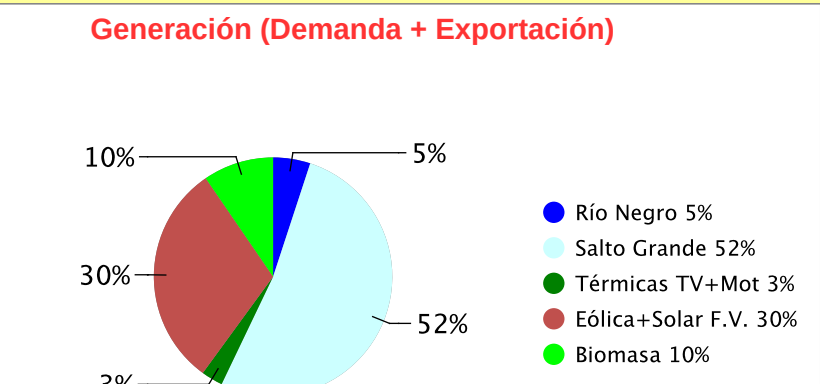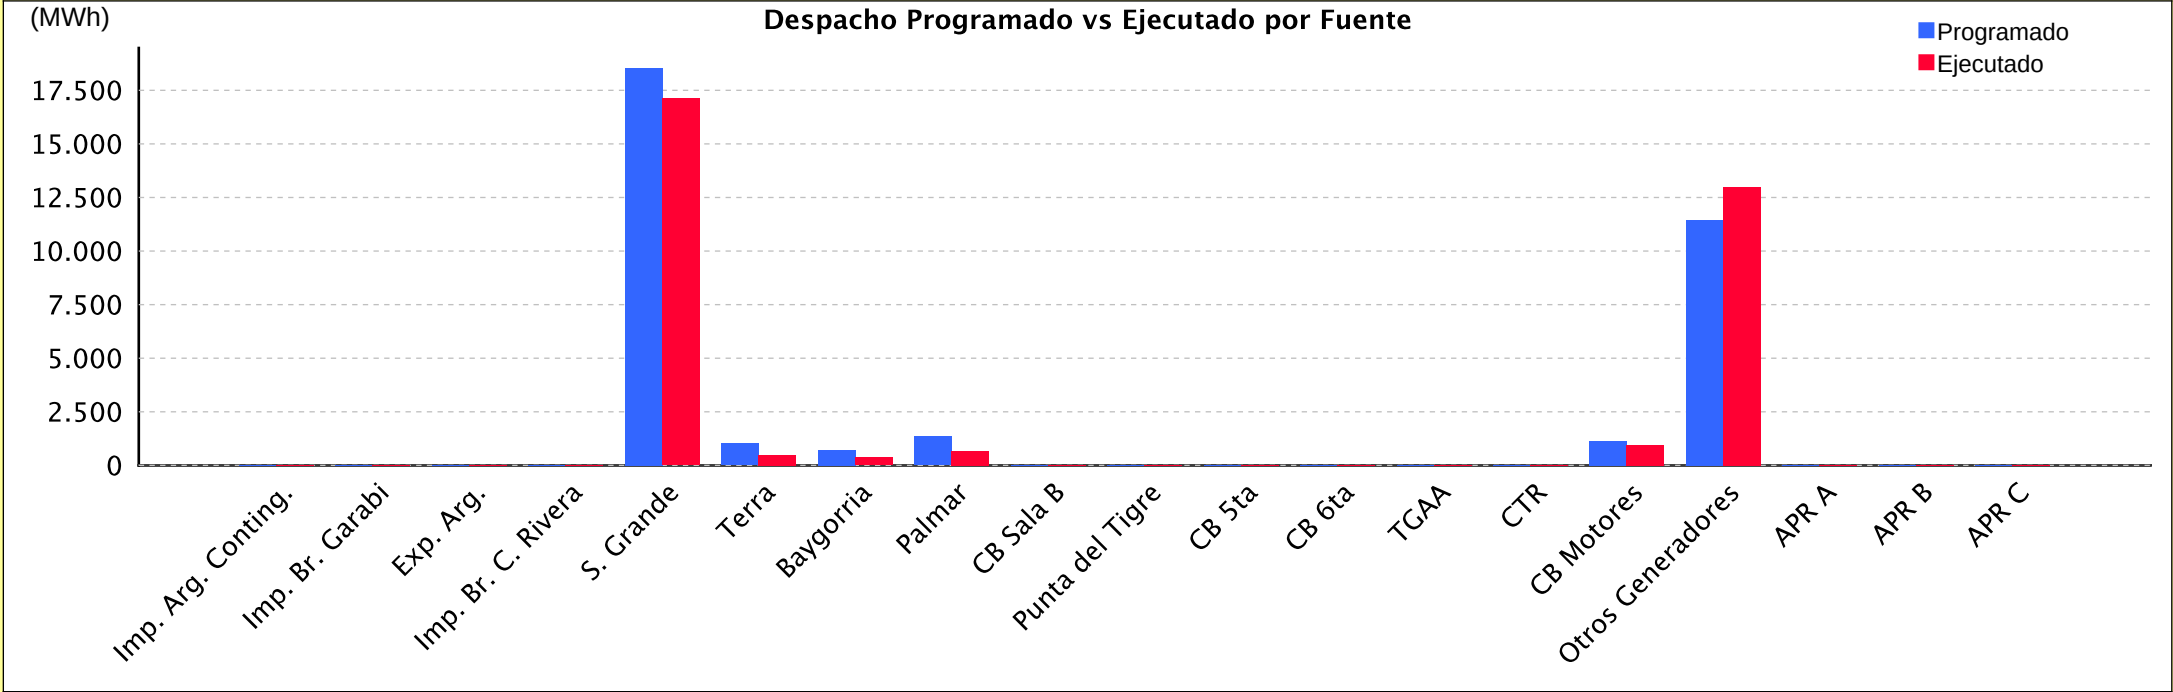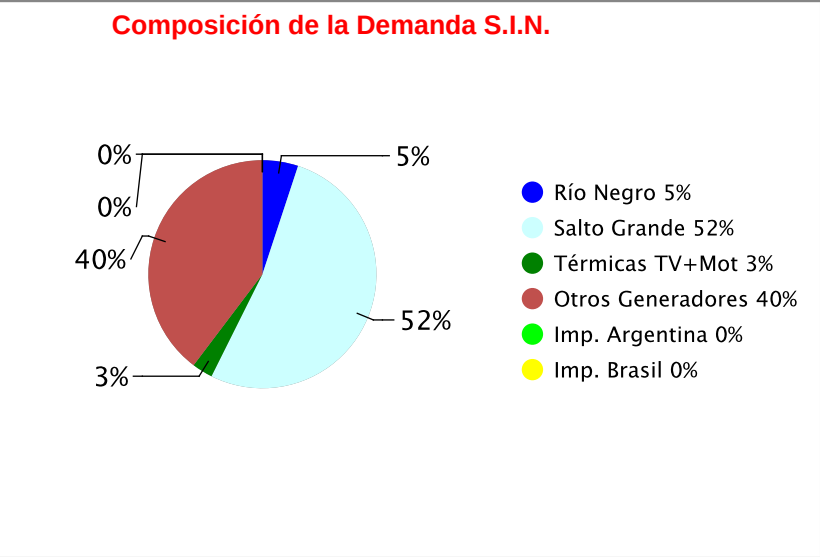



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

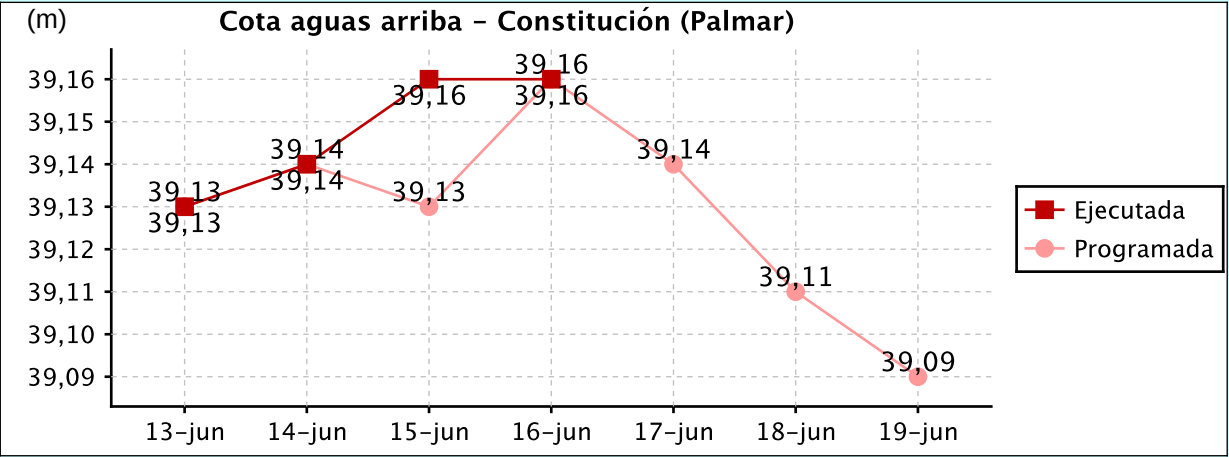
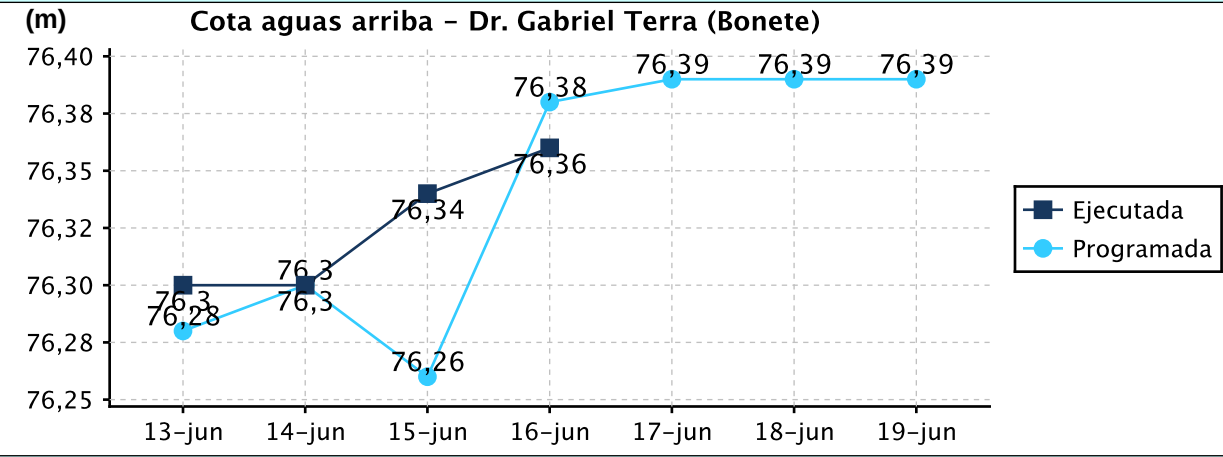


| COTA FINAL | Prevista | Ejecutada |
|------------|----------|-----------|
| Represa    | (m)      | (m)       |
| Terra      | 76,38    | 76,36     |
| Baygorria  | 53,83    | 53,88     |
| Palmar     | 39,16    | 39,16     |
| SGU        | 32,90    | 33,03     |

| Valores de Referencia (operación normal) |            |            |
|------------------------------------------|------------|------------|
| Represa                                  | Cota Min m | Cota Max m |
| Terra                                    | 70         | 80,7       |
| Baygorria                                | 53         | 54,5       |
| Palmar                                   | 36         | 40         |
| Salto Grande                             | 30         | 35         |

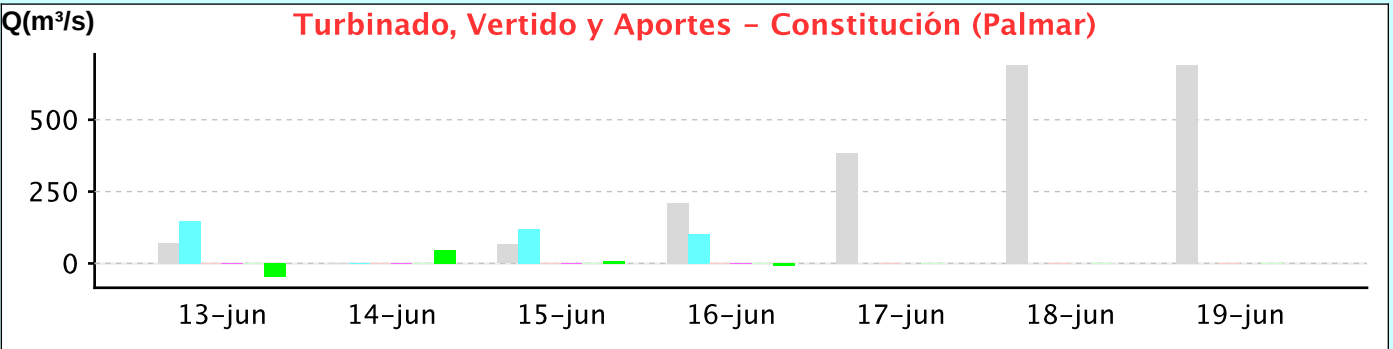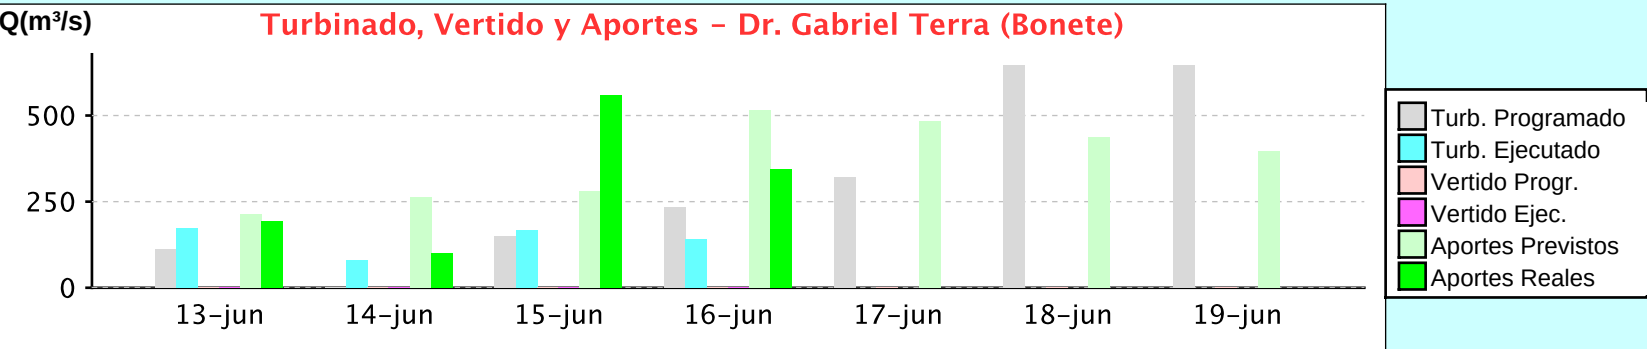

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

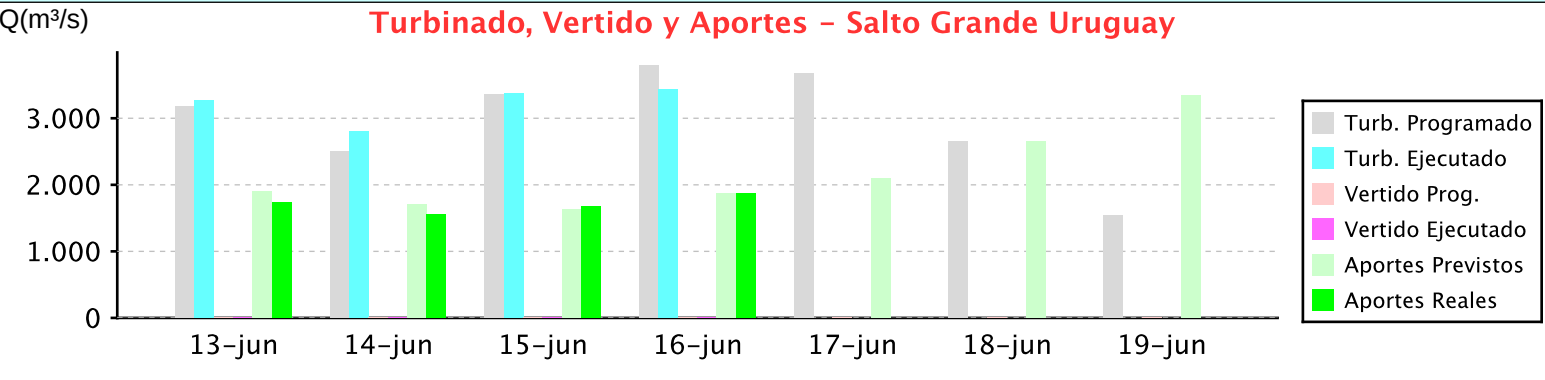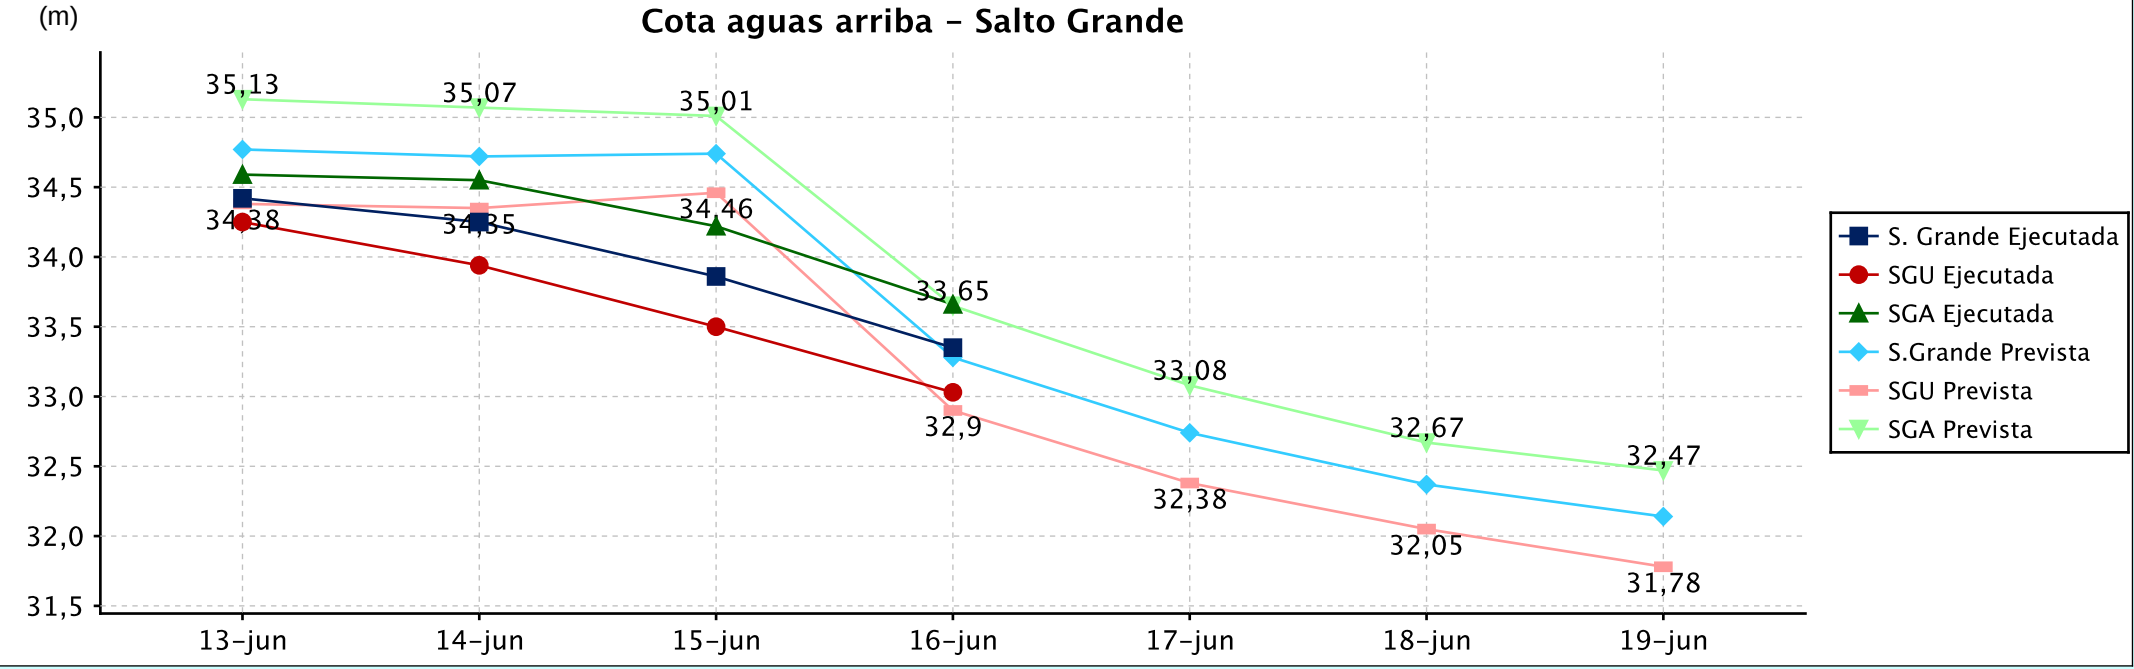

| VALORES CTM    |       |
|----------------|-------|
| Cotas          | (m)   |
| Cota Vista Uru | 33,03 |
| Cota Vista Arg | 33,66 |
| Cota real      | 33,35 |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Dif. Energ. (U-A) |         |
| Acumulado MWh     | -11.909 |

| TURBINADO | Previsto | Ejecutado |
|-----------|----------|-----------|
| Represa   | (m³/s)   | (m³/s)    |
| Terra     | 234      | 140       |
| Baygorria | 231      | 126       |
| Palmar    | 211      | 104       |
| SGU       | 3.799    | 3.433     |

| APORTES PROPIOS | Previstos | Reales |
|-----------------|-----------|--------|
| Represa         | (m³/s)    | (m³/s) |
| Terra           | 515       | 345    |
| Baygorria       | 0         | 50     |
| Palmar          | 0         | -9     |
| SGU             | 1.875     | 1.869  |

| VERTIDO   | Previsto | Ejecutado |
|-----------|----------|-----------|
| Represa   | (m³/s)   | (m³/s)    |
| Terra     | 0        | 0         |
| Baygorria | 0        | 0         |
| Palmar    | 0        | 0         |
| SGU       | 0        | 0         |

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
