




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

miércoles 17 de junio de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	961
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	965
Central La Tablada	-74
Central P. del Tigre	-3
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	1.342
C. Baygorria	866
C. Palmar	2.033
C. Salto Grande	17.198
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	10.739
TOTAL Generación	33.058

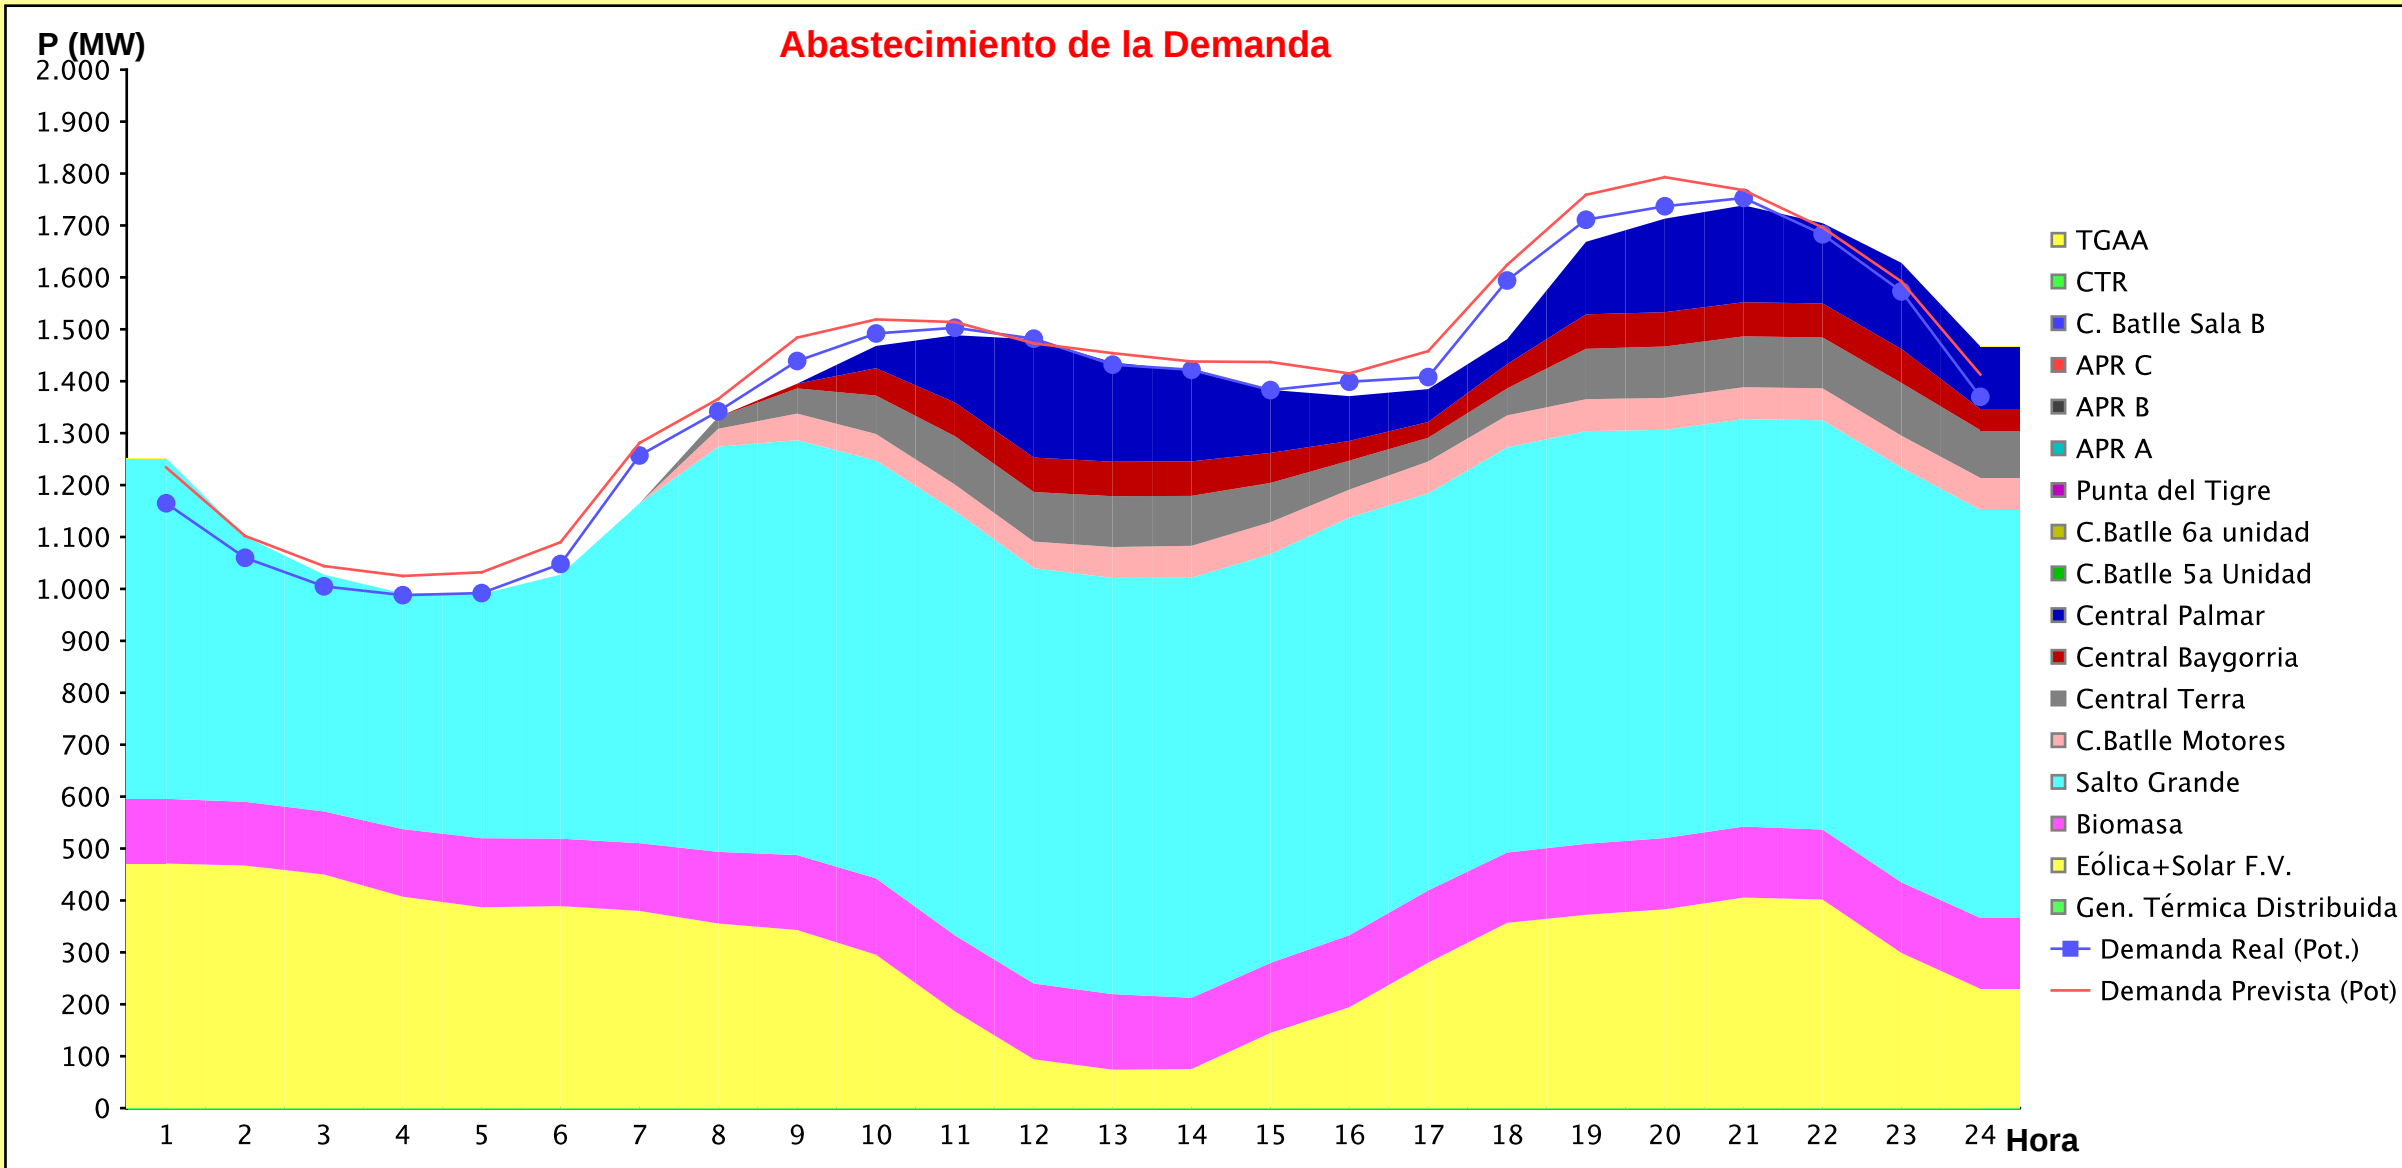

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	33.058
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	34.011
Diferencia (MWh)	-953
Ejecutada - Programada	-2,80 %

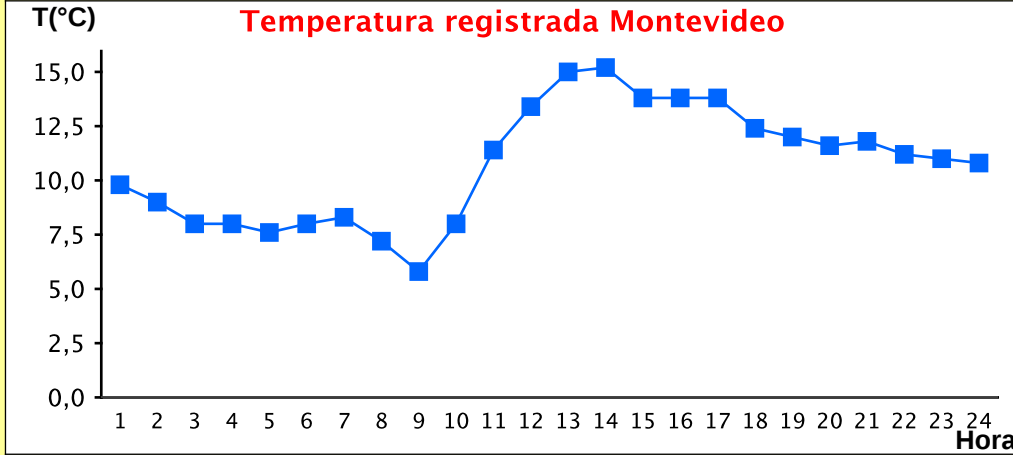



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1505 Hora 11:10
Potencia mínima:	970 Hora 04:19
Pico noche:	1759 Hora 20:54

Generación Media (MW)	
Eólica	310,4
Biomasa	136,0
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

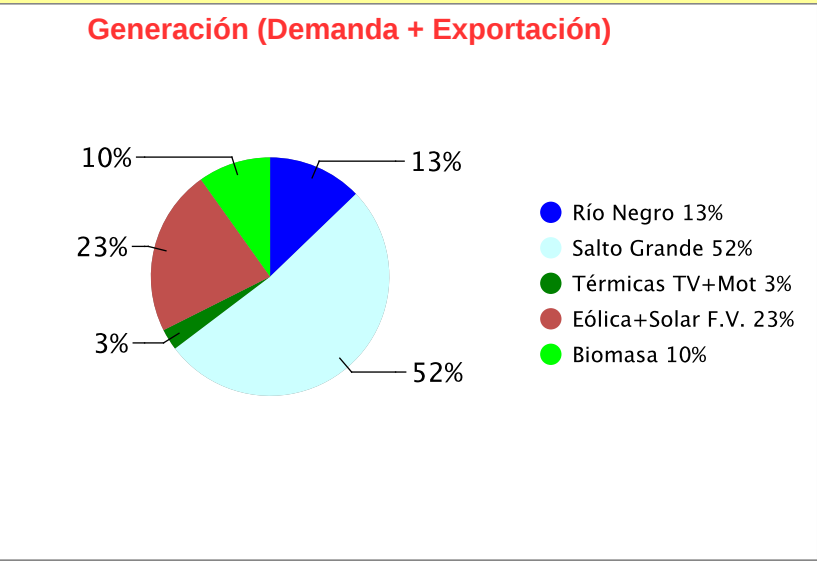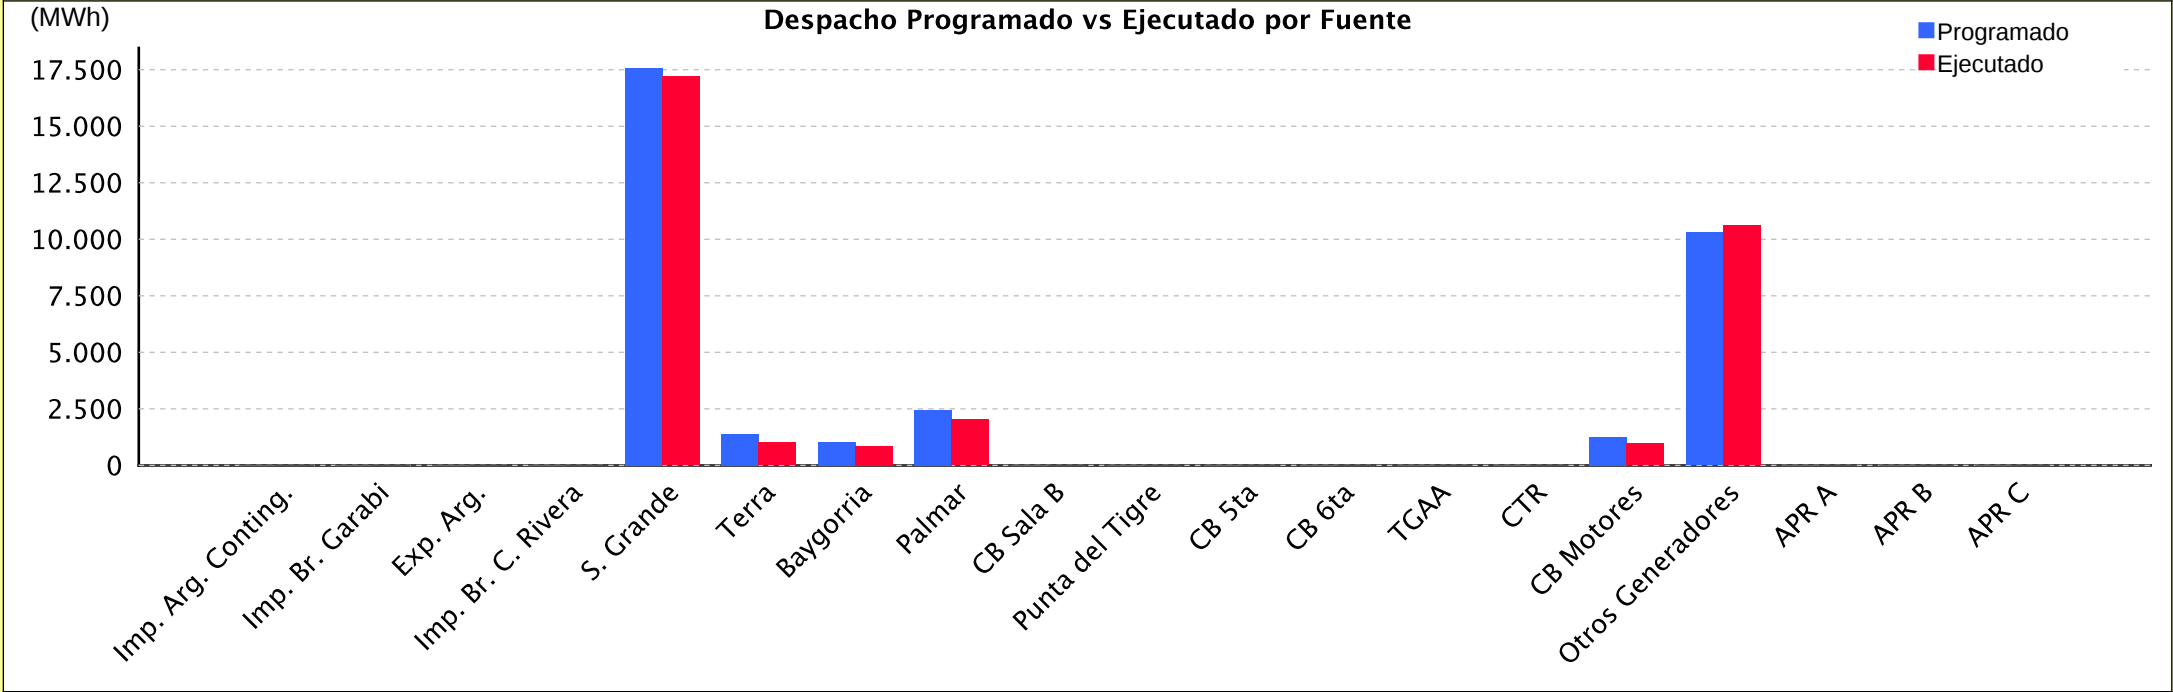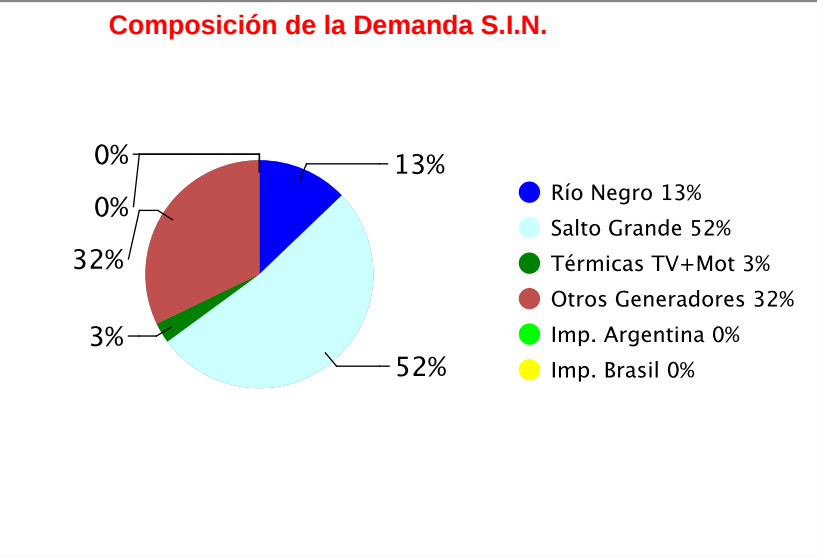



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

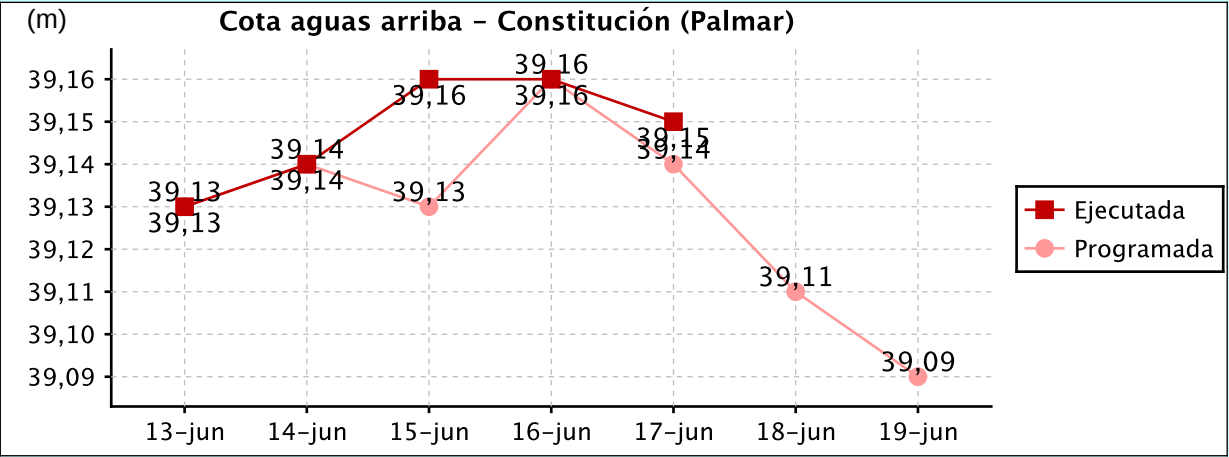
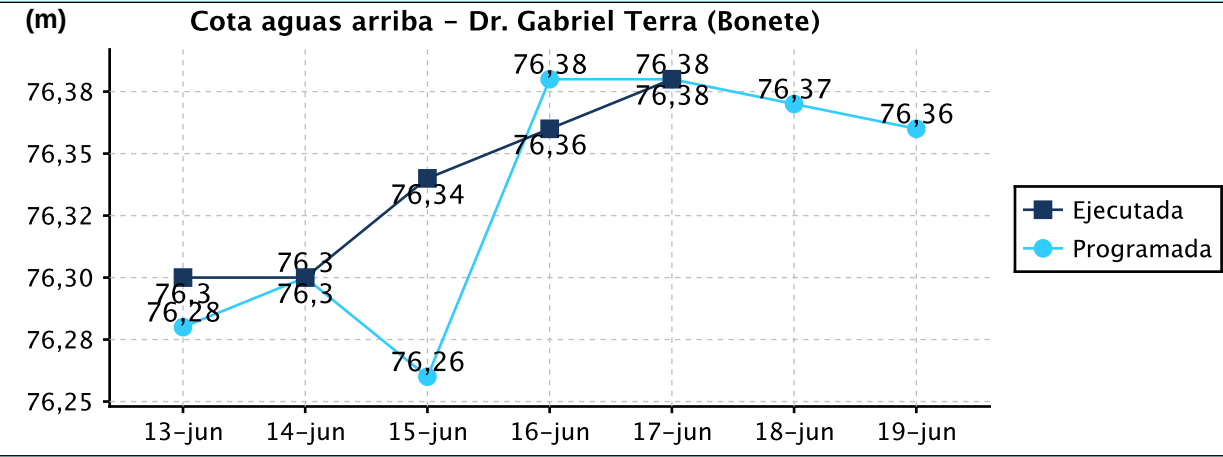


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,38	76,38
Baygorria	53,88	53,83
Palmar	39,14	39,15
SGU	32,45	32,39

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

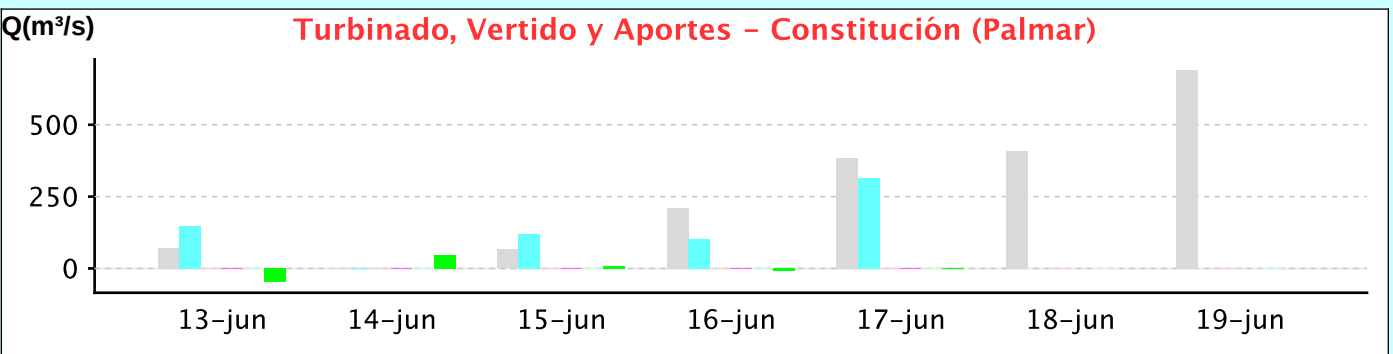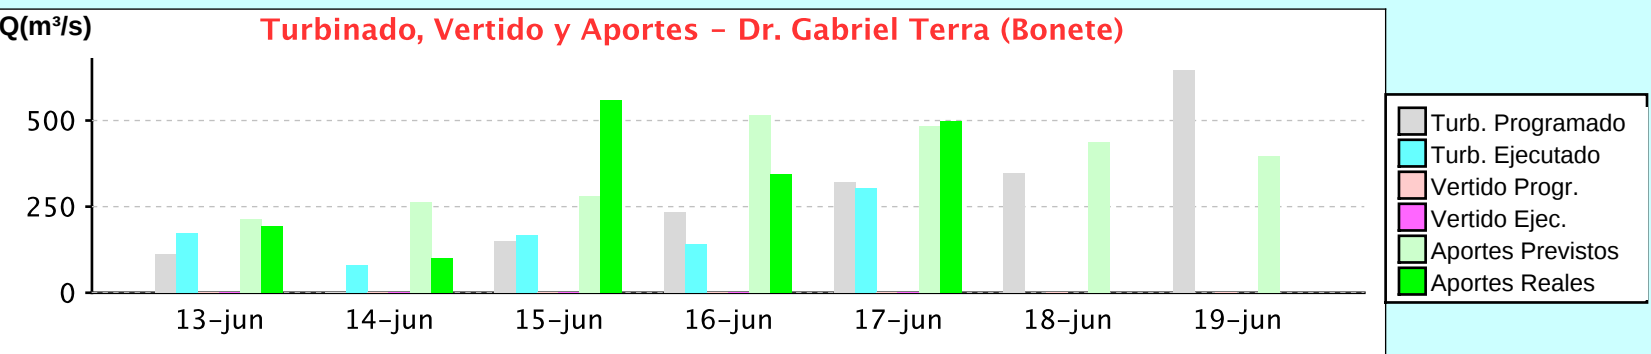

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

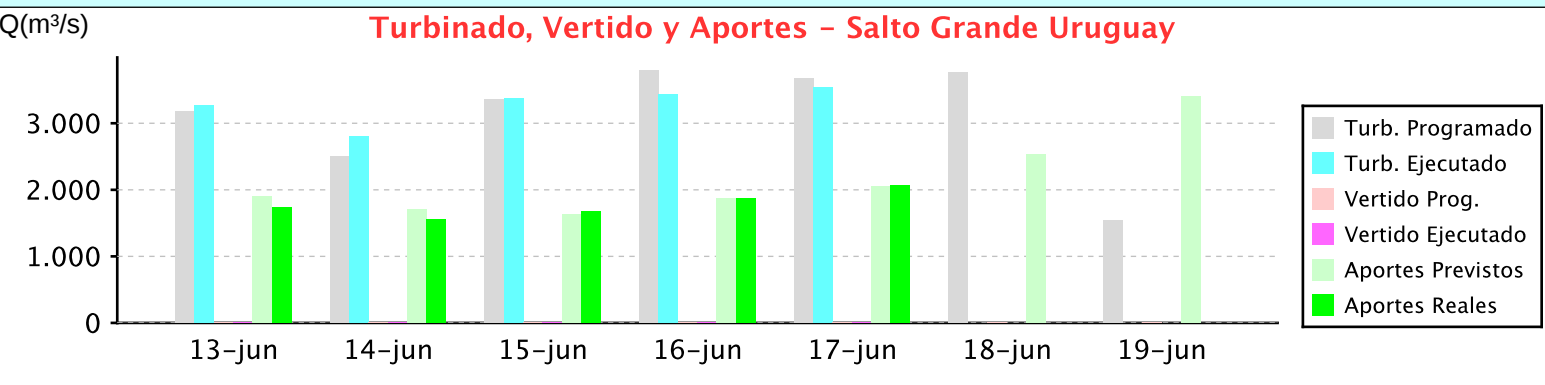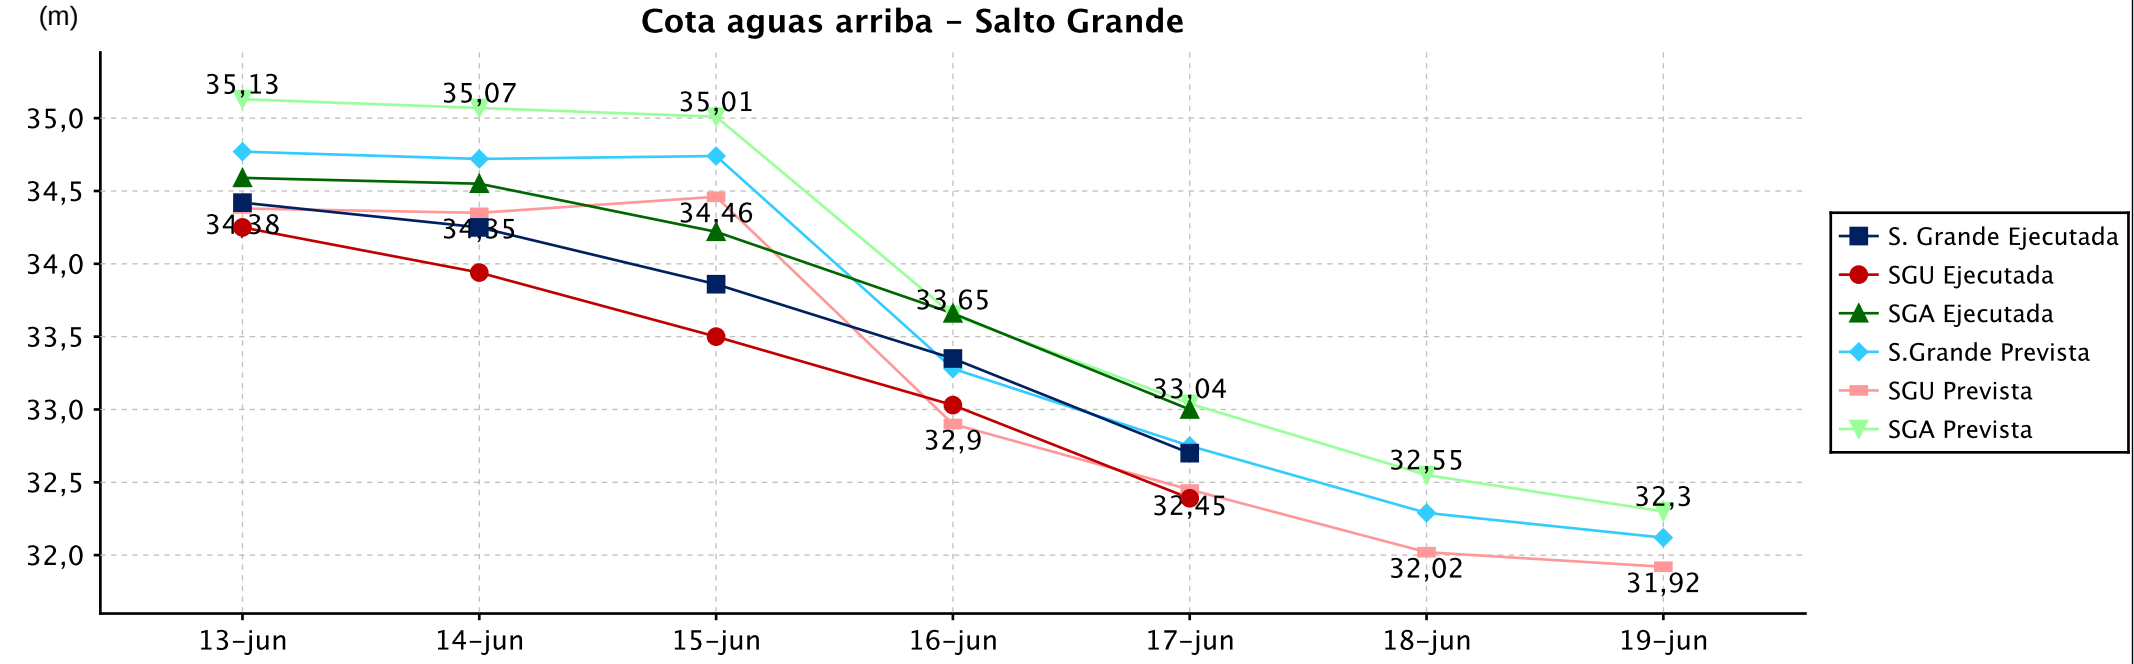

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	32,39
Cota Vista Arg	33,00
Cota real	32,70
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
-10.440	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	320	303
Baygorria	337	296
Palmar	384	314
SGU	3.671	3.541

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	482	497
Baygorria	0	-59
Palmar	0	-2
SGU	2.050	2.060

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
