




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

sábado 20 de junio de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	1.431
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	1.435
Central La Tablada	-82
Central P. del Tigre	-4
APR A	-2
APR B	130
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.015
C. Baygorria	1.991
C. Palmar	4.840
C. Salto Grande	12.290
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	9.509
TOTAL Generación	33.119

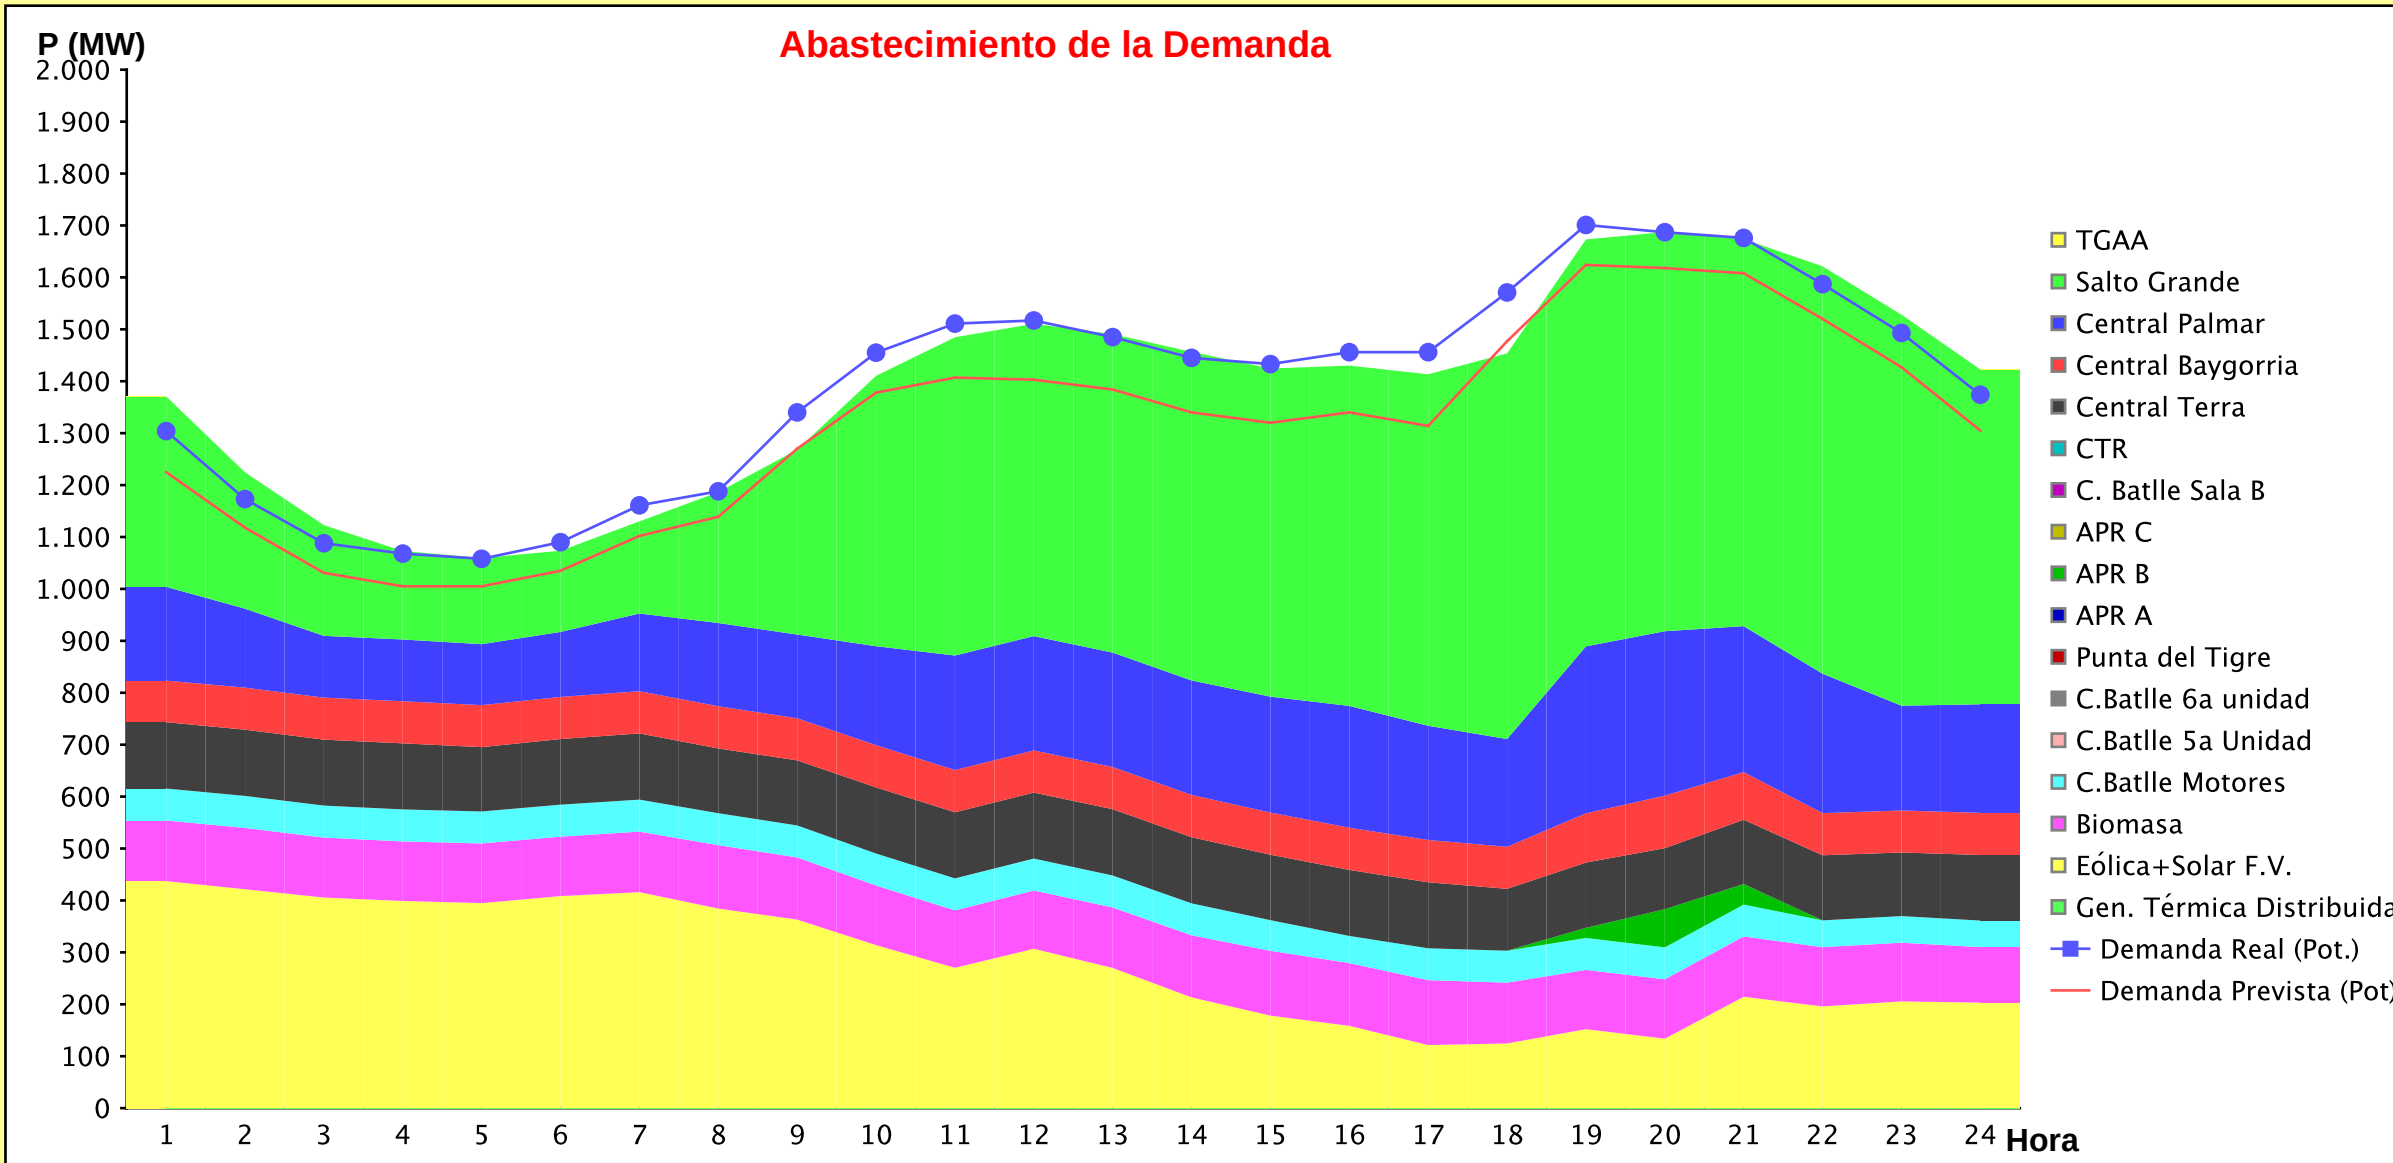

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	33.119
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	


Demanda Programada (MWh)	31.395
Diferencia (MWh)	1.724
Ejecutada - Programada	5,49 %

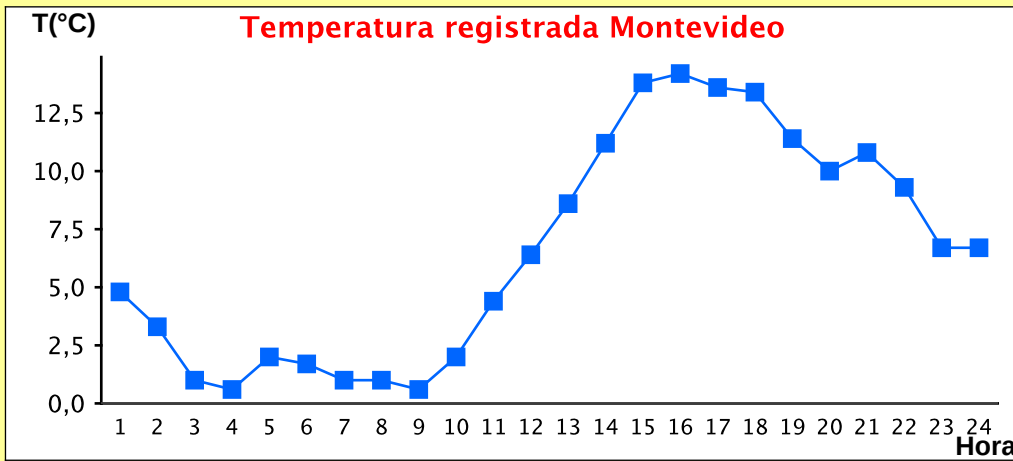

Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1531 Hora 11:36
Potencia mínima:	1060 Hora 04:27
Pico noche:	1712 Hora 19:41



Generación Media (MW)	
Eólica	279,1
Biomasa	116,7
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

Composición de la Demanda S.I.N.

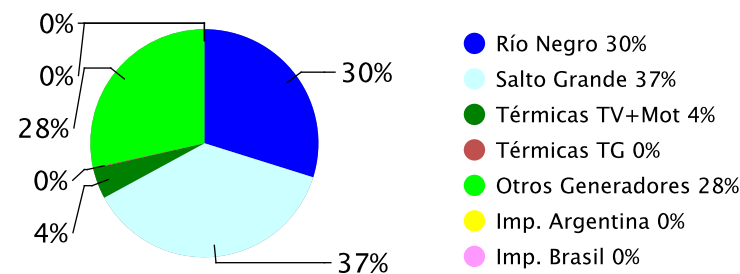



Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

Generación (Demanda + Exportación)

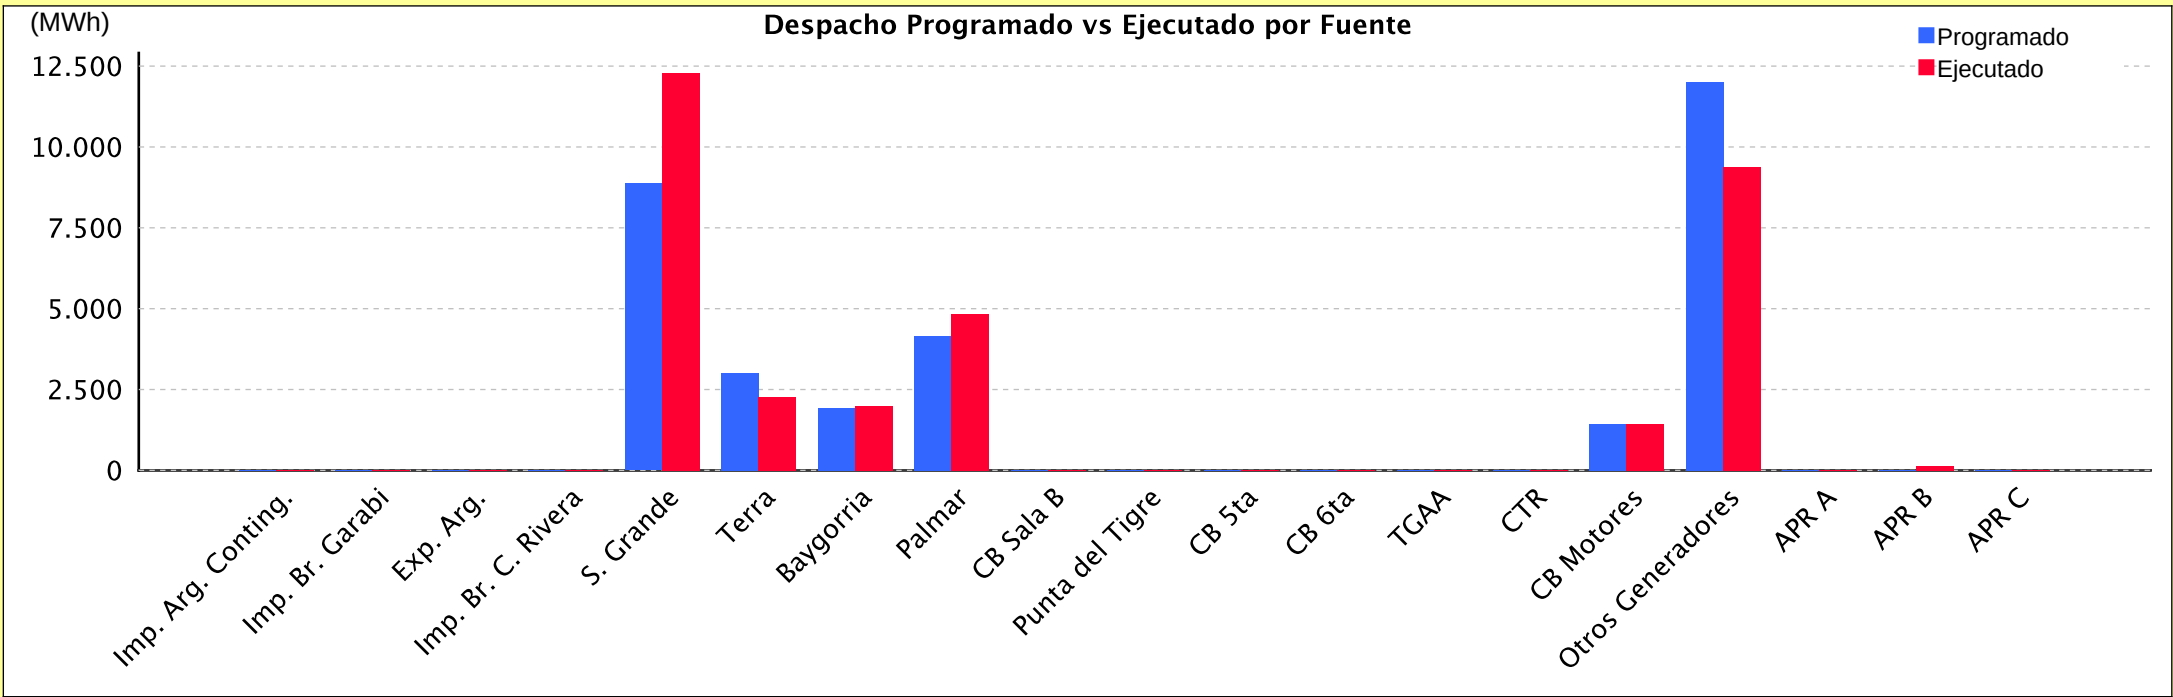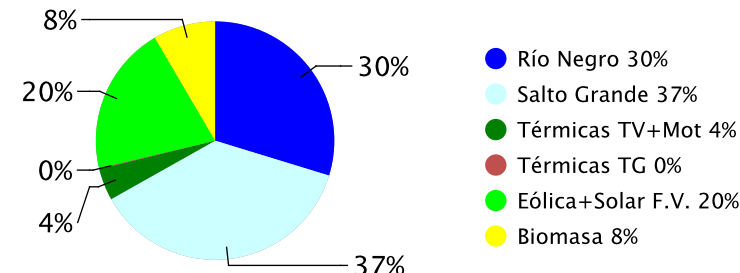



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

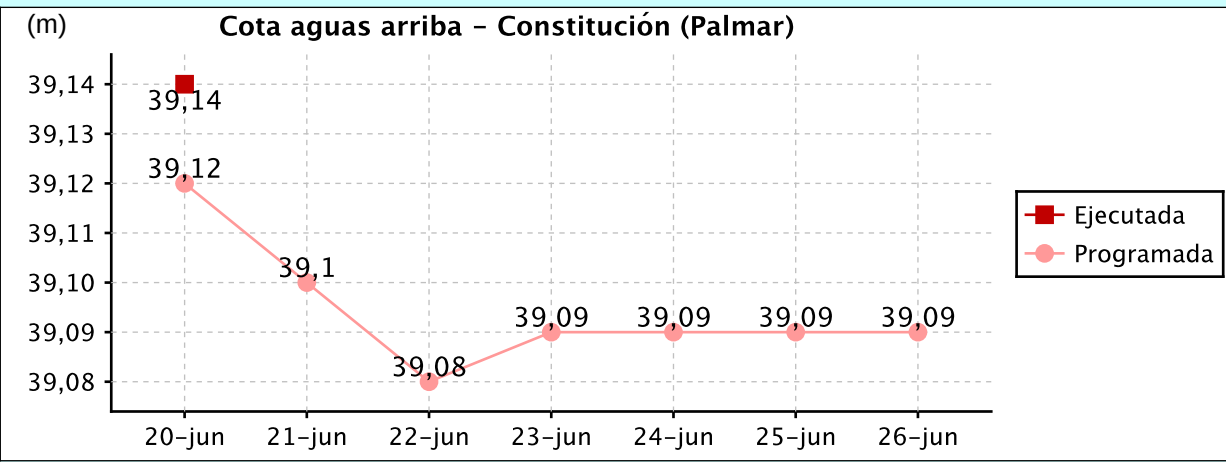
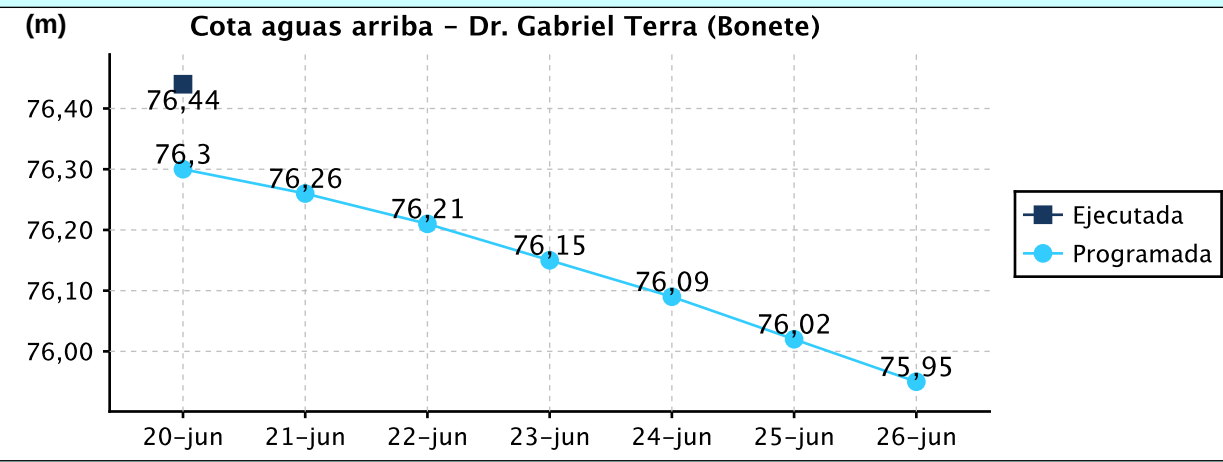


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,30	76,44
Baygorria	53,89	53,88
Palmar	39,12	39,14
SGU	32,70	32,6

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

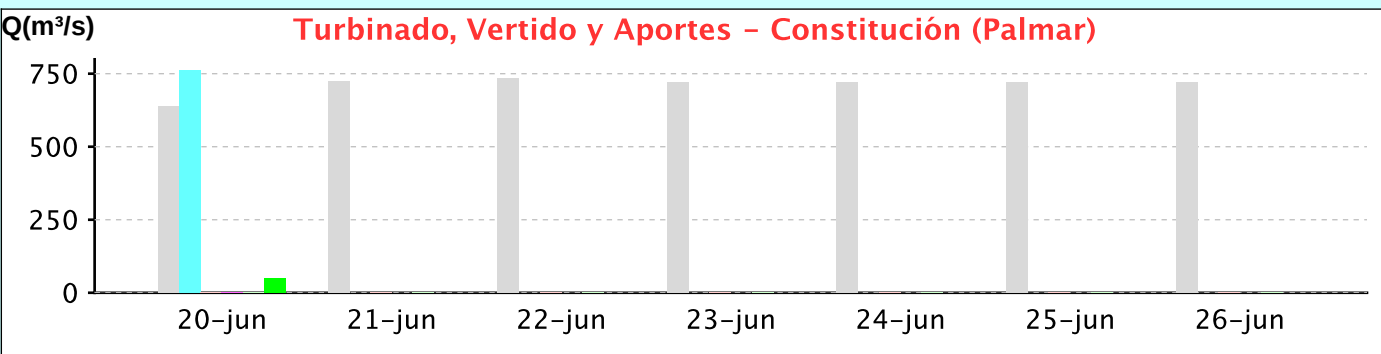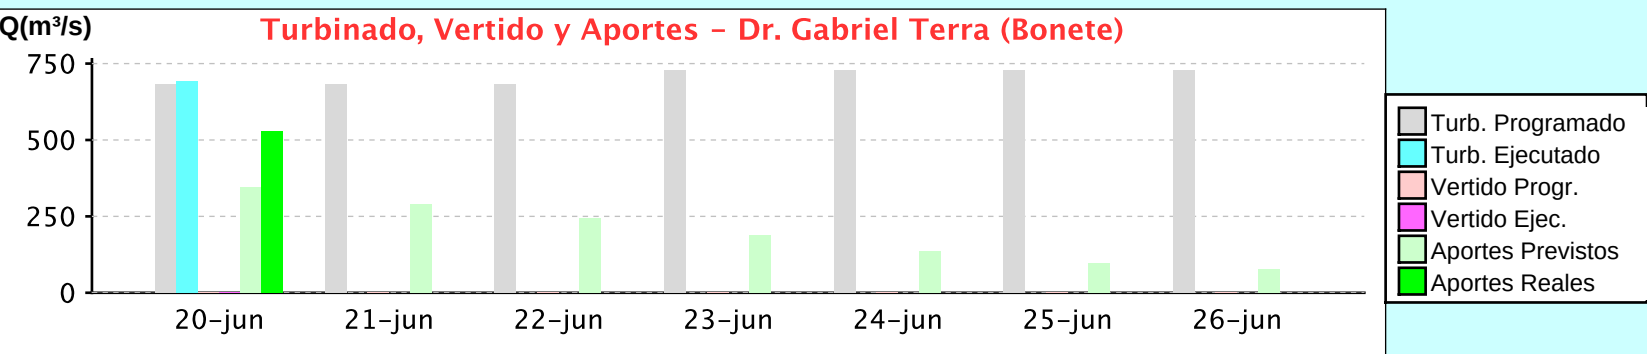

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

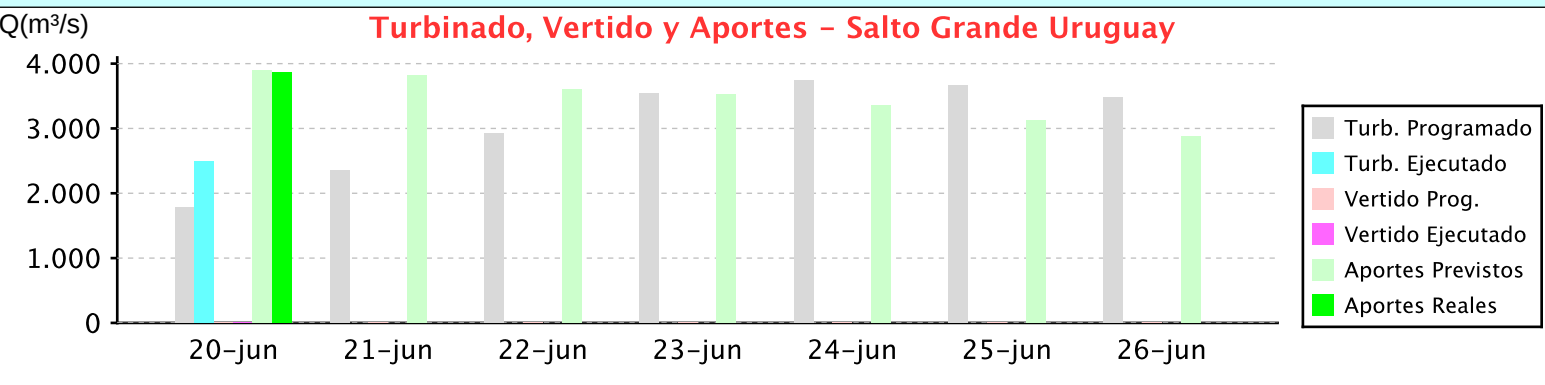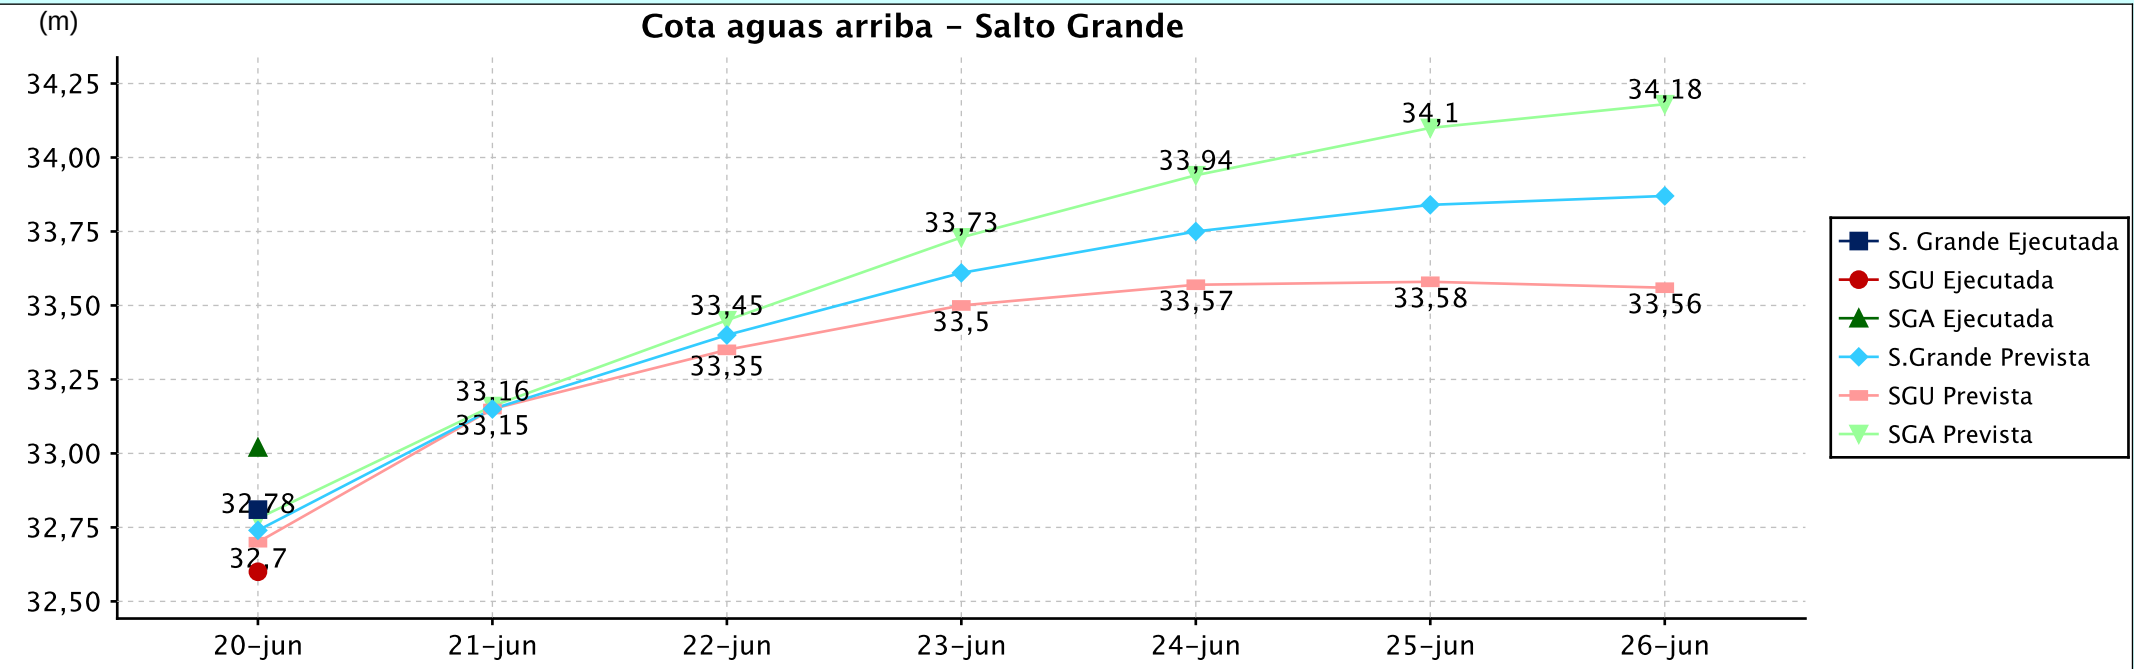

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	32,60
Cota Vista Arg	33,02
Cota real	32,81
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
-7.152	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	682	692
Baygorria	665	690
Palmar	640	761
SGU	1.785	2.486

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	344	527
Baygorria	0	5
Palmar	0	49
SGU	3.900	3.858

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
