




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

domingo 21 de junio de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	1.295
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	1.299
Central La Tablada	-82
Central P. del Tigre	236
APR A	-2
APR B	94
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.019
C. Baygorria	2.009
C. Palmar	4.826
C. Salto Grande	14.147
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	4.207
TOTAL Generación	29.748

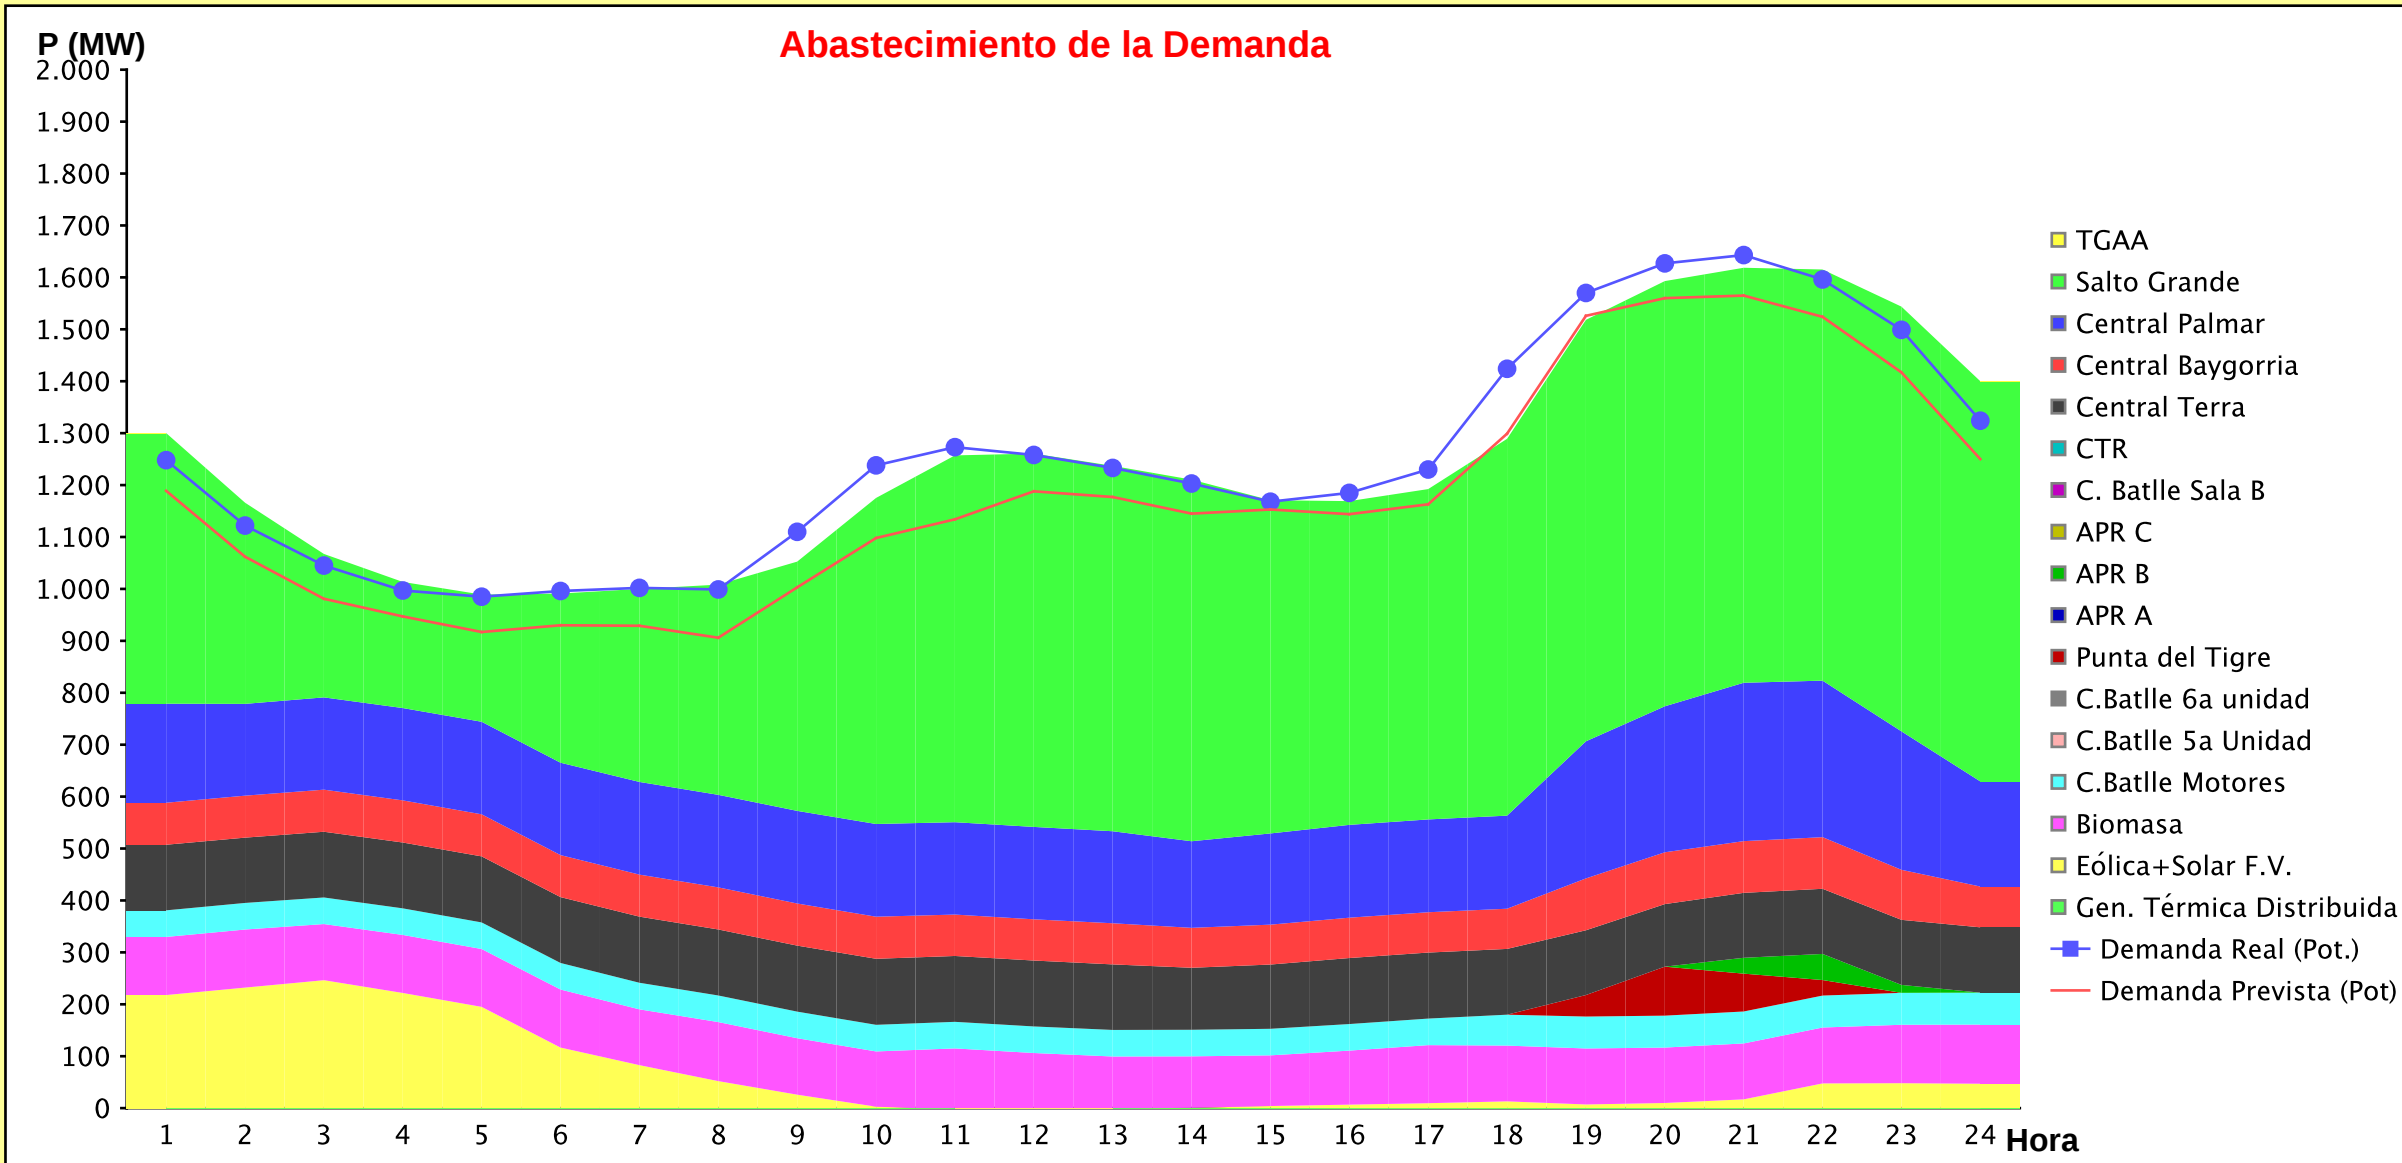

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0



DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	29.748
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	28.207
Diferencia (MWh)	1.541
Ejecutada - Programada	5,46 %

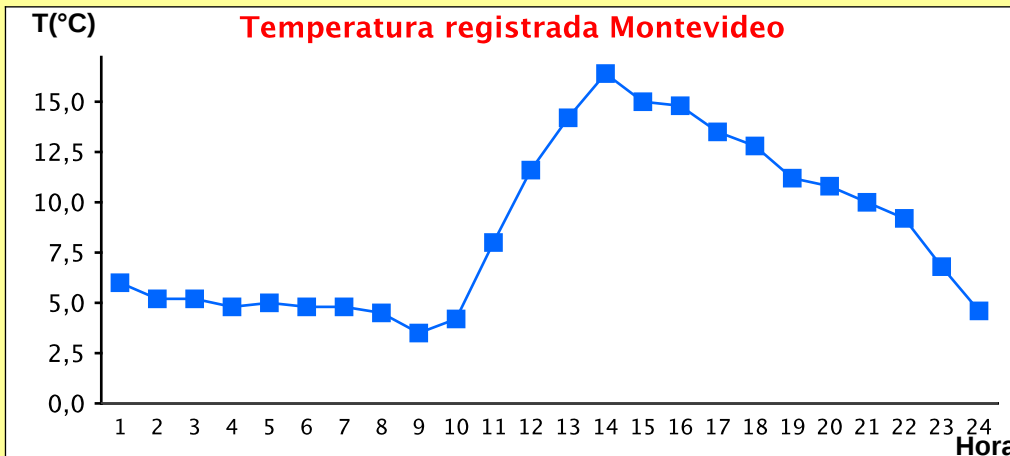


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1276 Hora 11:01
Potencia mínima:	983 Hora 05:37
Pico noche:	1645 Hora 20:55

Generación Media (MW)	
Eólica	67,5
Biomasa	109,0
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

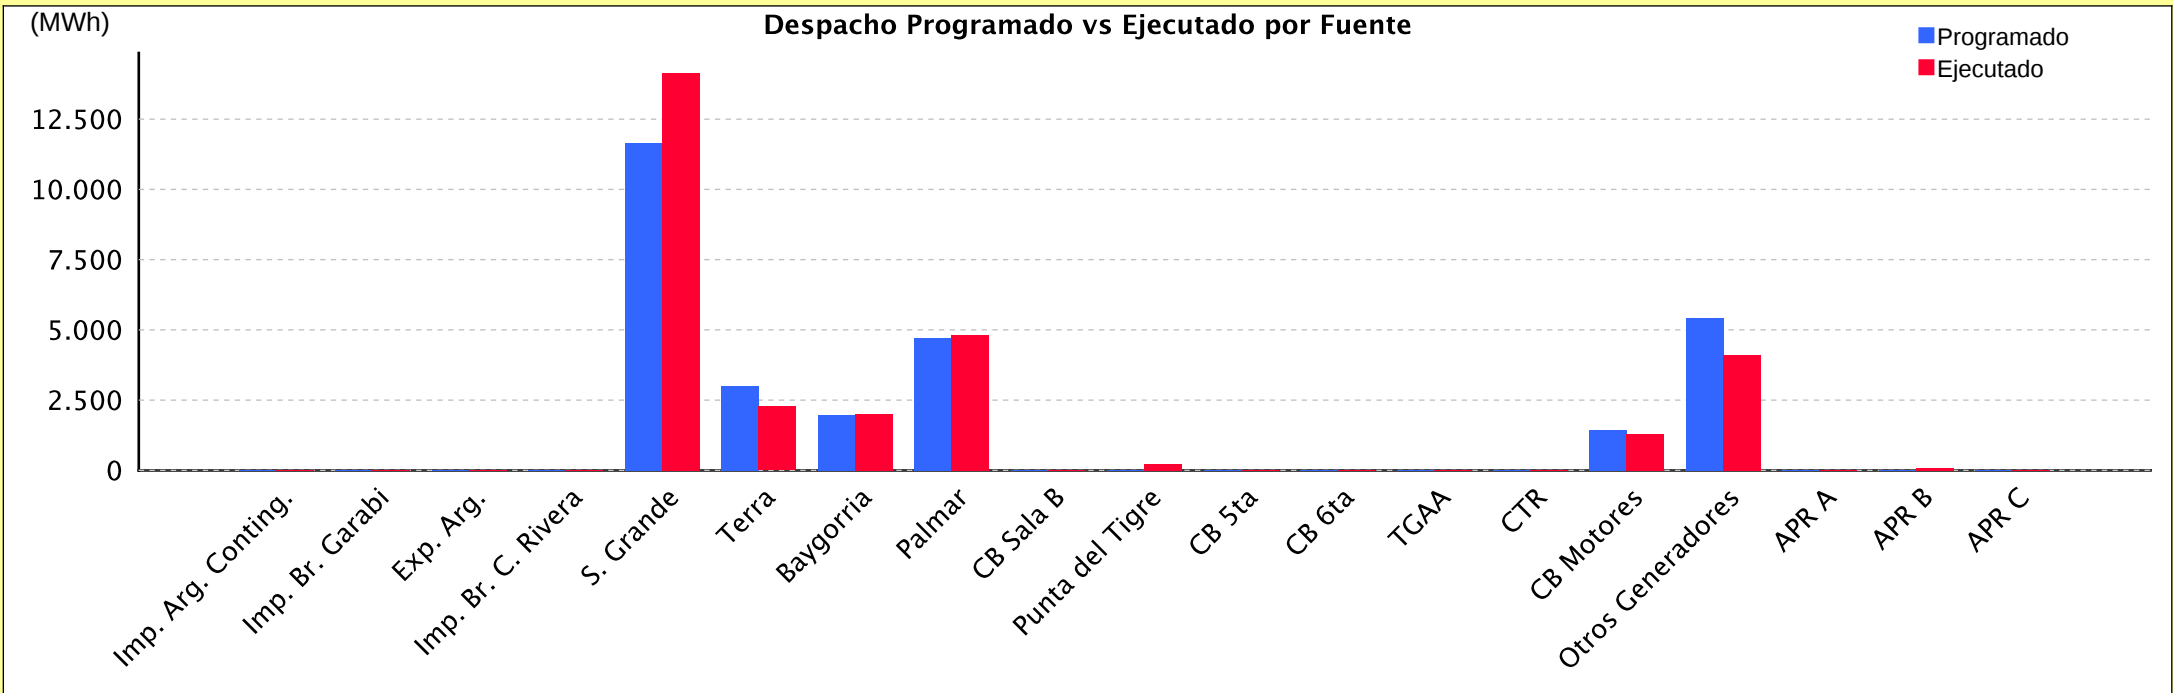
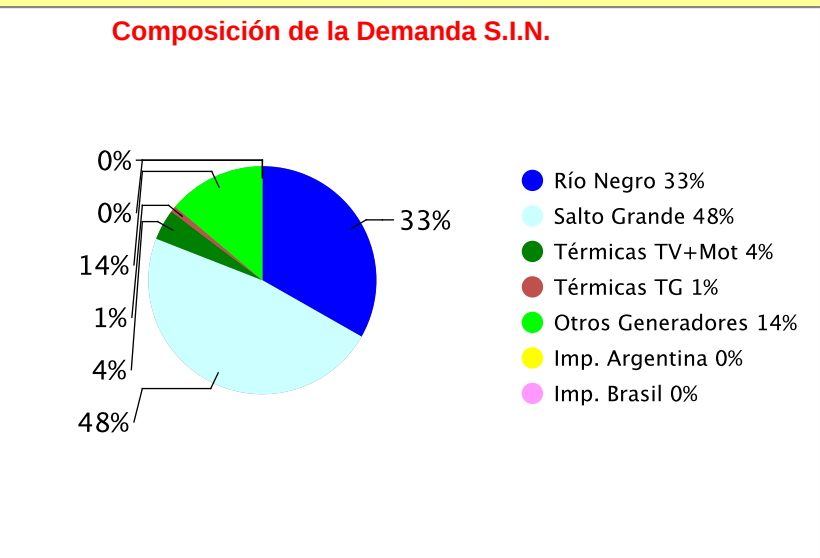


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

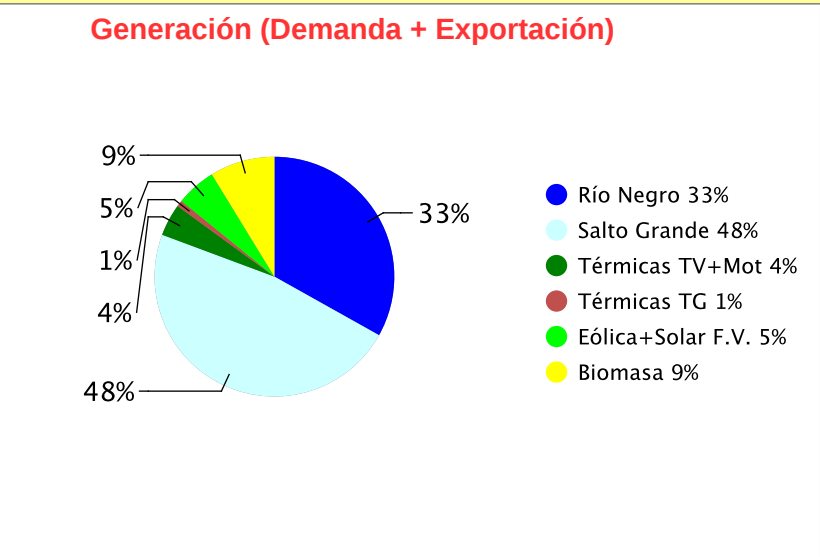



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

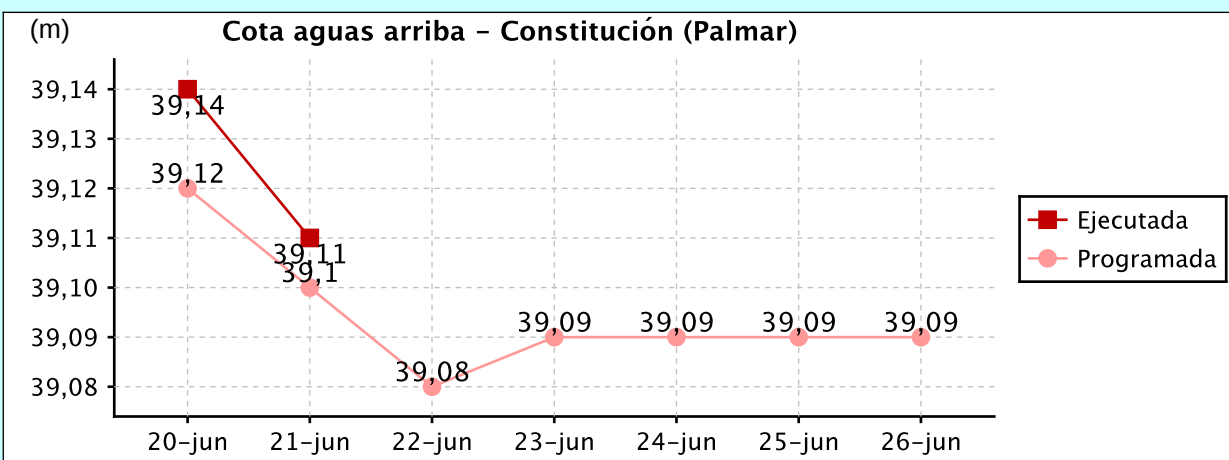
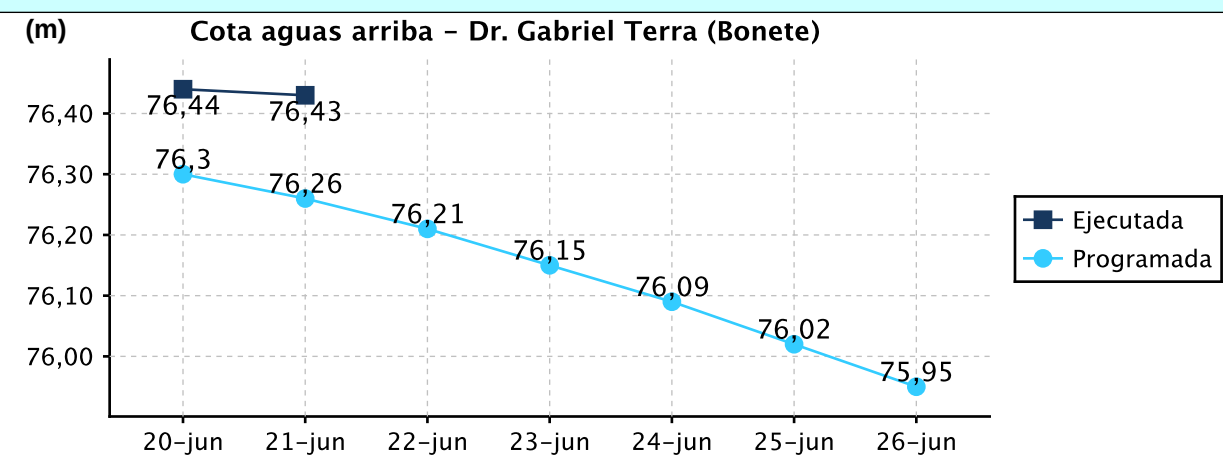


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,26	76,43
Baygorria	53,91	53,69
Palmar	39,10	39,11
SGU	33,15	33,14

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

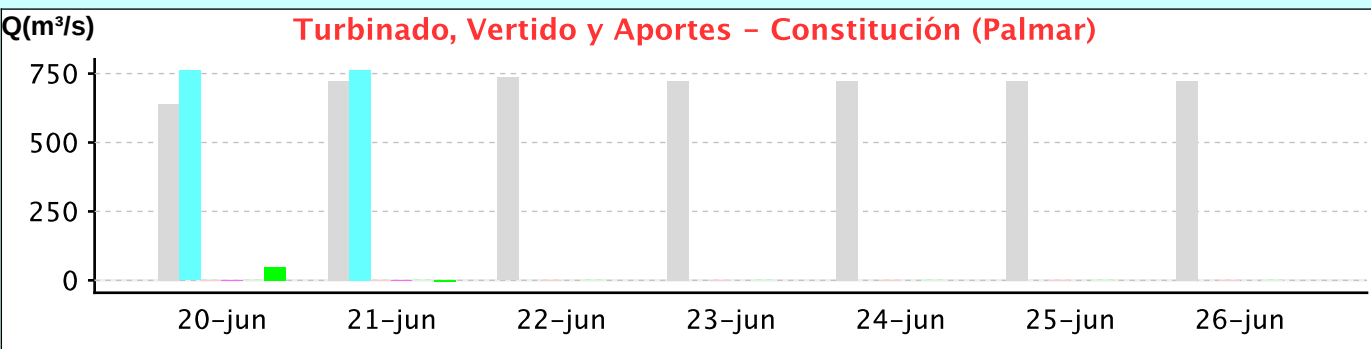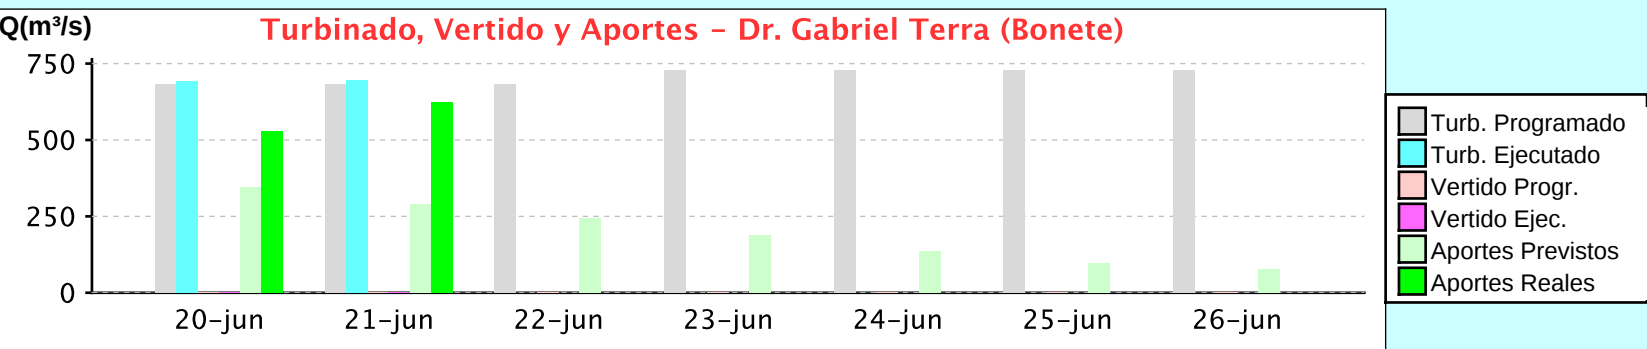

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

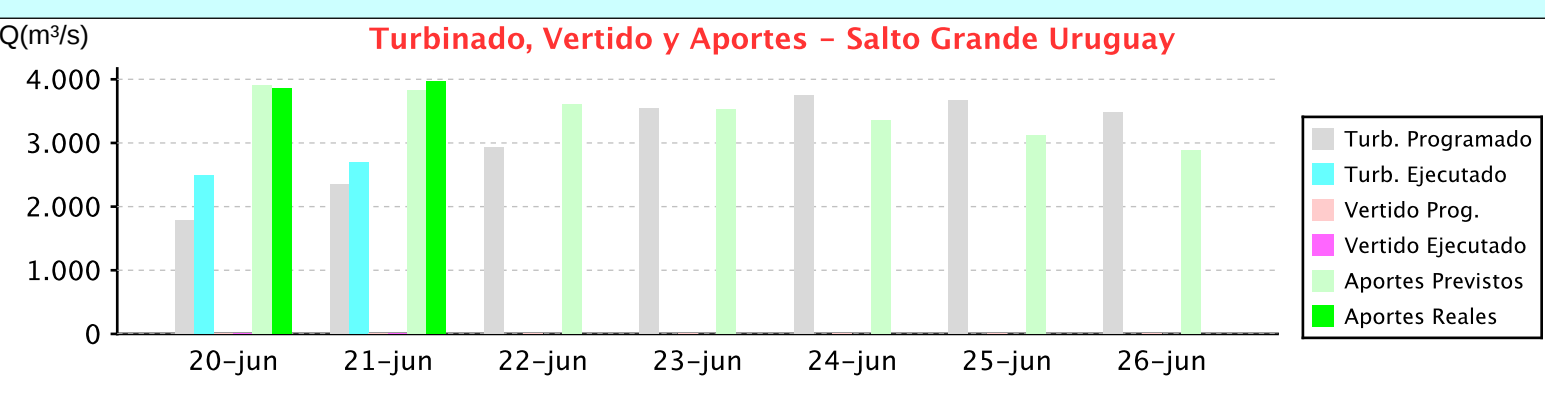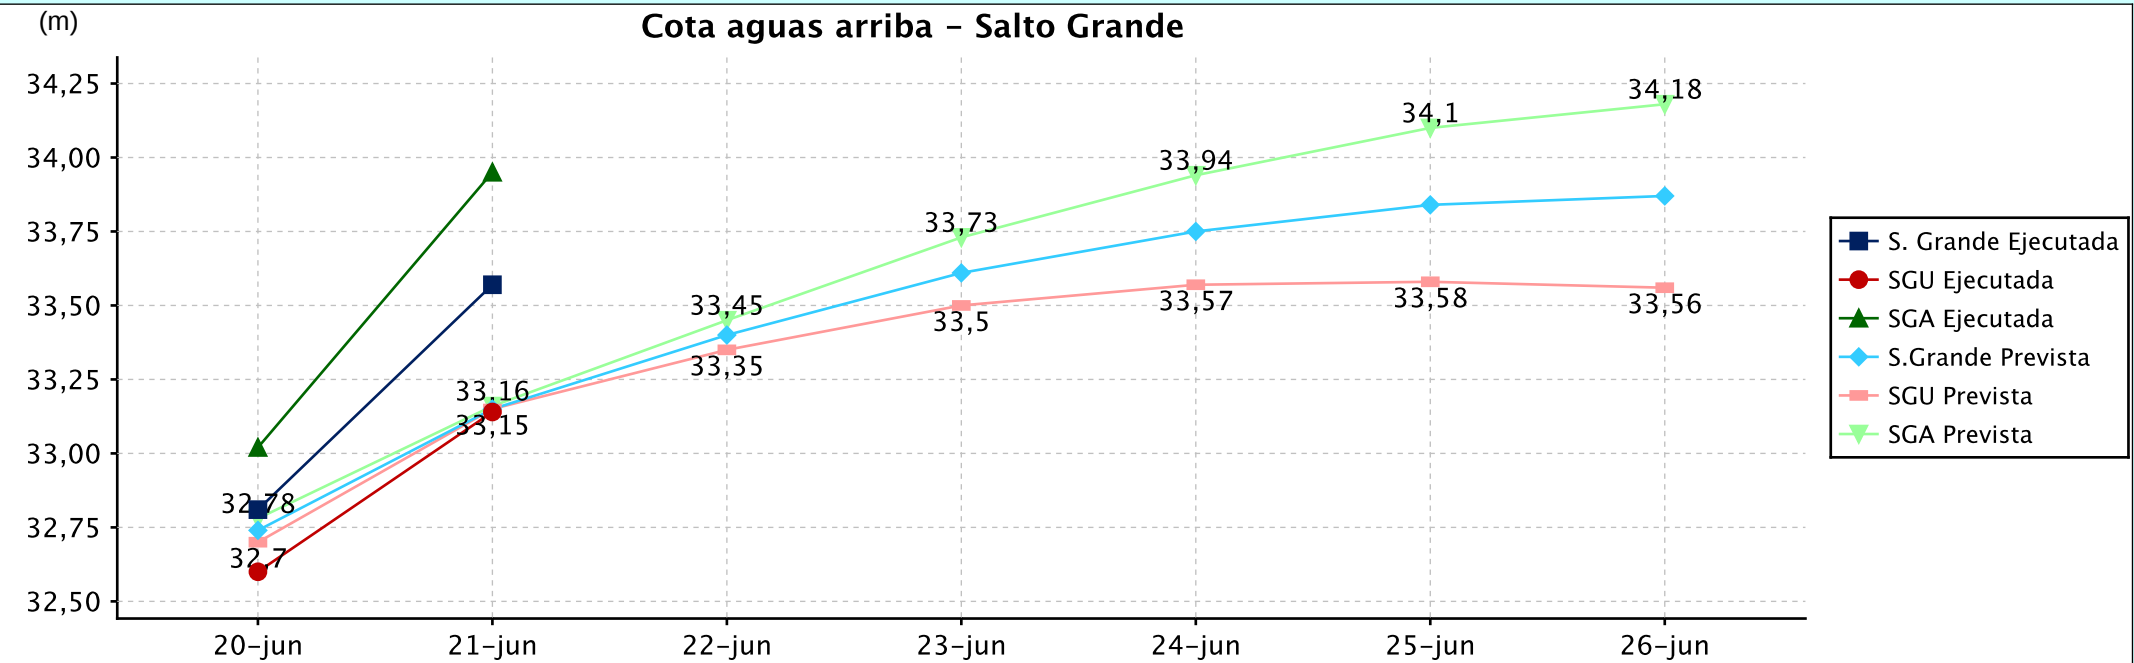

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	33,14
Cota Vista Arg	33,95
Cota real	33,57
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	-15.691

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	682	696
Baygorria	686	691
Palmar	724	763
SGU	2.347	2.702

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	289	624
Baygorria	0	12
Palmar	0	-7
SGU	3.825	3.972

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
