




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

viernes 26 de junio de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	1.261
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	1.265
Central La Tablada	-80
Central P. del Tigre	-4
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	1.755
C. Baygorria	1.205
C. Palmar	2.249
C. Salto Grande	15.830
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	8.189
TOTAL Generación	30.400

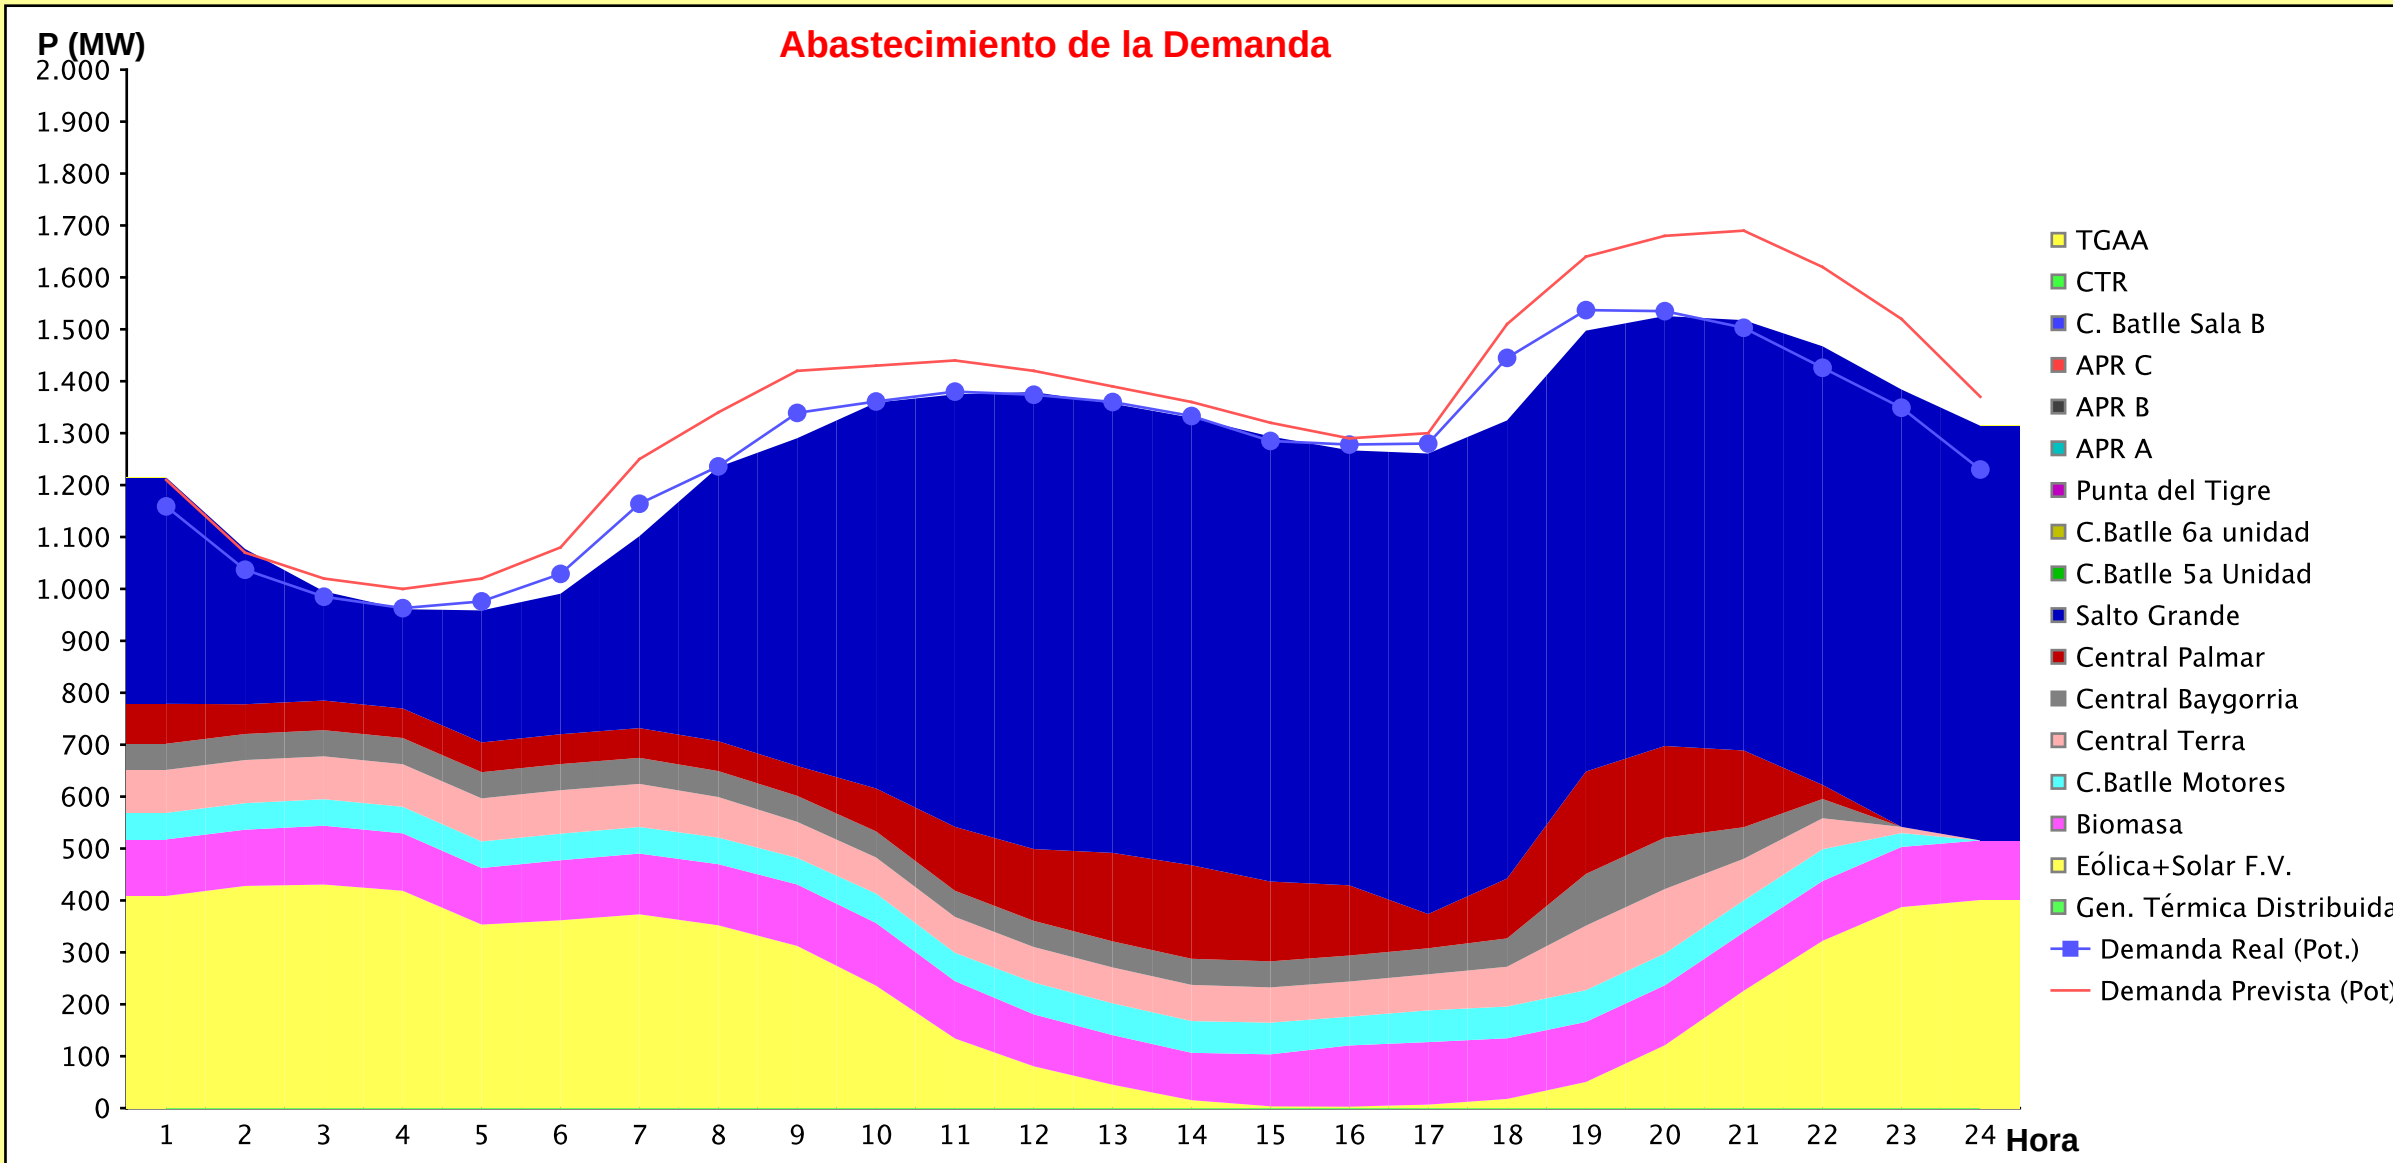

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	30.400
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	


Demanda Programada (MWh)	32.390
Diferencia (MWh)	-1.990
Ejecutada - Programada	-6,14 %

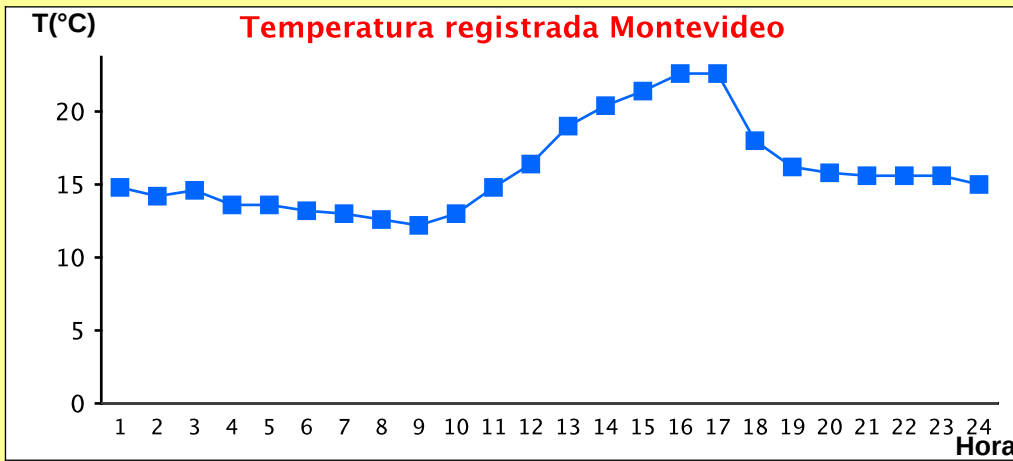

Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1390 Hora 11:51
Potencia mínima:	958 Hora 03:40
Pico noche:	1549 Hora 20:19



Generación Media (MW)	
Eólica	229,5
Biomasa	112,1
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

Composición de la Demanda S.I.N.

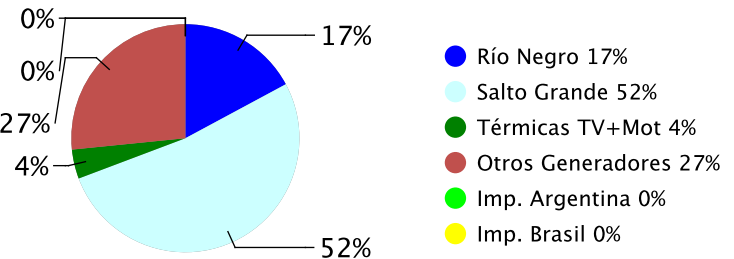



Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

Generación (Demanda + Exportación)

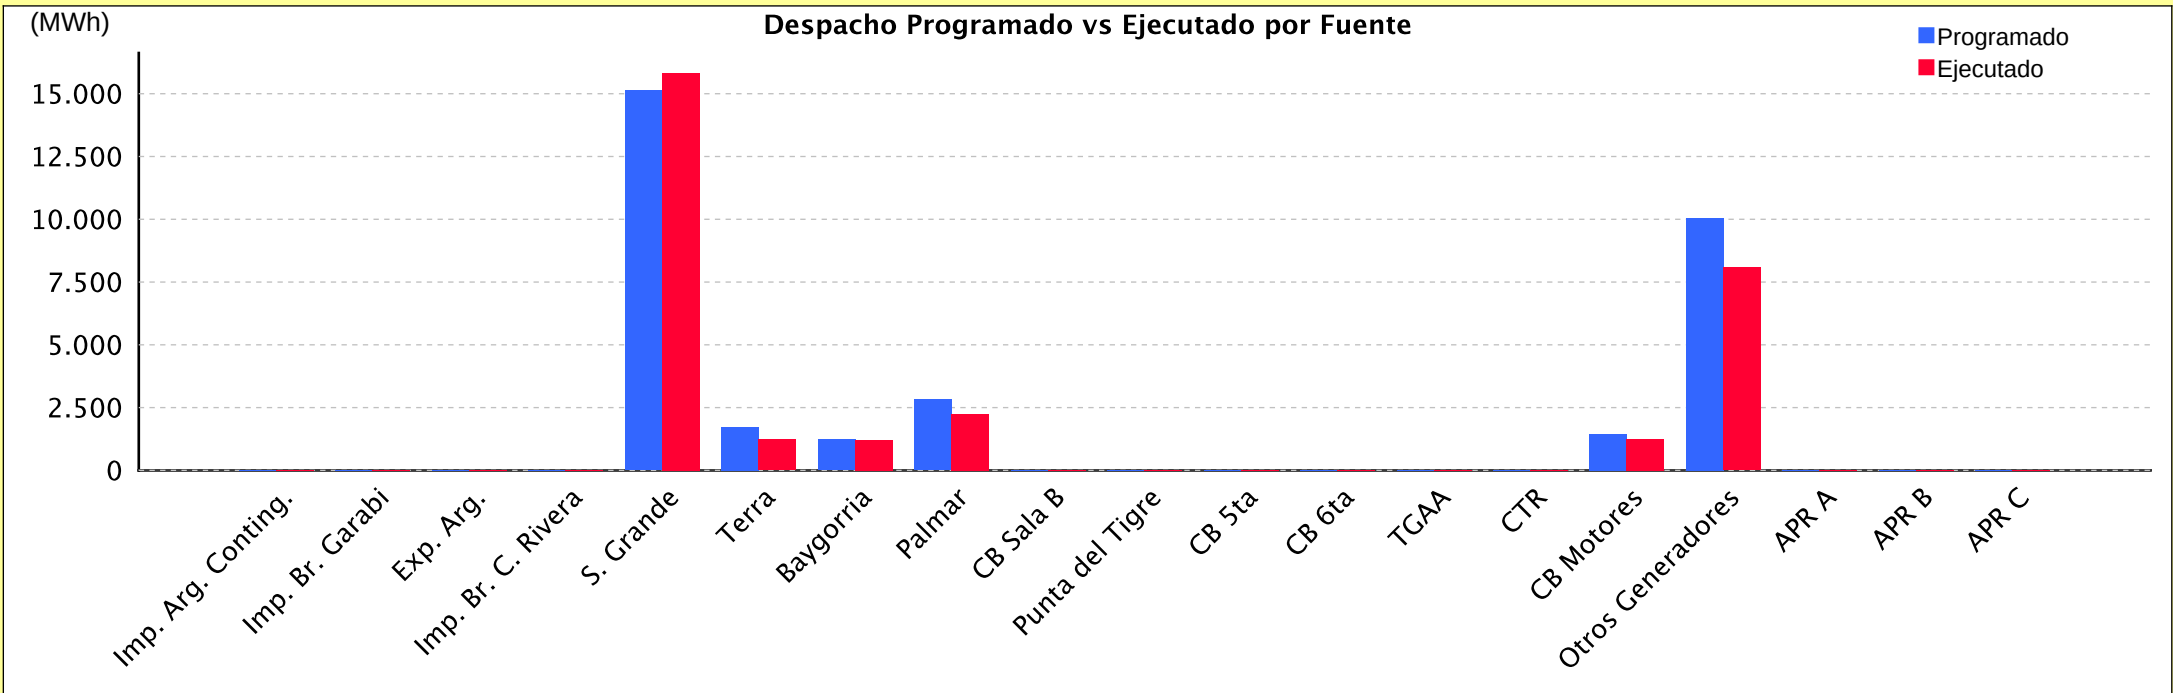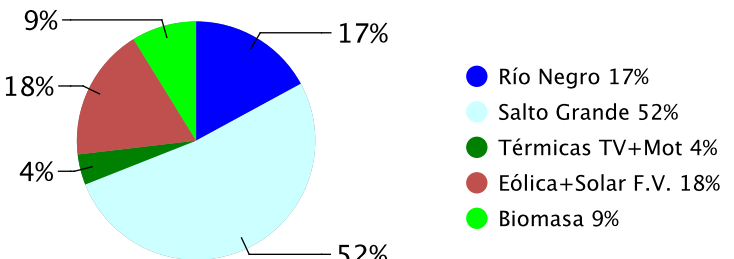



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

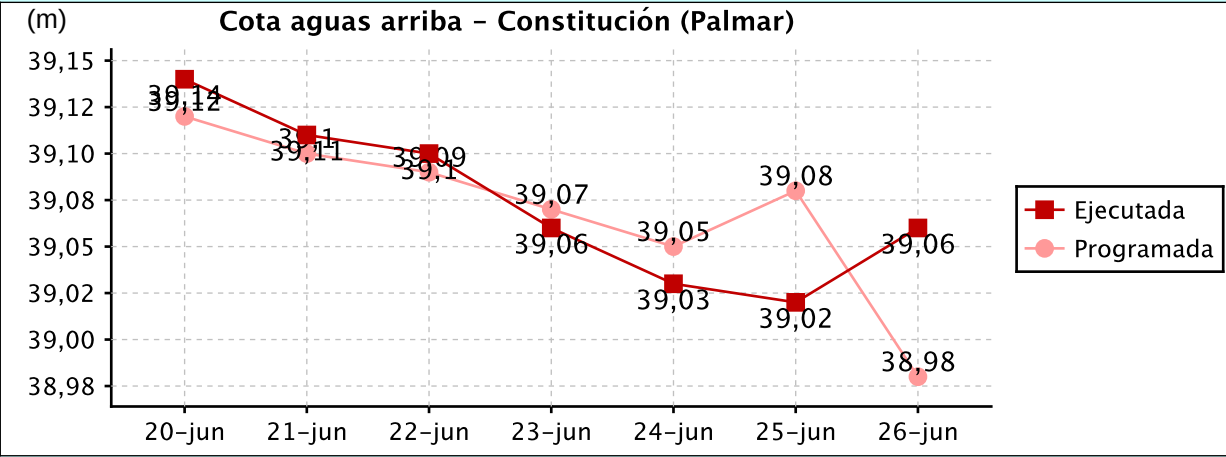
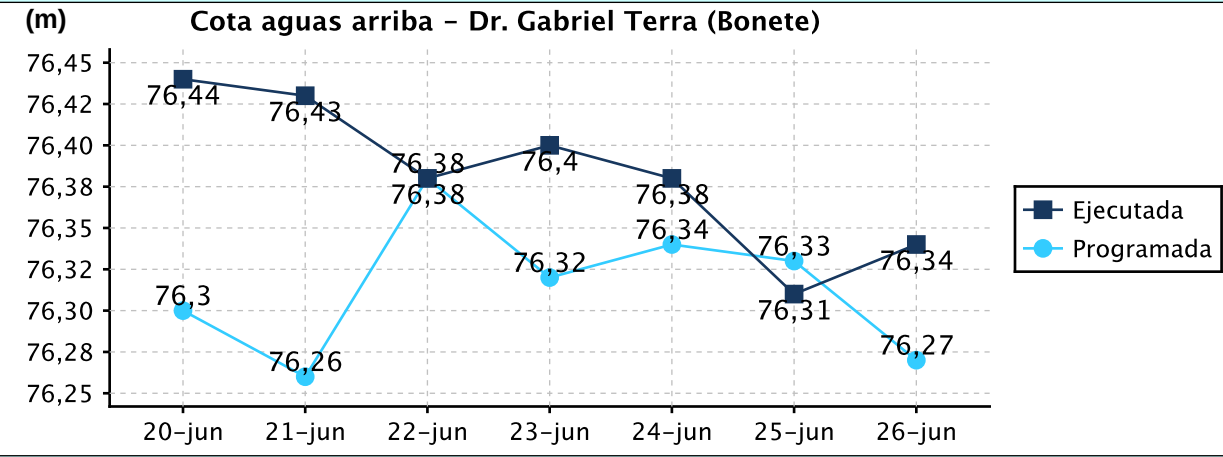


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,27	76,34
Baygorria	53,78	53,82
Palmar	38,98	39,06
SGU	34,90	34,77

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

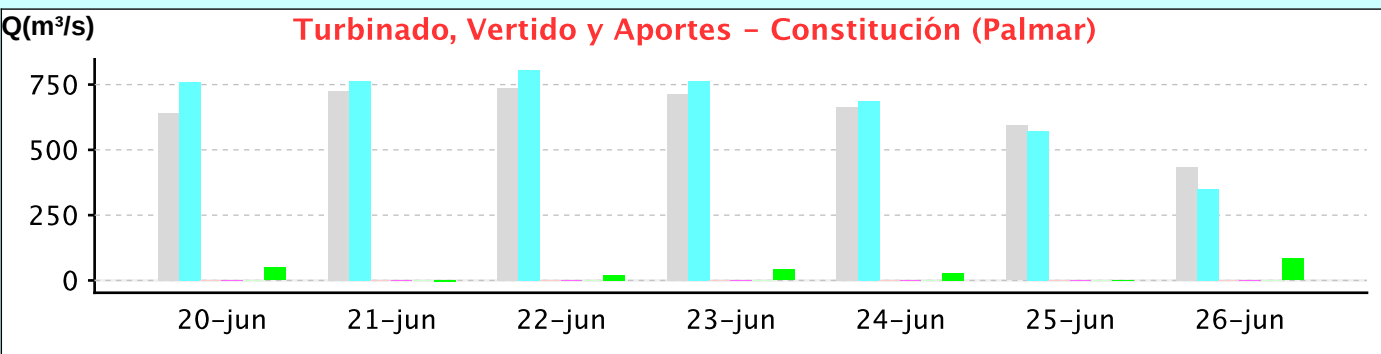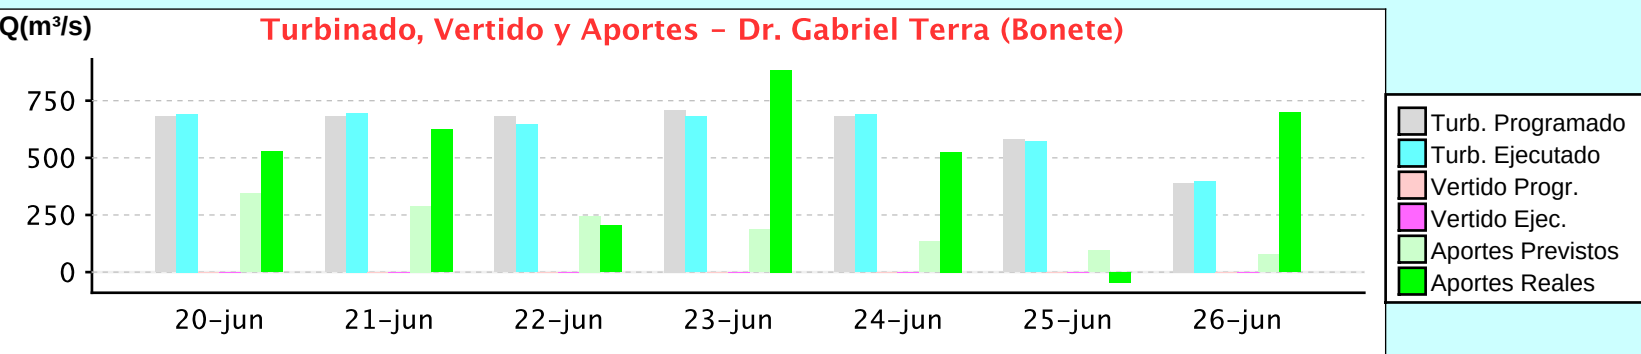

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

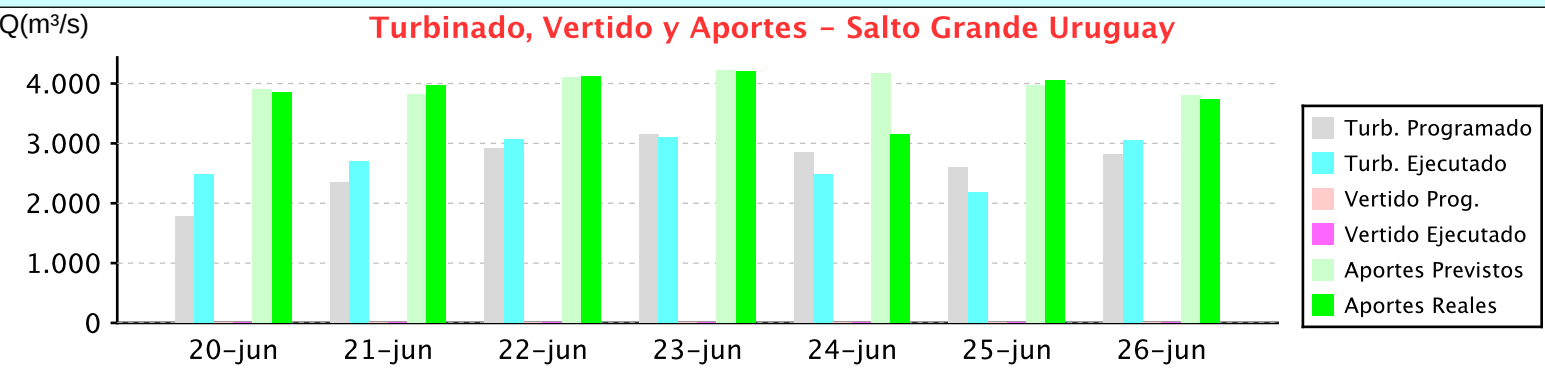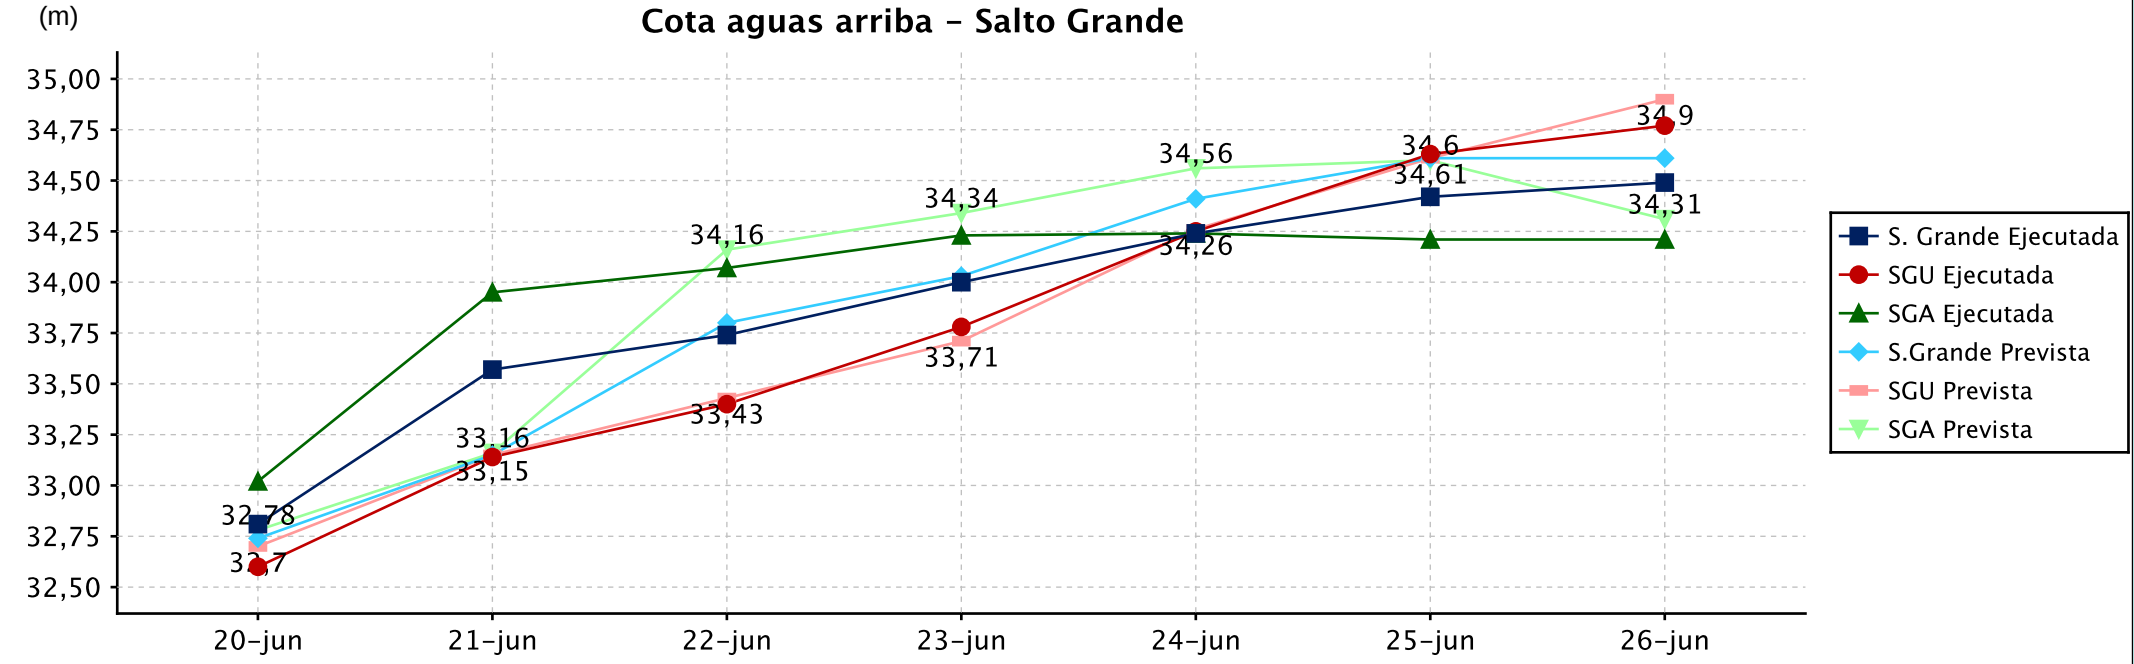

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,77
Cota Vista Arg	34,21
Cota real	34,49
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
12.395	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	390	399
Baygorria	426	407
Palmar	433	351
SGU	2.816	3.043

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	77	697
Baygorria	0	61
Palmar	0	84
SGU	3.800	3.730

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
