




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

domingo 28 de junio de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	259
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	263
Central La Tablada	-90
Central P. del Tigre	-3
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	0
C. Baygorria	225
C. Palmar	161
C. Salto Grande	15.768
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	9.088
TOTAL Generación	25.403

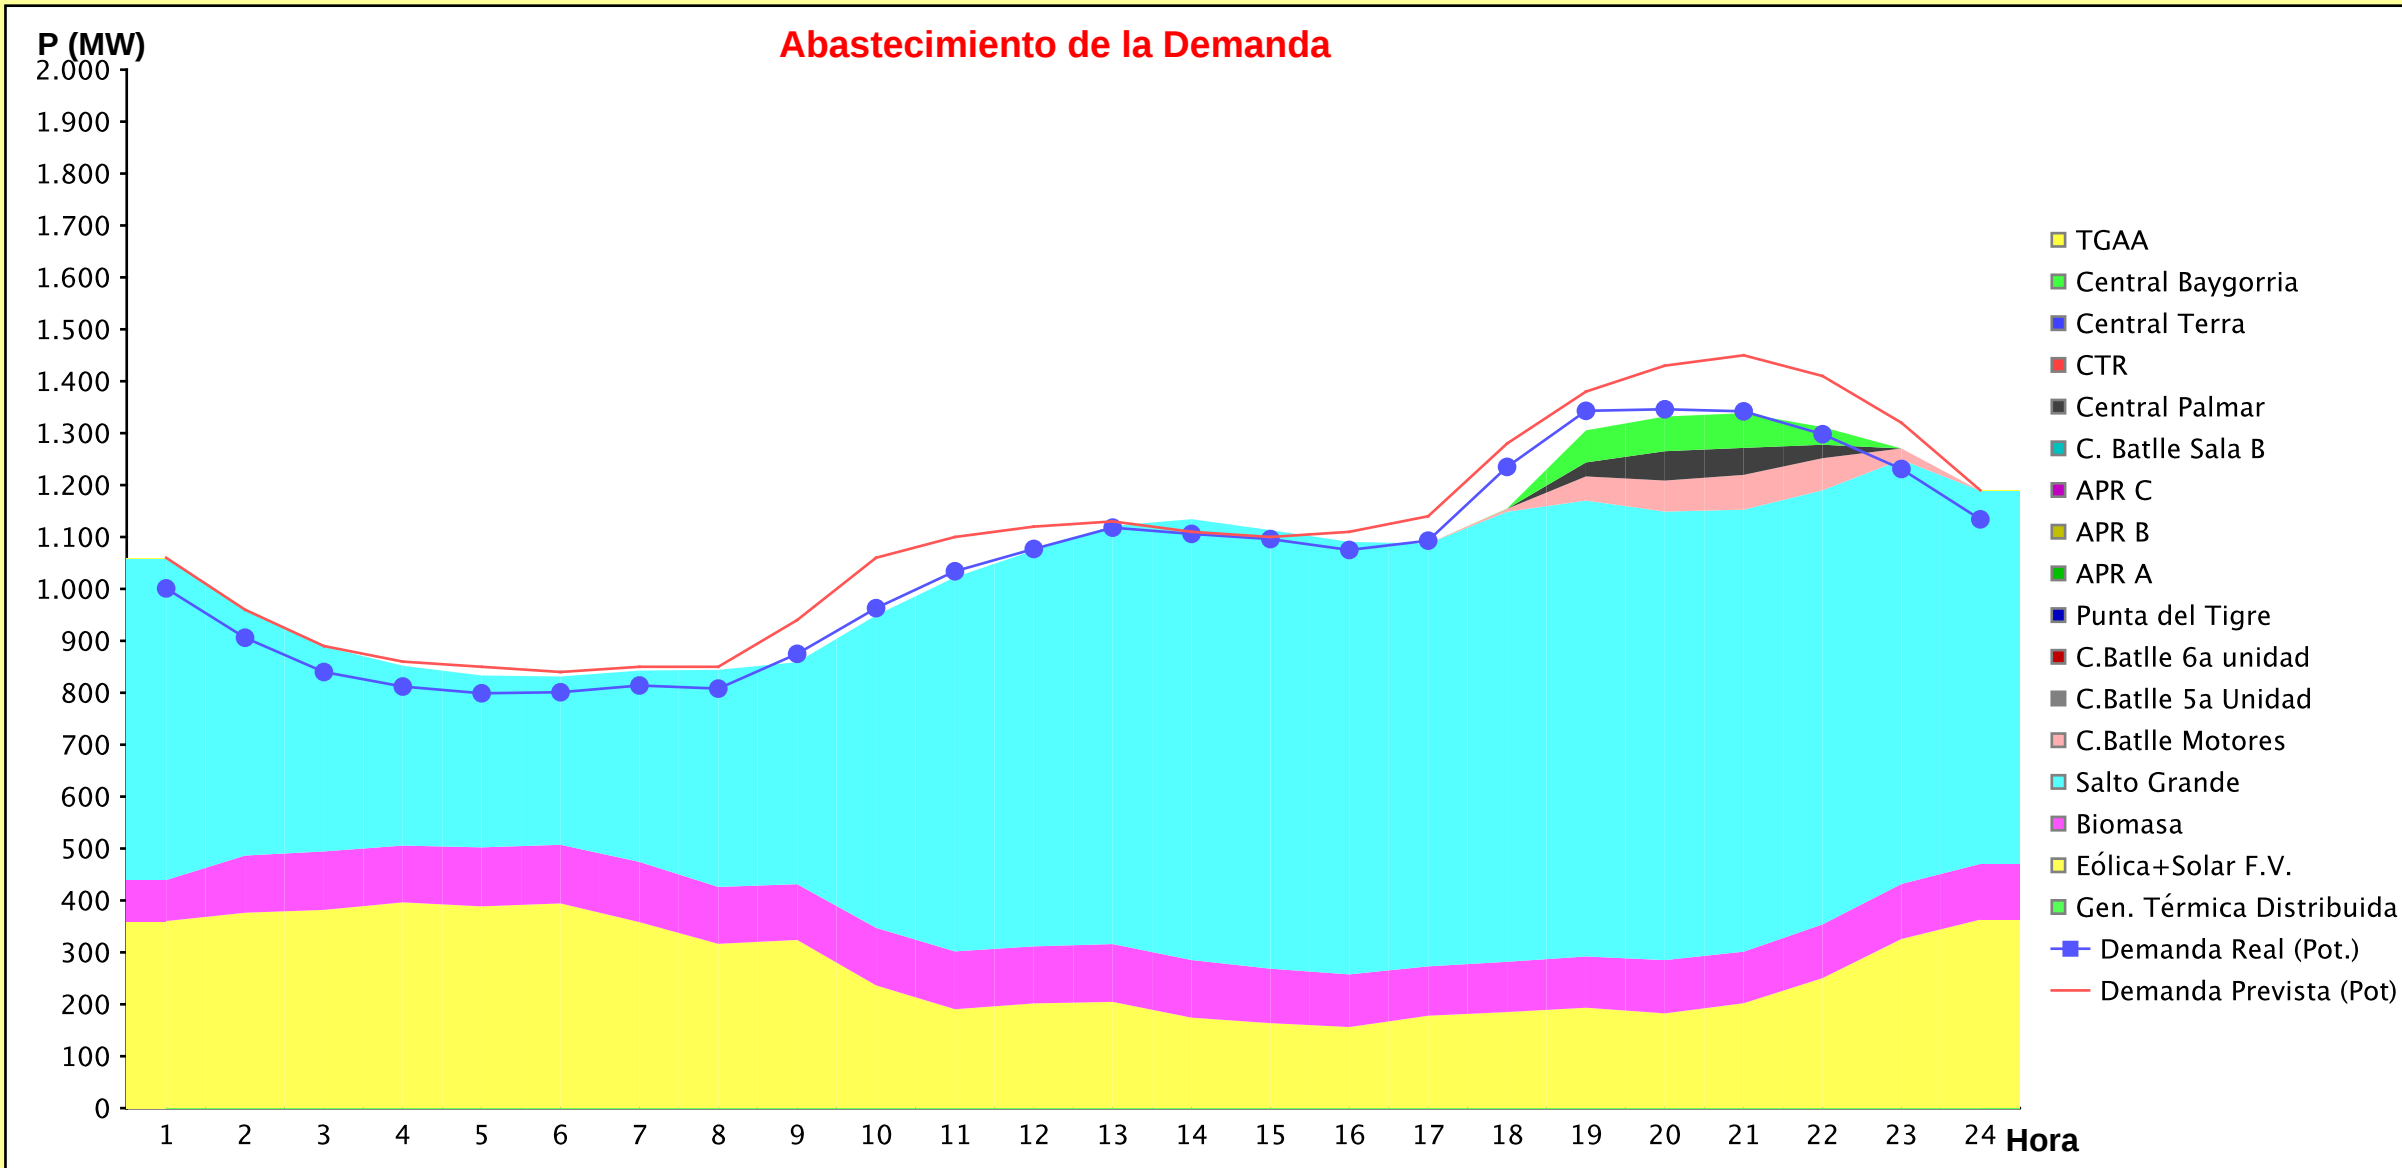

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	25.403
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	


Demanda Programada (MWh)	26.430
Diferencia (MWh)	-1.027
Ejecutada - Programada	-3,88 %

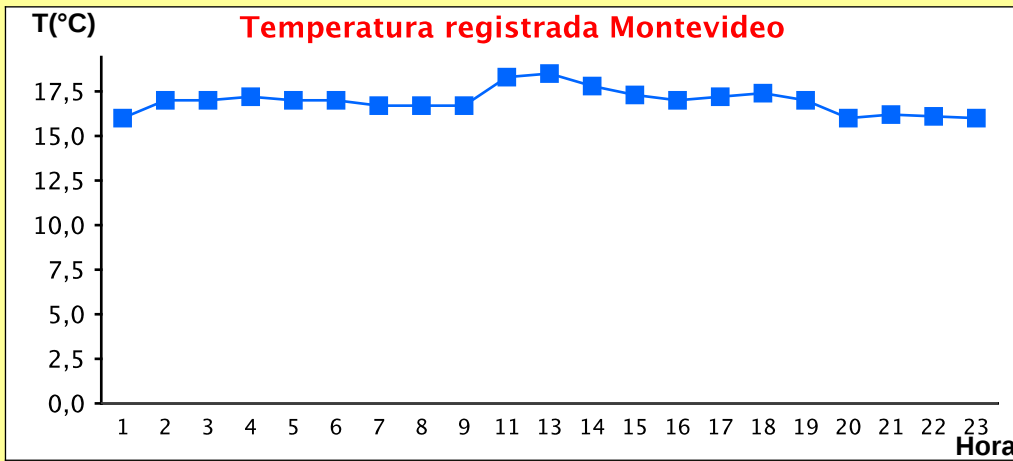

Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1146 Hora 13:19
Potencia mínima:	822 Hora 05:17
Pico noche:	1362 Hora 20:13



Generación Media (MW)	
Eólica	271,2
Biomasa	106,3
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

Composición de la Demanda S.I.N.

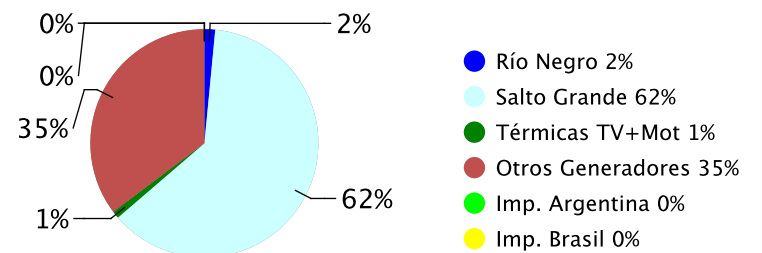



Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

Generación (Demanda + Exportación)

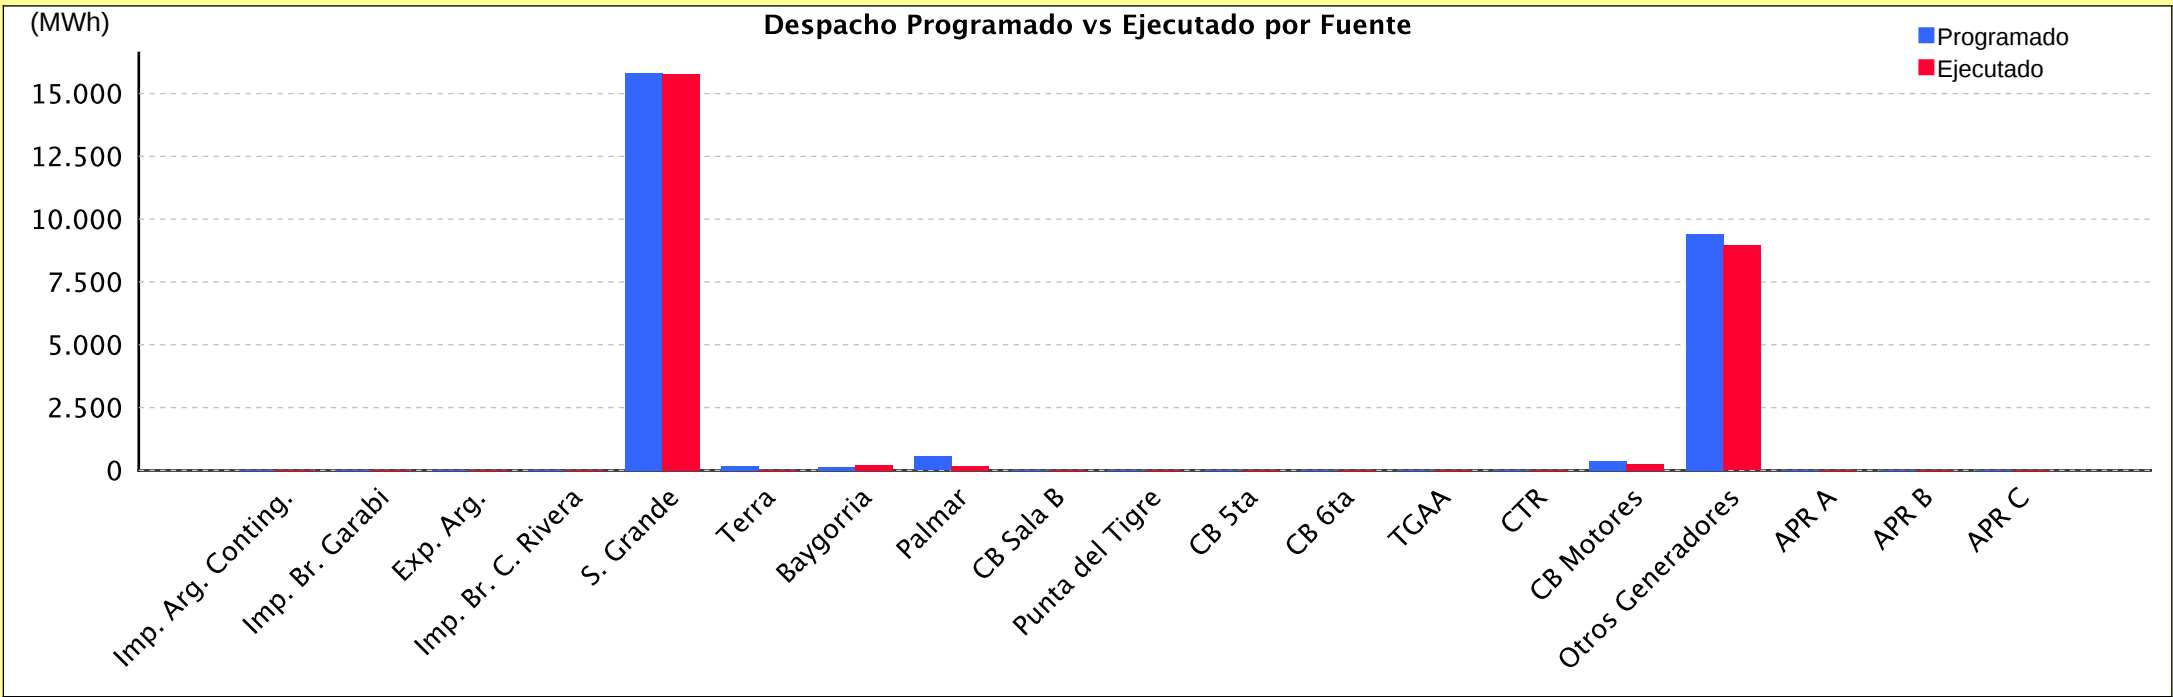



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

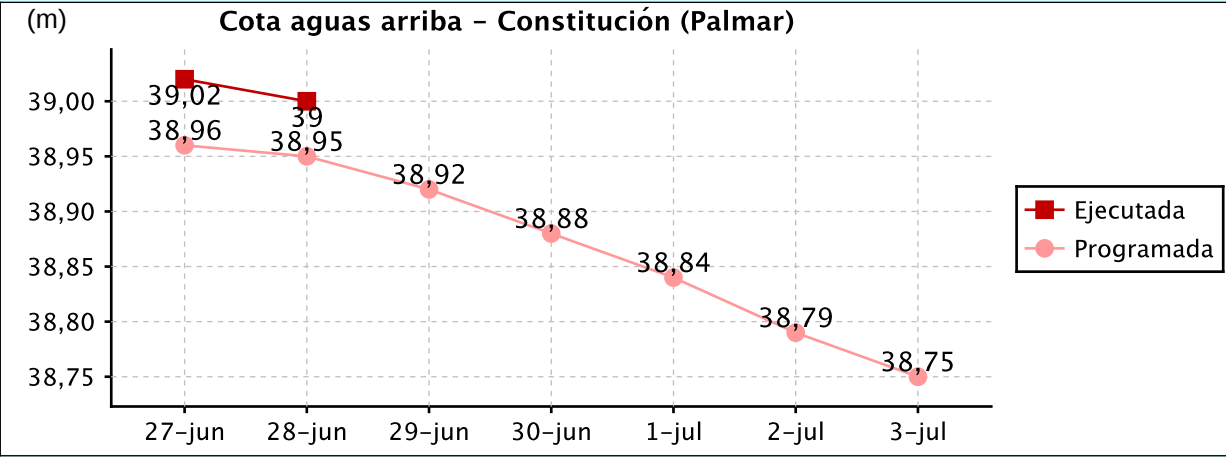
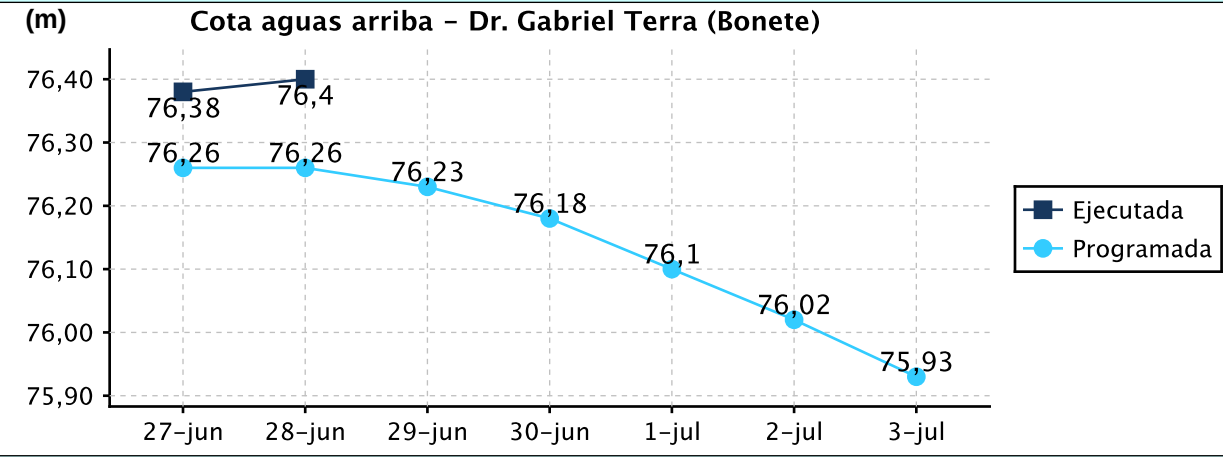


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,26	76,4
Baygorria	53,77	53,82
Palmar	38,95	39
SGU	34,92	34,9

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

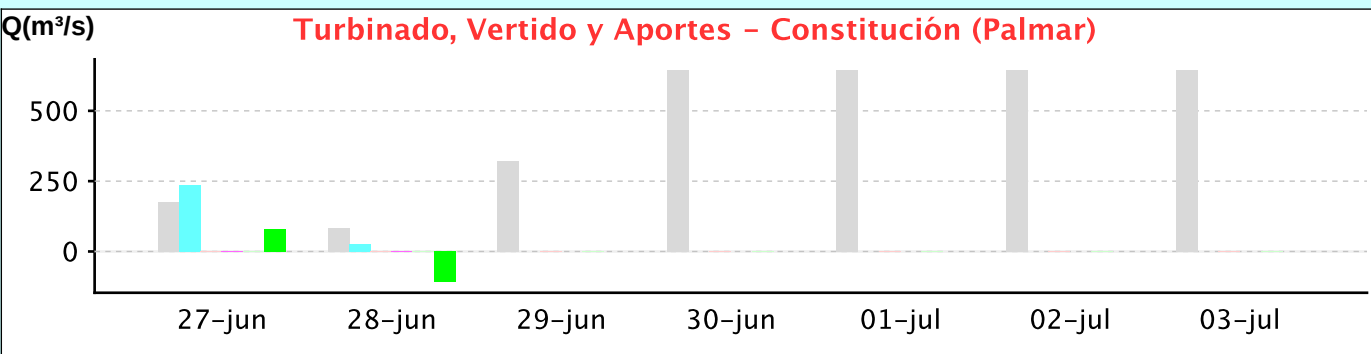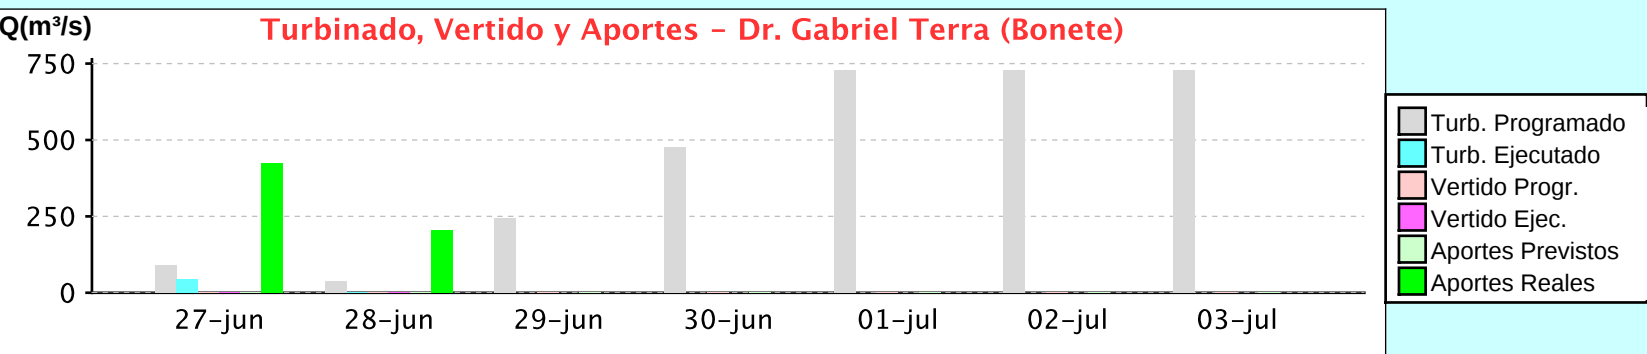

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

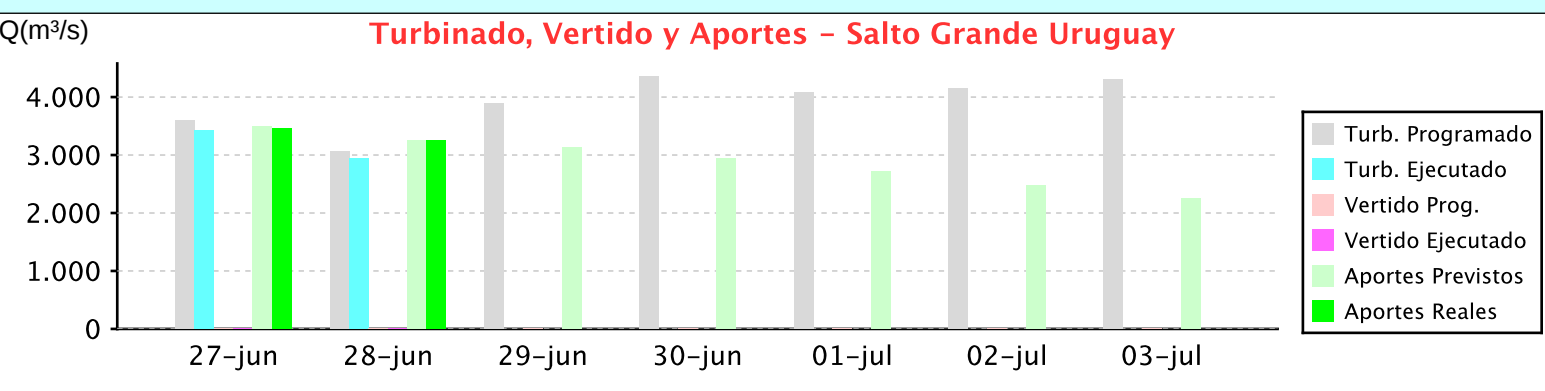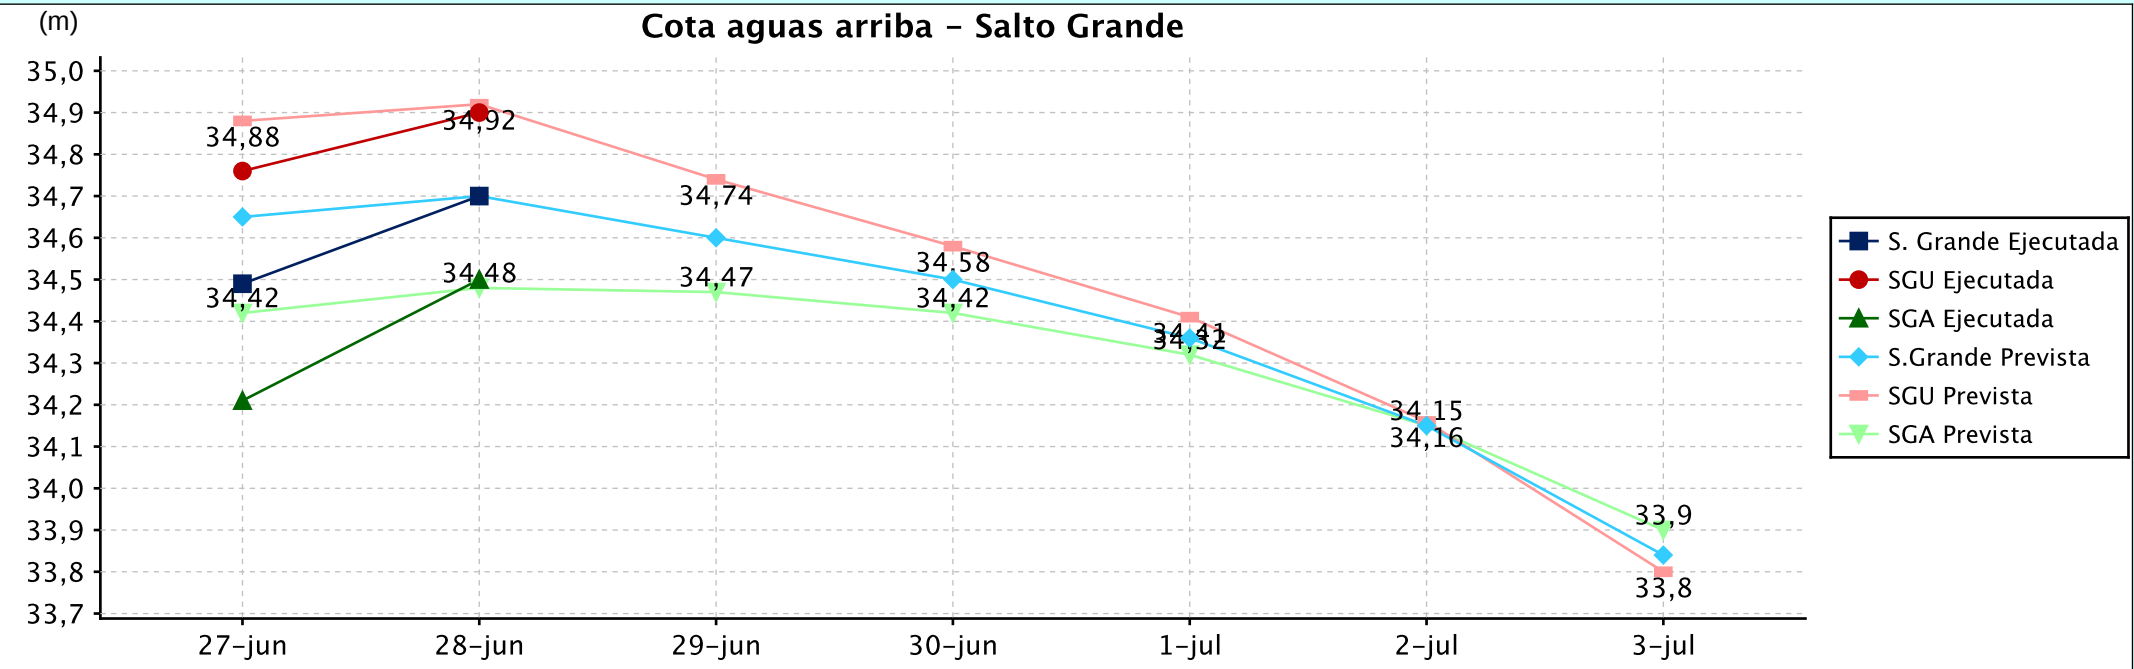

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,90
Cota Vista Arg	34,50
Cota real	34,70
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
9.028	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	36	0
Baygorria	42	78
Palmar	85	25
SGU	3.065	2.937

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	205
Baygorria	0	60
Palmar	0	-109
SGU	3.250	3.256

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
