




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

lunes 29 de junio de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	785
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	789
Central La Tablada	-56
Central P. del Tigre	-3
APR A	-2
APR B	104
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	768
C. Baygorria	694
C. Palmar	2.507
C. Salto Grande	18.289
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	6.663
TOTAL Generación	29.749

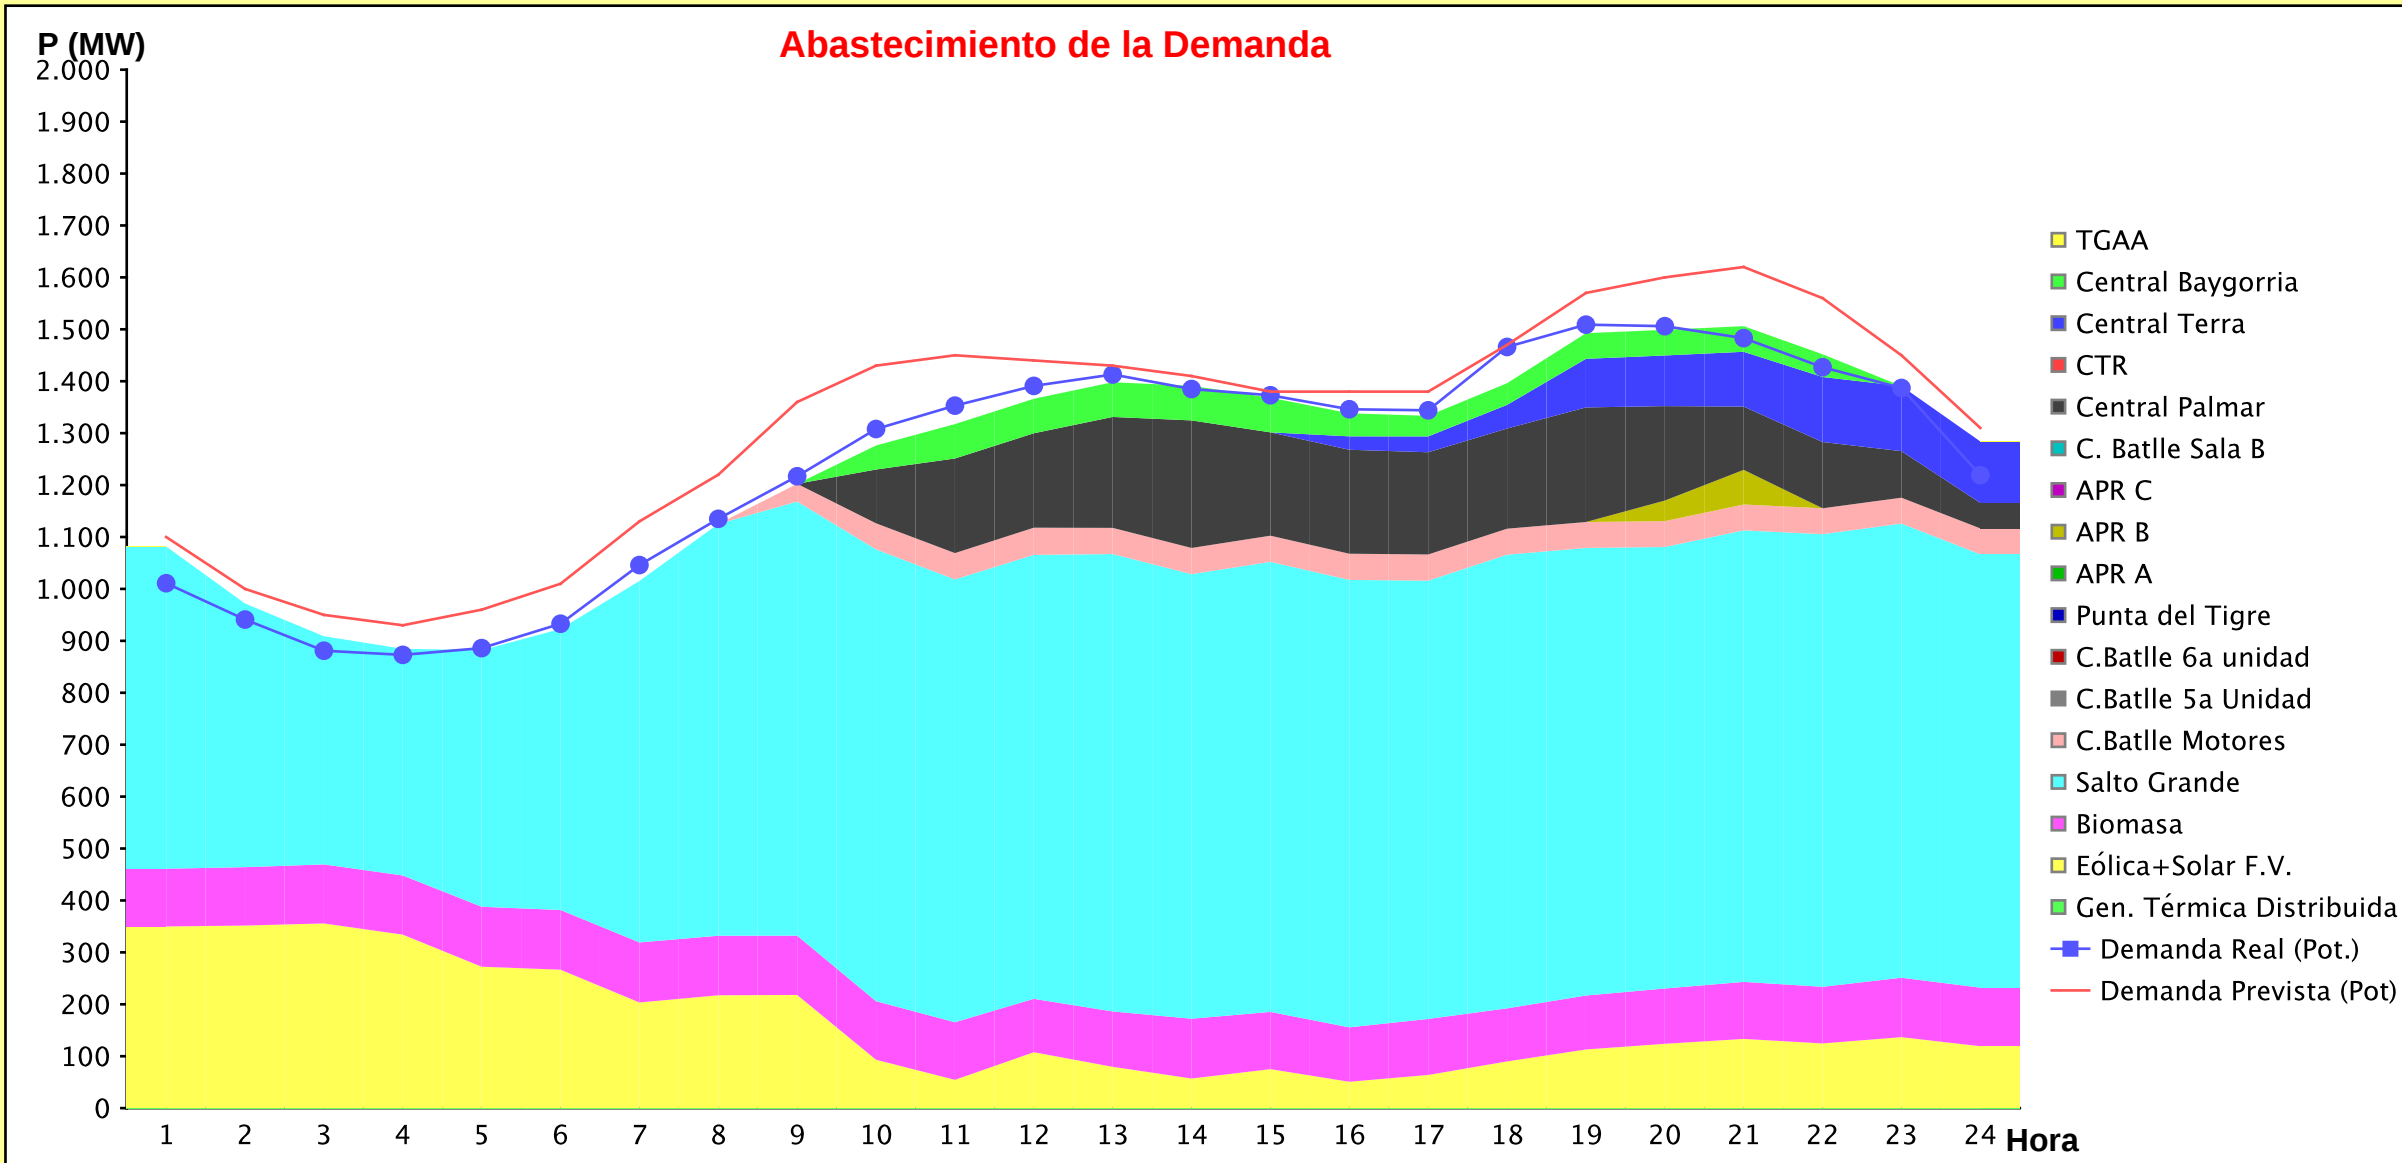

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0



DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	29.749
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	31.540
Diferencia (MWh)	-1.791
Ejecutada - Programada	-5,68 %

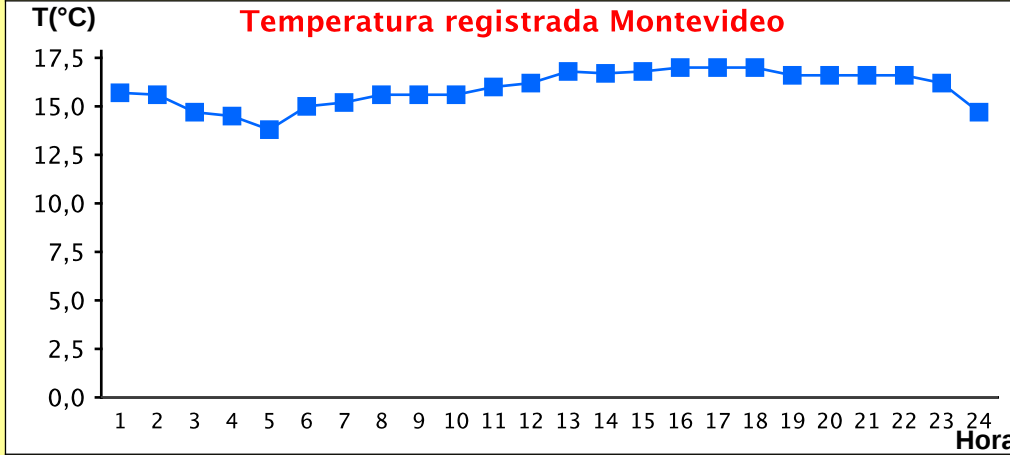


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1422 Hora 12:28
Potencia mínima:	861 Hora 03:45
Pico noche:	1526 Hora 20:30

Generación Media (MW)	
Eólica	167,6
Biomasa	111,6
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

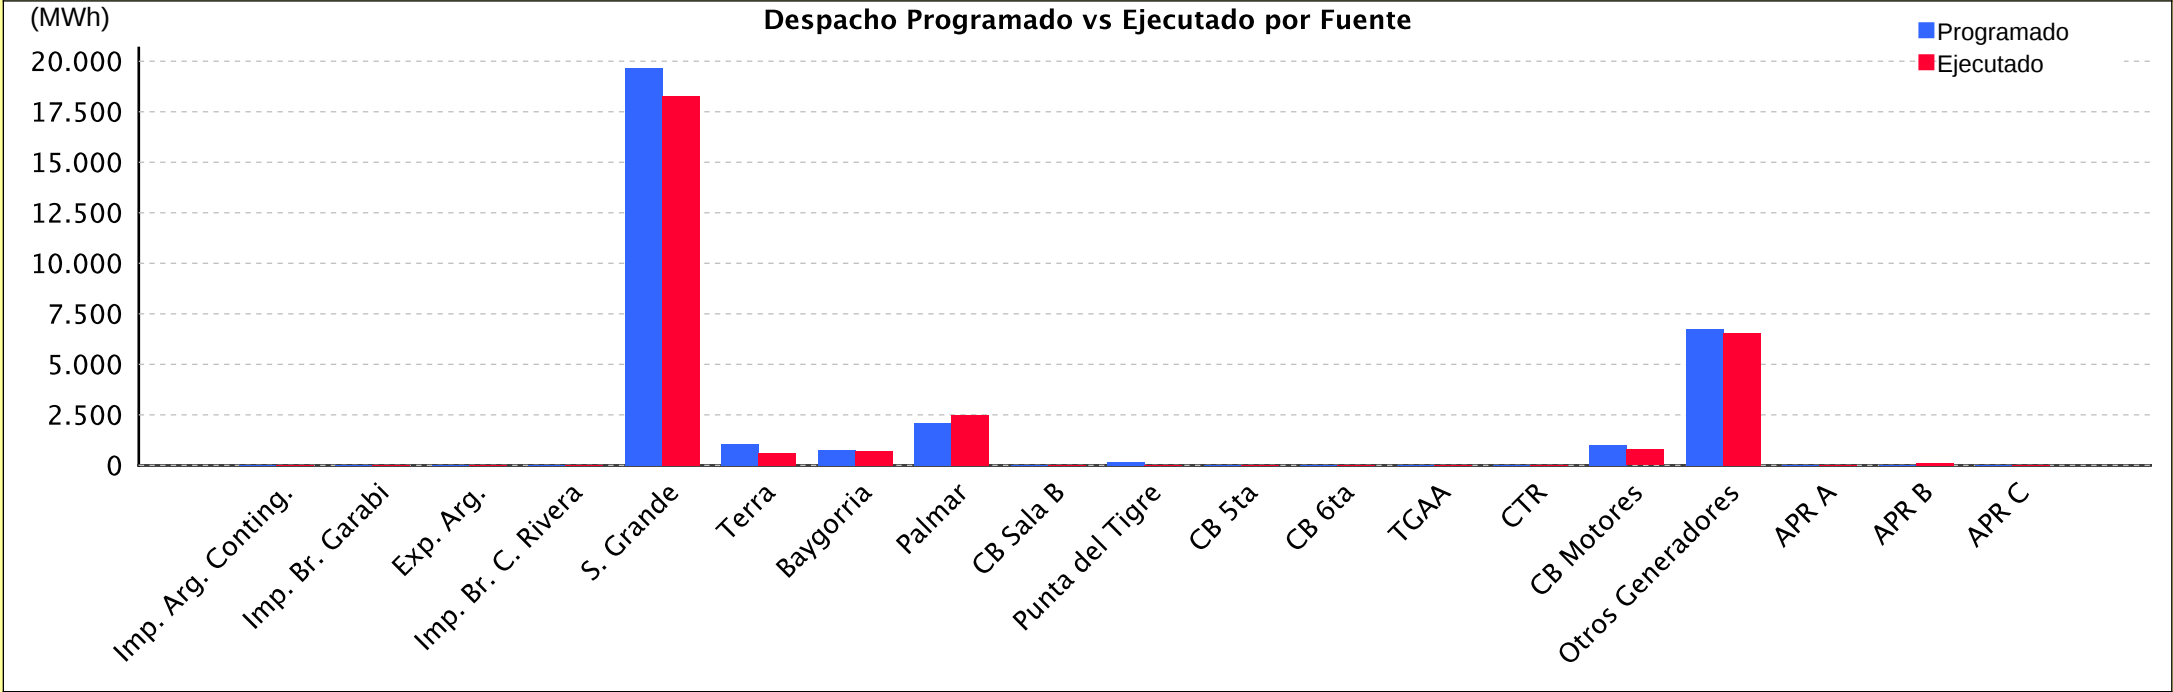
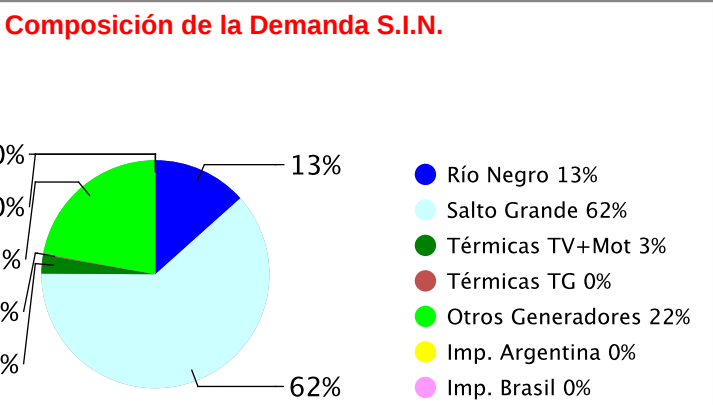


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

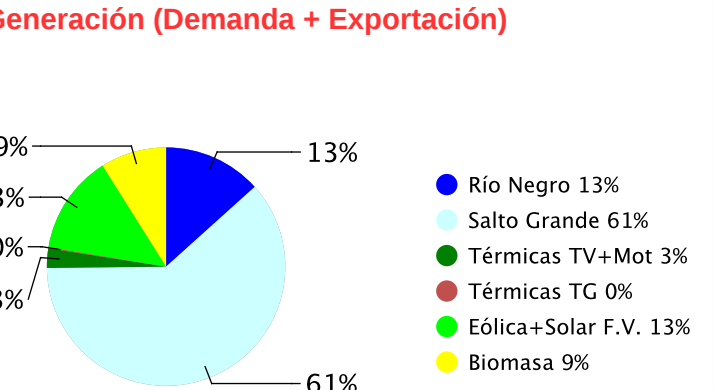



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

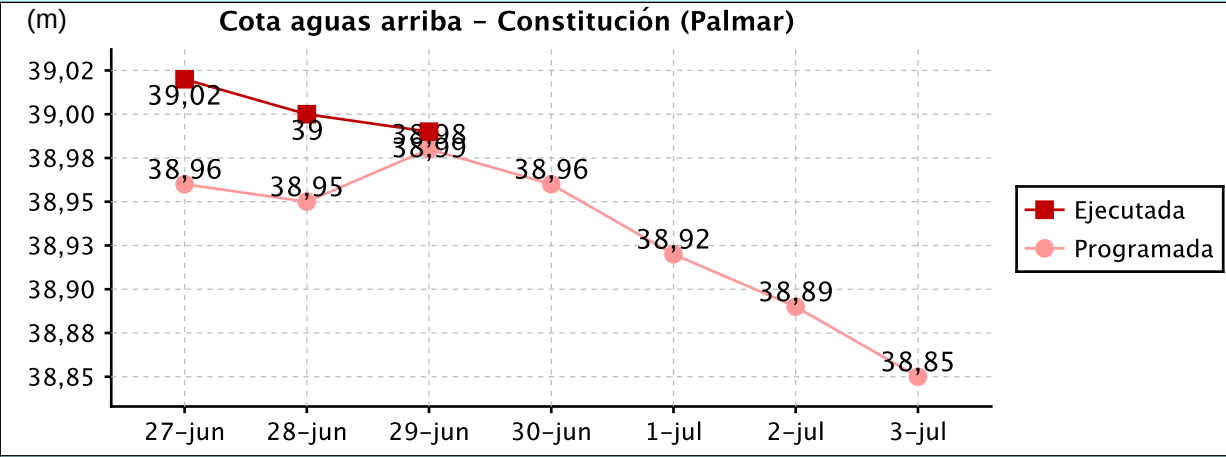
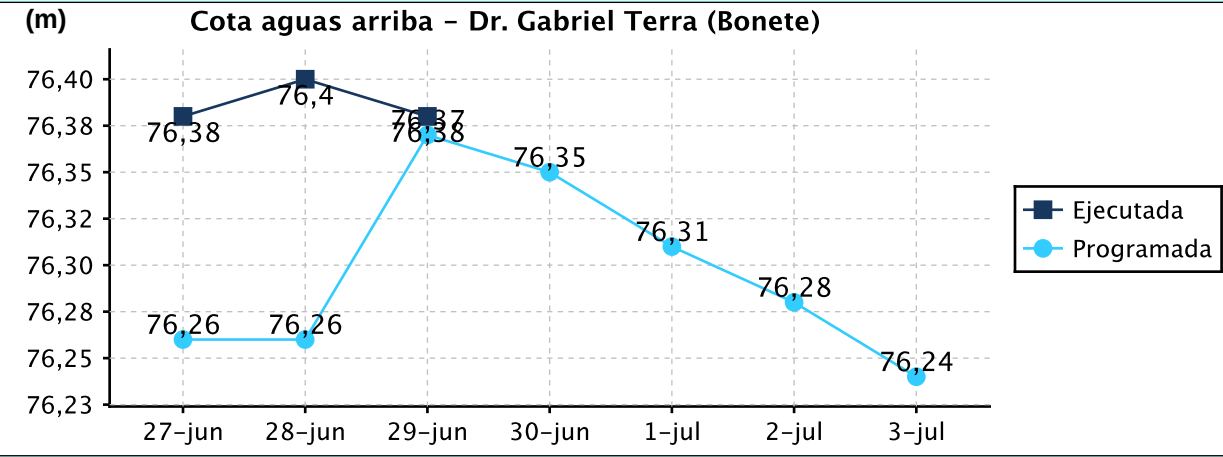


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,37	76,38
Baygorria	53,81	53,68
Palmar	38,98	38,99
SGU	34,73	34,87

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

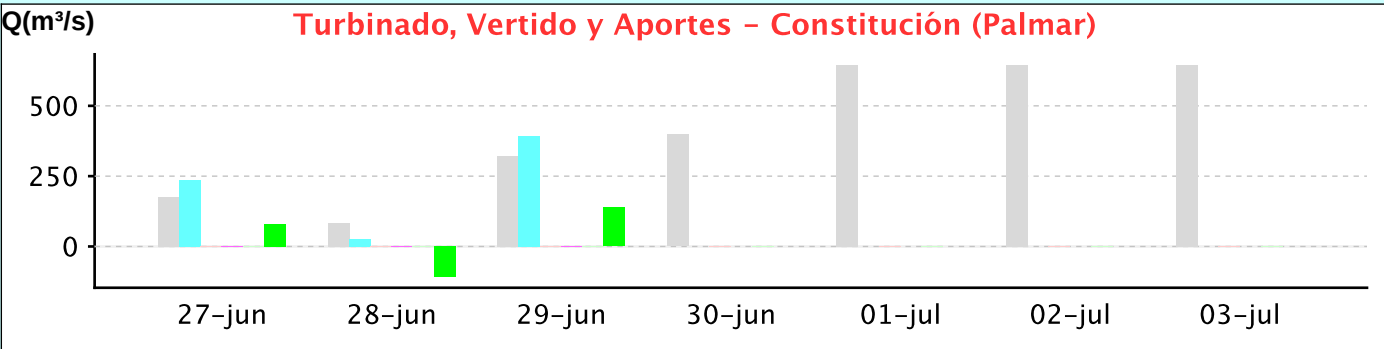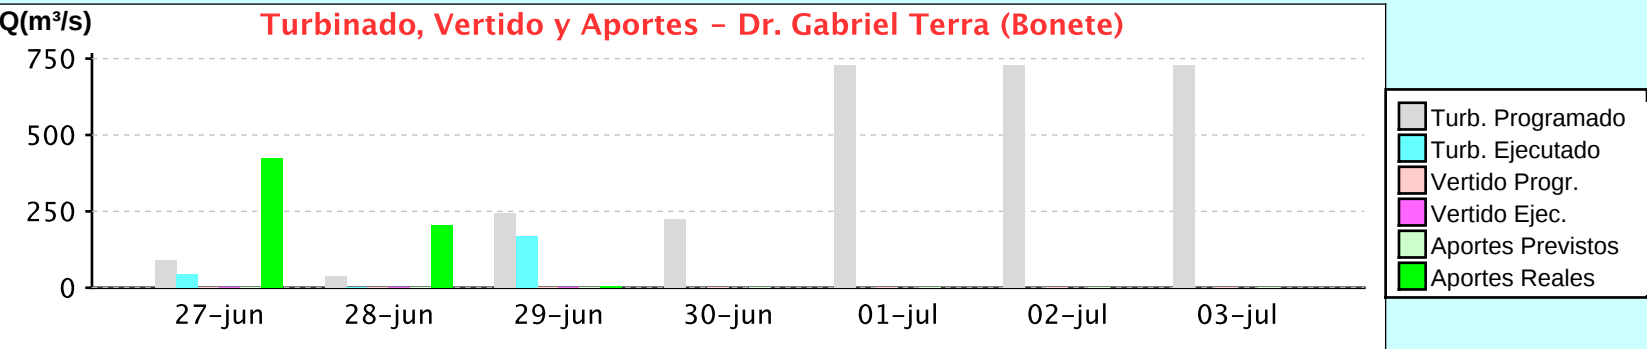

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

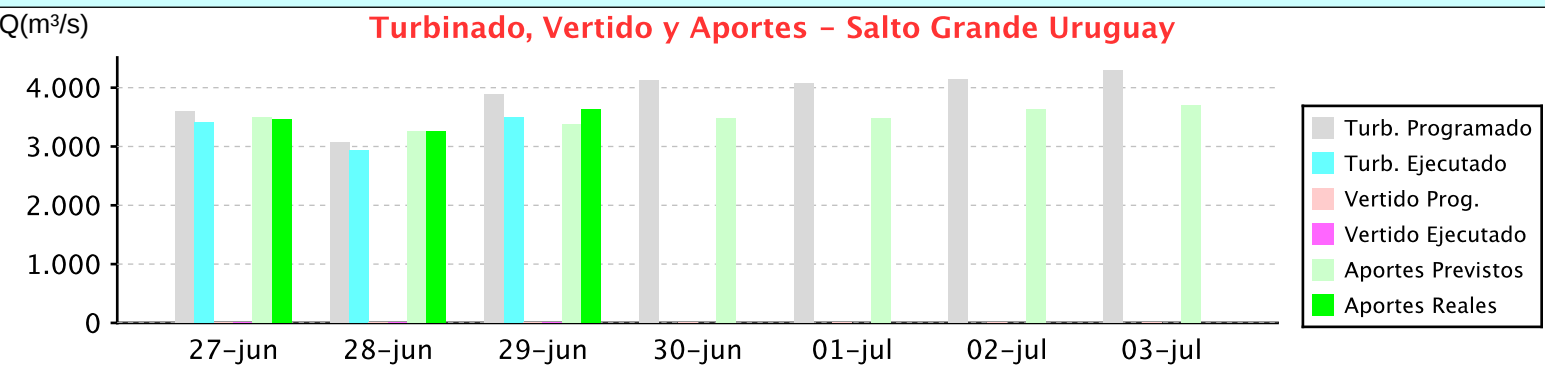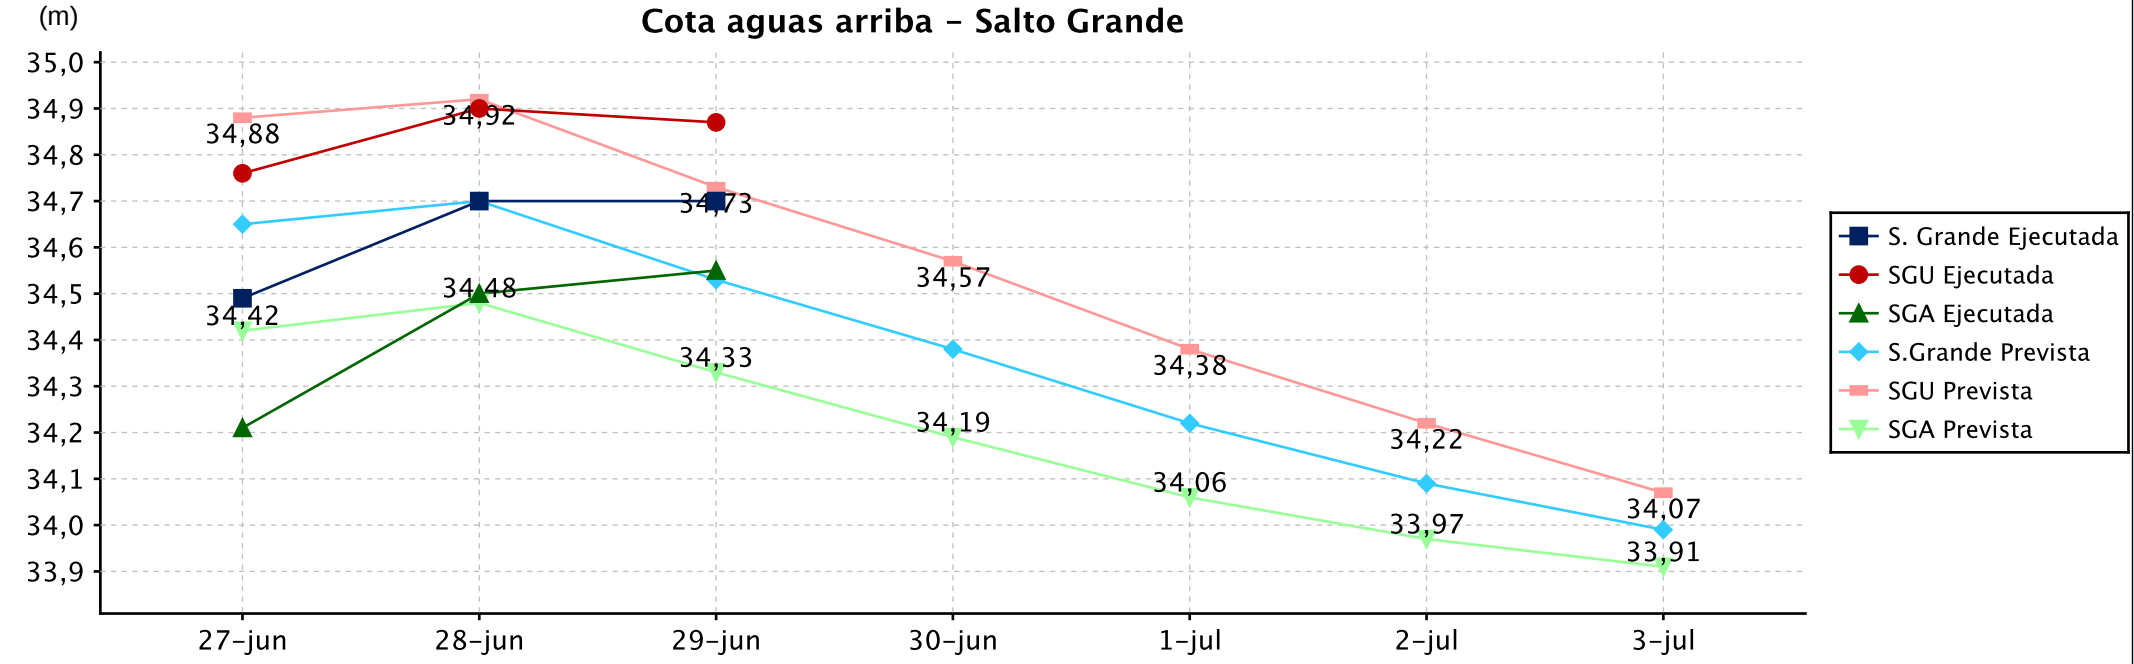

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,87
Cota Vista Arg	34,55
Cota real	34,70
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	7.350

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	243	169
Baygorria	265	233
Palmar	323	393
SGU	3.884	3.490

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	5
Baygorria	0	-92
Palmar	0	139
SGU	3.375	3.632

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
