




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

martes 07 de julio de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	127
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	131
Central La Tablada	-60
Central P. del Tigre	-4
APR A	-2
APR B	362
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	2.225
C. Baygorria	1.675
C. Palmar	2.953
C. Salto Grande	21.030
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	5.960
TOTAL Generación	34.266

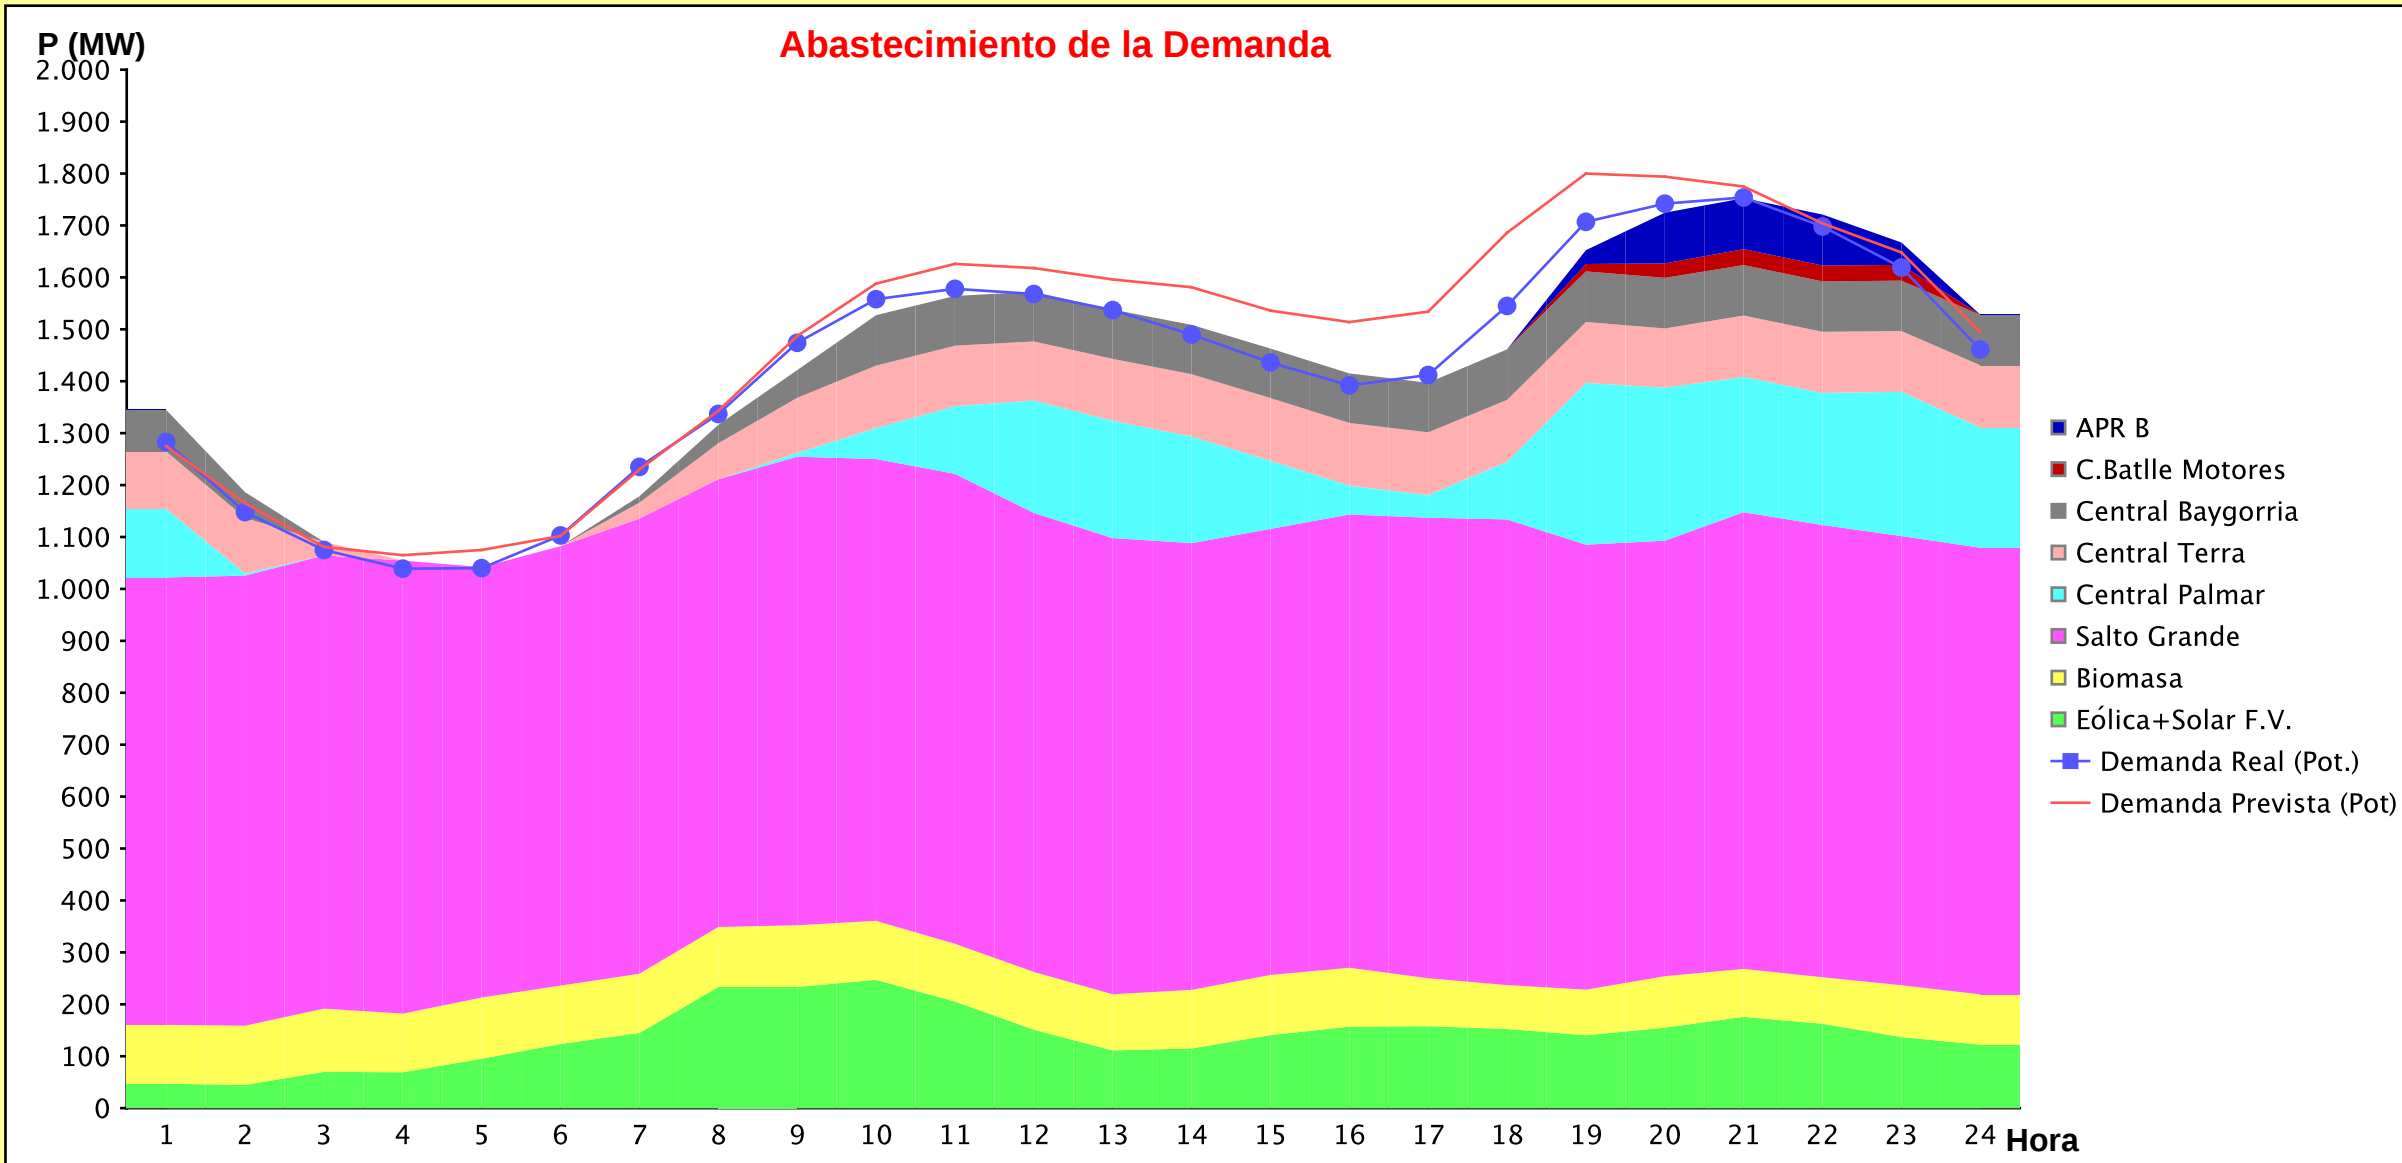

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	134
Hidráulica	134
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	134

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	34.132
(en bormes de generación, incluye pérdidas en la red)	


Demanda Programada (MWh)	35.318
Diferencia (MWh)	-1.186
Ejecutada - Programada	-3,36 %

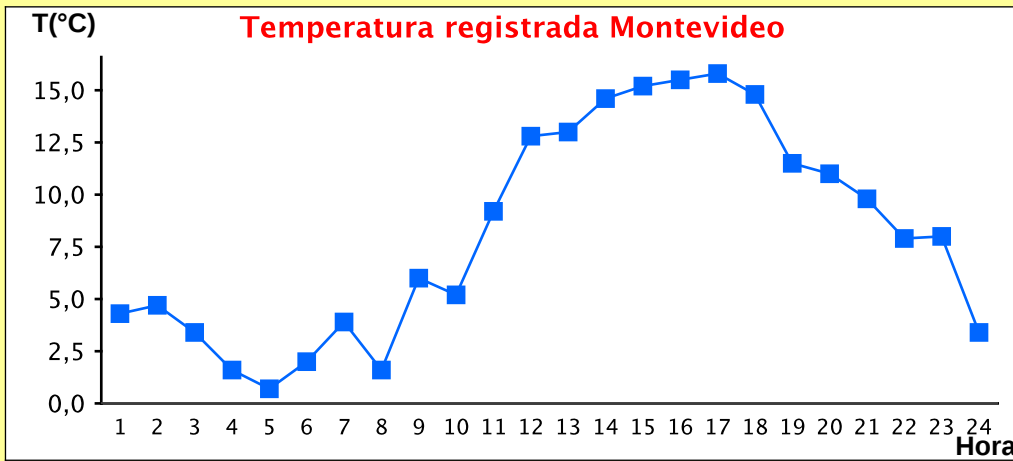

Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1587 Hora 11:25
Potencia mínima:	1032 Hora 04:37
Pico noche:	1770 Hora 20:42



Generación Media (MW)	
Eólica	143,0
Biomasa	107,2
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

Composición de la Demanda S.I.N.

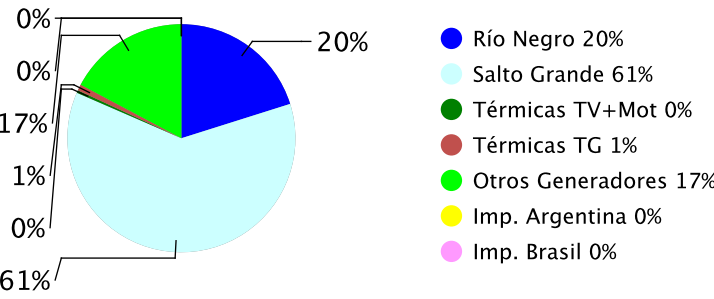



Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

Generación (Demanda + Exportación)

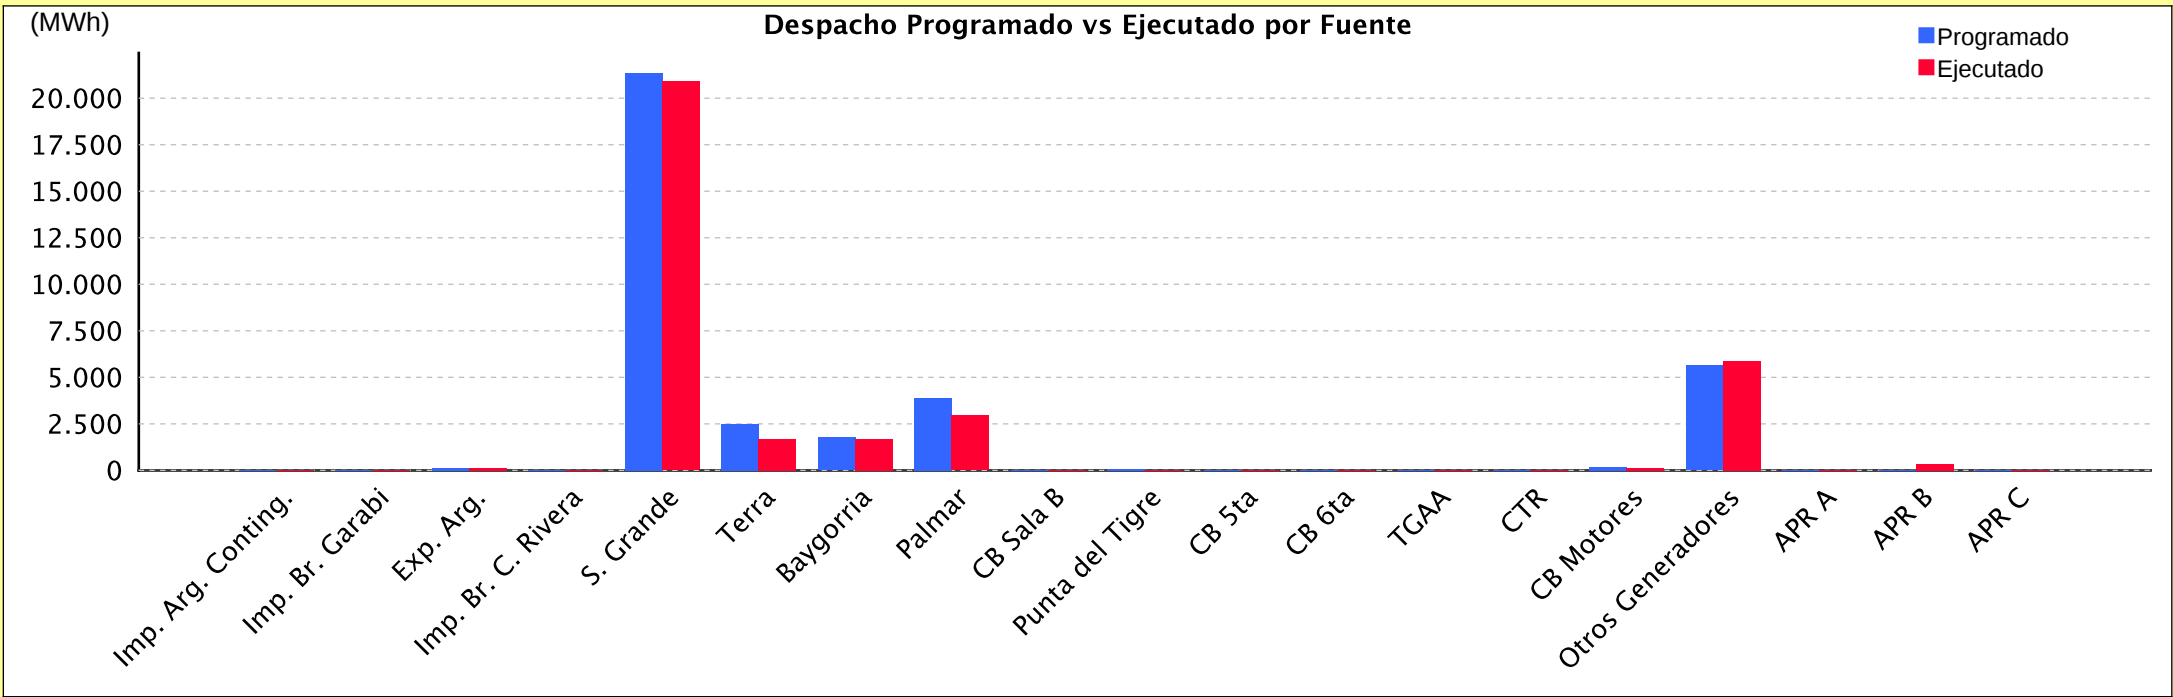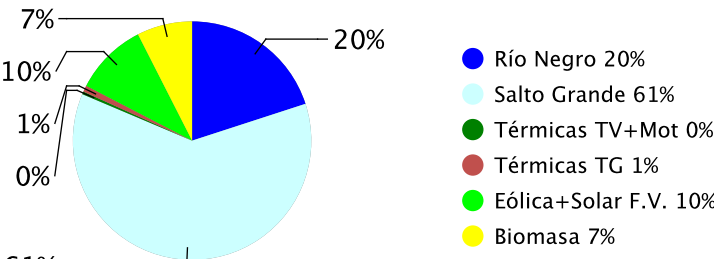



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

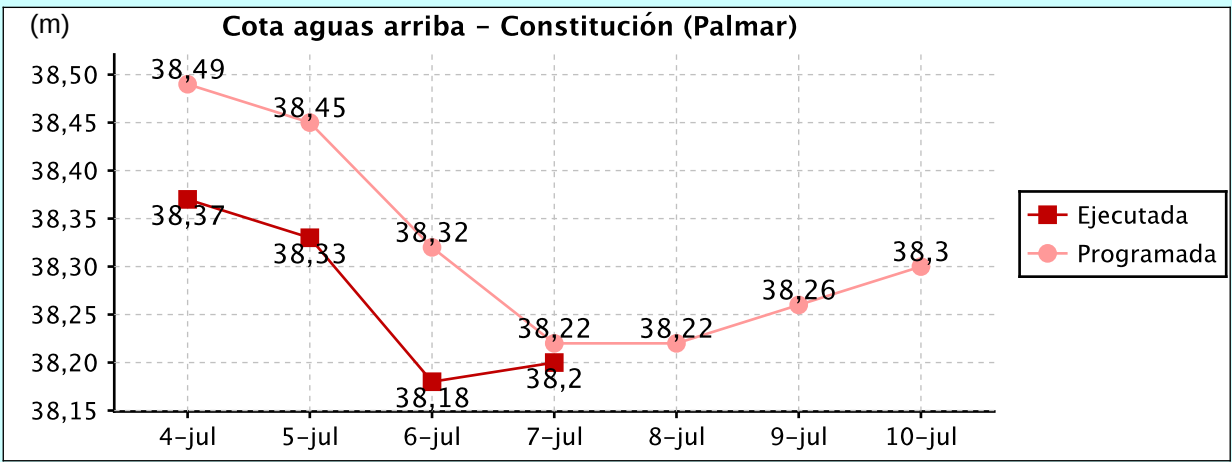
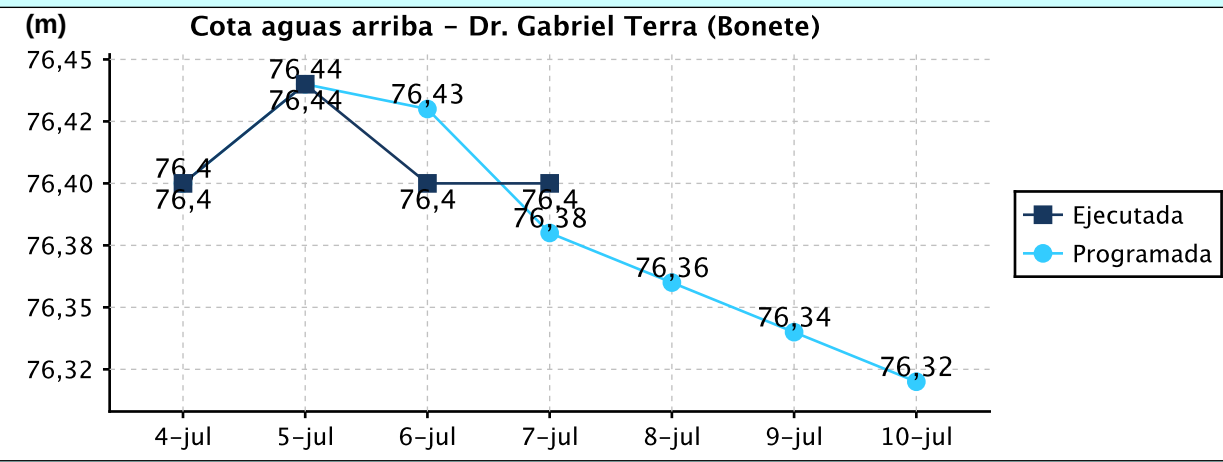


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,38	76,4
Baygorria	53,63	53,62
Palmar	38,22	38,2
SGU	35,29	35,22

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

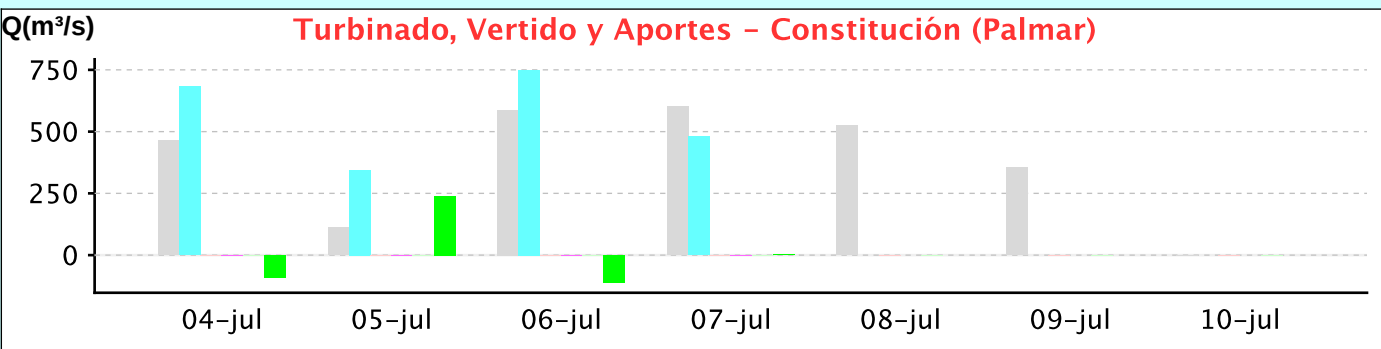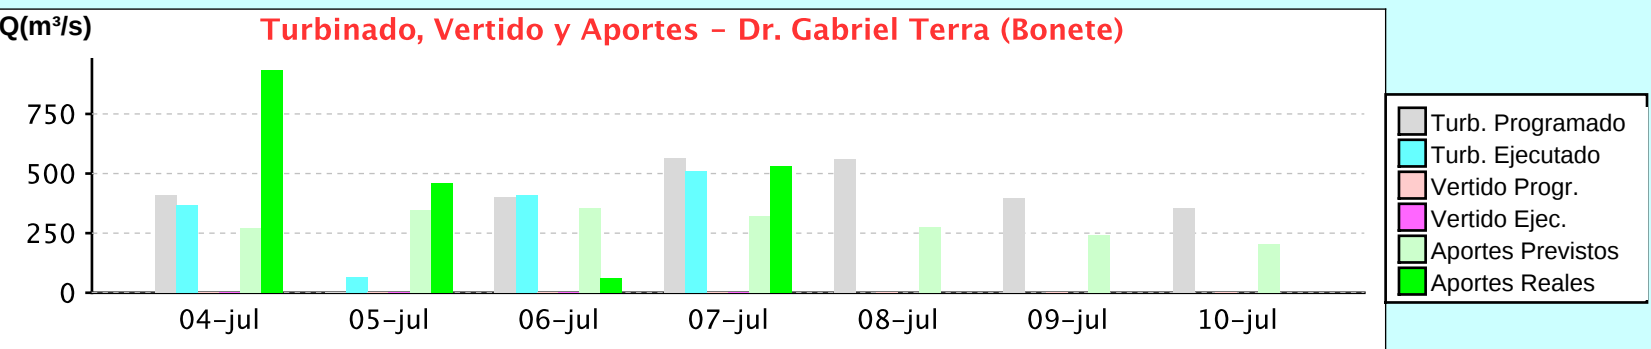

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

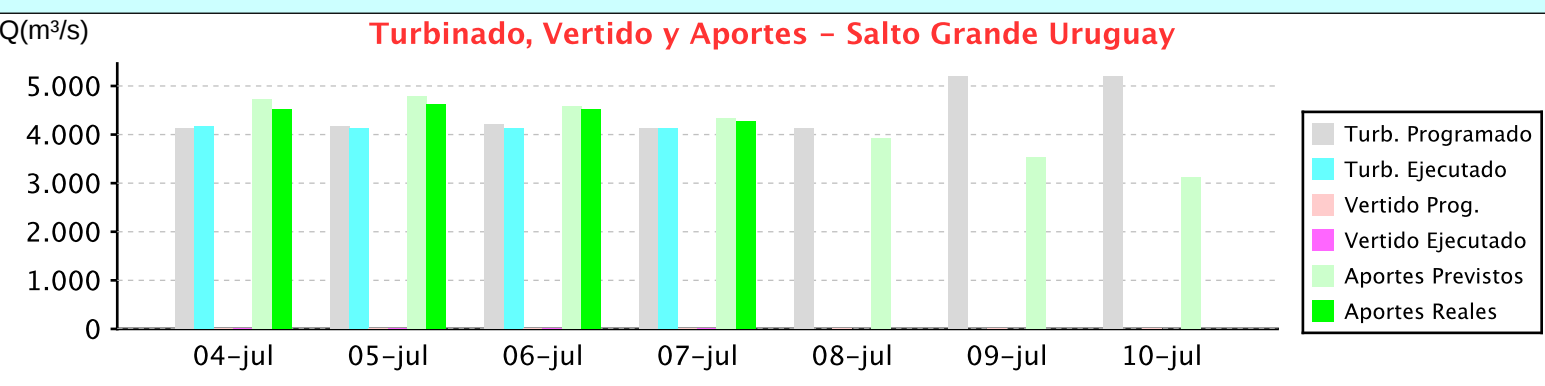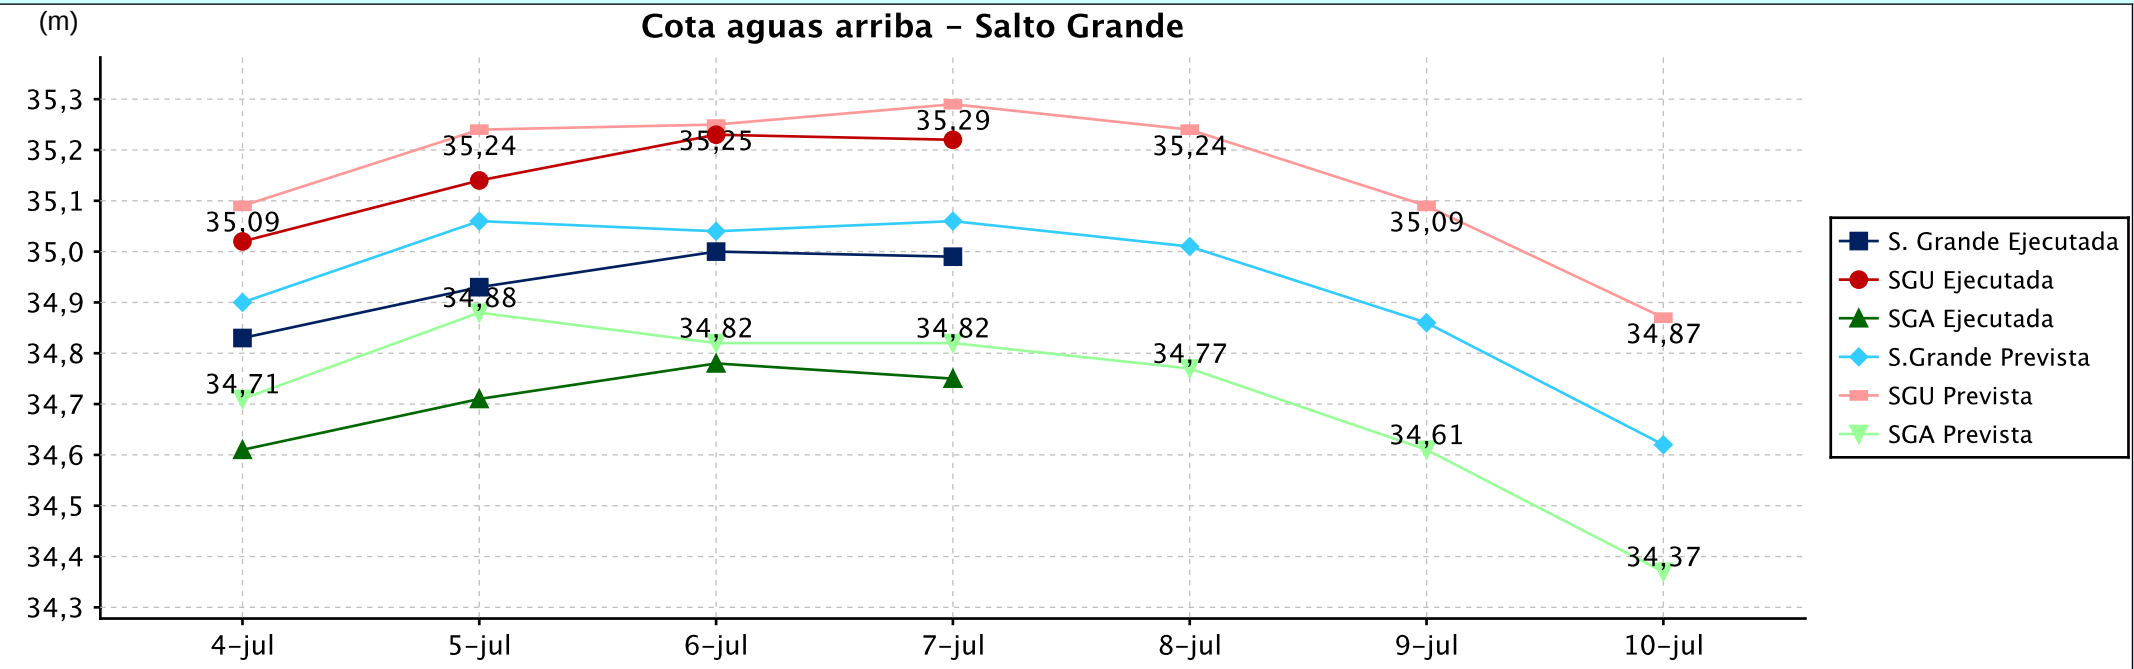

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,22
Cota Vista Arg	34,75
Cota real	34,99
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
11.184	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	565	508
Baygorria	613	548
Palmar	601	482
SGU	4.124	4.132

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	319	530
Baygorria	0	1
Palmar	0	3
SGU	4.325	4.264

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
