




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

jueves 09 de julio de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	362
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	366
Central La Tablada	-43
Central P. del Tigre	-3
APR A	102
APR B	402
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	2.253
C. Baygorria	1.520
C. Palmar	4.151
C. Salto Grande	20.430
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	4.101
TOTAL Generación	33.275

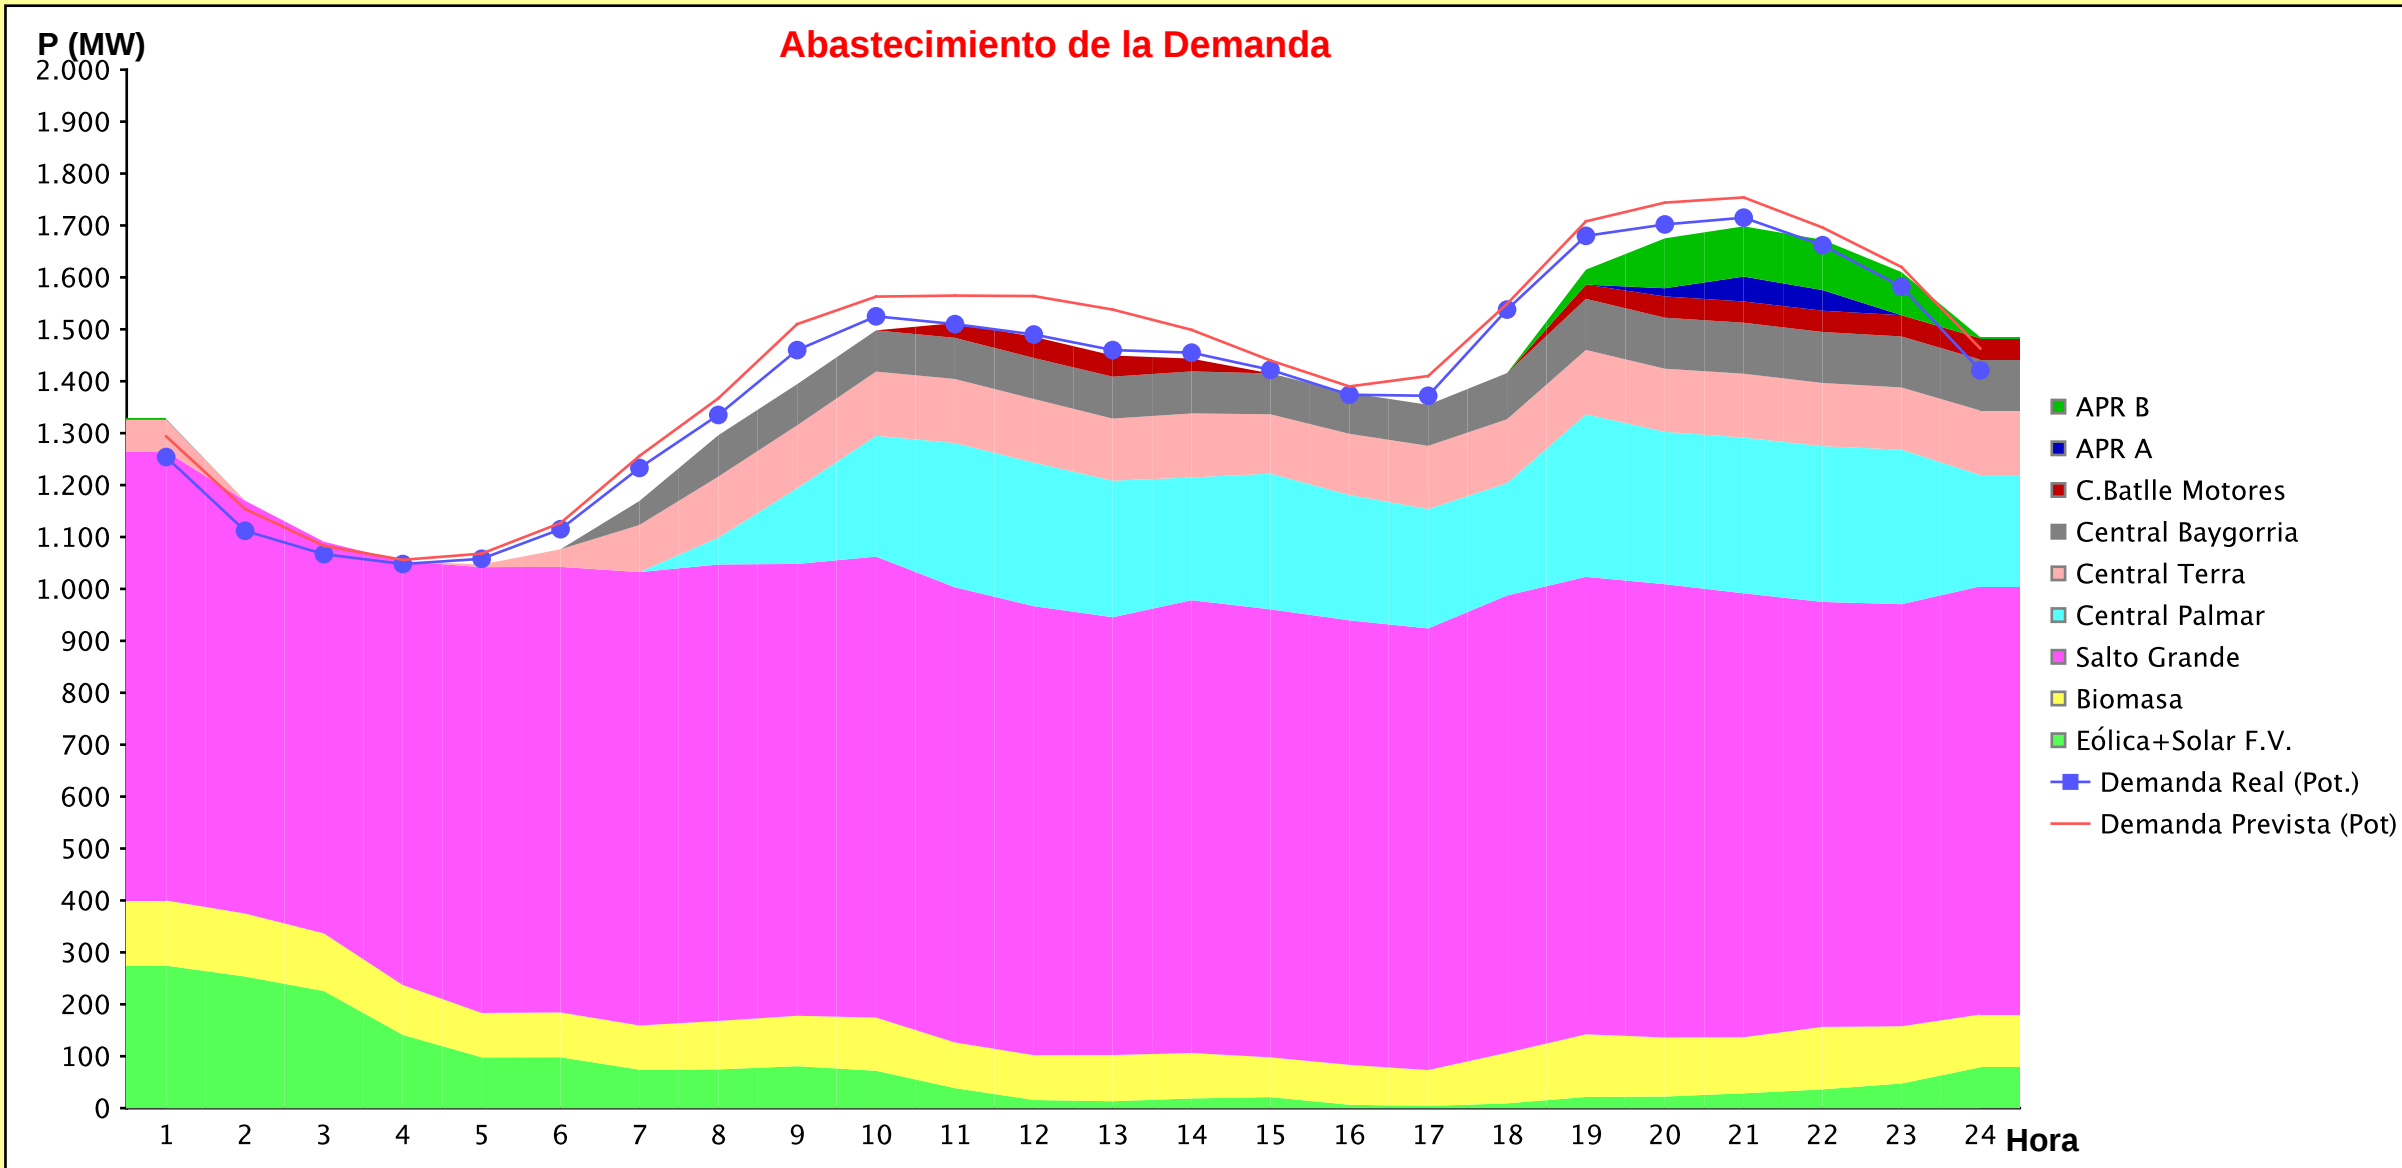

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	33.275
(en bormes de generación, incluye pérdidas en la red)	


Demanda Programada (MWh)	34.418
Diferencia (MWh)	-1.143
Ejecutada - Programada	-3,32 %

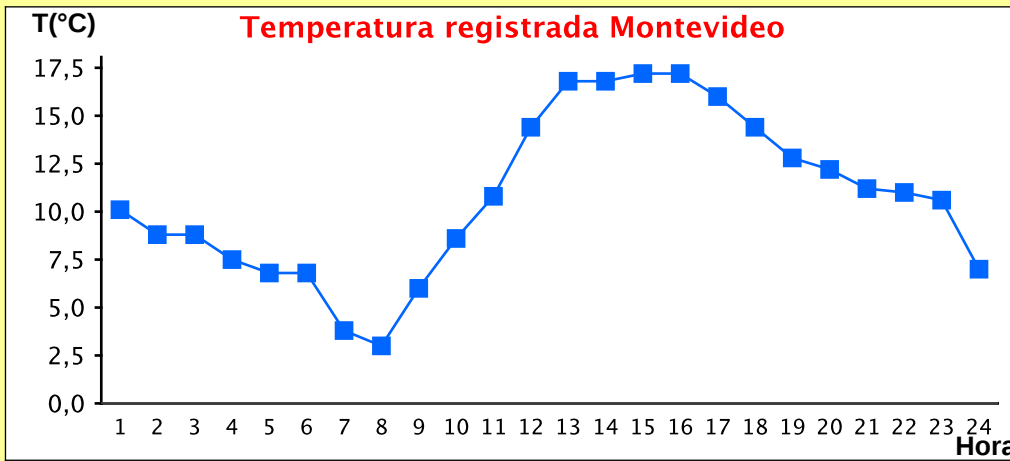

Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1528 Hora 10:16
Potencia mínima:	1030 Hora 03:50
Pico noche:	1721 Hora 20:41



Generación Media (MW)	
Eólica	74,6
Biomasa	98,1
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

Composición de la Demanda S.I.N.

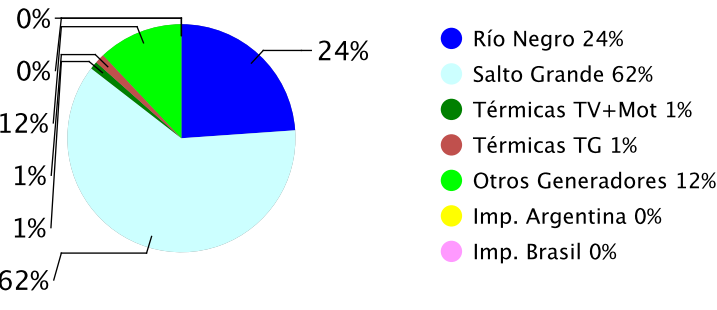



Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

Generación (Demanda + Exportación)

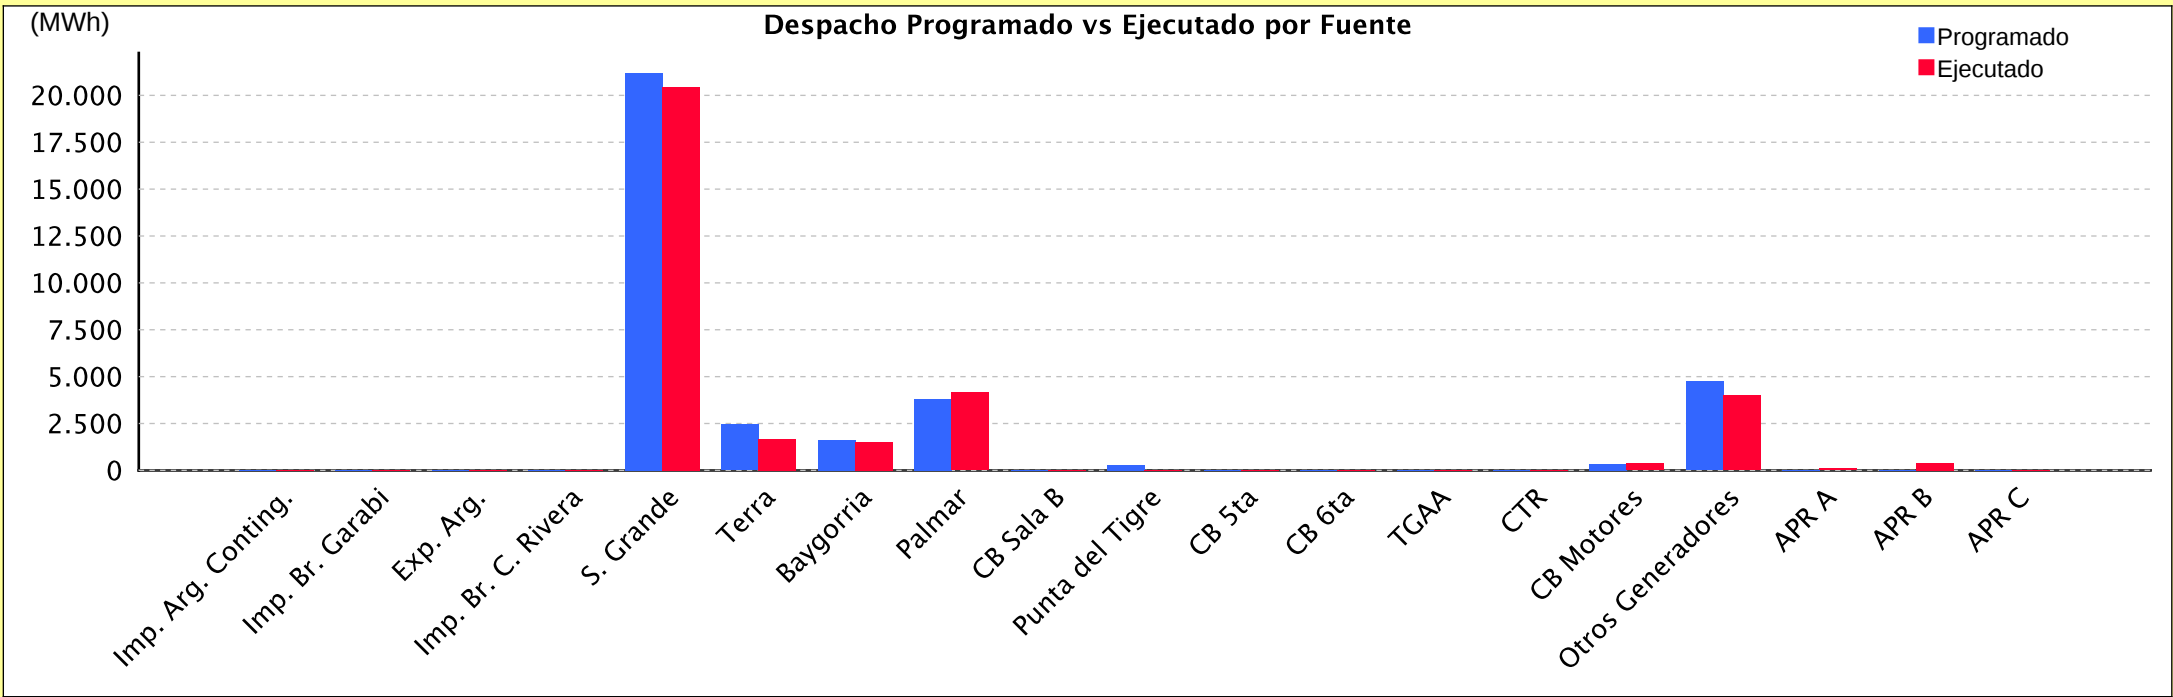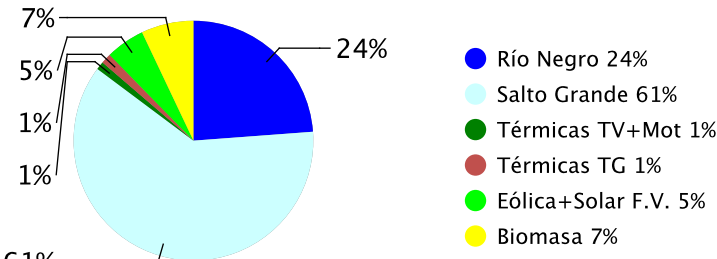



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

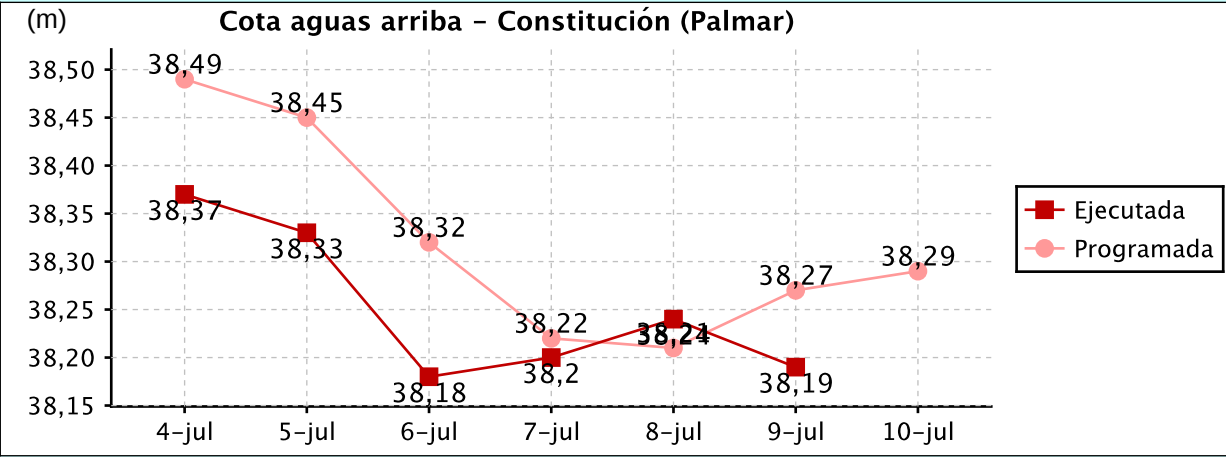
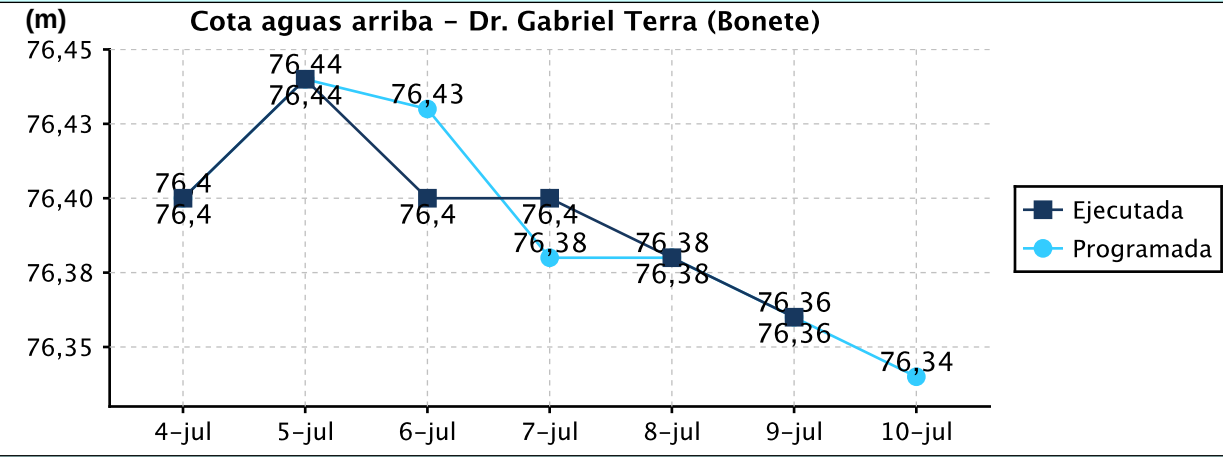


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,36	76,36
Baygorria	53,64	53,64
Palmar	38,27	38,19
SGU	35,03	34,99

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

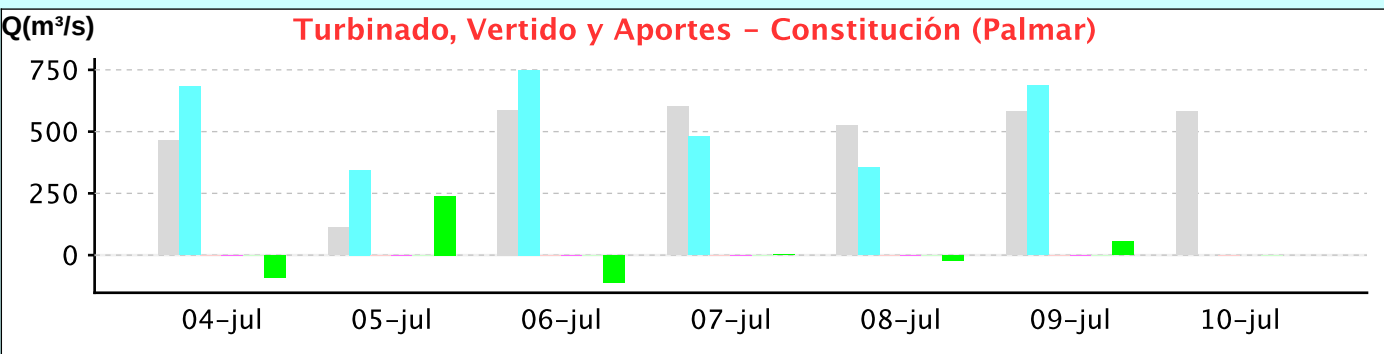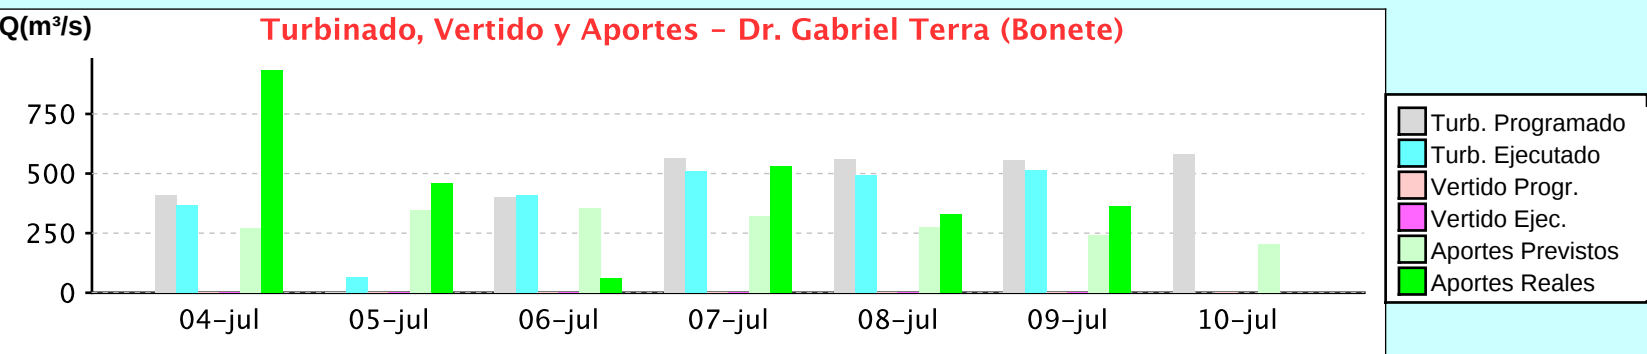

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

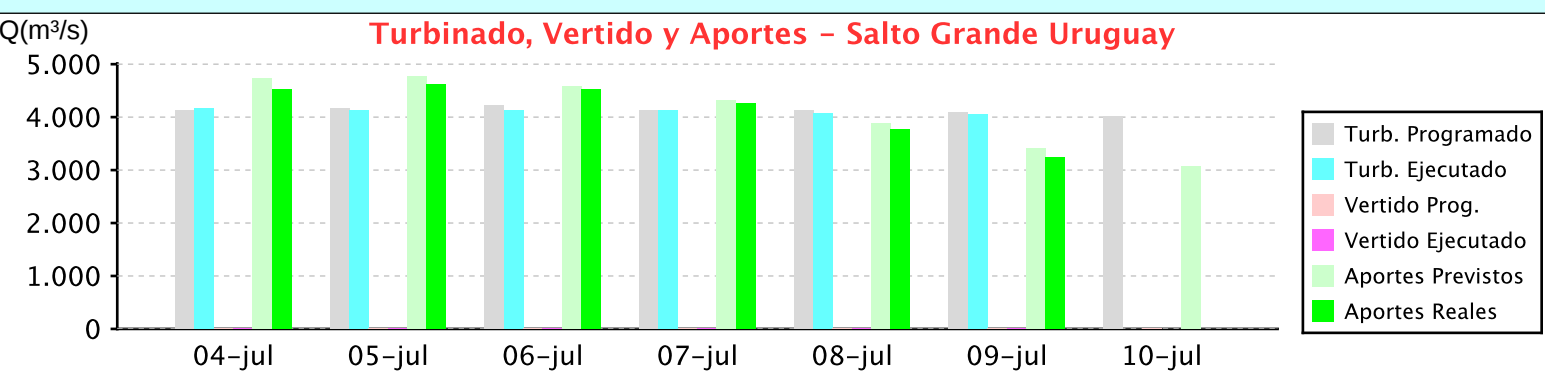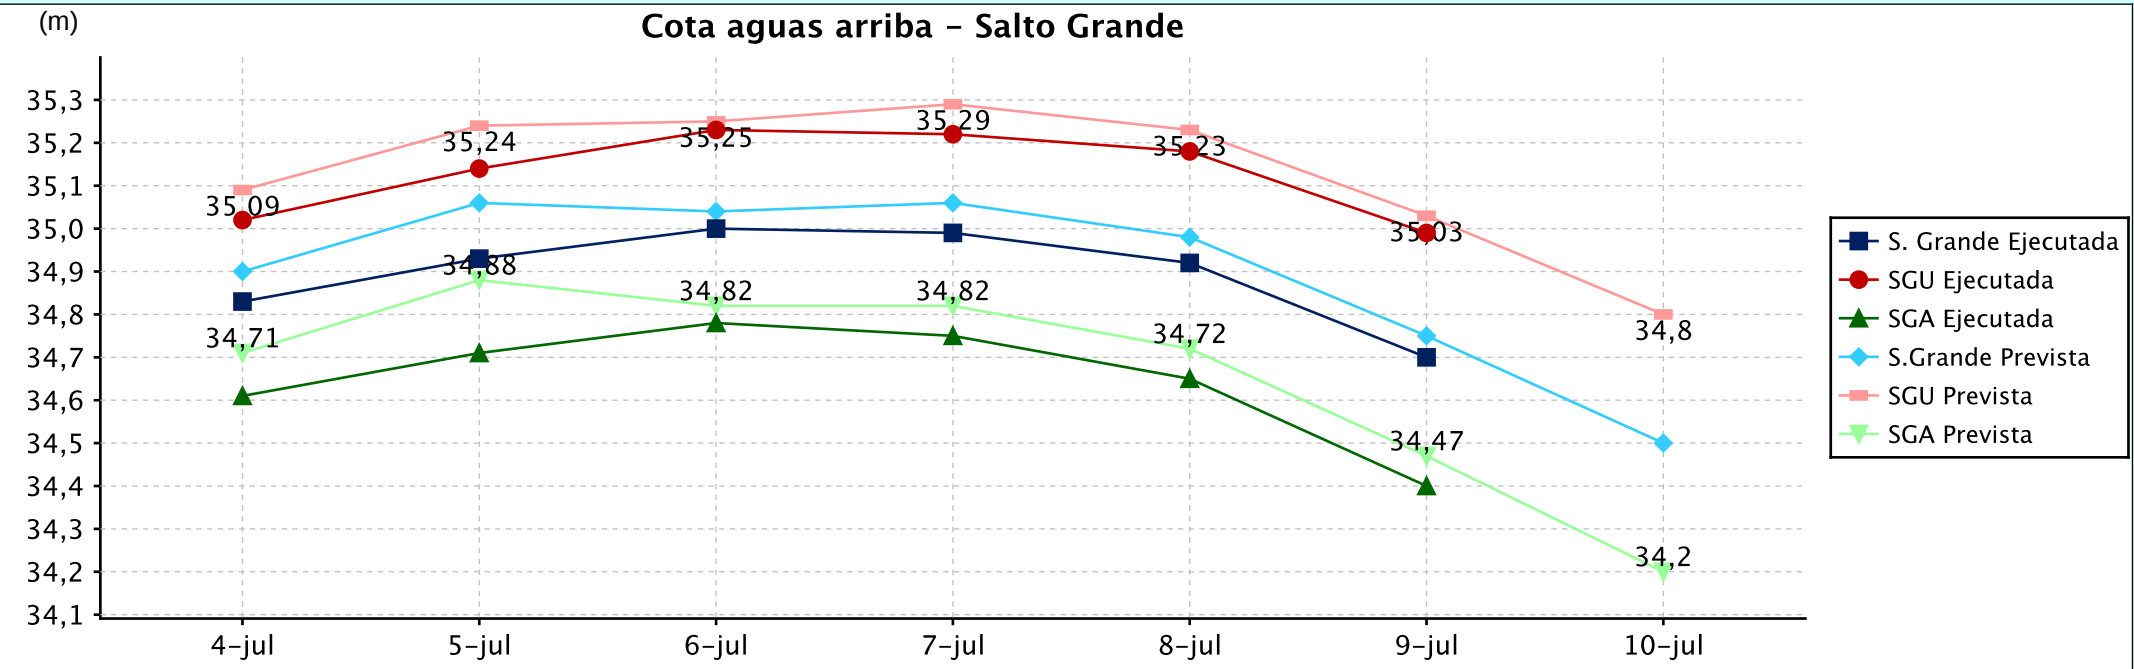

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,99
Cota Vista Arg	34,40
Cota real	34,70
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	13.298

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	558	516
Baygorria	568	492
Palmar	583	685
SGU	4.093	4.042

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	241	364
Baygorria	0	-6
Palmar	0	55
SGU	3.400	3.232

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

INFORME PRELIMINAR: POR FERIADO ARGENTINO, LOS DATOS DE INTERCAMBIOS Y DE SALTO GRANDE SERAN MODIFICADOS

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

10/07/2015 14:45
