




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

domingo 12 de julio de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	0
Central La Tablada	-87
Central P. del Tigre	-3
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	714
C. Baygorria	280
C. Palmar	129
C. Salto Grande	19.914
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	8.442
TOTAL Generación	29.380

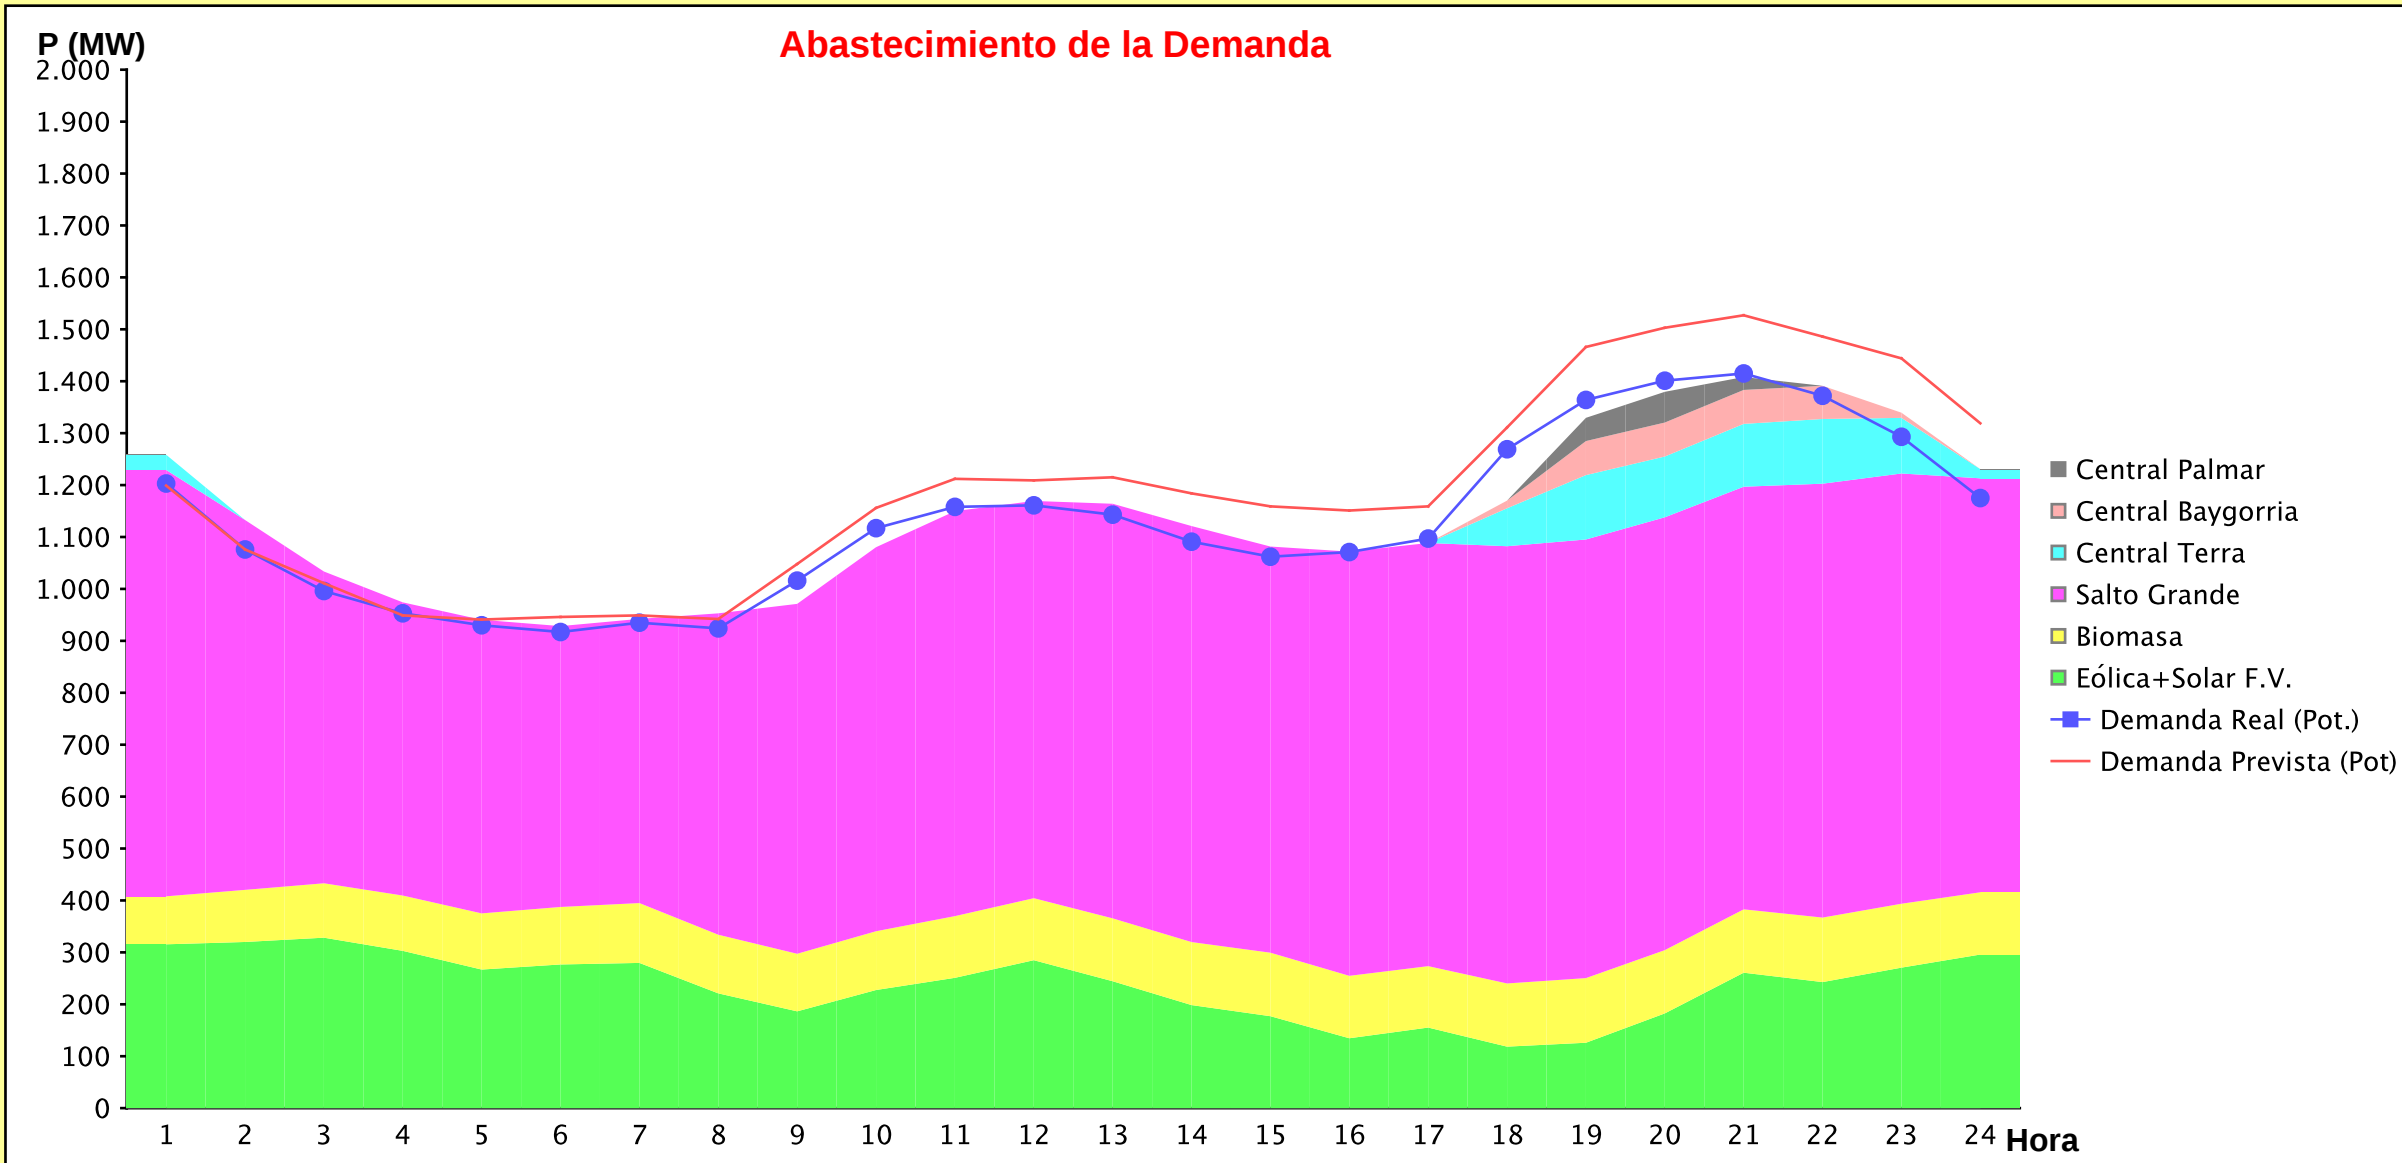

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	2.174
Hidráulica	2.174
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	2.174

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	27.206
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	


Demanda Programada (MWh)	28.562
Diferencia (MWh)	-1.356
Ejecutada - Programada	-4,75 %

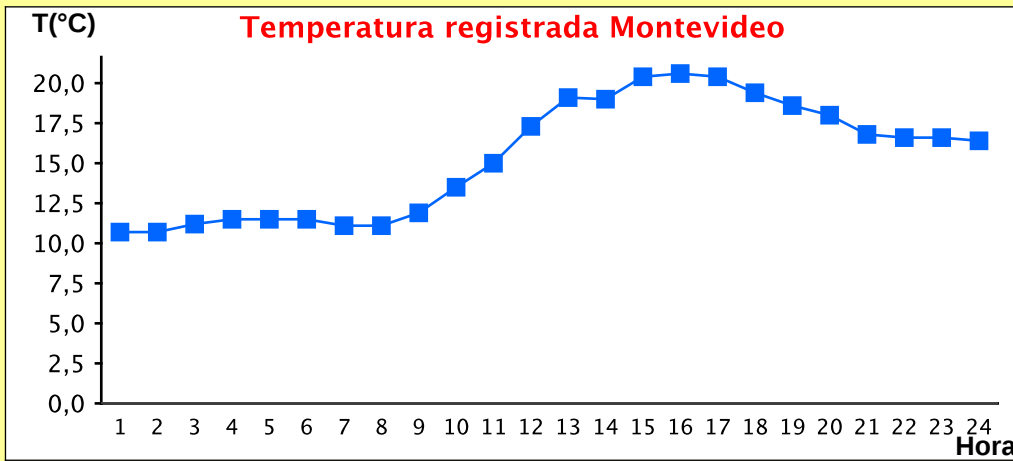

Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1174 Hora 11:07
Potencia mínima:	919 Hora 07:58
Pico noche:	1418 Hora 20:28


Generación Media (MW)	
Eólica	235,3
Biomasa	115,8
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

Composición de la Demanda S.I.N.

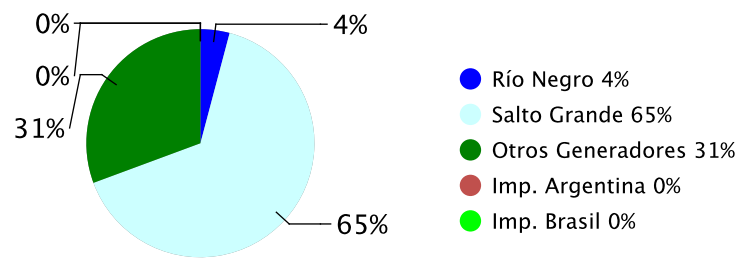



Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

Generación (Demanda + Exportación)

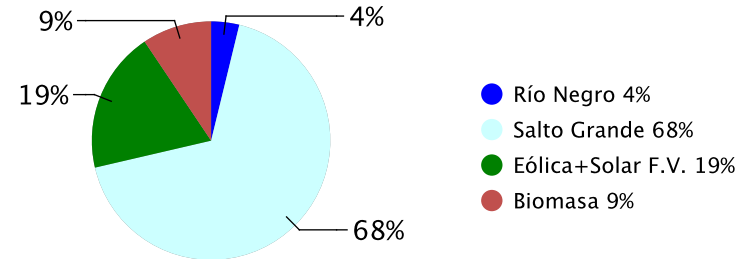



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

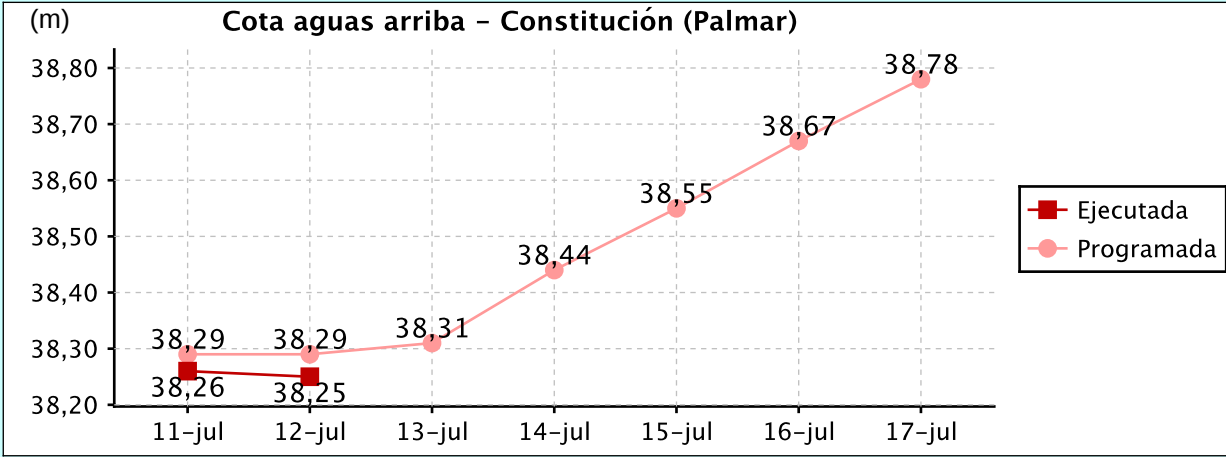
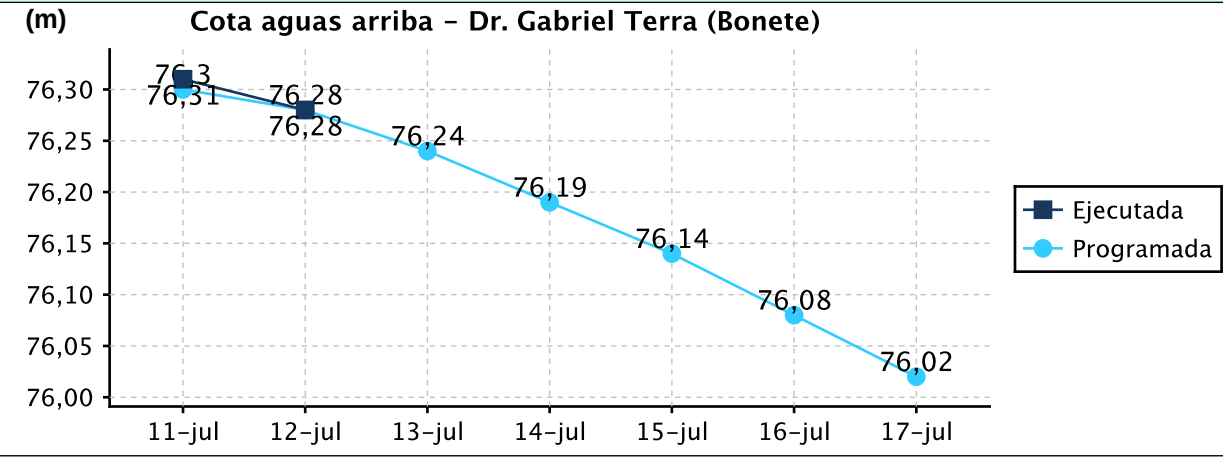


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,28	76,28
Baygorria	53,85	53,72
Palmar	38,29	38,25
SGU	34,32	34,41

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

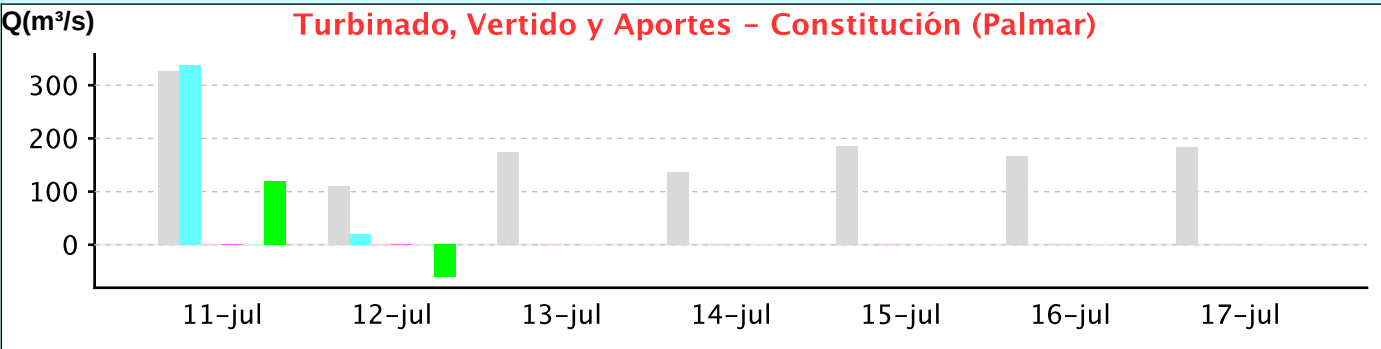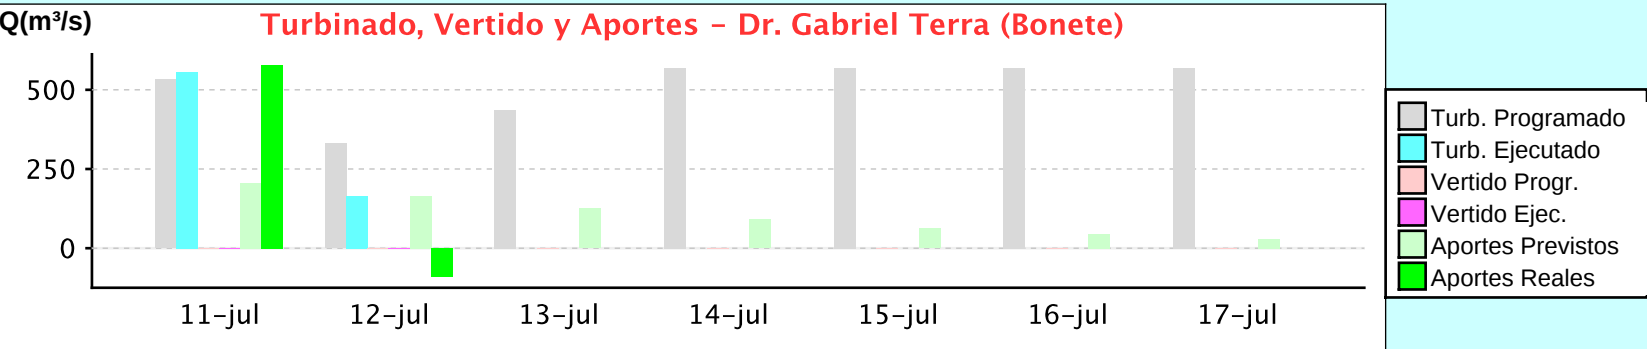

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

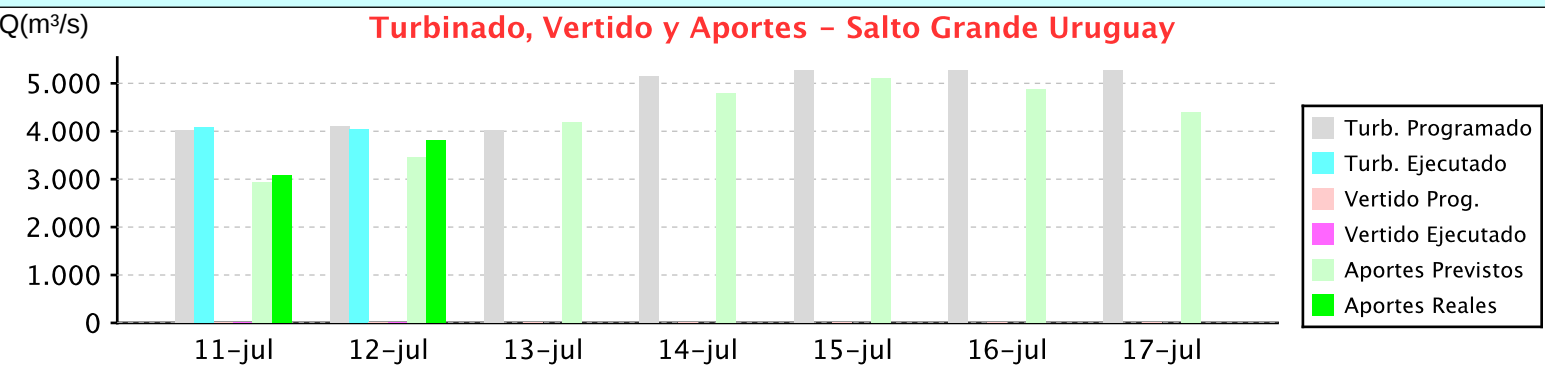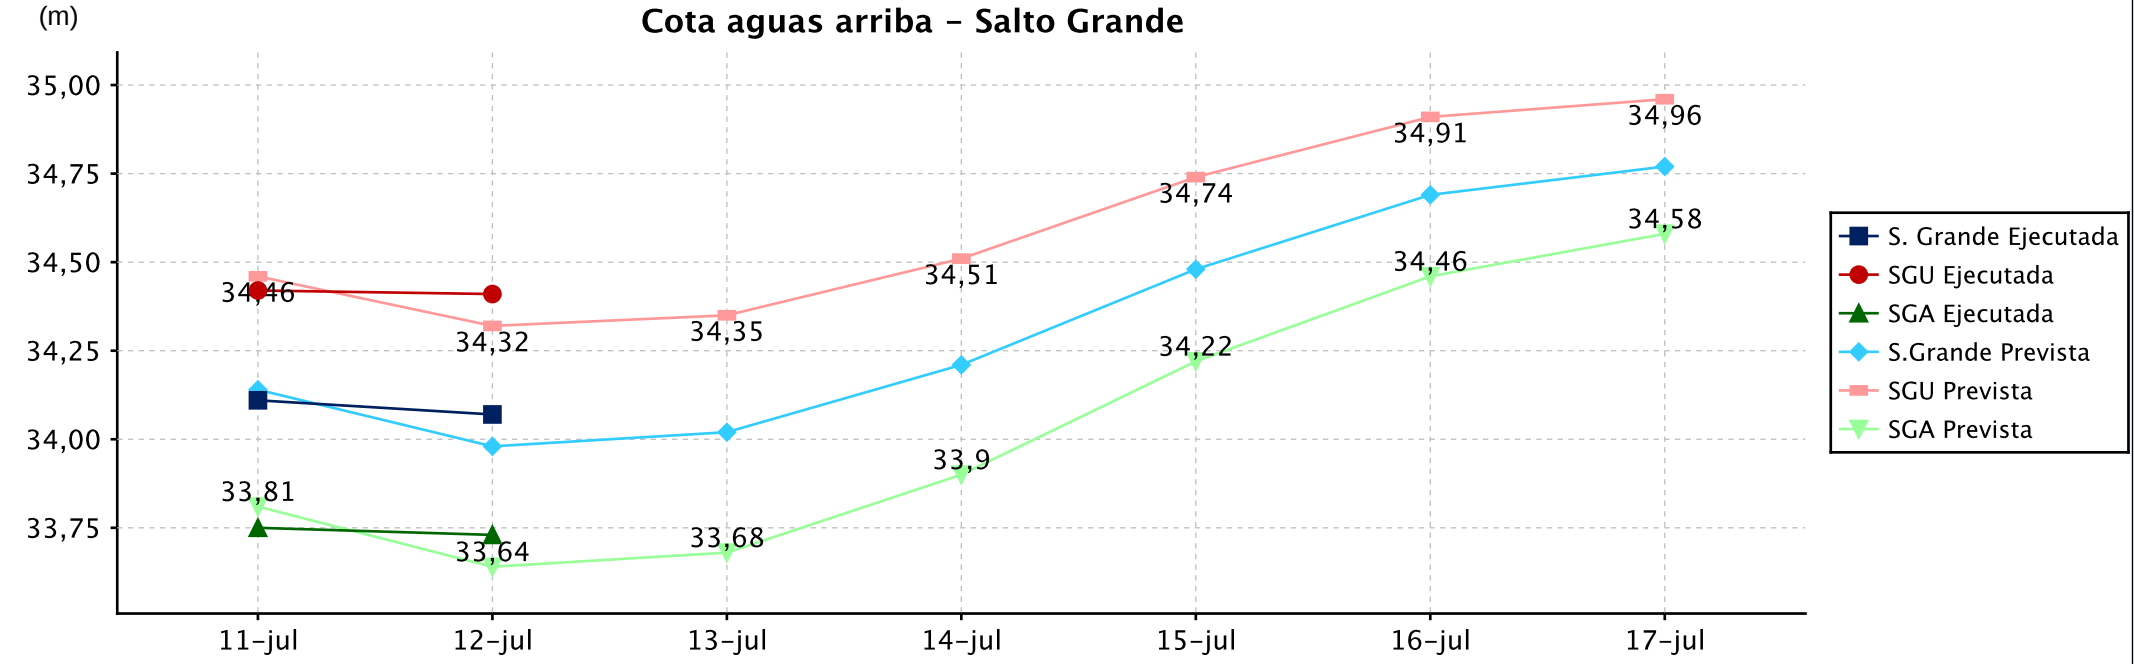

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,41
Cota Vista Arg	33,73
Cota real	34,07
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
14.276	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	331	165
Baygorria	158	94
Palmar	110	20
SGU	4.107	4.047

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	165	-91
Baygorria	0	63
Palmar	0	-61
SGU	3.450	3.808

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
