




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


miércoles 15 de julio de 2015

Generación Térmica	
Central Battle	599
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	603
Central La Tablada	121
Central P. del Tigre	-3
APR A	311
APR B	534
APR C	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	2.349
C. Baygorria	1.739
C. Palmar	4.362
C. Salto Grande	20.503
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	4.037
TOTAL Generación	34.552



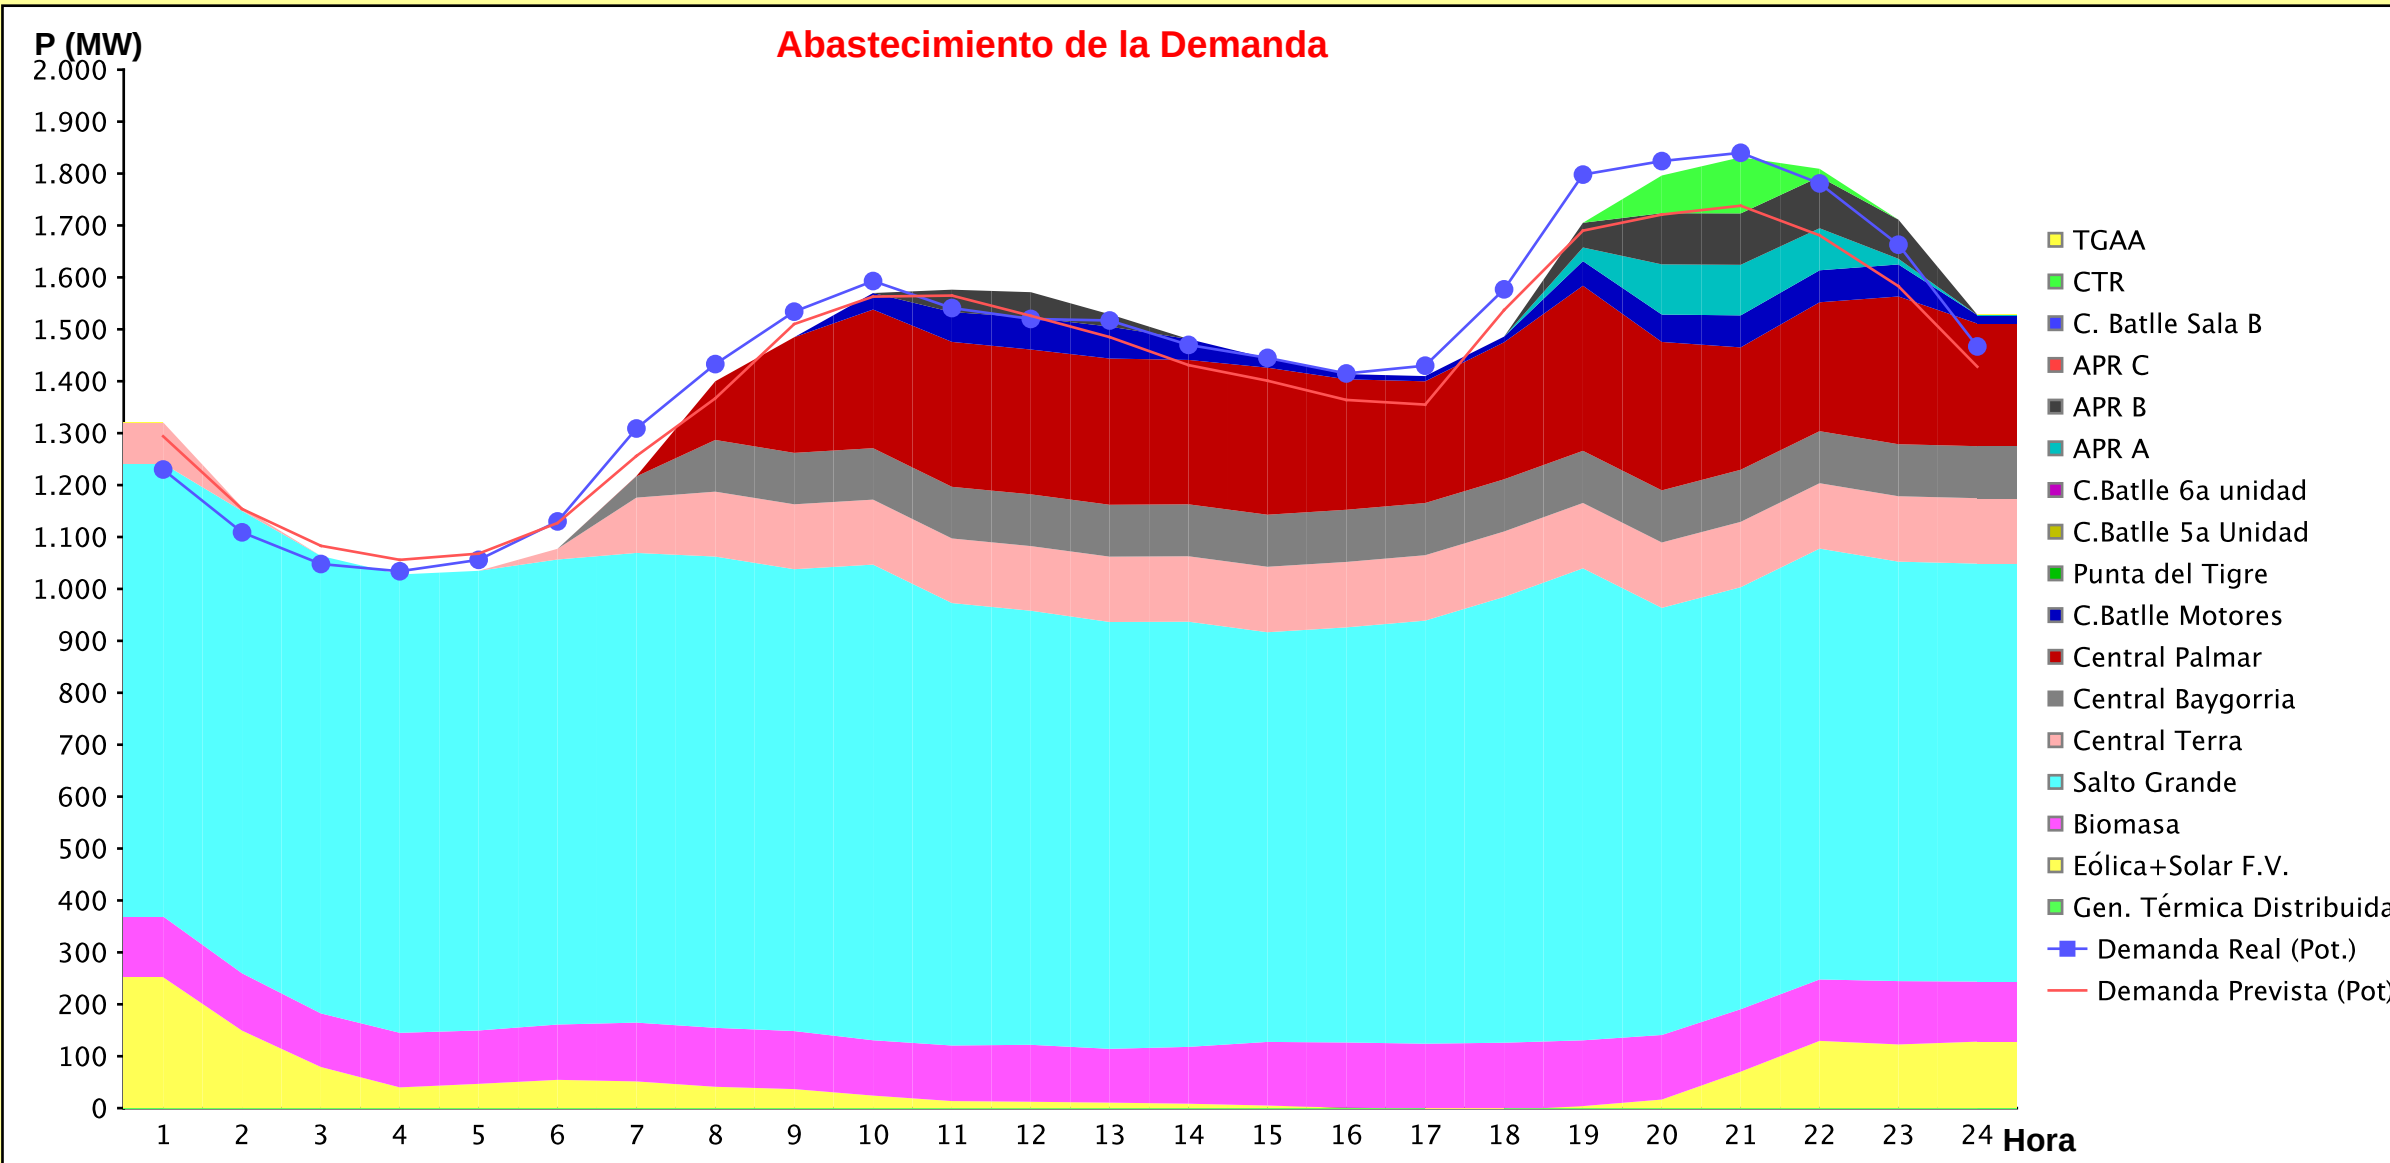


Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	34.552
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	33.983
Diferencia (MWh)	569
Ejecutada - Programada	1,67 %


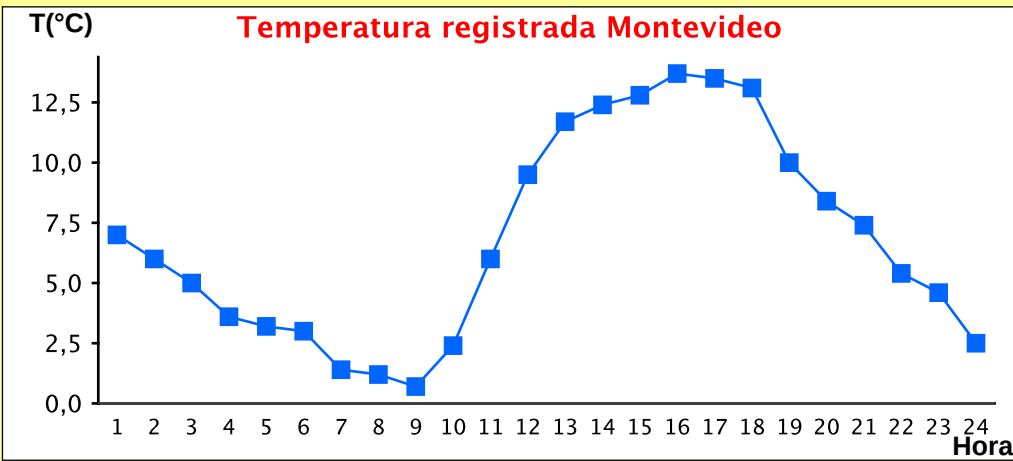


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1597 Hora 10:18
Potencia mínima:	1020 Hora 03:40
Pico noche:	1859 Hora 20:54
Generación Media (MW)	
Eólica	55,7
Biomasa	114,4
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

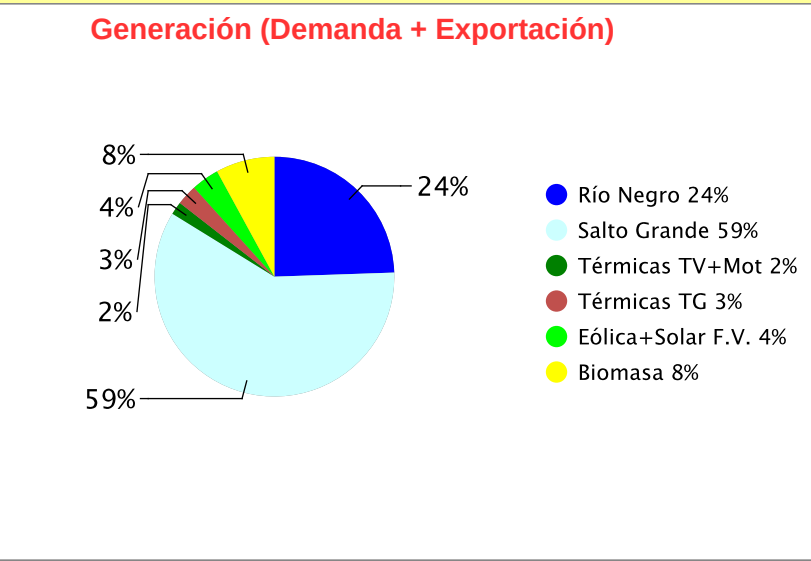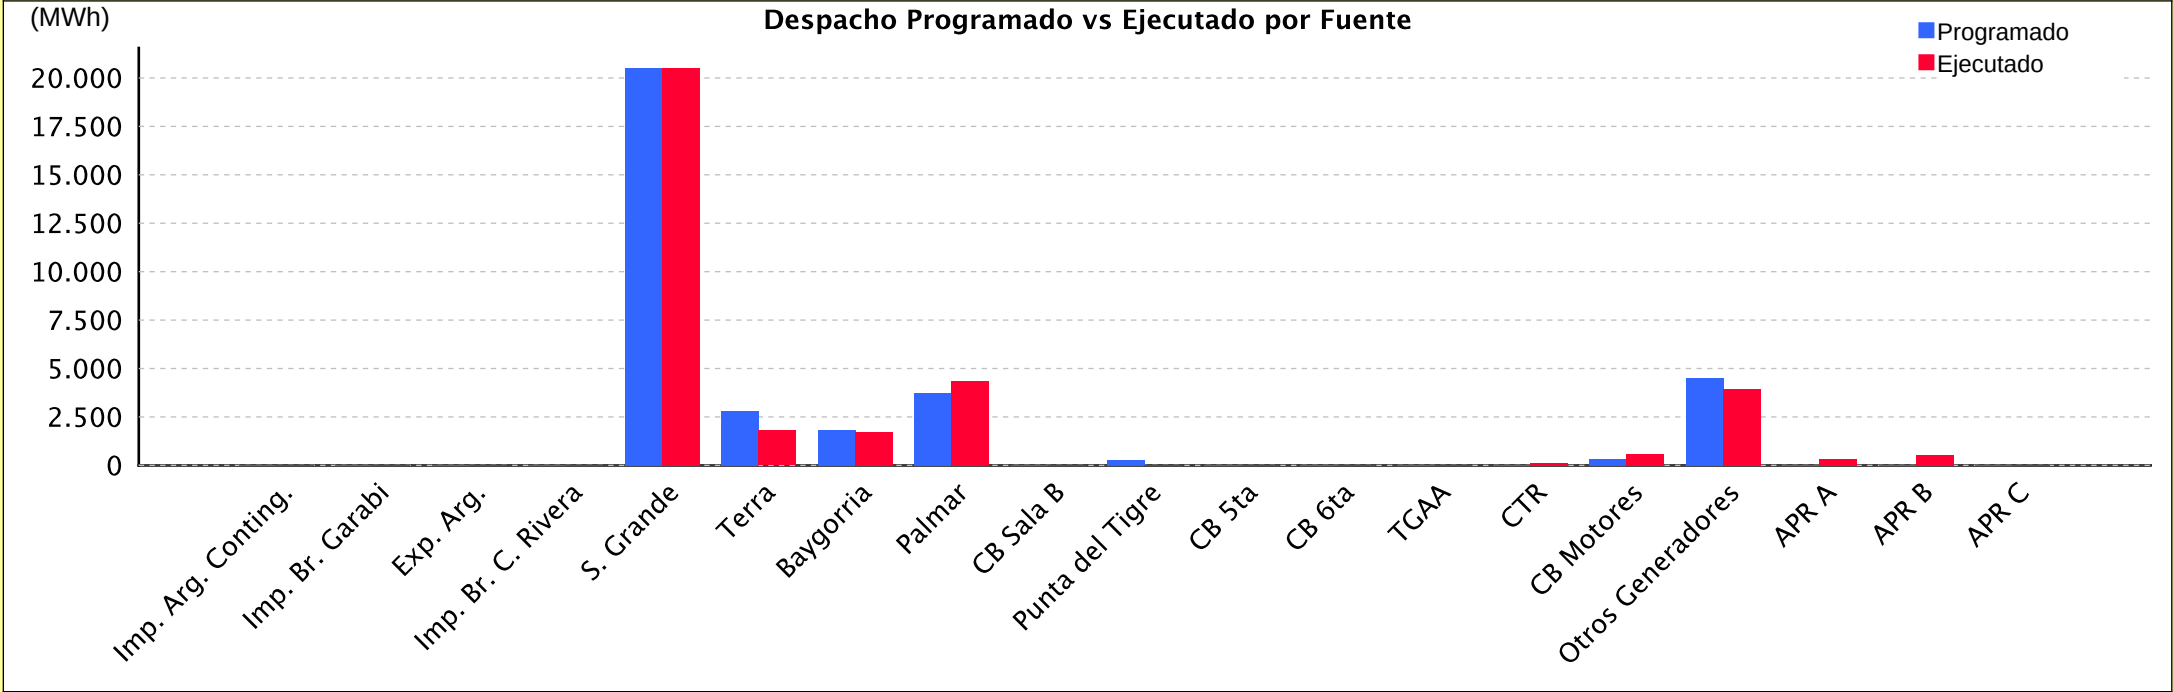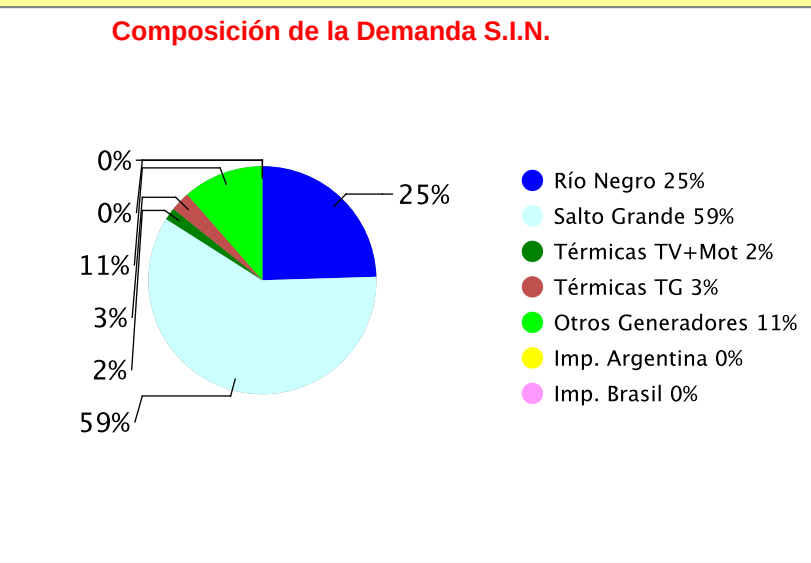



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

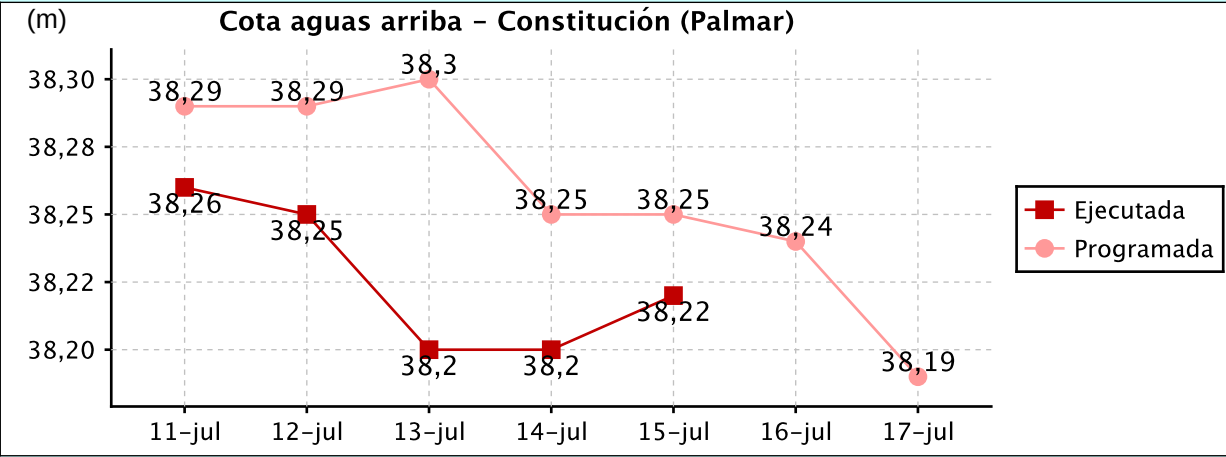
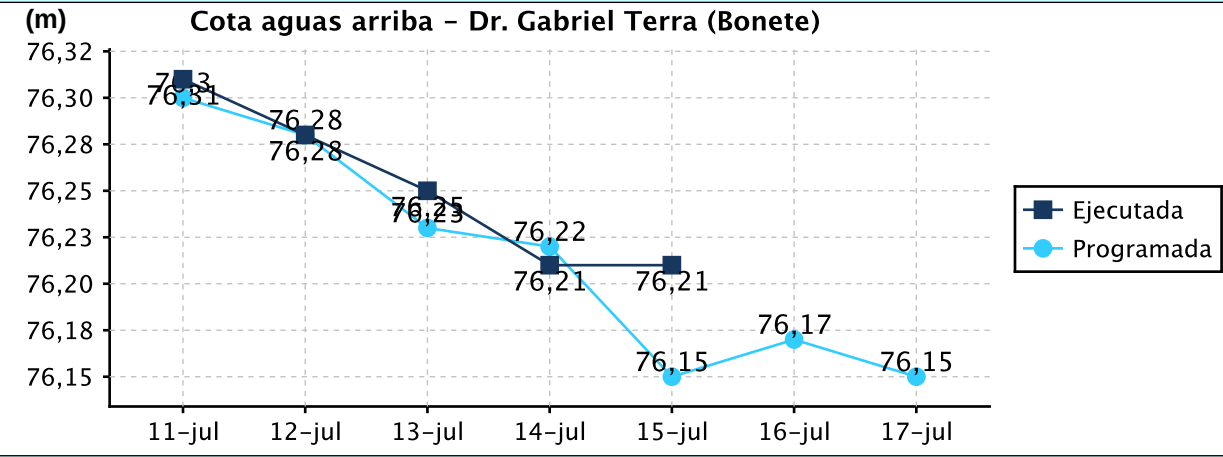


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,15	76,21
Baygorria	53,66	53,73
Palmar	38,25	38,22
SGU	34,27	34,34

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

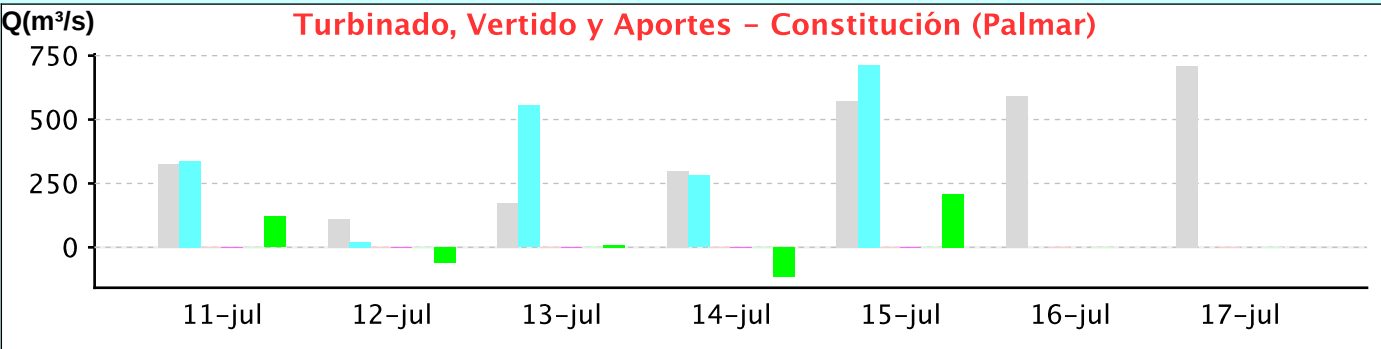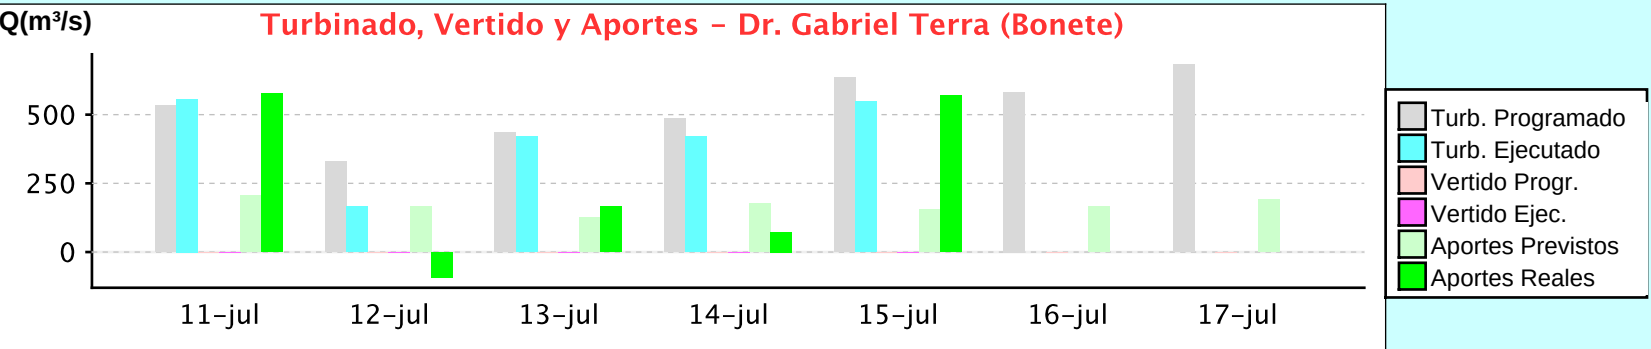

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

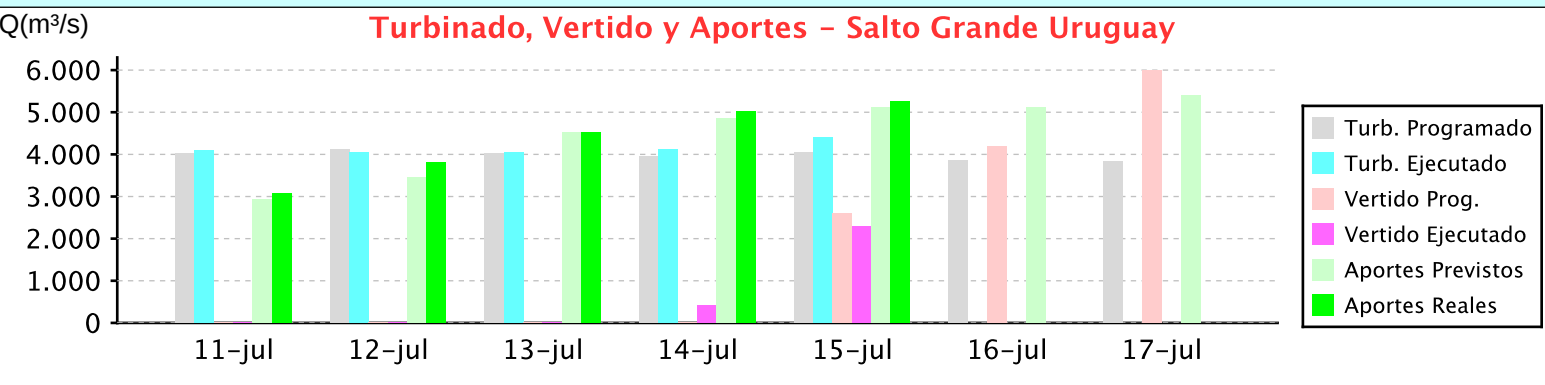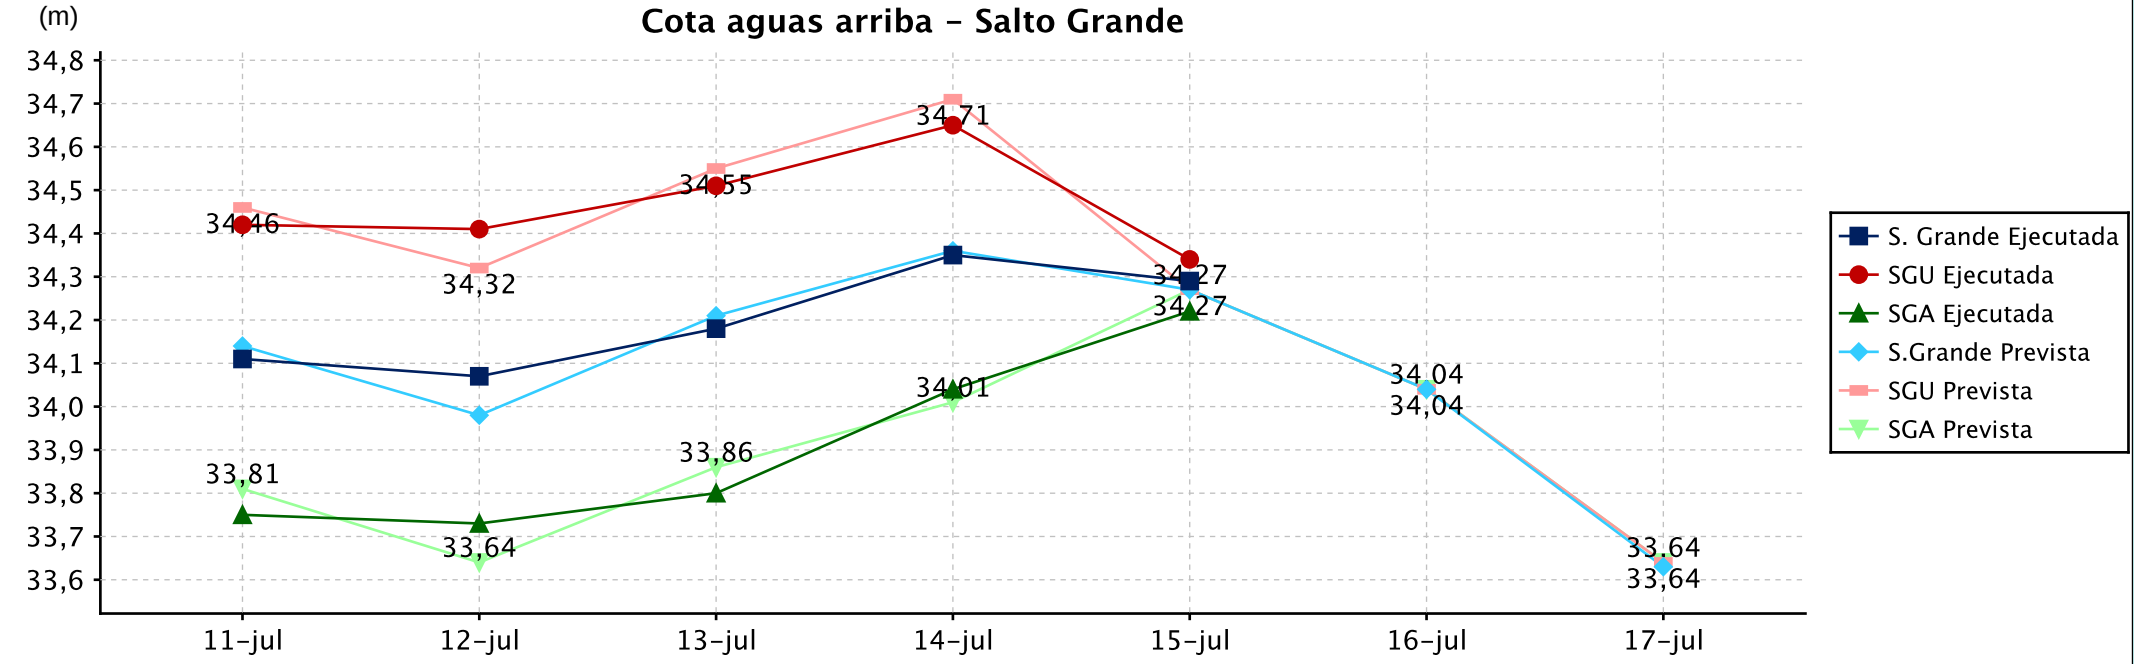

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,34
Cota Vista Arg	34,22
Cota real	34,29
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	2.525

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	636	547
Baygorria	637	573
Palmar	573	714
SGU	4.045	4.401

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	156	568
Baygorria	0	45
Palmar	0	210
SGU	5.125	5.266

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	2.600	2.288

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
