




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

jueves 16 de julio de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	798
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	802
Central La Tablada	134
Central P. del Tigre	-9
APR A	341
APR B	759
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	2.395
C. Baygorria	1.815
C. Palmar	4.036
C. Salto Grande	18.929
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	6.133
TOTAL Generación	35.331

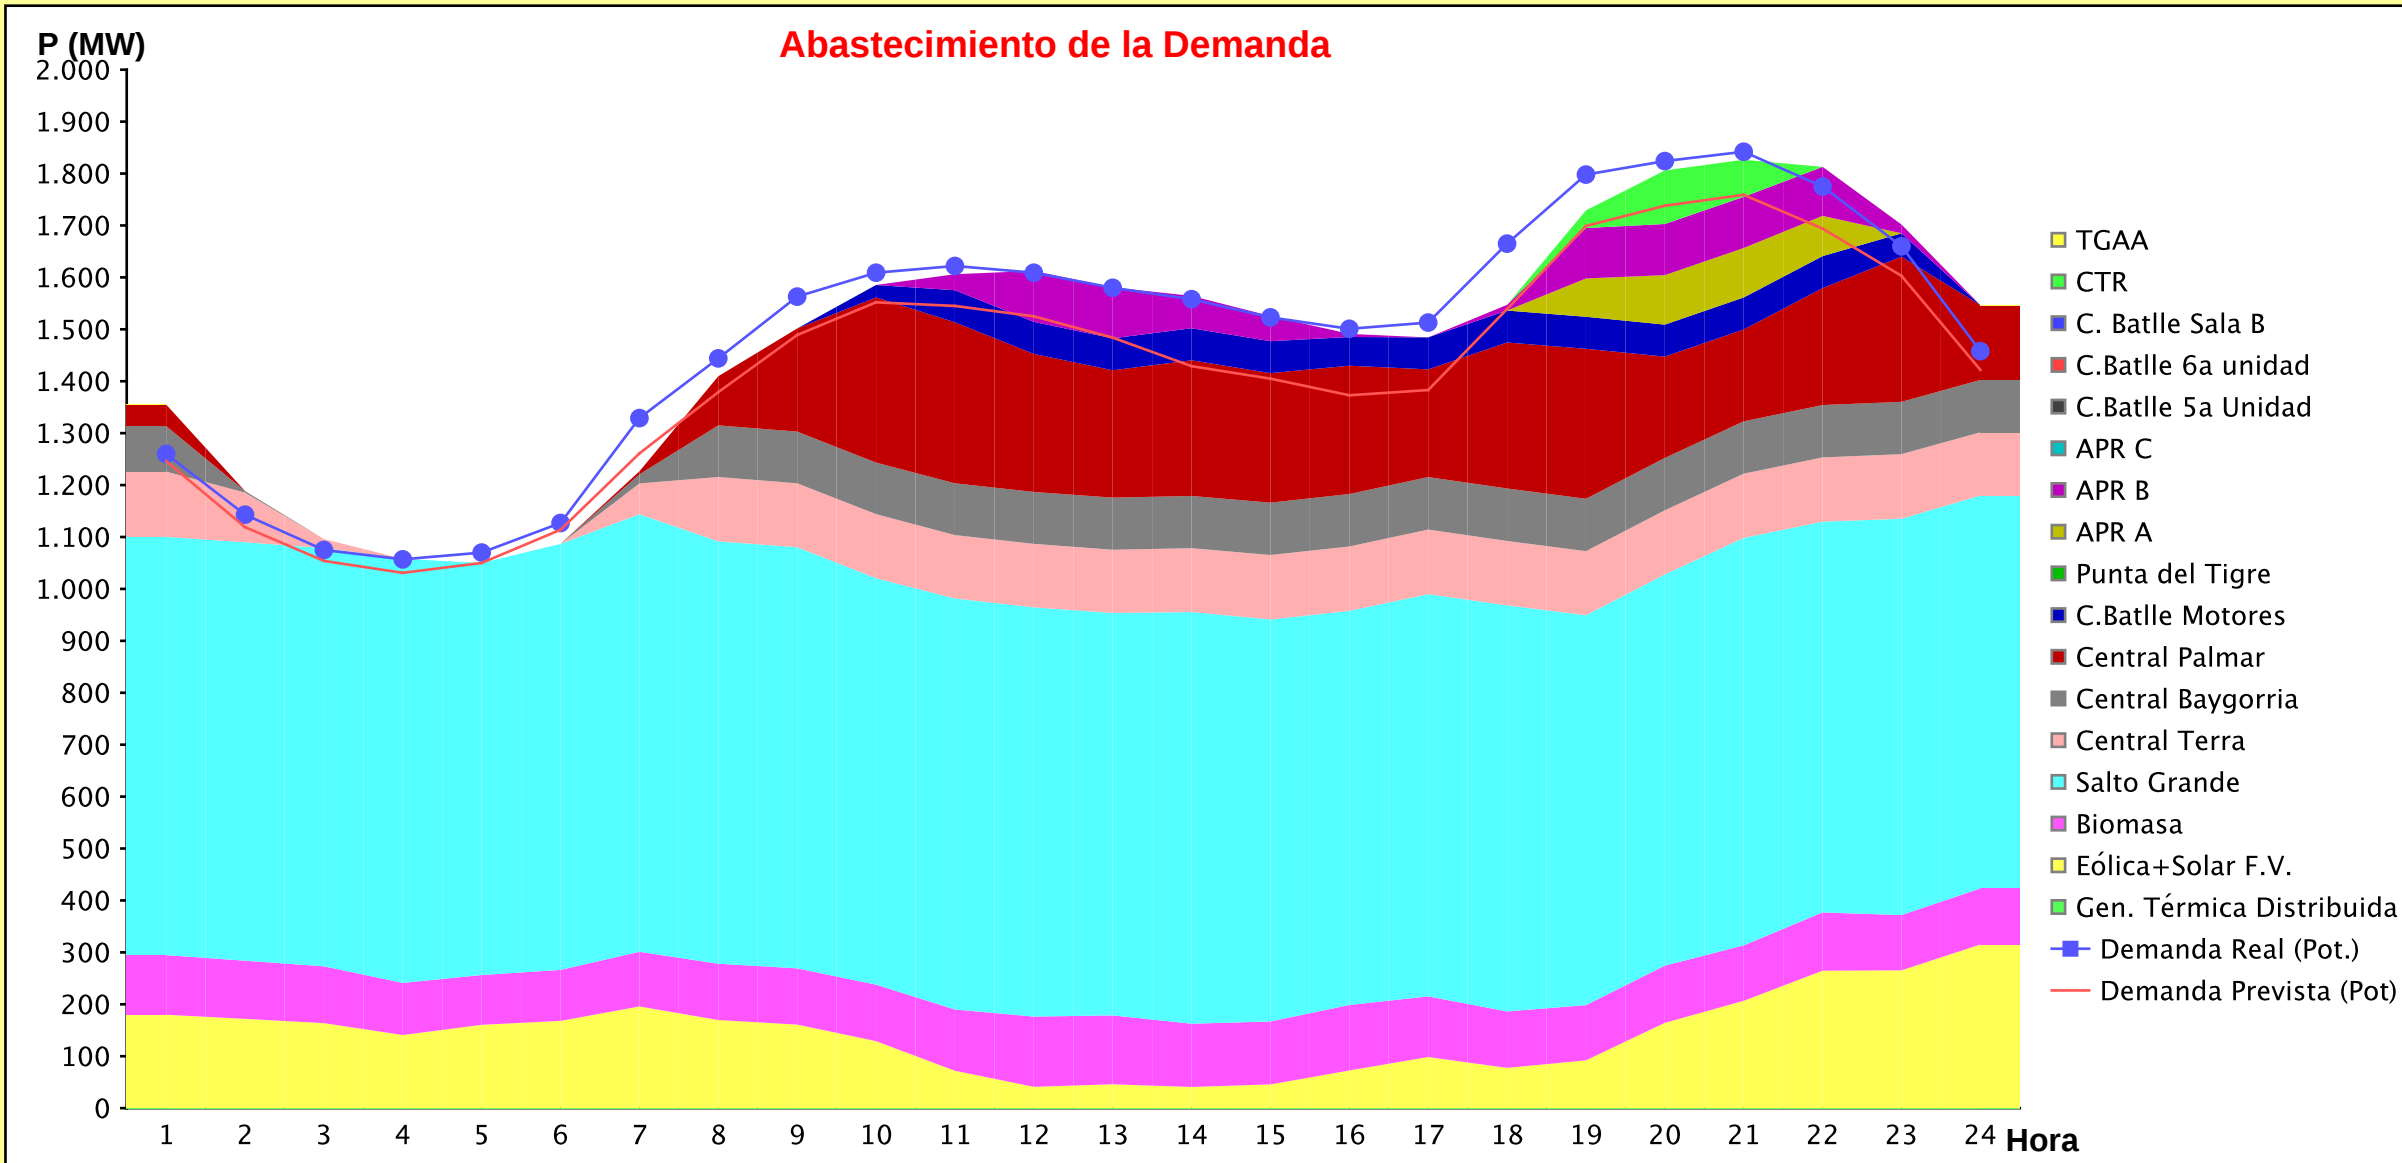

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	32
Hidráulica	32
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	32



DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	35.299
(en bormes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	33.893
Diferencia (MWh)	1.406
Ejecutada - Programada	4,15 %

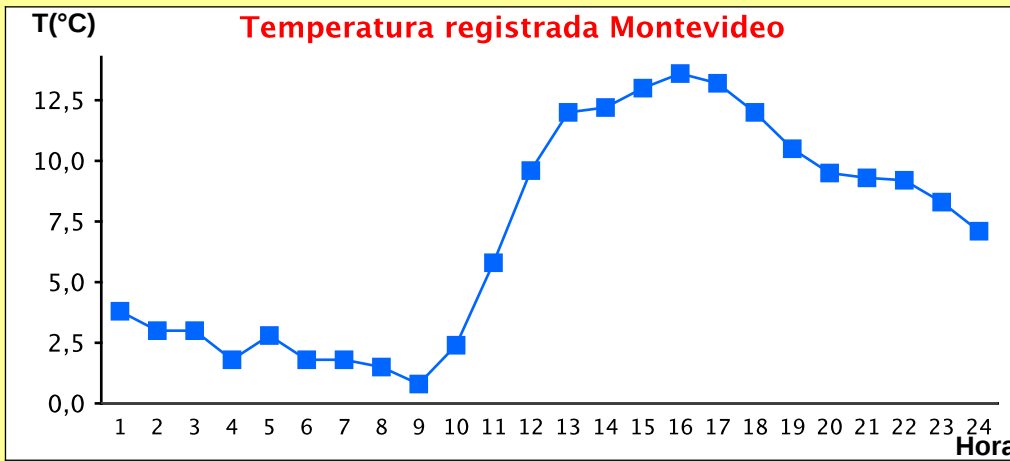


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1632 Hora 10:23
Potencia mínima:	1047 Hora 04:22
Pico noche:	1862 Hora 20:51

Generación Media (MW)	
Eólica	144,5
Biomasa	112,5
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

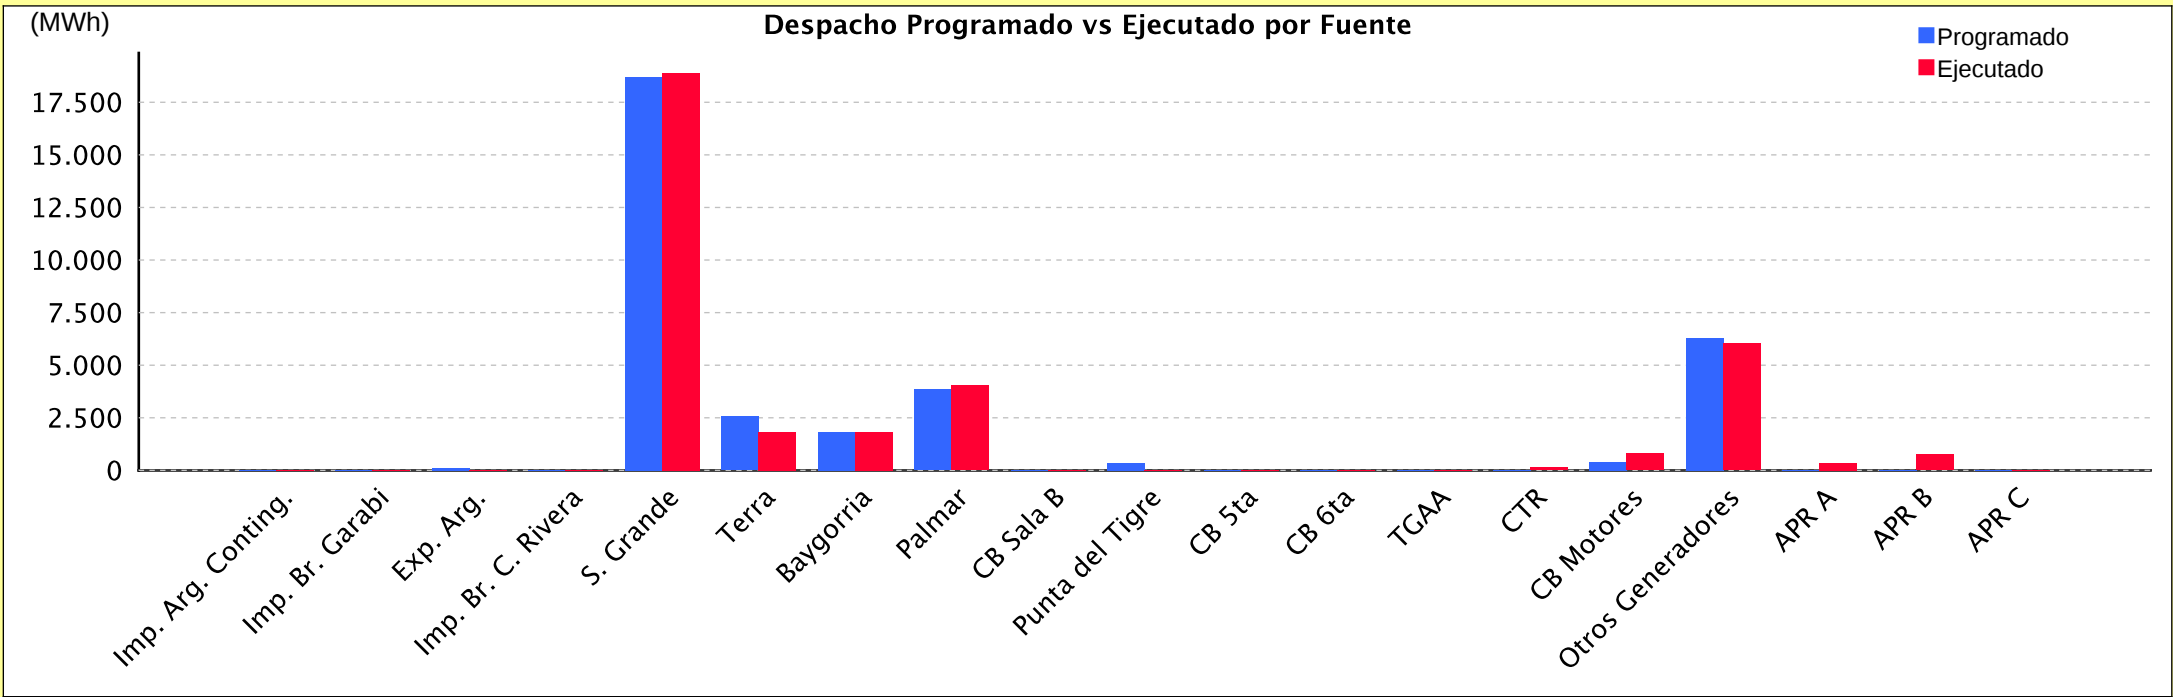
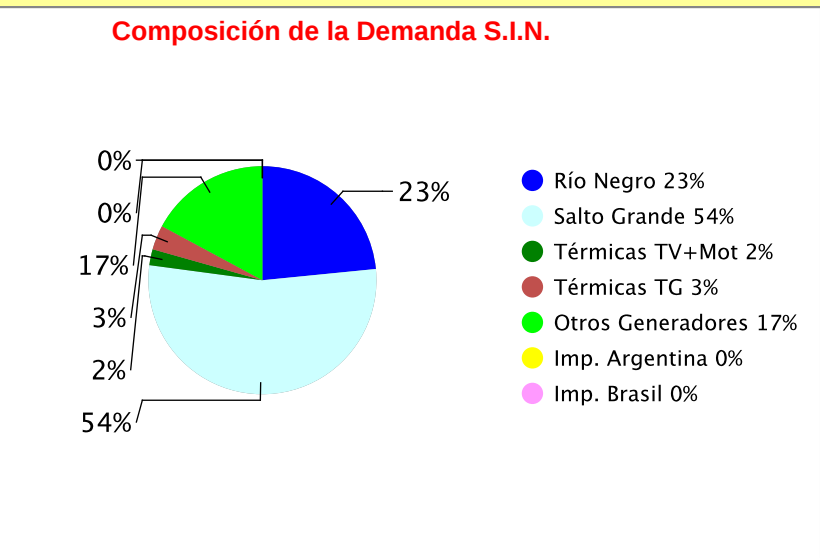


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

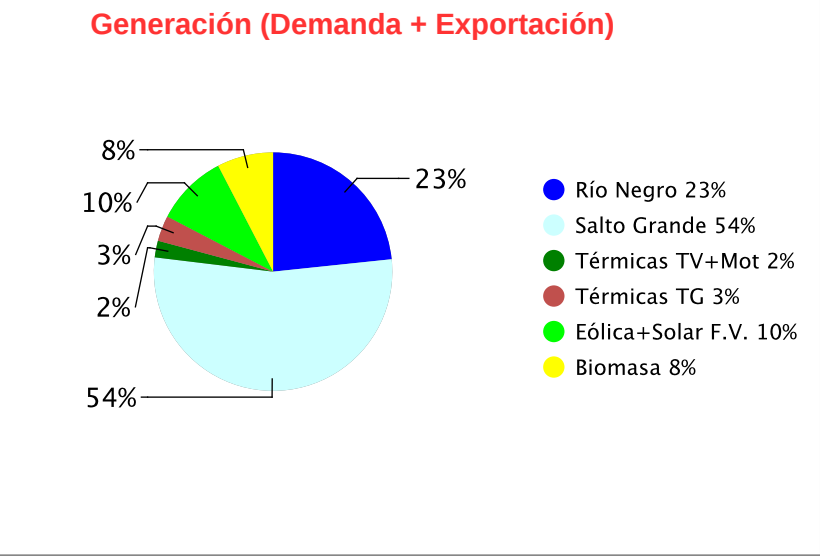



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

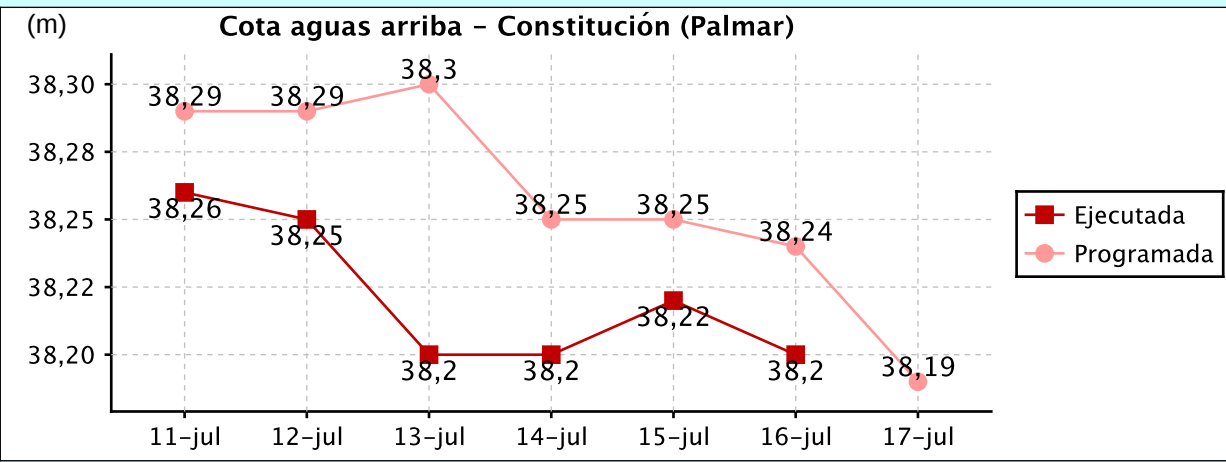
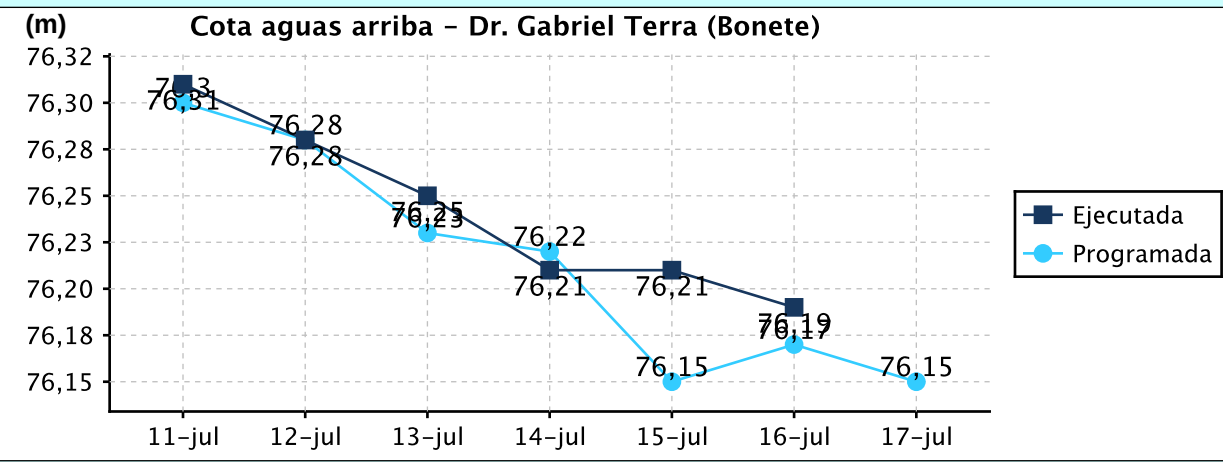


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,17	76,19
Baygorria	53,69	53,69
Palmar	38,24	38,2
SGU	34,04	33,99

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

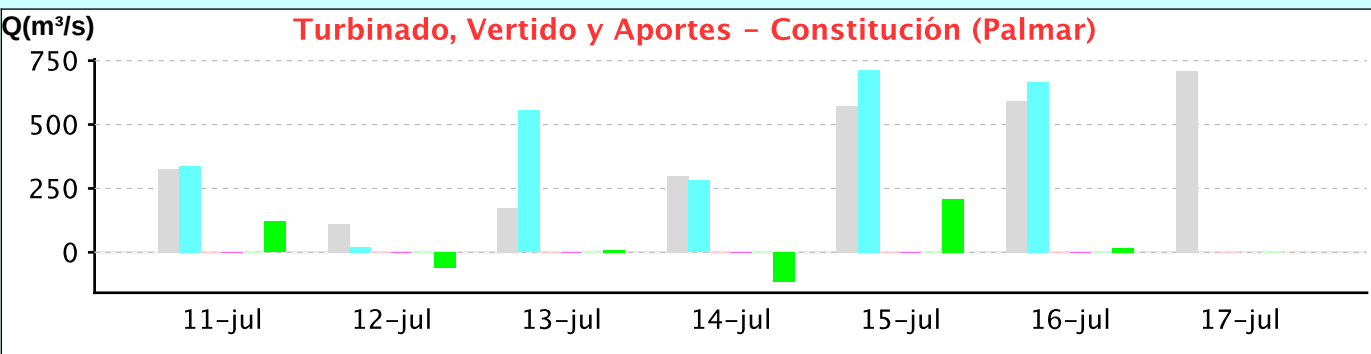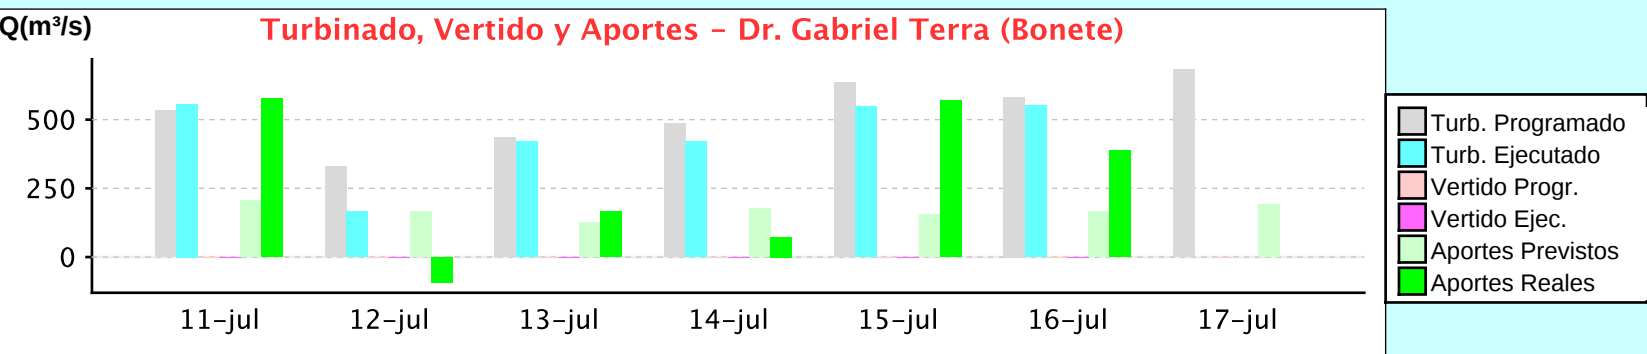

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

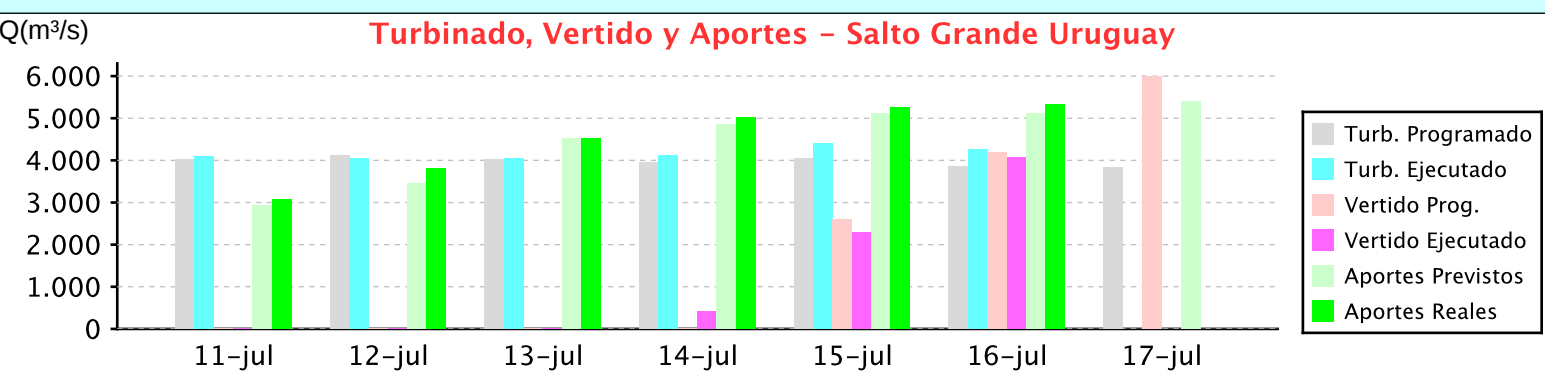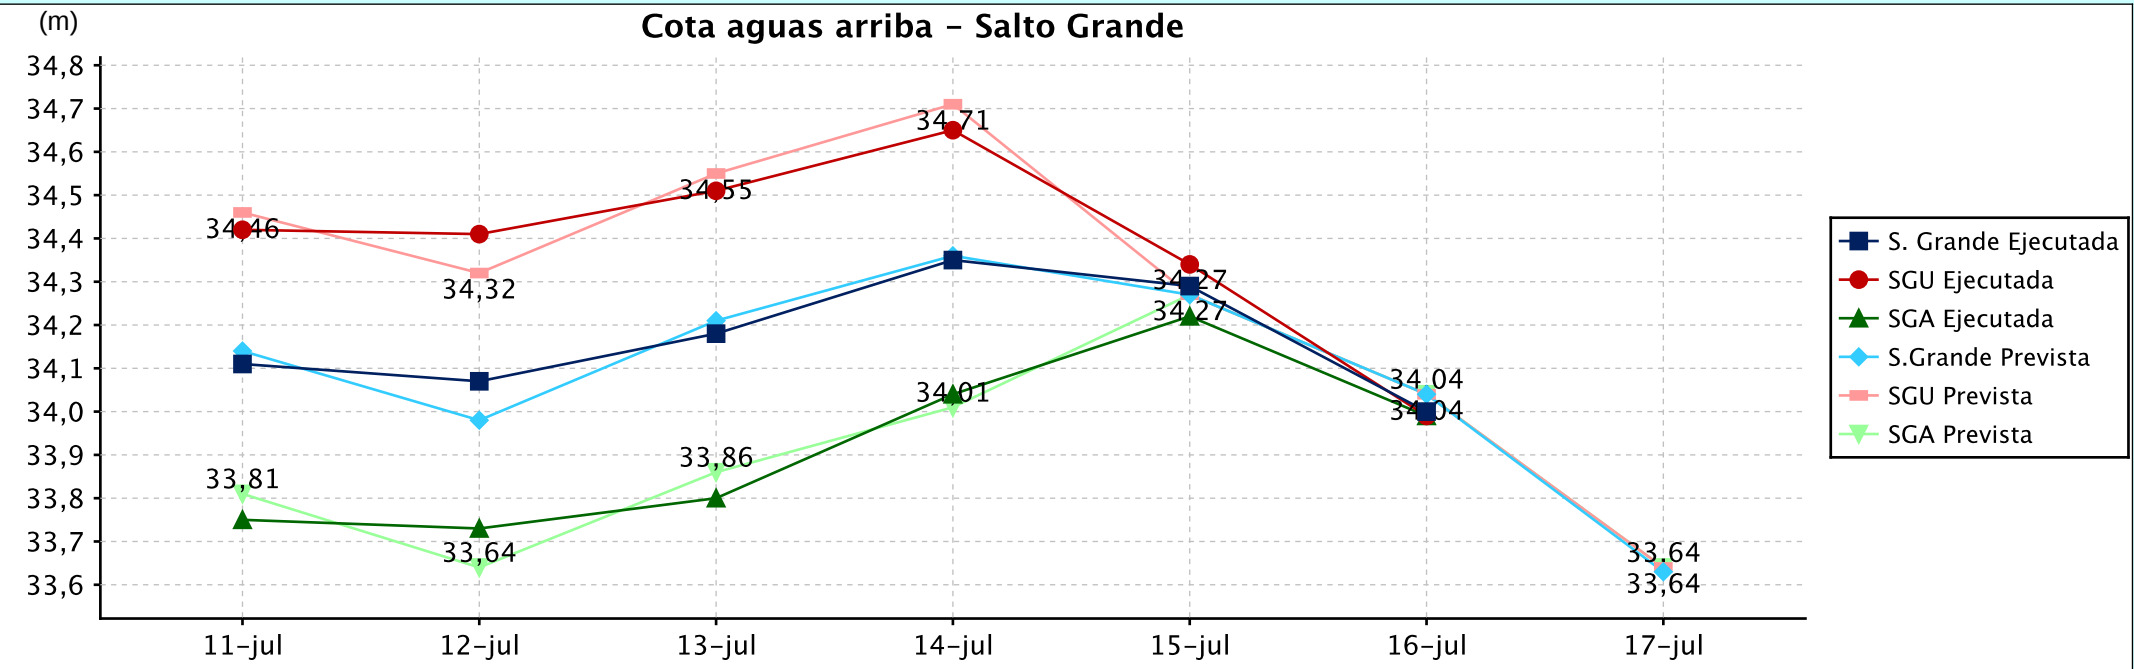

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	33,99
Cota Vista Arg	33,99
Cota real	34,00
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	0

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	582	552
Baygorria	631	603
Palmar	591	666
SGU	3.865	4.269

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	167	389
Baygorria	0	11
Palmar	0	17
SGU	5.125	5.330

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	4.200	4.069

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
