




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


viernes 17 de julio de 2015

Generación Térmica	
Central Battle	409
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	413
Central La Tablada	-78
Central P. del Tigre	-5
APR A	-2
APR B	144
APR C	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	2.710
C. Baygorria	1.838
C. Palmar	3.674
C. Salto Grande	18.209
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	6.628
TOTAL Generación	33.528

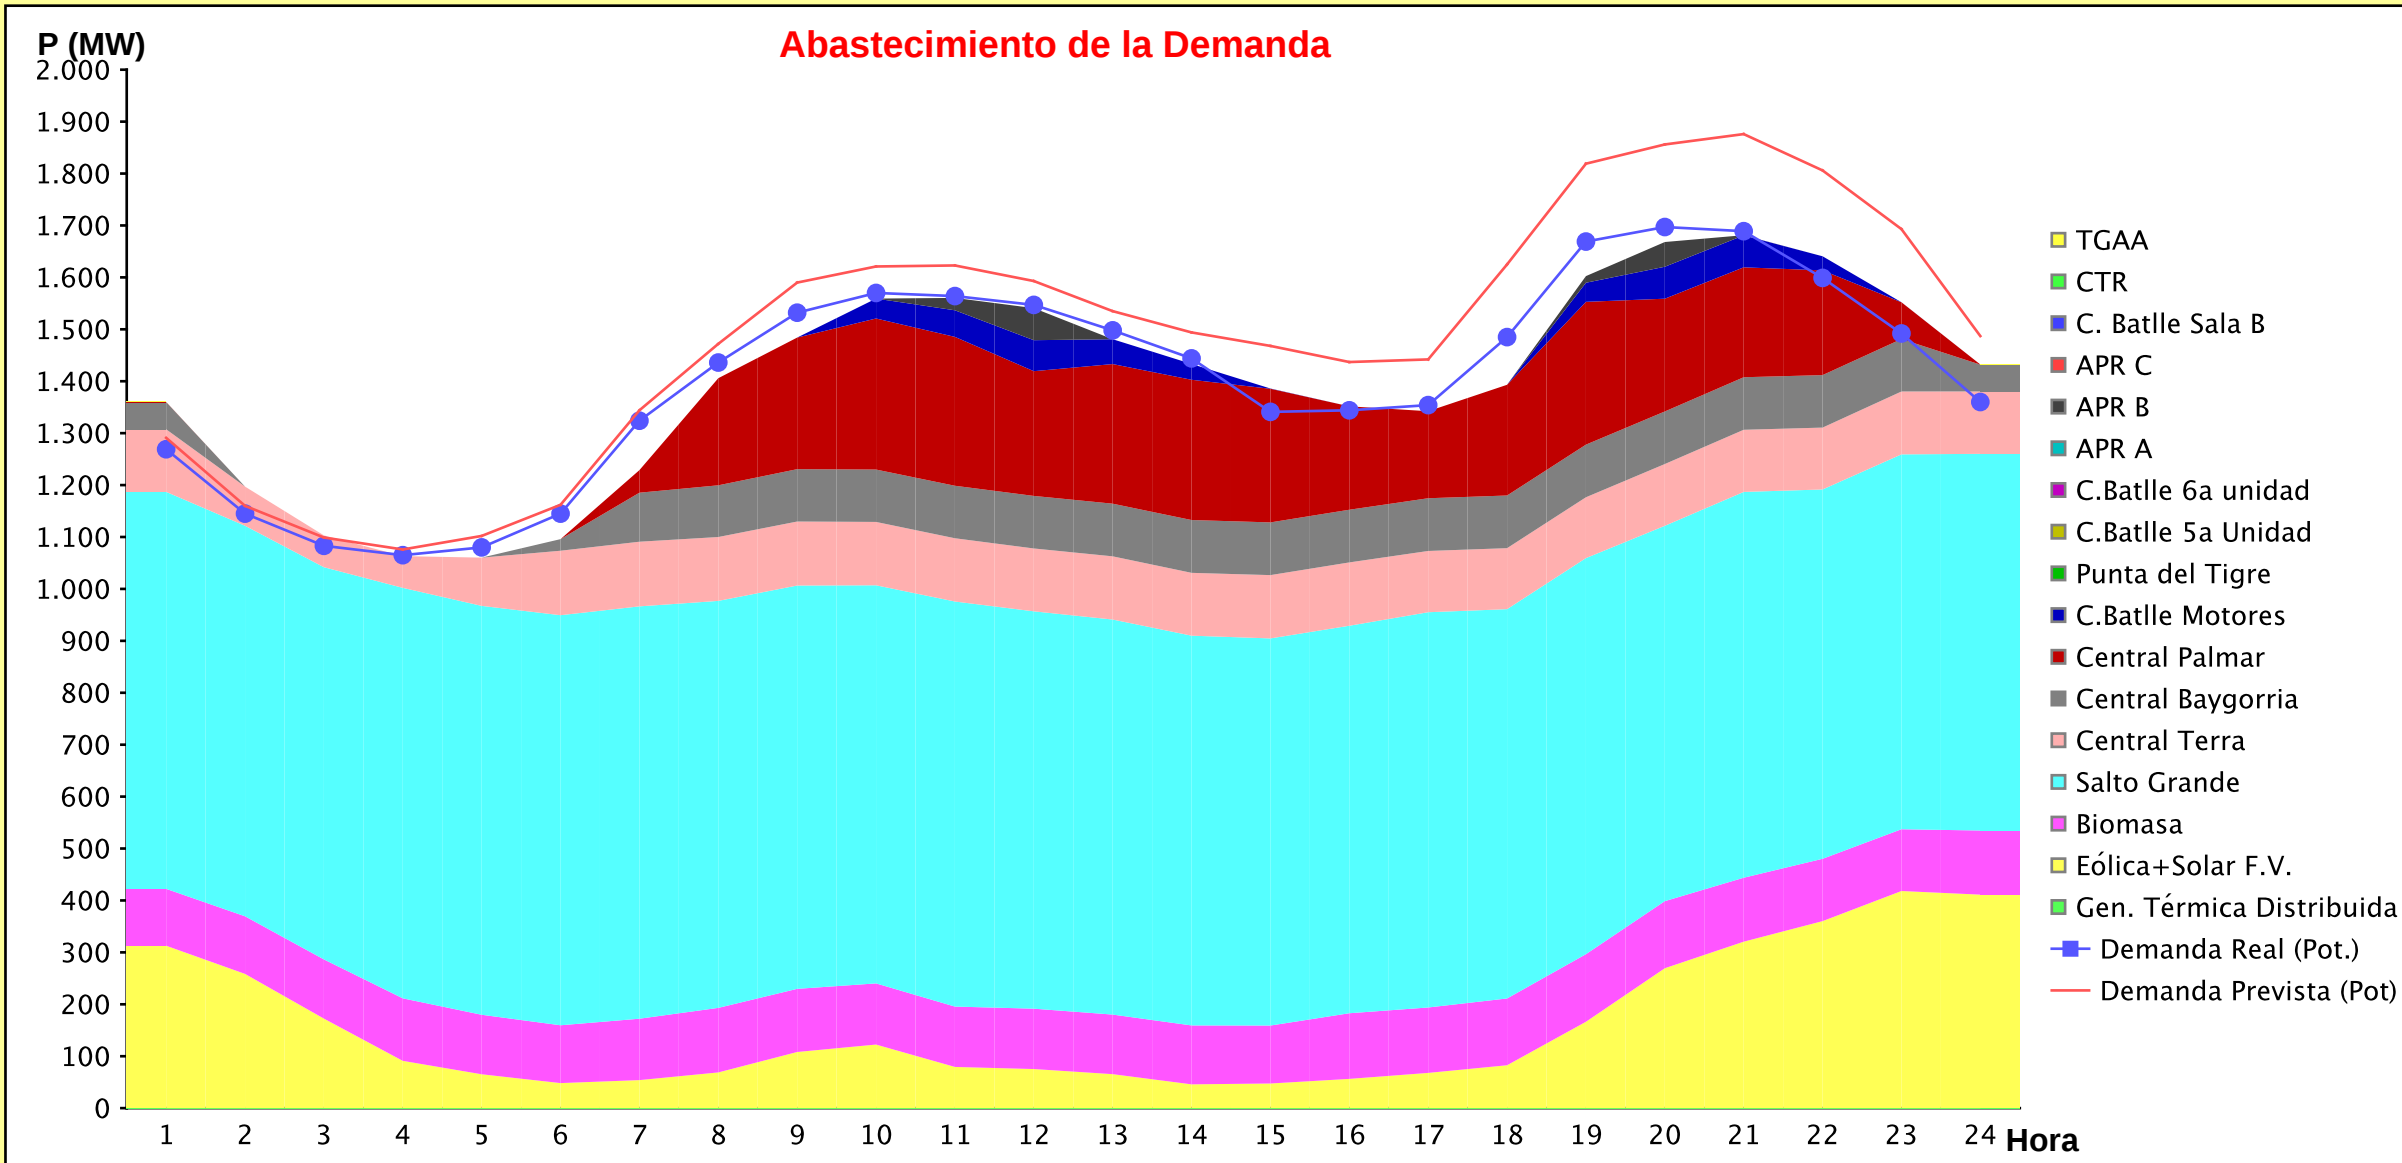




Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	33.528
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	35.671
Diferencia (MWh)	-2.143
Ejecutada - Programada	-6.01 %

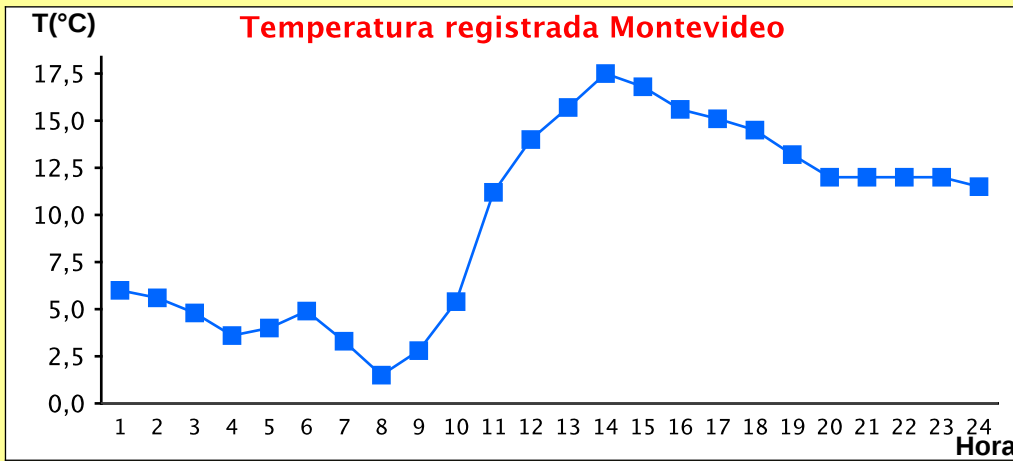



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1581 Hora 10:21
Potencia mínima:	1052 Hora 03:57
Pico noche:	1700 Hora 19:55

Generación Media (MW)	
Eólica	157,0
Biomasa	119,2
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

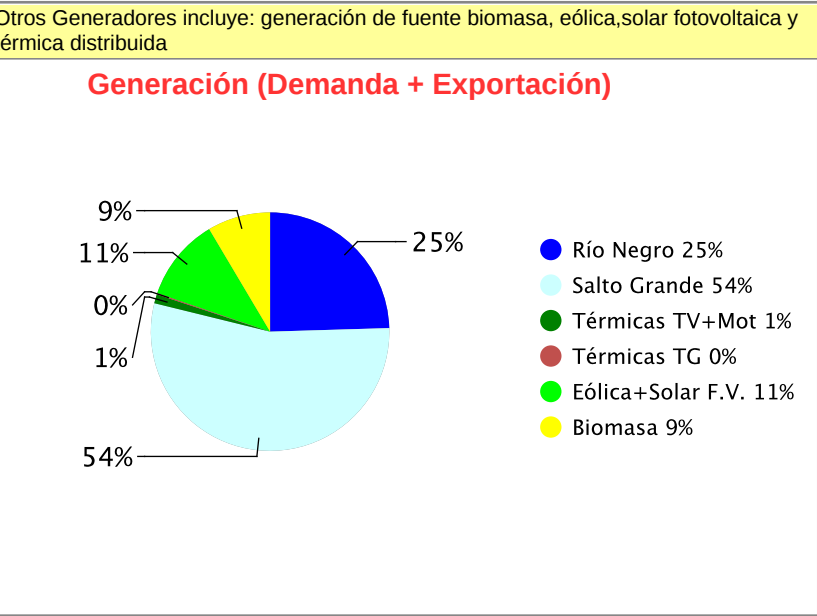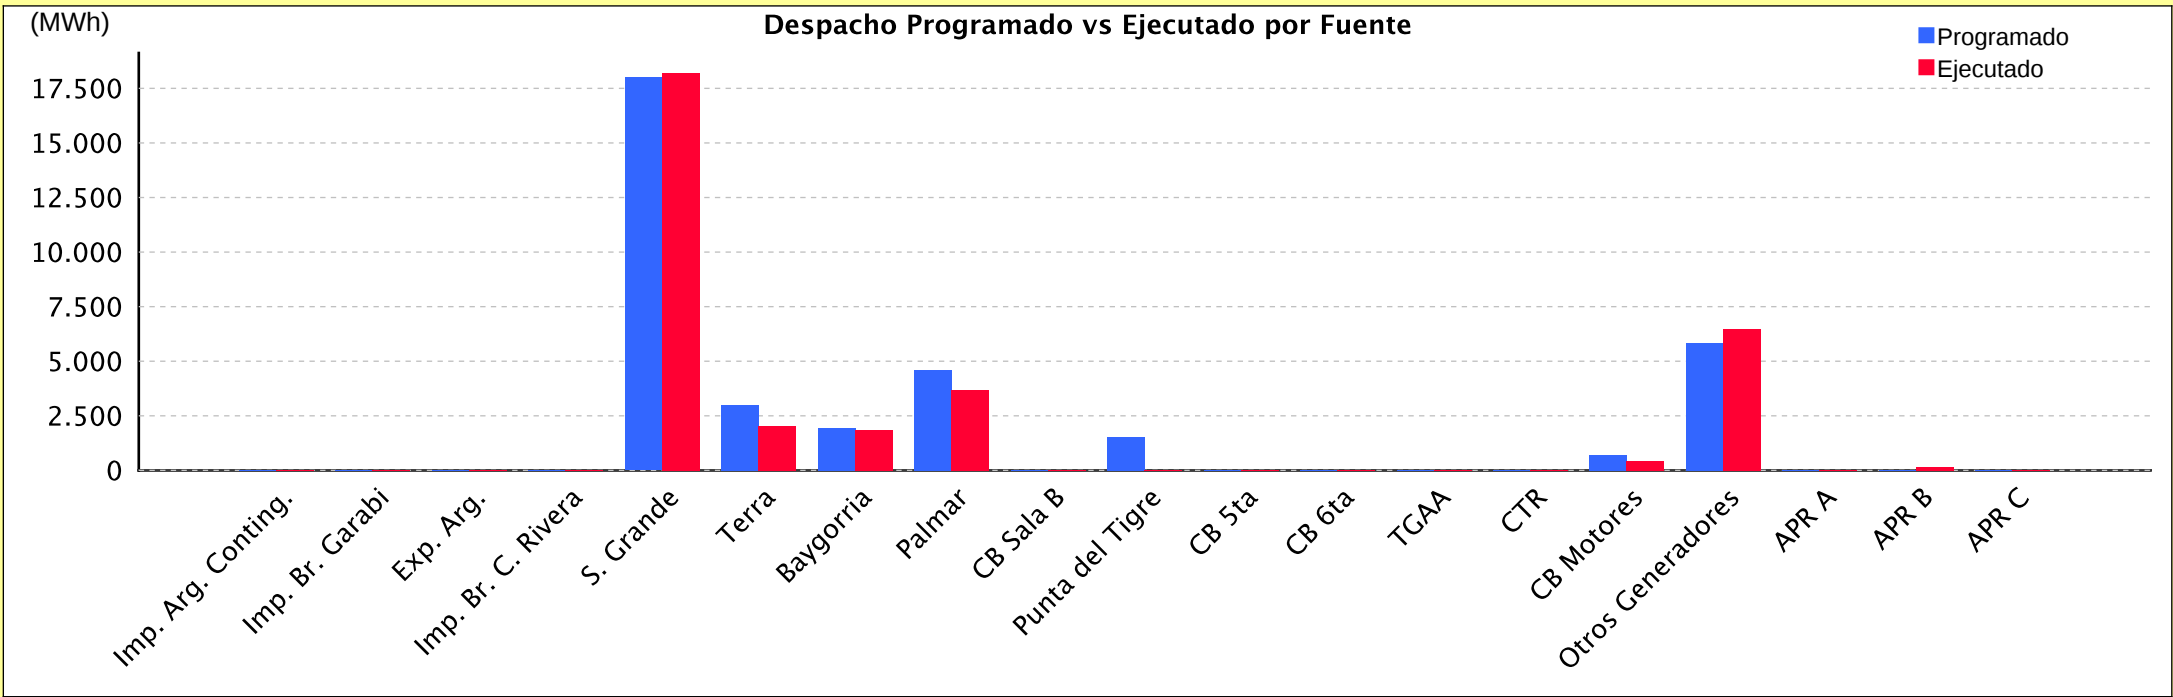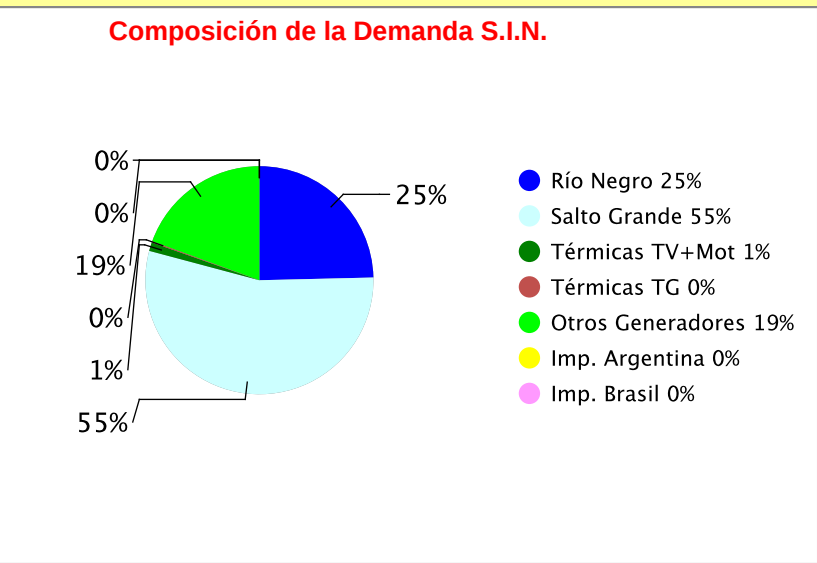



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

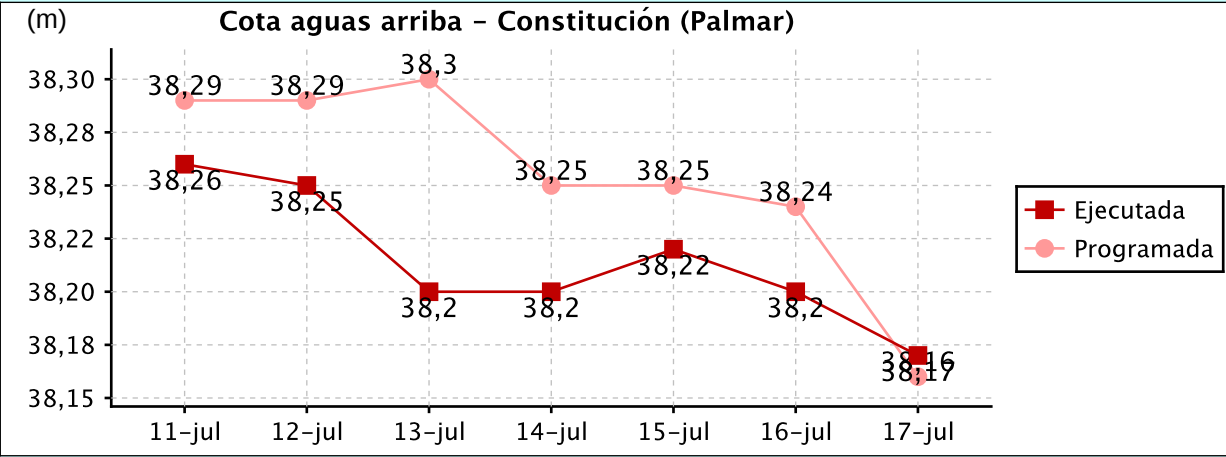
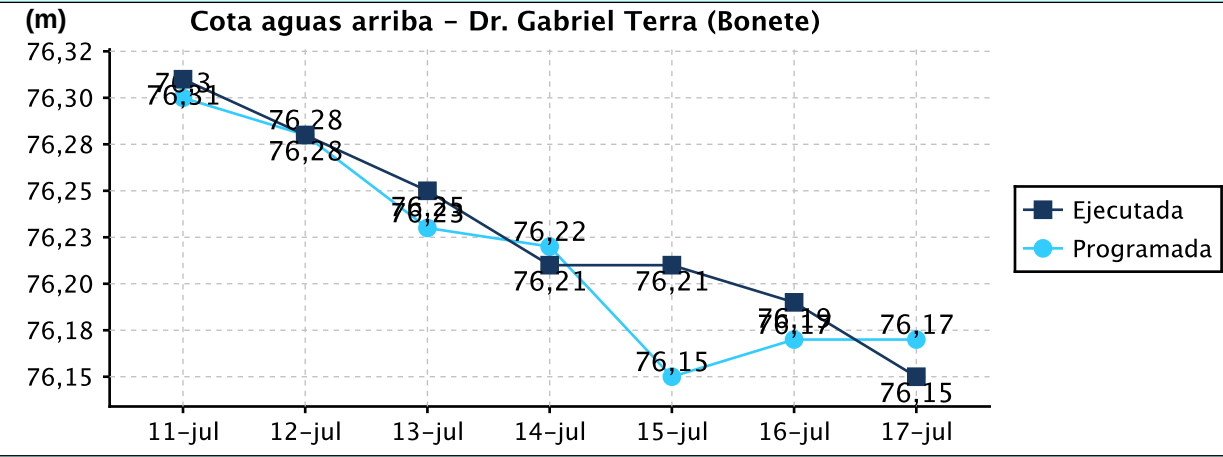


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,17	76,15
Baygorria	53,72	53,71
Palmar	38,16	38,17
SGU	33,59	33,61

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

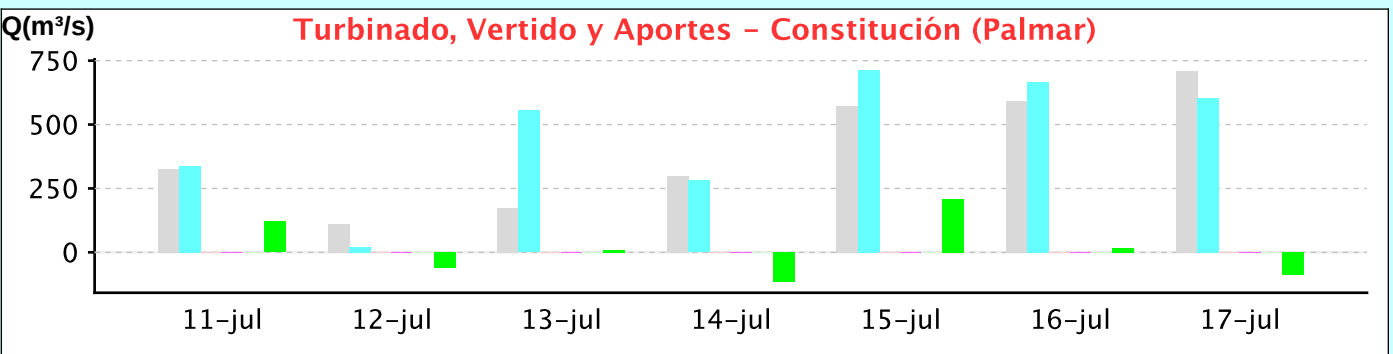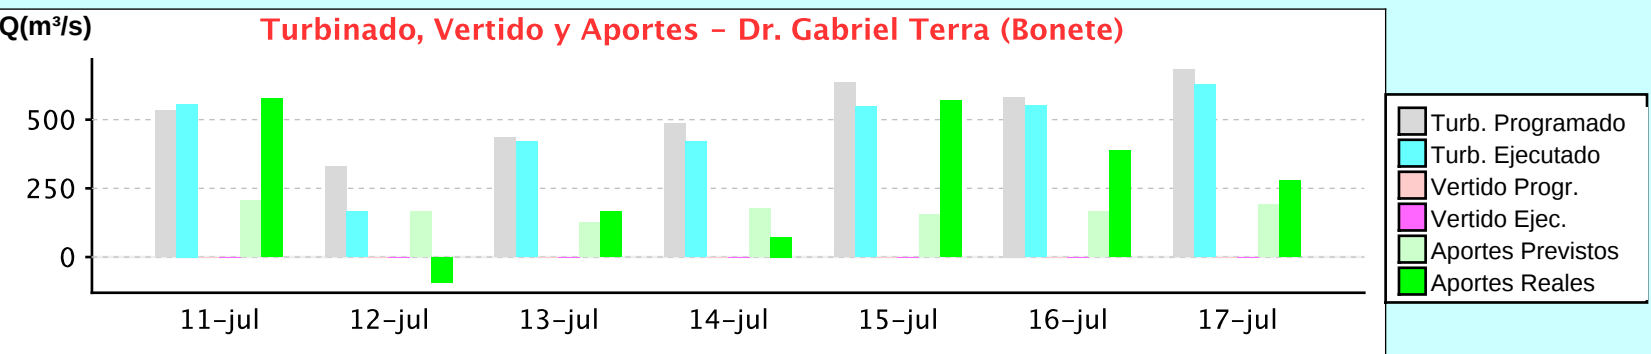

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

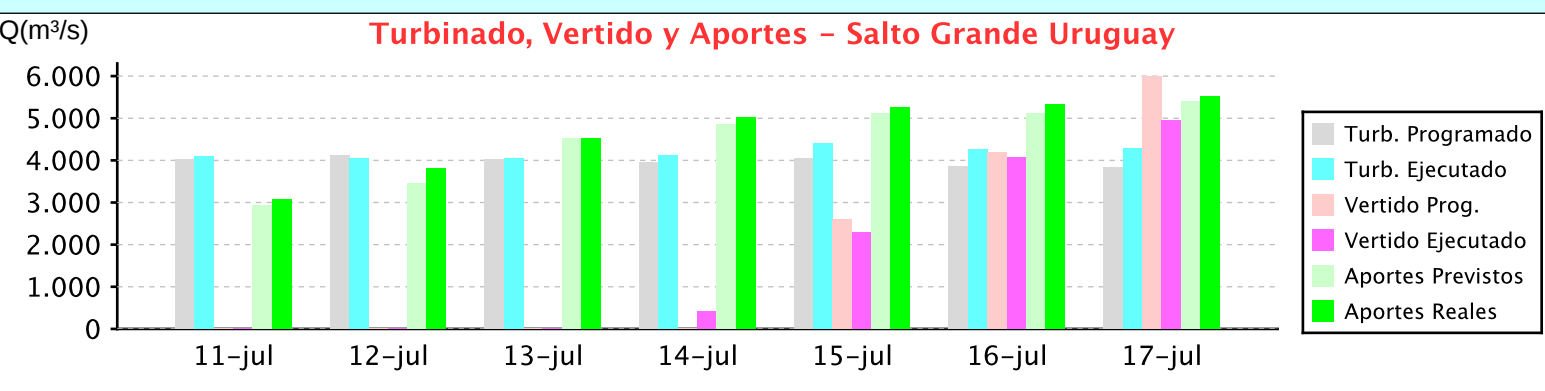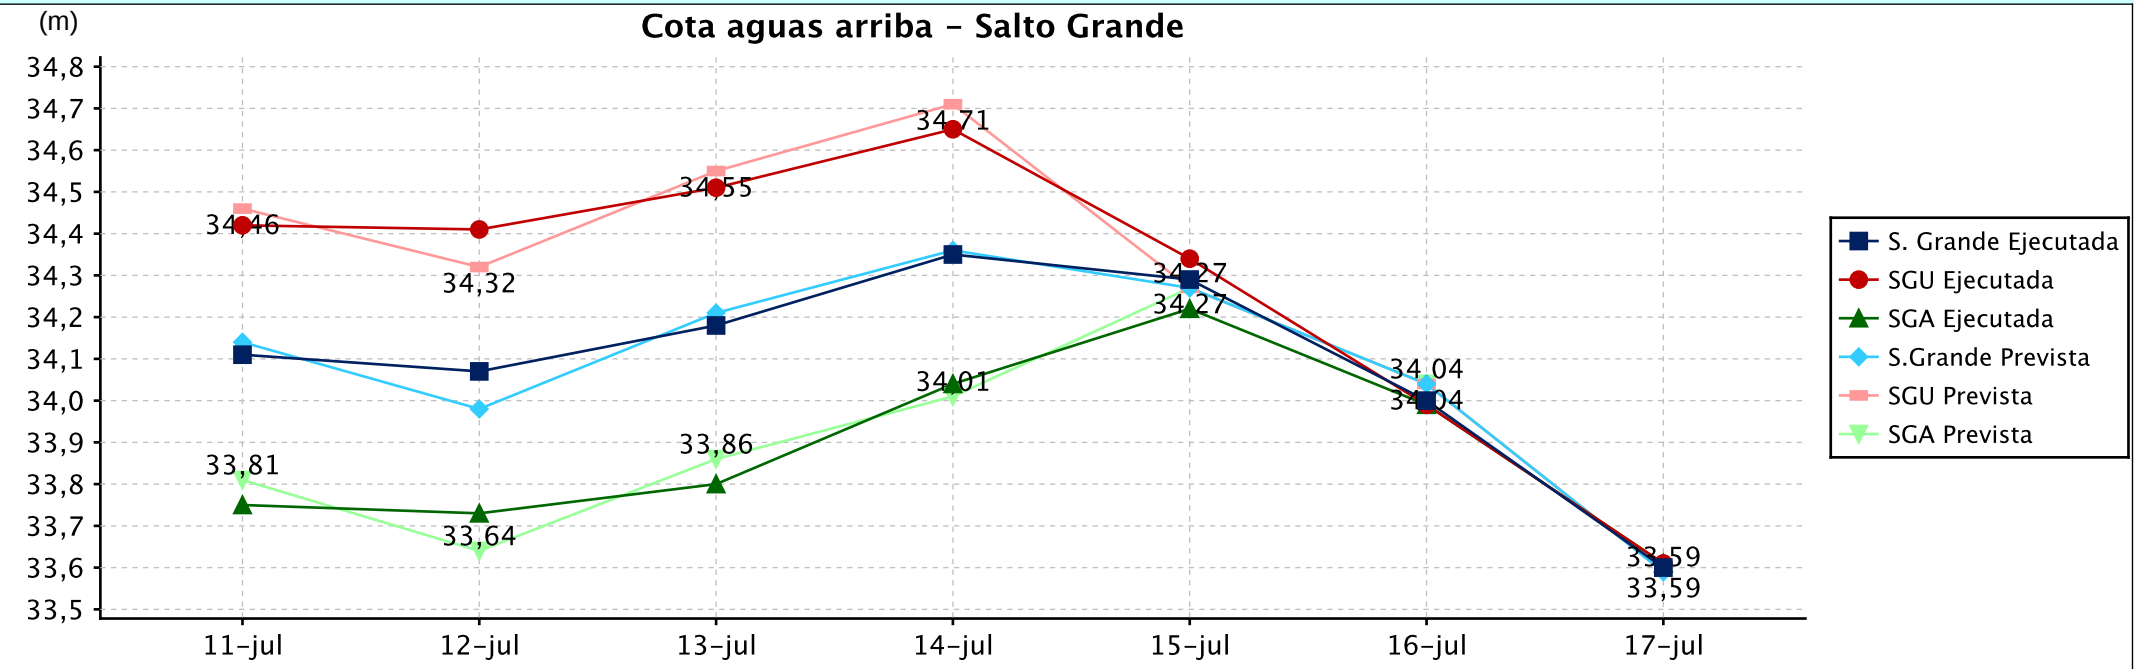

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	33,61
Cota Vista Arg	33,61
Cota real	33,60

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	0
------------------------------------	---

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	681	628
Baygorria	678	613
Palmar	710	604
SGU	3.838	4.280

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	191	279
Baygorria	0	15
Palmar	0	-89
SGU	5.400	5.514

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	6.000	4.947

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
