




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

sábado 18 de julio de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	-7
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-3
Central La Tablada	-94
Central P. del Tigre	-3
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	1.695
C. Baygorria	1.265
C. Palmar	1.206
C. Salto Grande	17.315
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	8.709
TOTAL Generación	30.081

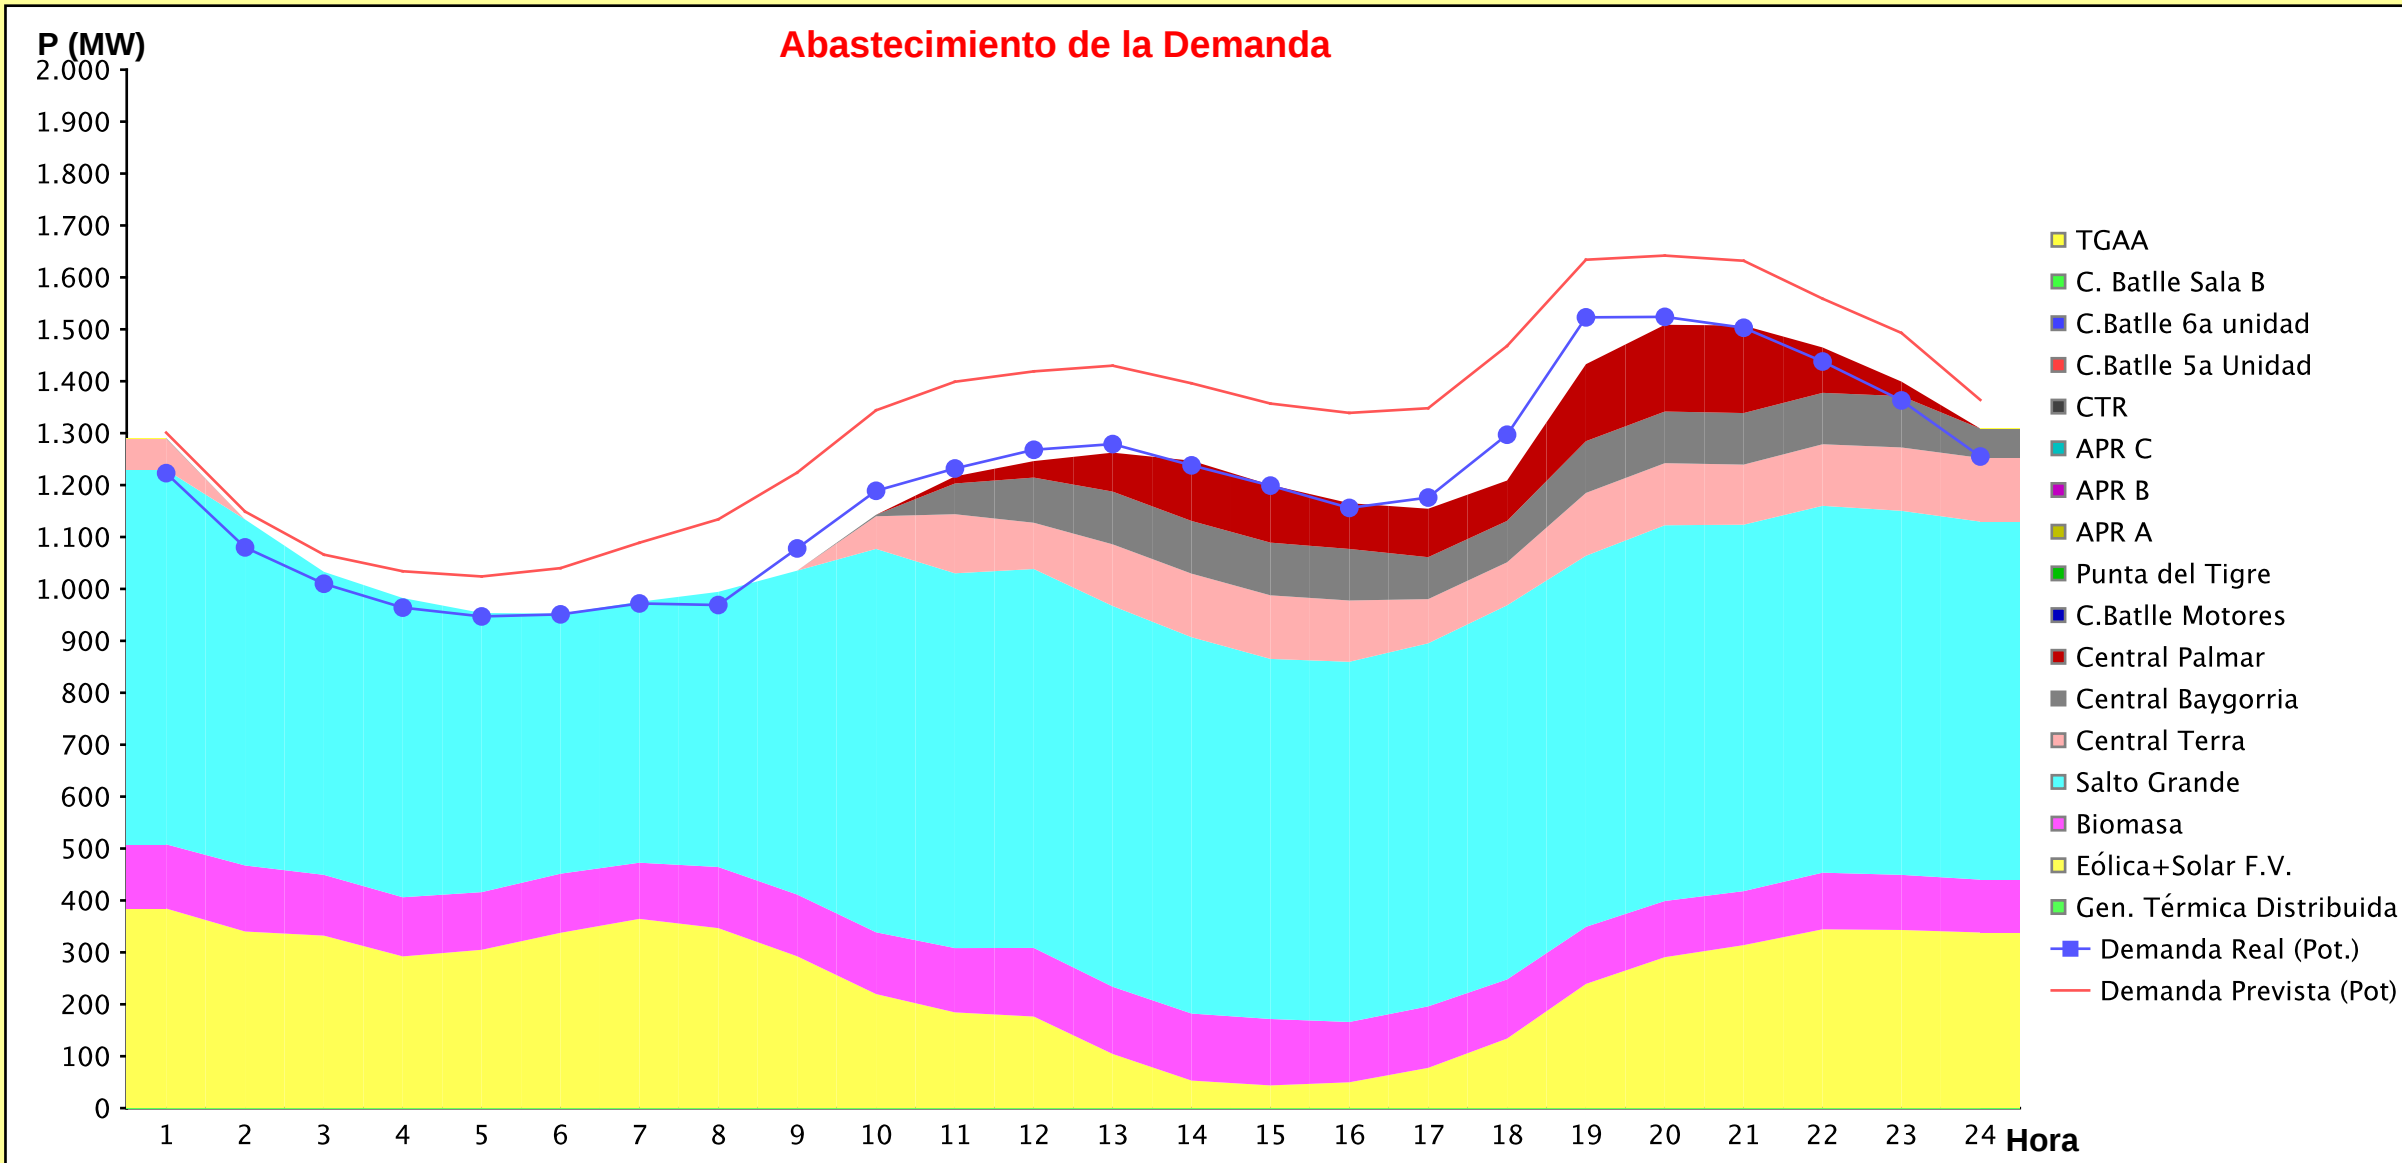

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	1.376
Hidráulica	1.376
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	1.376




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	28.705
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	31.885
Diferencia (MWh)	-3.180
Ejecutada - Programada	-9,97 %

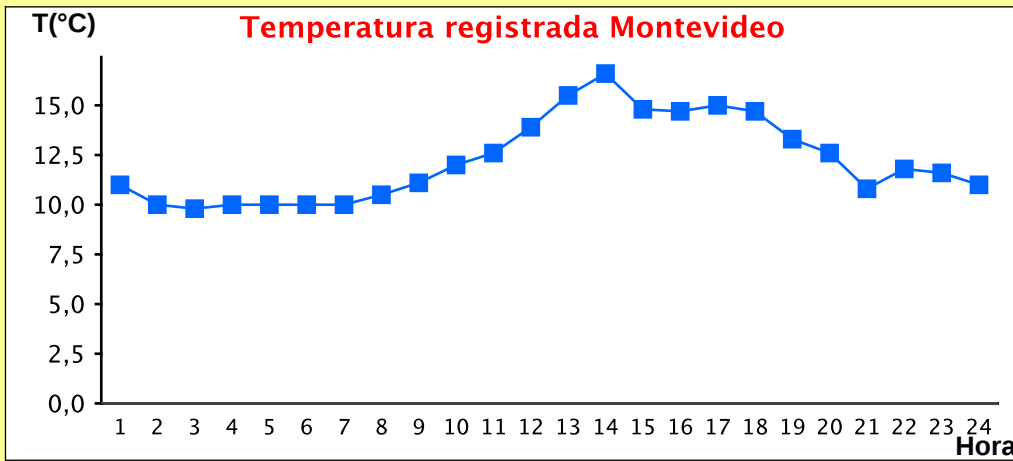



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1277 Hora 12:38
Potencia mínima:	948 Hora 04:53
Pico noche:	1534 Hora 20:08

Generación Media (MW)	
Eólica	245,1
Biomasa	116,7
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

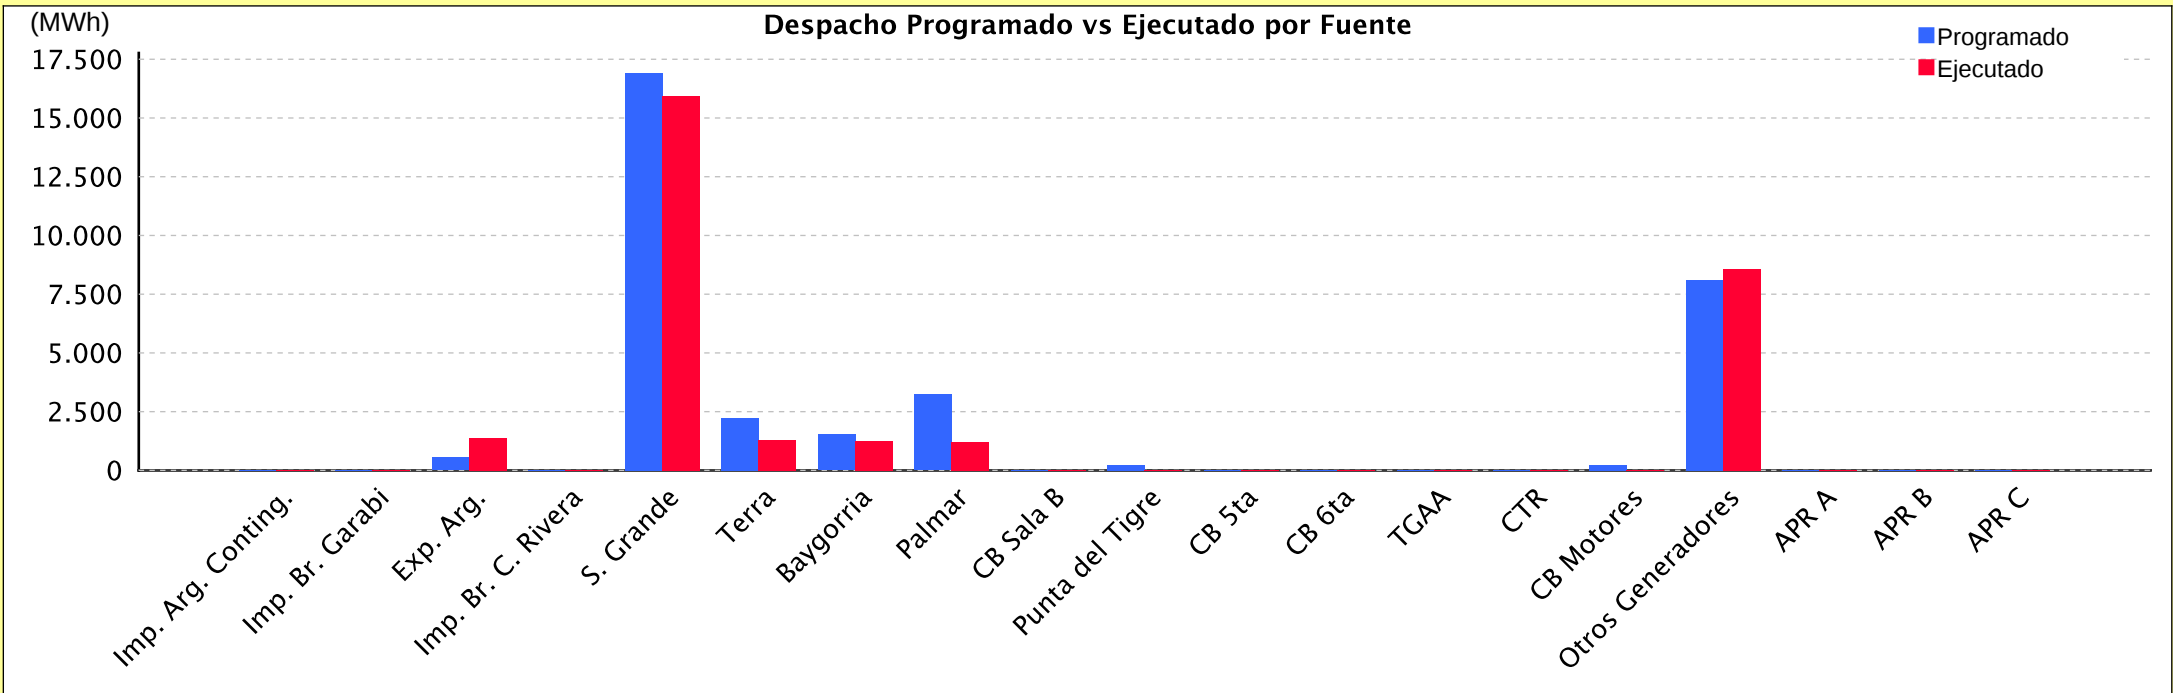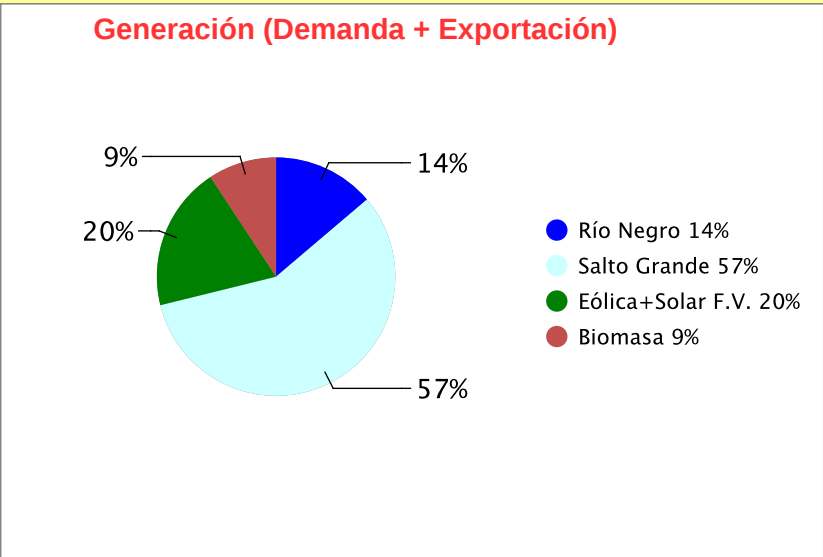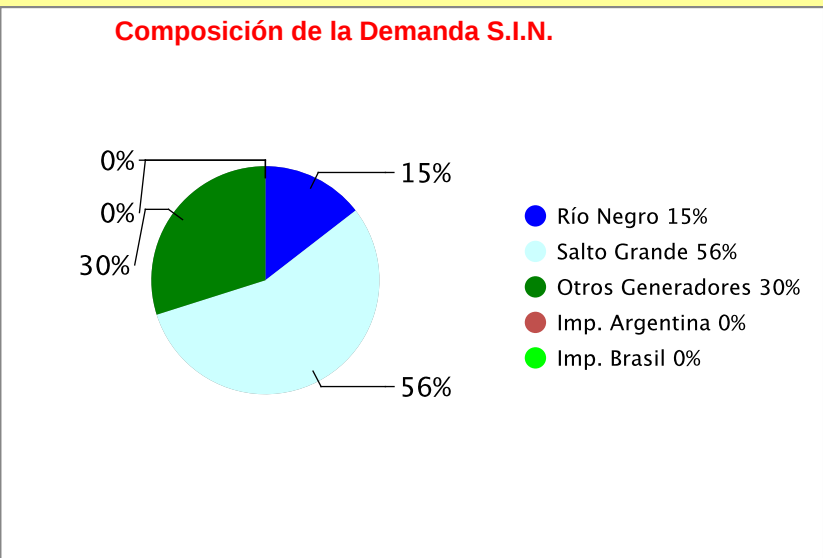



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

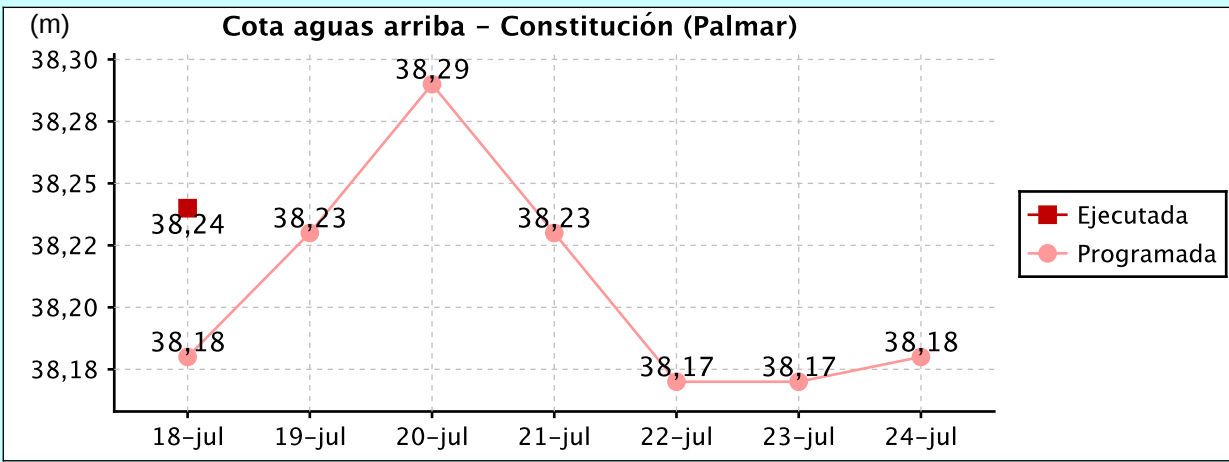
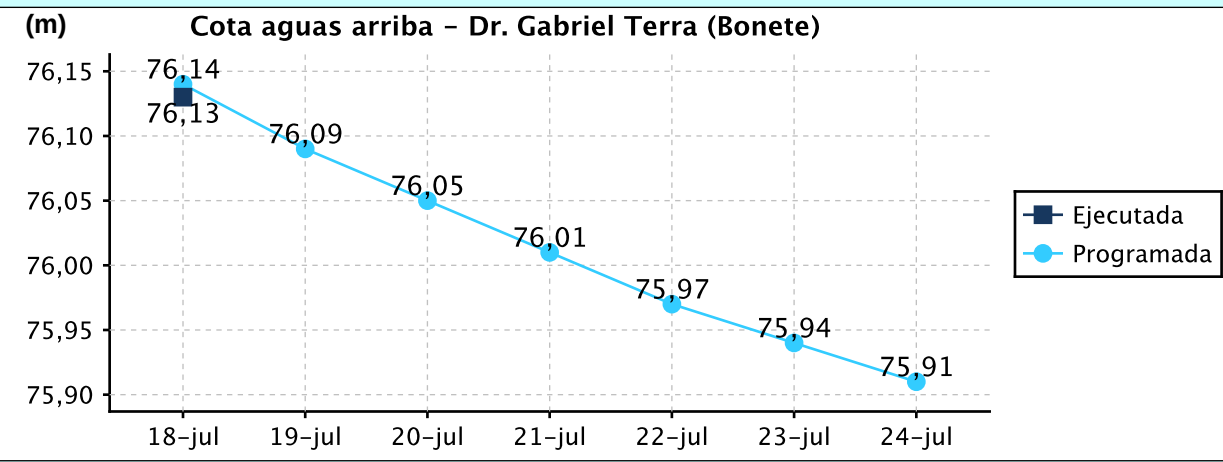


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,14	76,13
Baygorria	53,71	53,67
Palmar	38,18	38,24
SGU	33,21	33,14

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

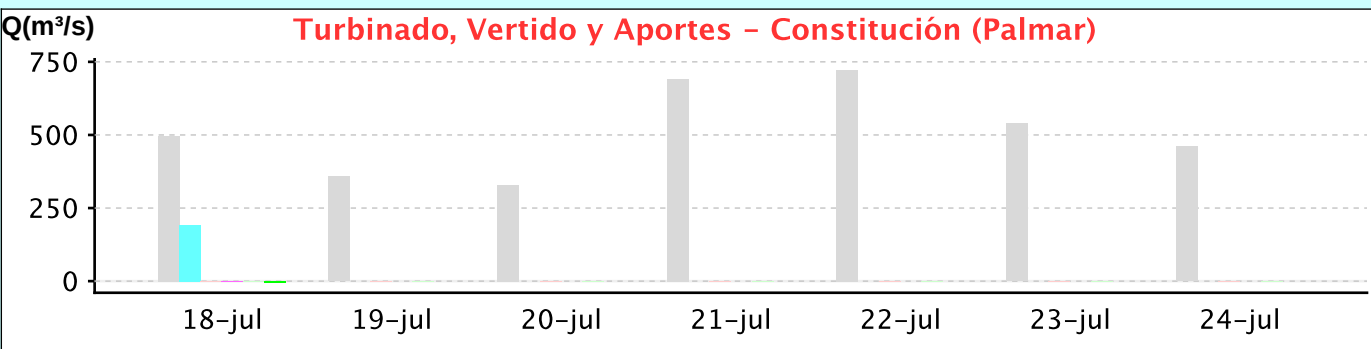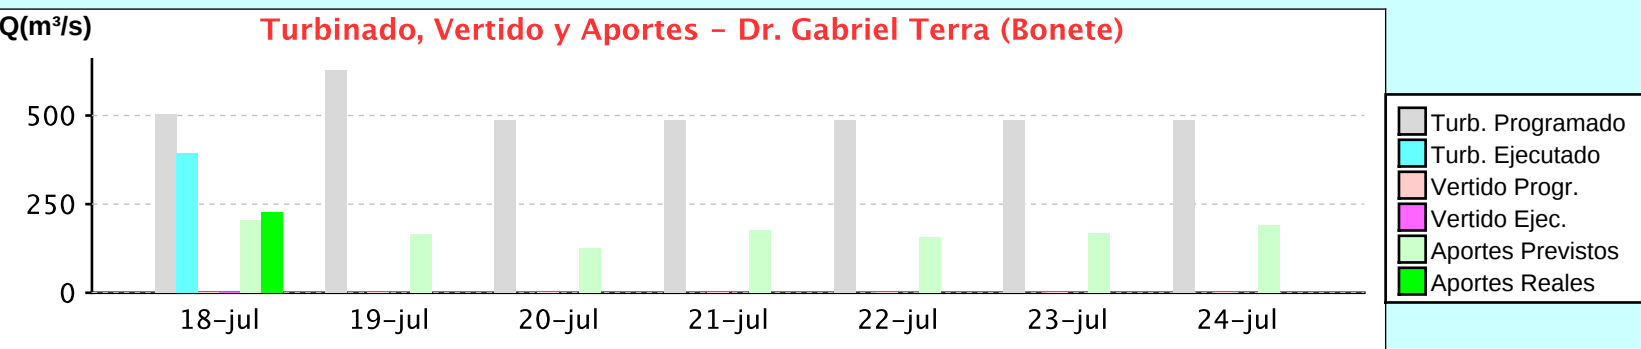

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

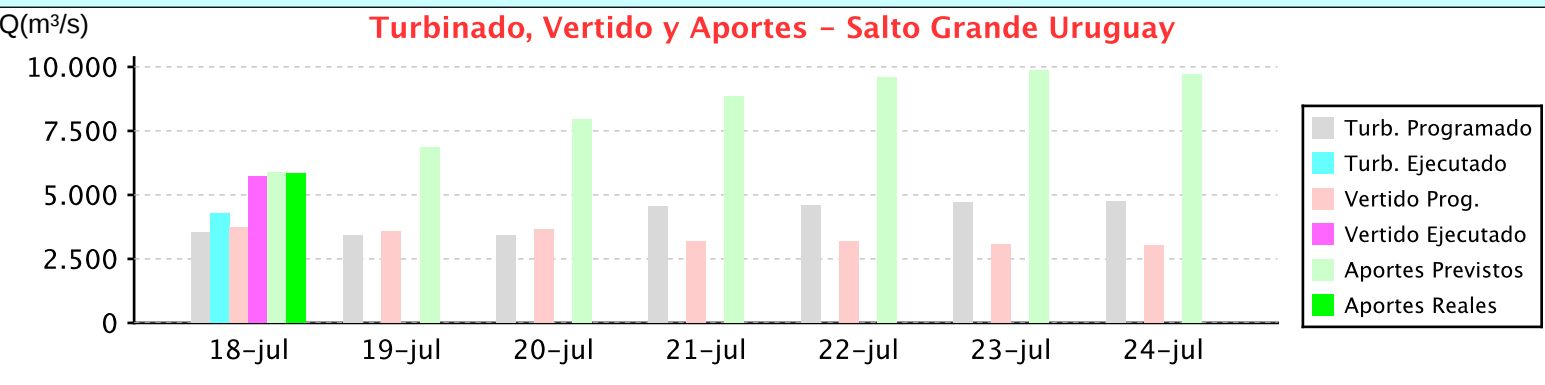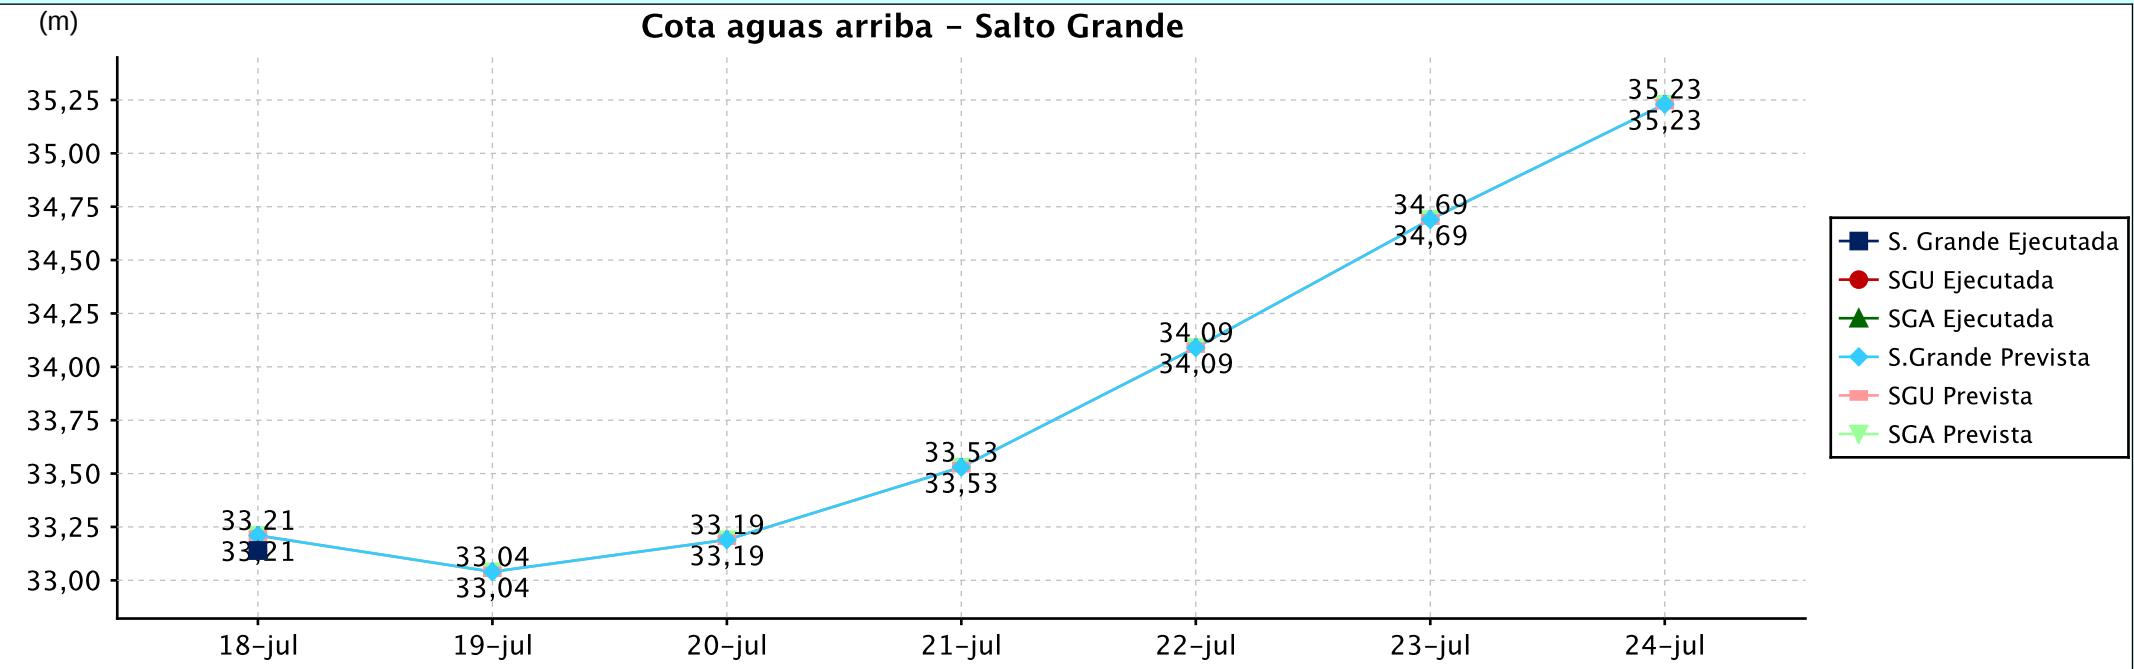

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	33,14
Cota Vista Arg	33,14
Cota real	33,14
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	0

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	504	392
Baygorria	529	415
Palmar	496	192
SGU	3.545	4.261

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	206	228
Baygorria	0	-17
Palmar	0	-3
SGU	5.875	5.823

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	3.735	5.729

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
