




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


jueves 23 de julio de 2015

Generación Térmica	
Central Battle	777
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	781
Central La Tablada	-81
Central P. del Tigre	2.534
APR A	182
APR B	-3
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	2.803
C. Baygorria	2.043
C. Palmar	5.182
C. Salto Grande	16.290
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	5.355
TOTAL Generación	35.083



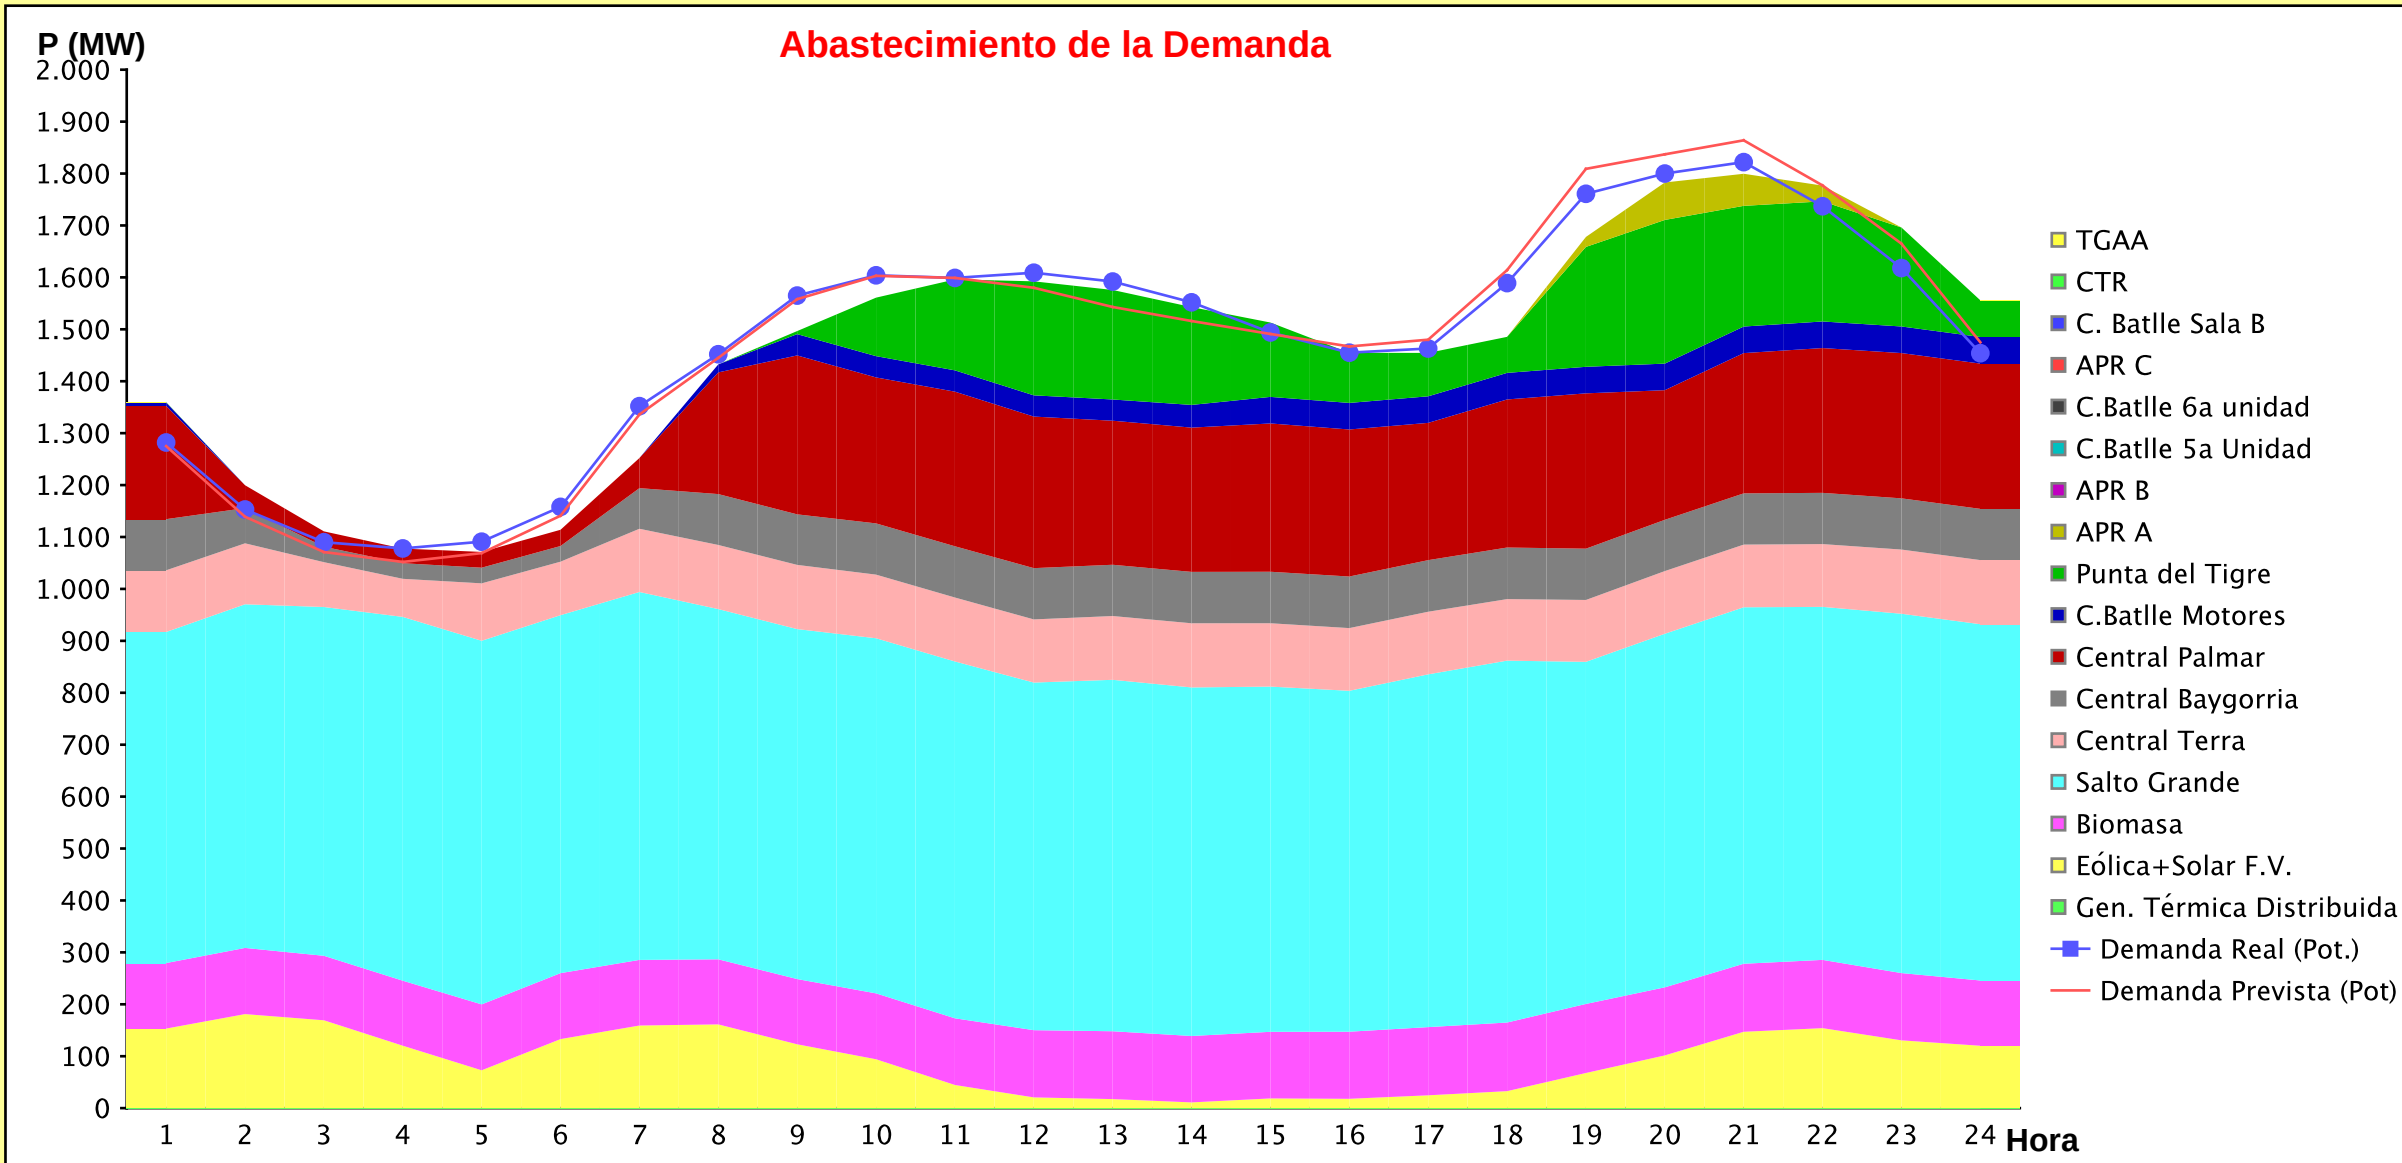


Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	35.083
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	35.406
Diferencia (MWh)	-323
Ejecutada - Programada	-0,91 %


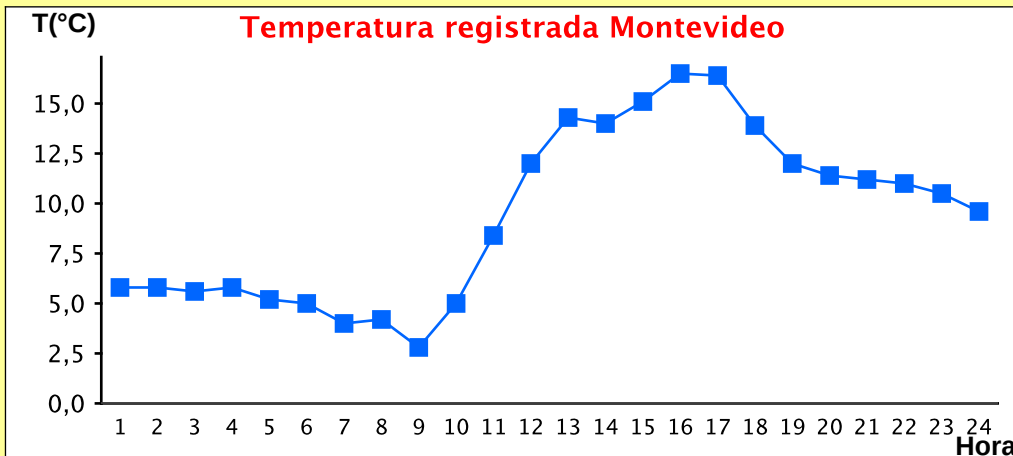


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1620 Hora 10:55
Potencia mínima:	1065 Hora 03:53
Pico noche:	1834 Hora 20:48
Generación Media (MW)	
Eólica	96,0
Biomasa	128,4
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

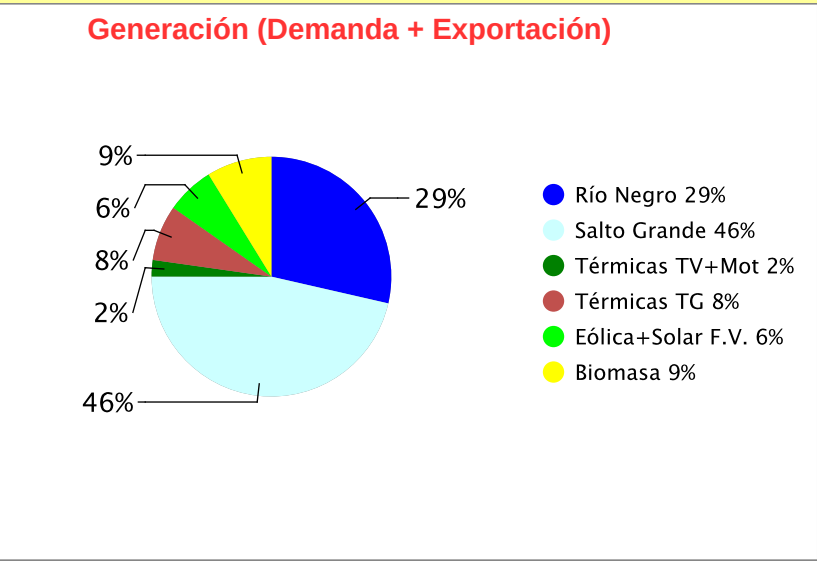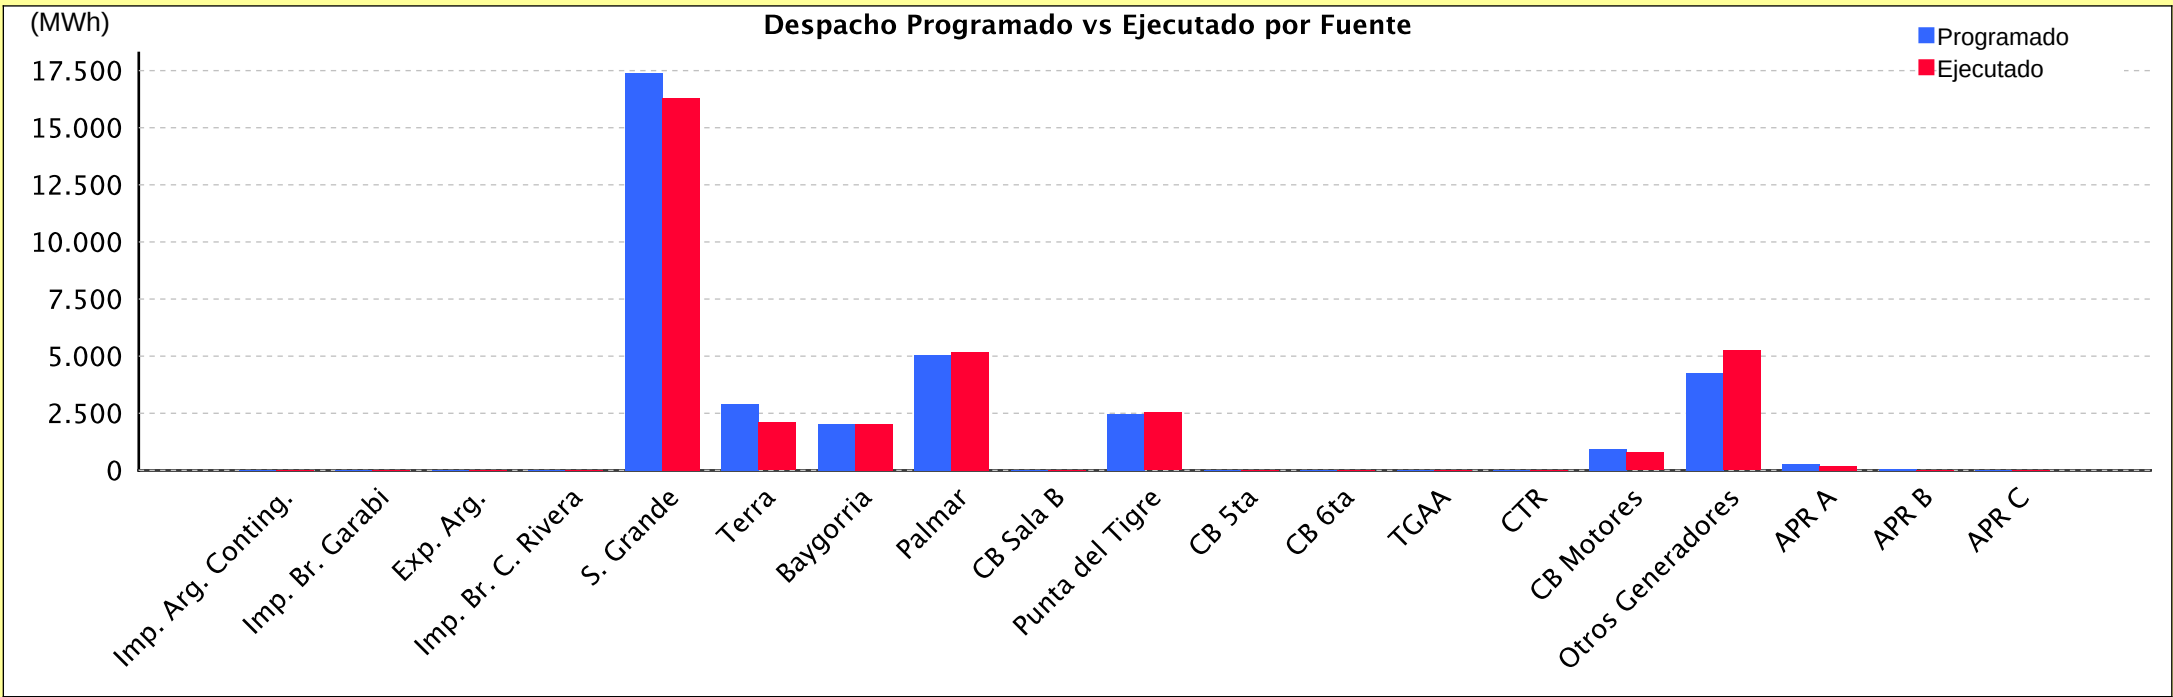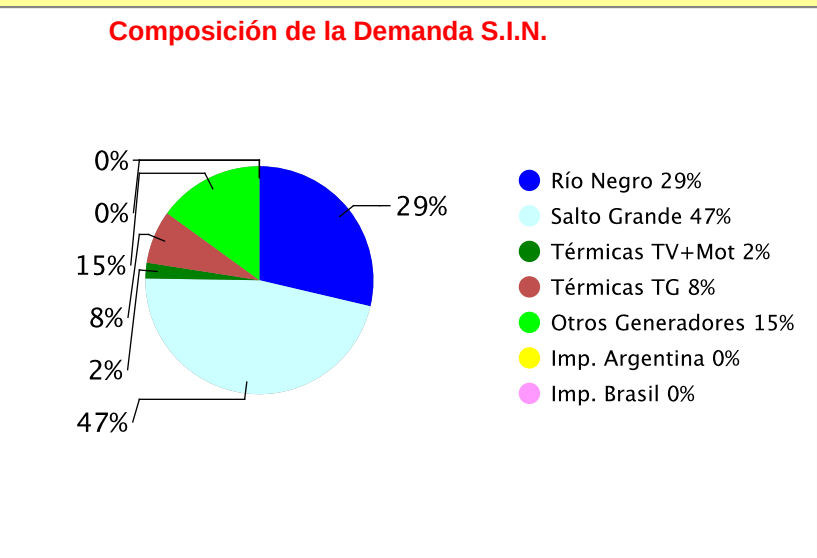



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

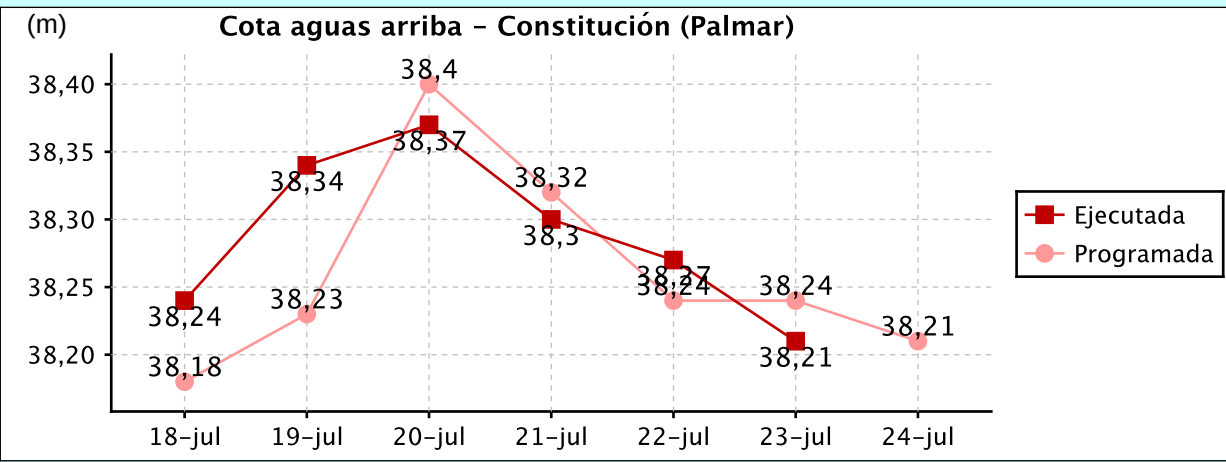
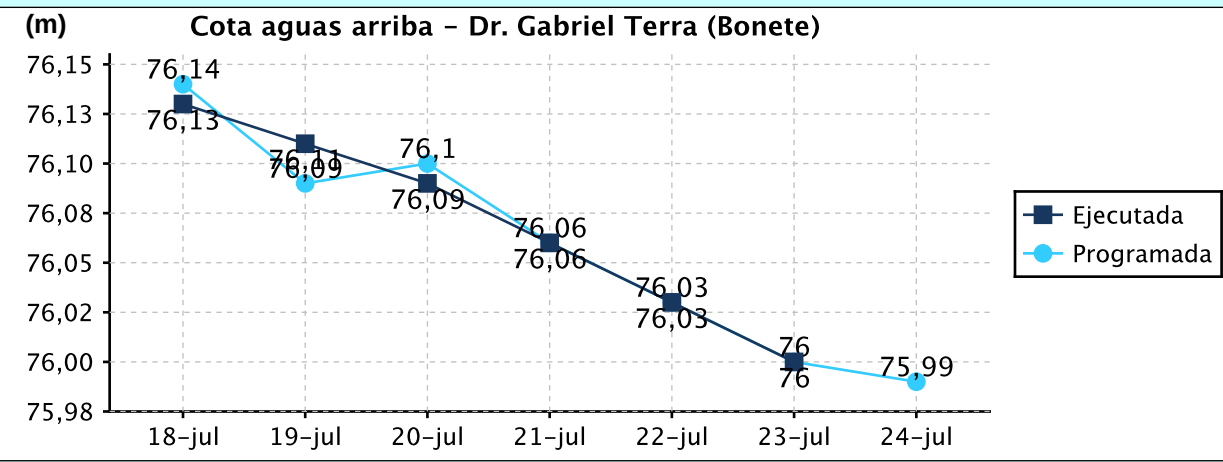


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,00	76
Baygorria	53,55	52,49
Palmar	38,24	38,21
SGU	33,84	33,68

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

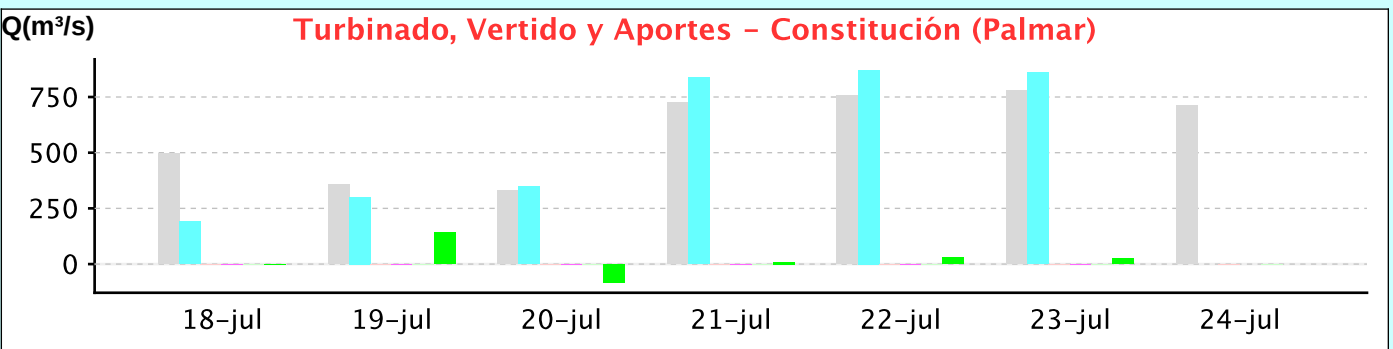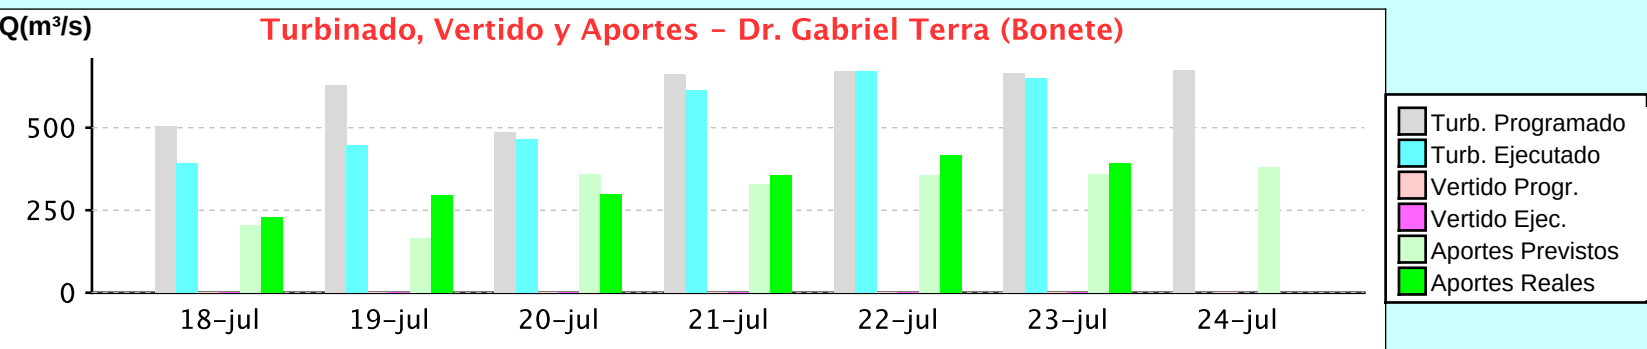

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

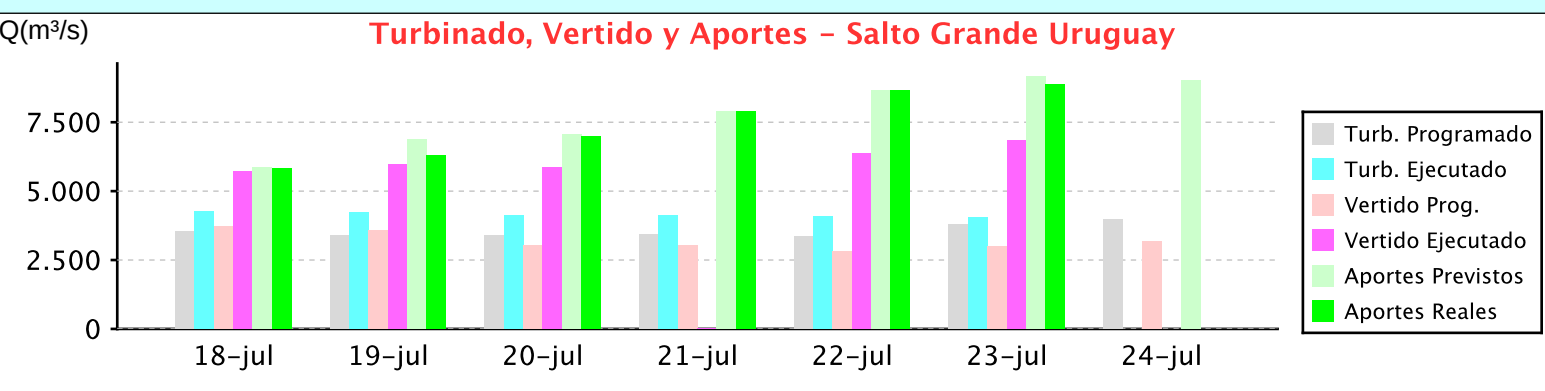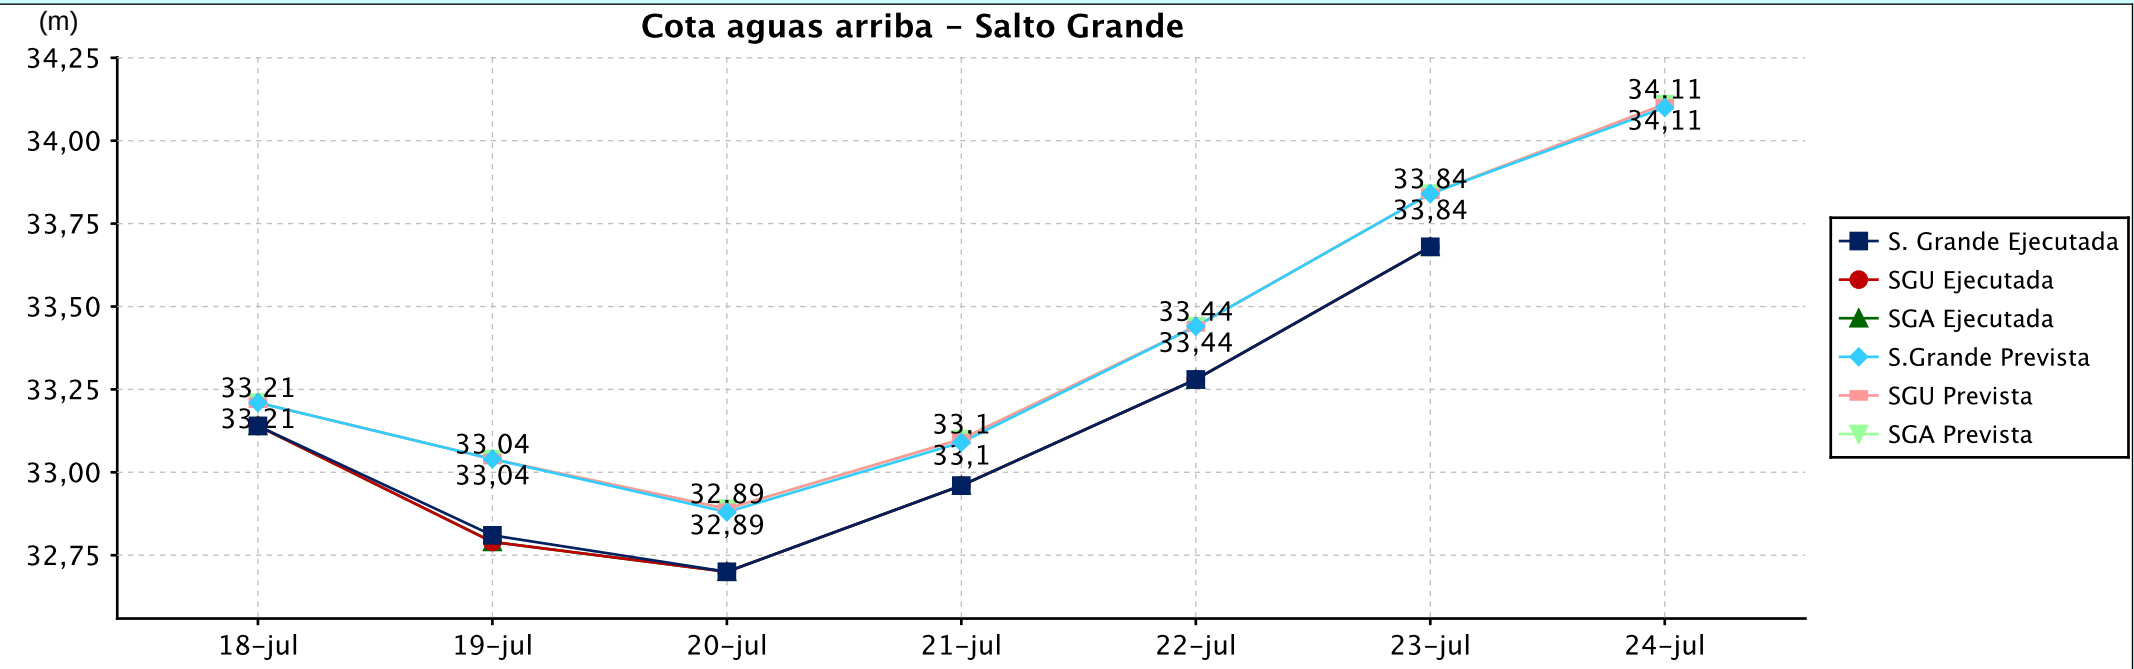

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	33,68
Cota Vista Arg	33,68
Cota real	33,68
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	0

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	664	649
Baygorria	703	673
Palmar	779	861
SGU	3.806	4.028

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	360	392
Baygorria	0	-15
Palmar	0	25
SGU	9.175	8.871

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	2.982	6.855

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
