




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

sábado 25 de julio de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	13
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	17
Central La Tablada	-91
Central P. del Tigre	-9
APR A	-1
APR B	-3
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	1.612
C. Baygorria	307
C. Palmar	1.119
C. Salto Grande	17.393
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	9.153
TOTAL Generación	29.493

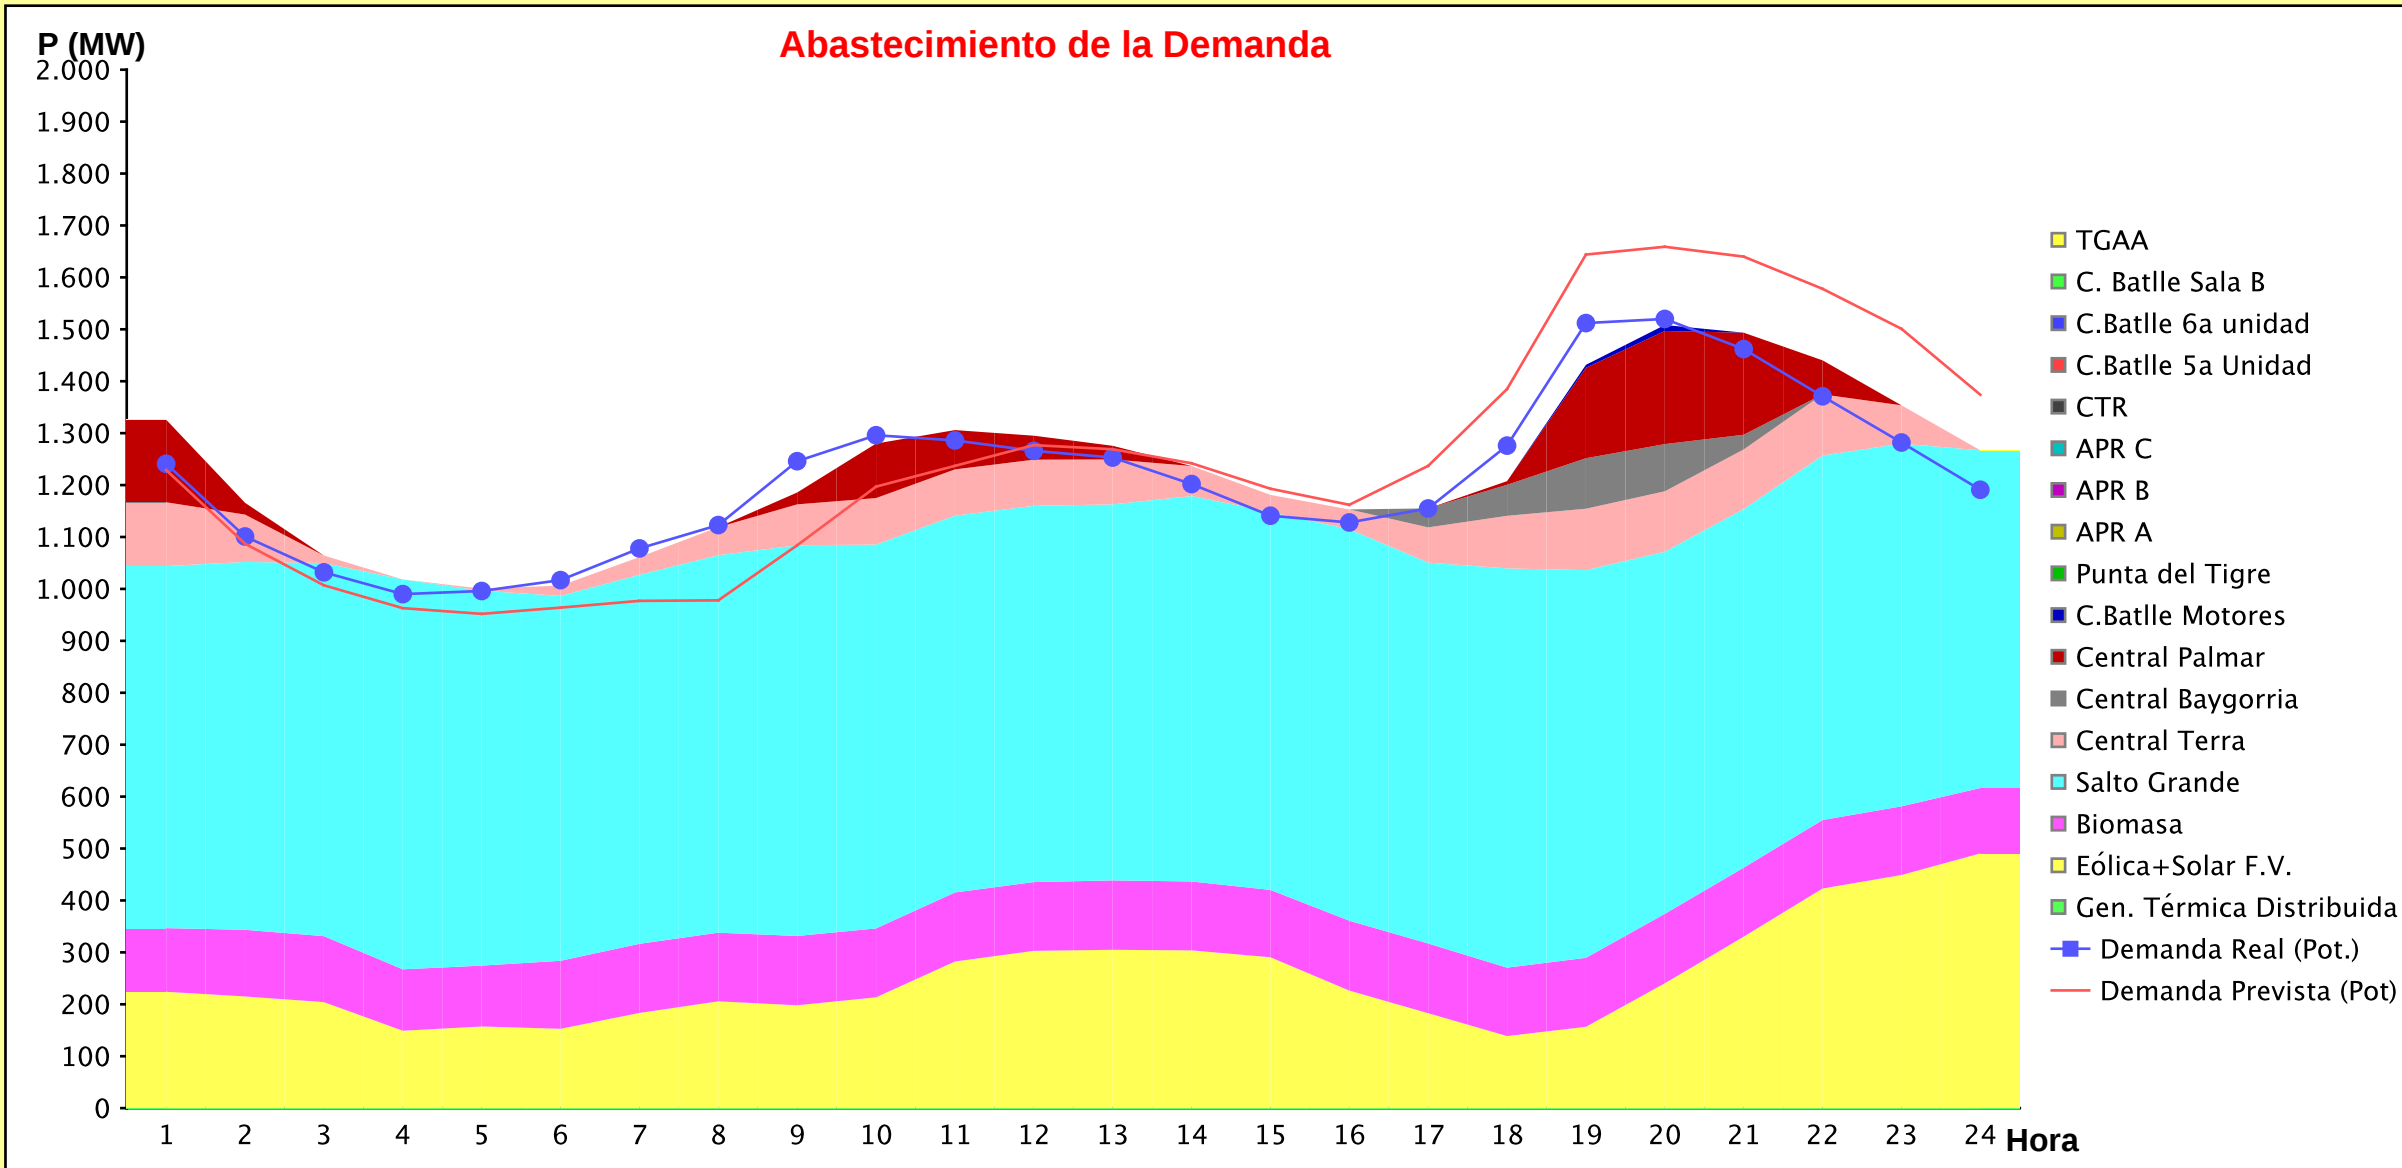

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	76
Hidráulica	76
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	76




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	29.417
(en bormes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	29.836
Diferencia (MWh)	-419
Ejecutada - Programada	-1,41 %

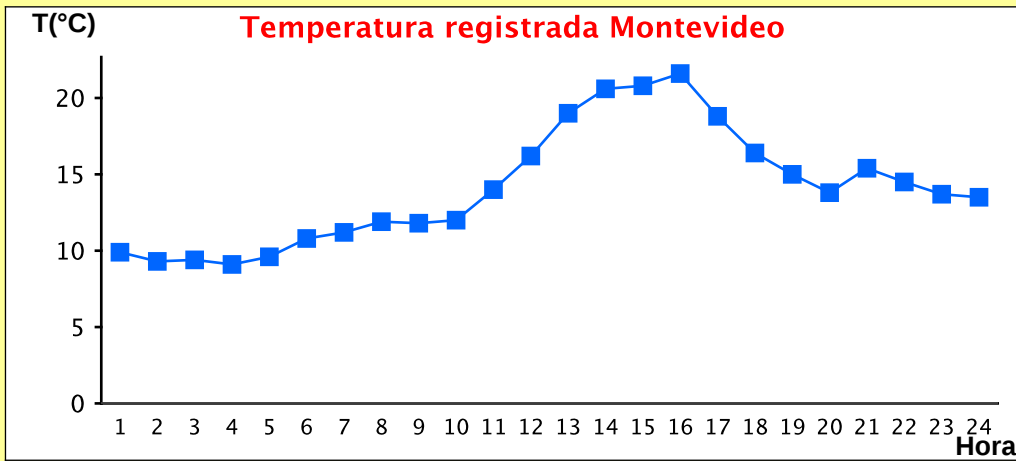



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1324 Hora 11:01
Potencia mínima:	1009 Hora 04:46
Pico noche:	1536 Hora 19:38

Generación Media (MW)	
Eólica	250,1
Biomasa	130,3
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

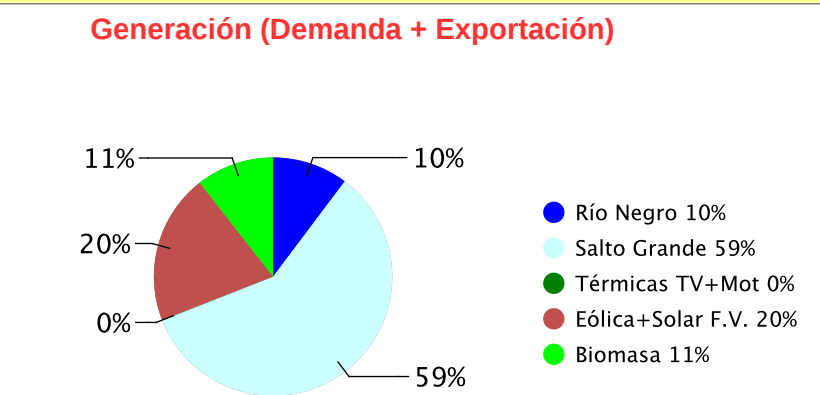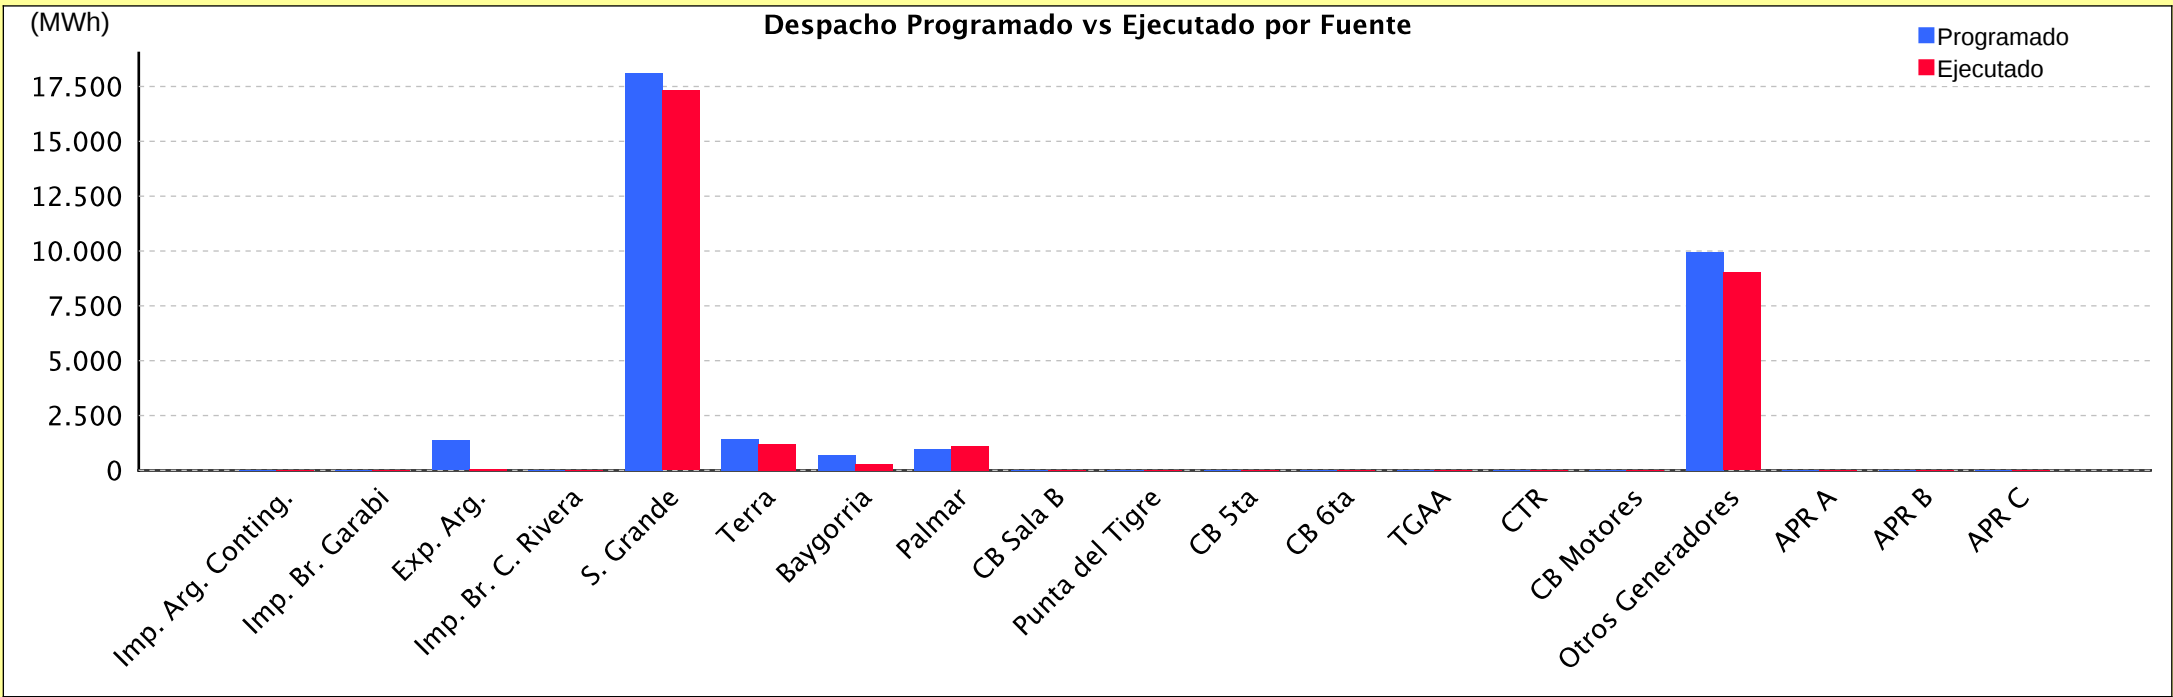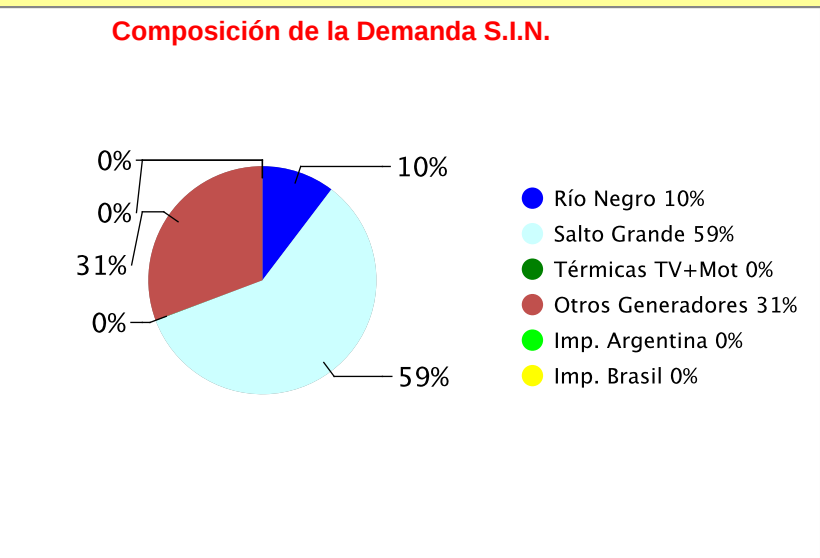



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

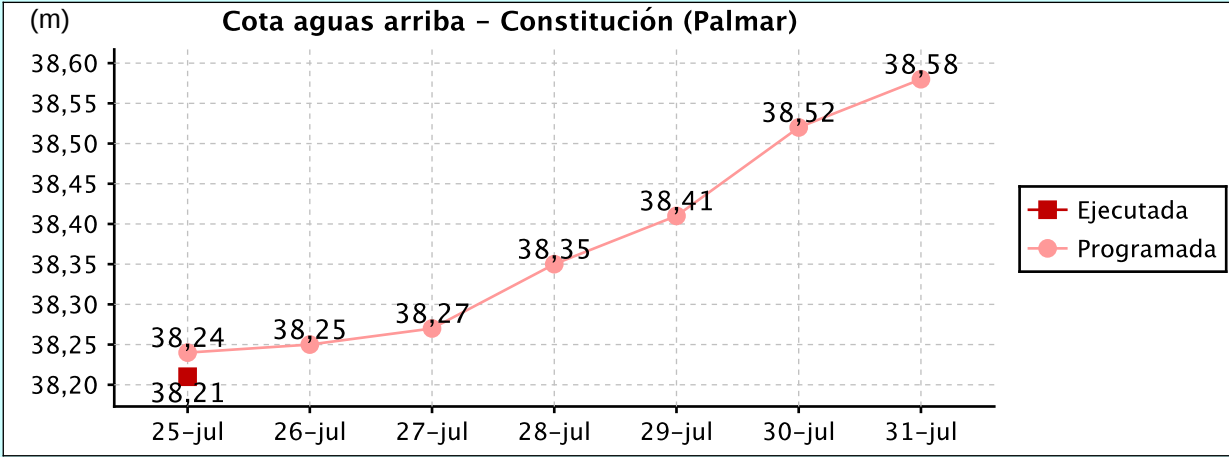
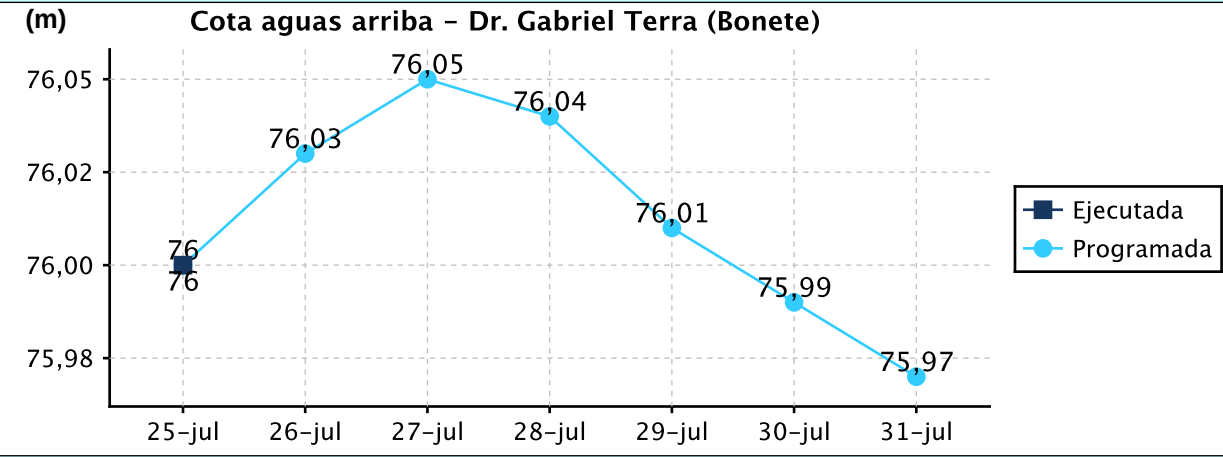


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,00	76
Baygorria	53,56	53,74
Palmar	38,24	38,21
SGU	34,59	34,52

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

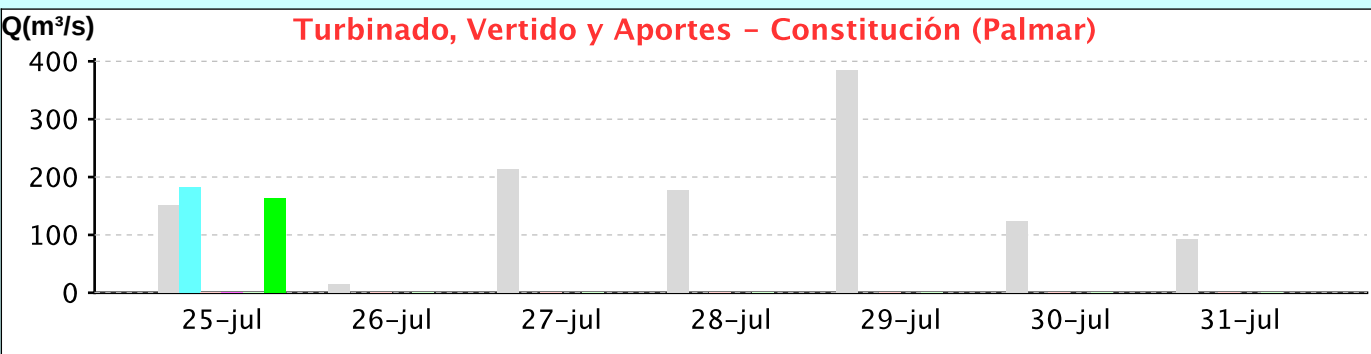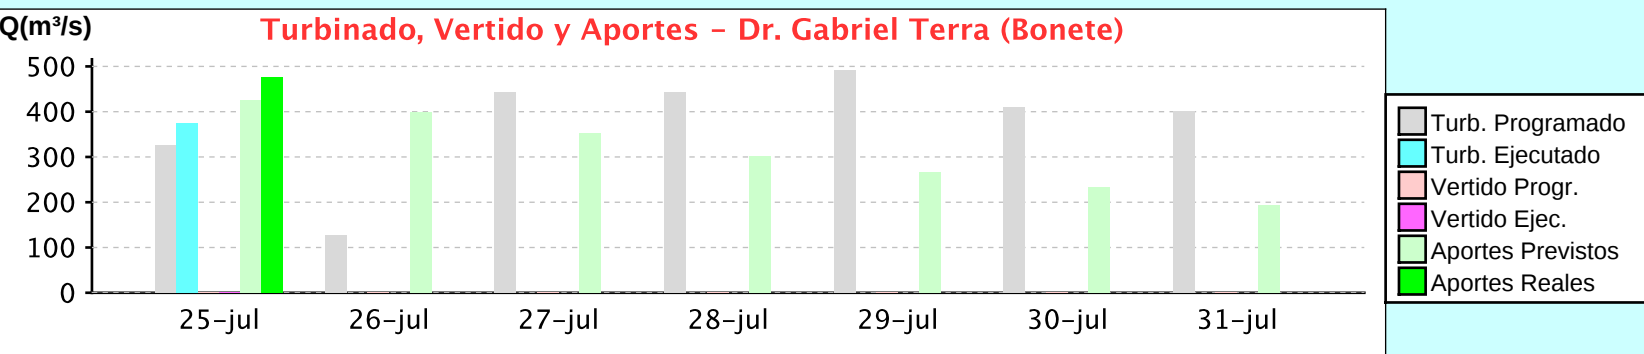

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

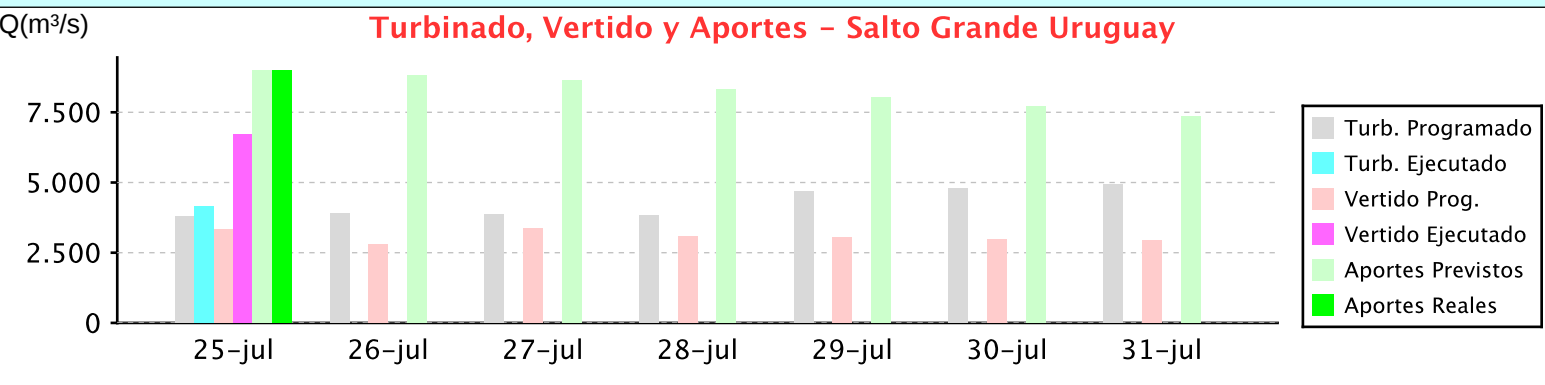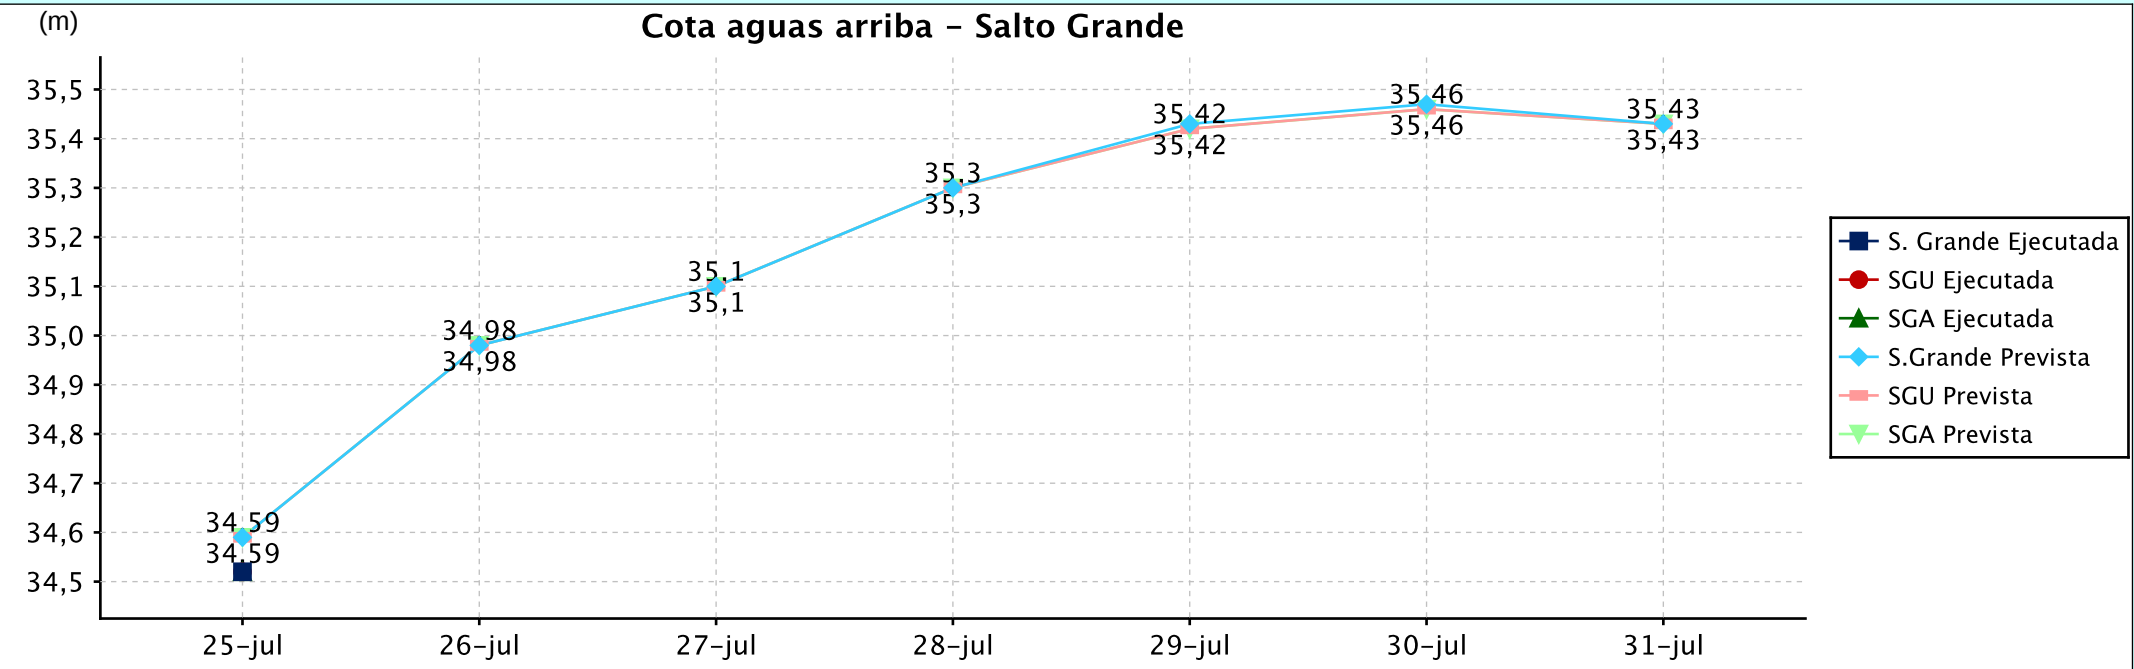

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	34,52
Cota Vista Arg	34,52
Cota real	34,52
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
0	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	326	373
Baygorria	237	99
Palmar	152	181
SGU	3.797	4.139

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	425	476
Baygorria	0	102
Palmar	0	163
SGU	9.000	9.003

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	3.313	6.708

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
