




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

lunes 27 de julio de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	0
Central La Tablada	-80
Central P. del Tigre	-9
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	1.517
C. Baygorria	599
C. Palmar	272
C. Salto Grande	17.929
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	11.509
TOTAL Generación	31.728

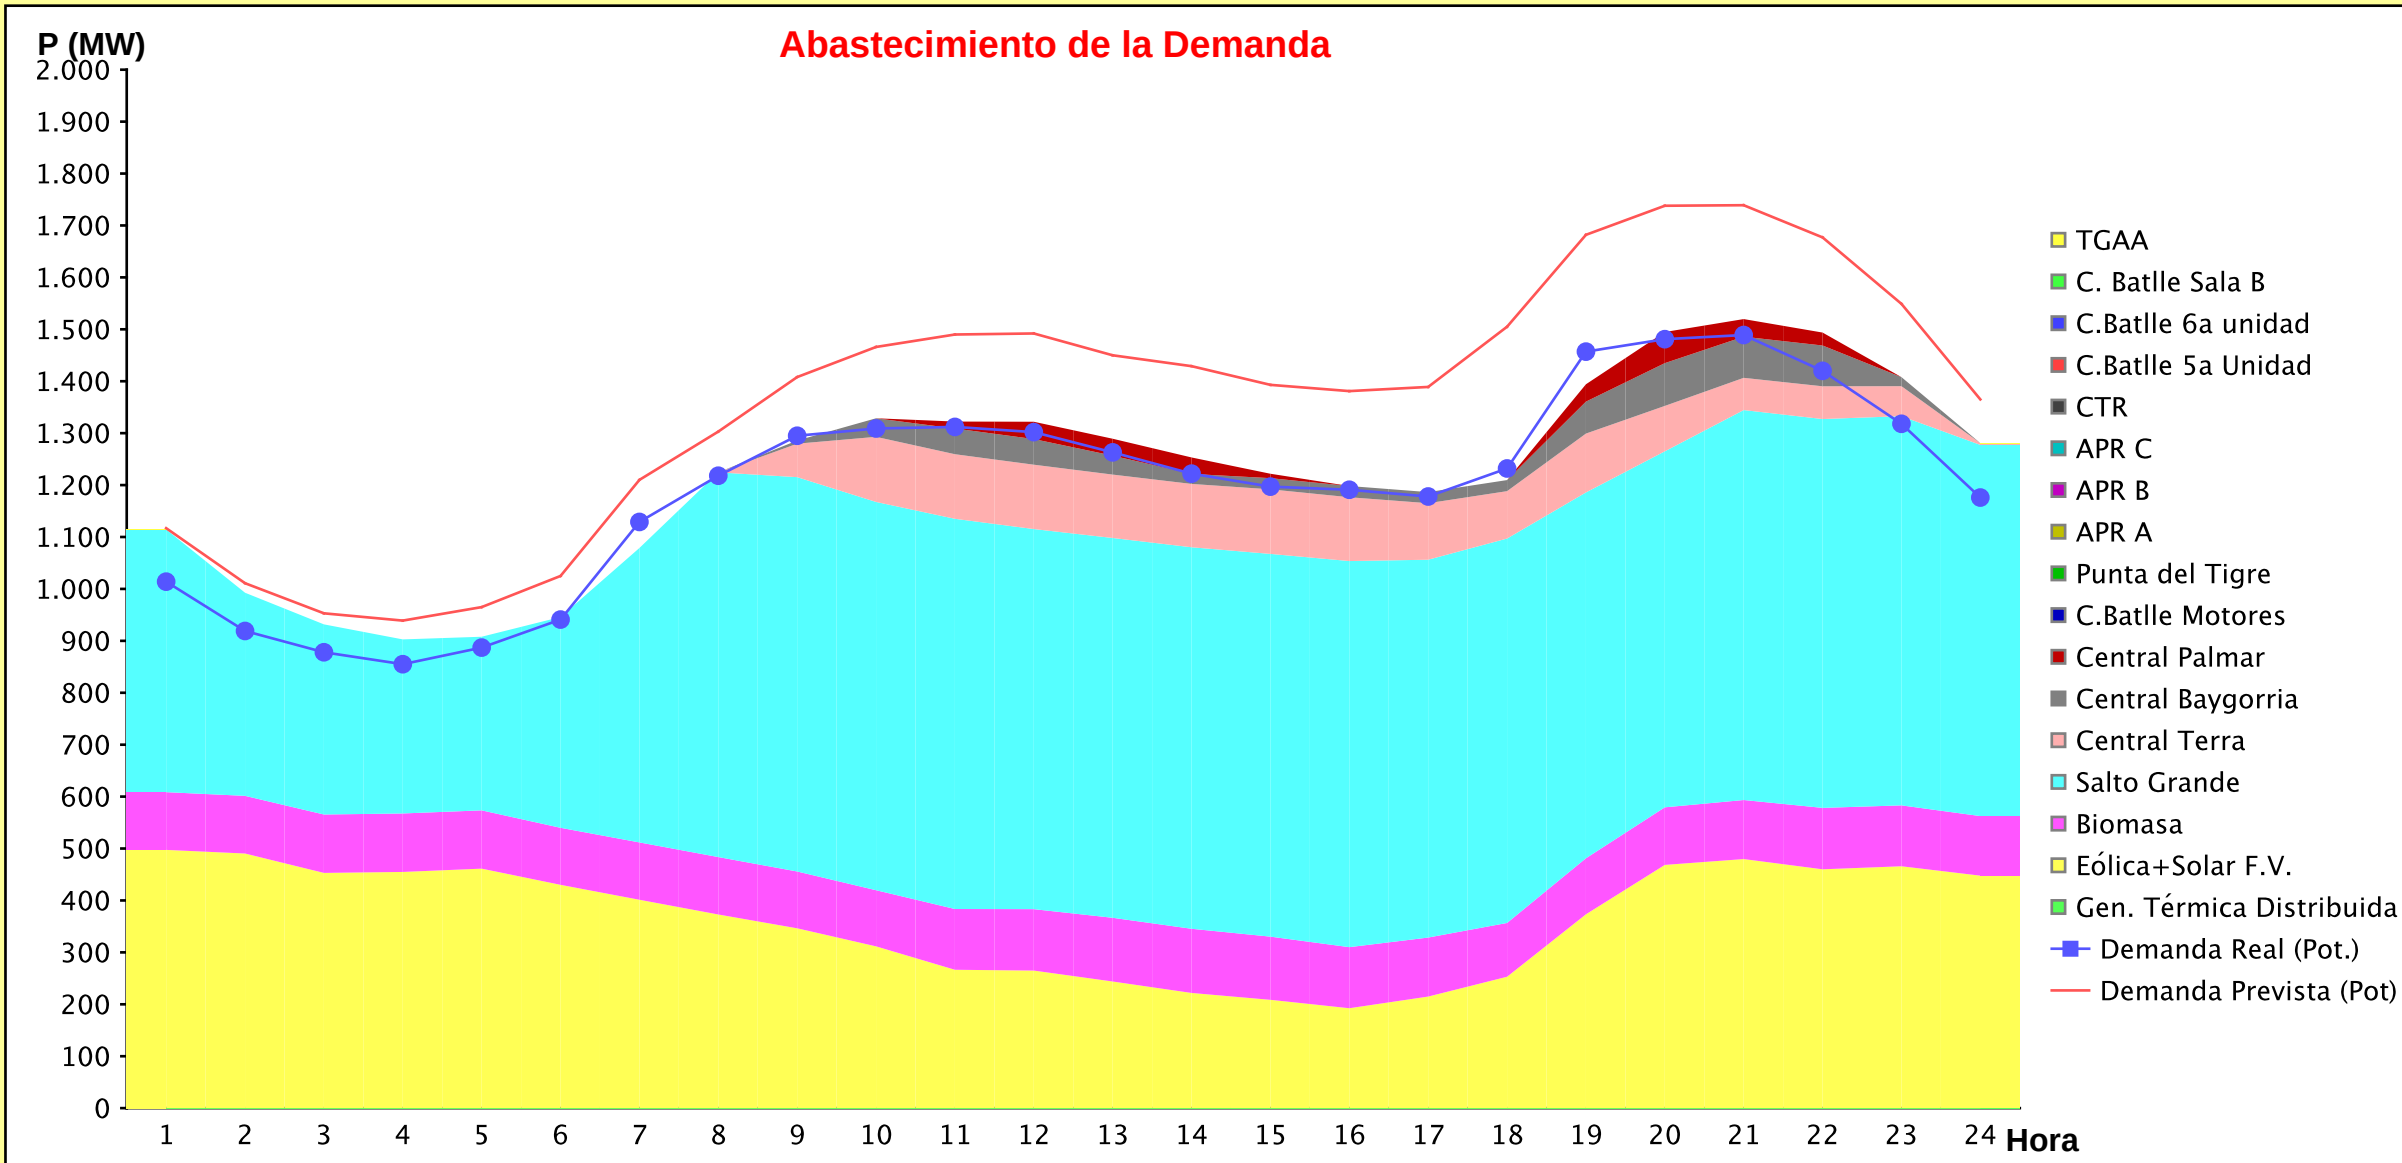

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	2.521
Hidráulica	2.521
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	2.521

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	29.207
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	


Demanda Programada (MWh)	32.676
Diferencia (MWh)	-3.469
Ejecutada - Programada	-10,62 %

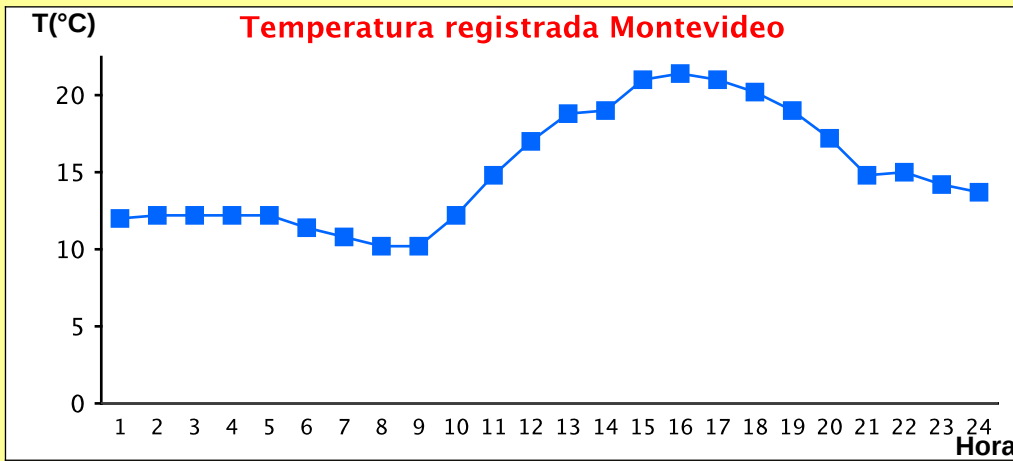

Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1354 Hora 10:01
Potencia mínima:	907 Hora 03:47
Pico noche:	1571 Hora 20:53



Generación Media (MW)	
Eólica	365,0
Biomasa	114,0
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

Composición de la Demanda S.I.N.

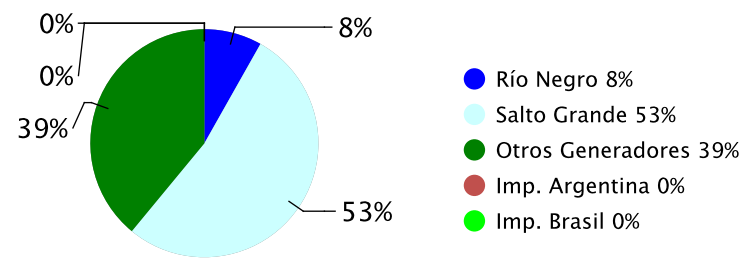



Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

Generación (Demanda + Exportación)

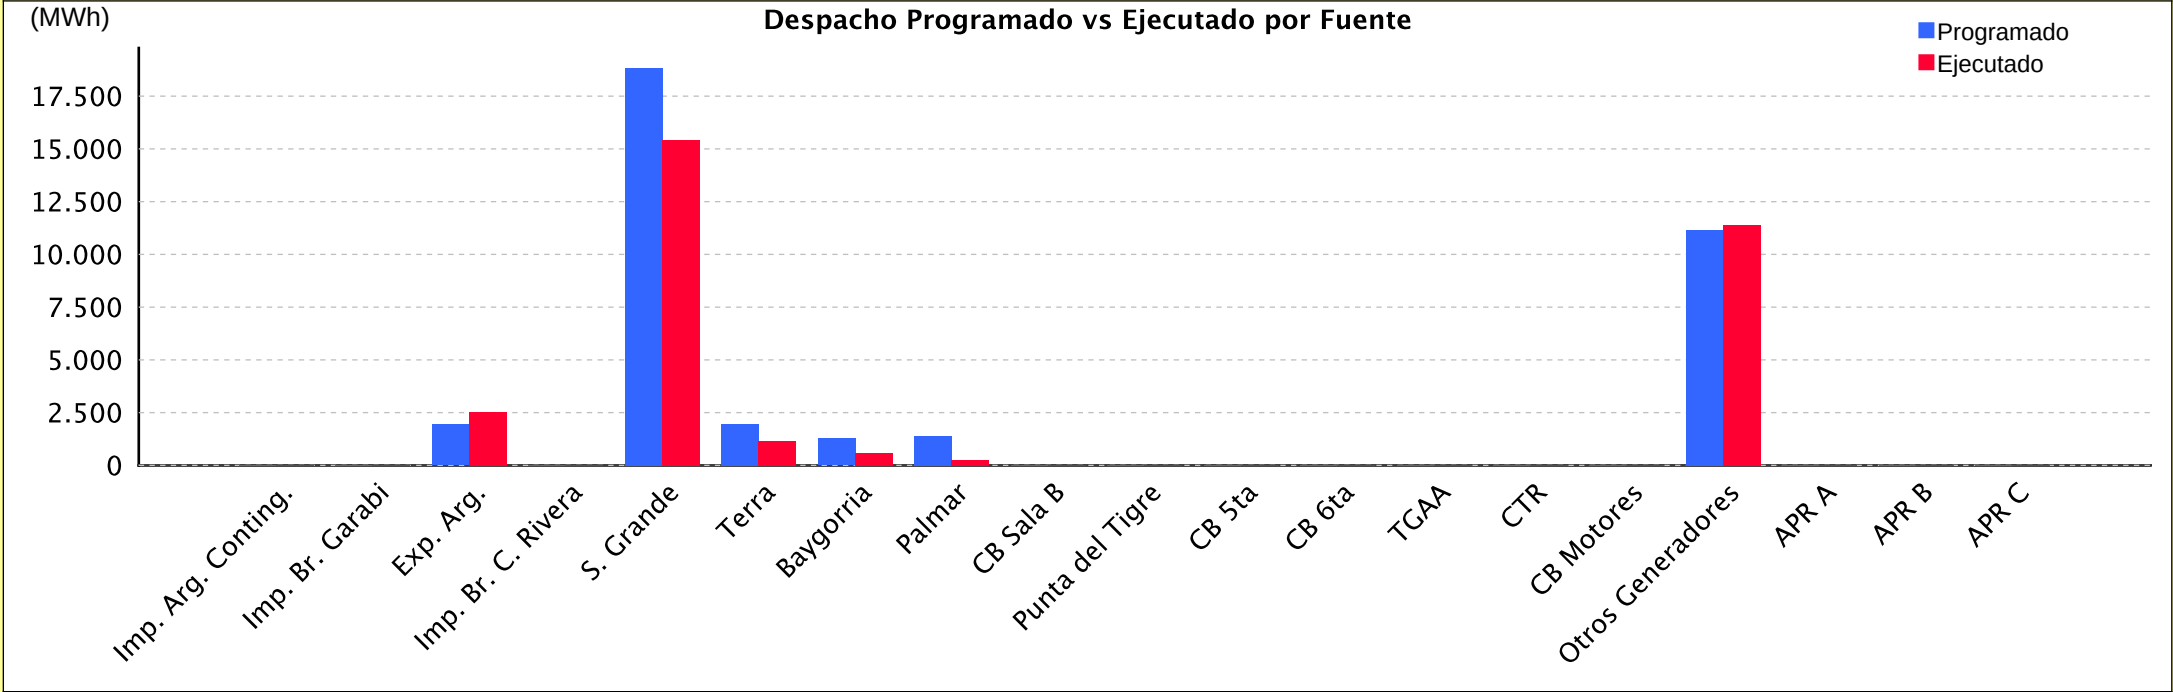



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

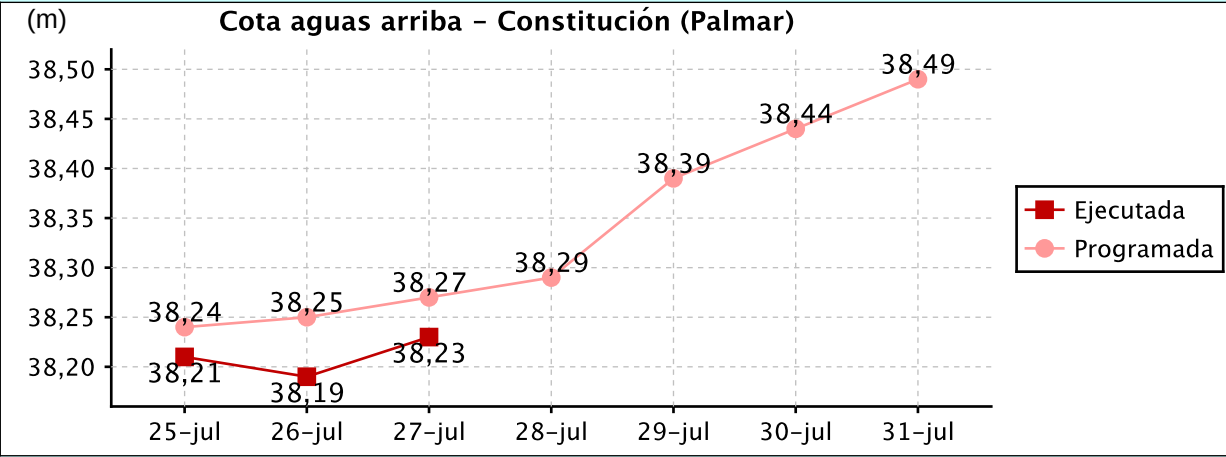
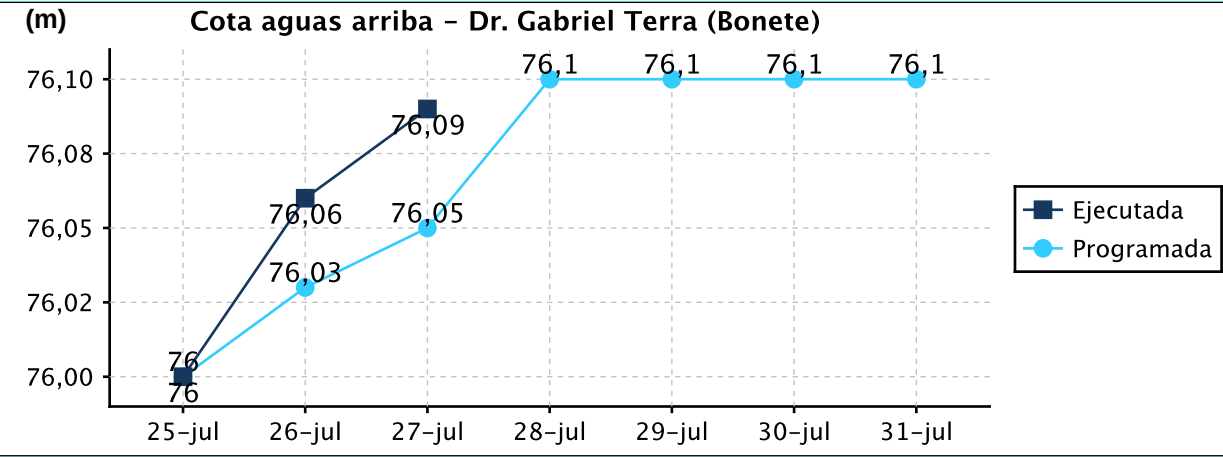


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,05	76,09
Baygorria	53,80	53,94
Palmar	38,27	38,23
SGU	35,10	35,11

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

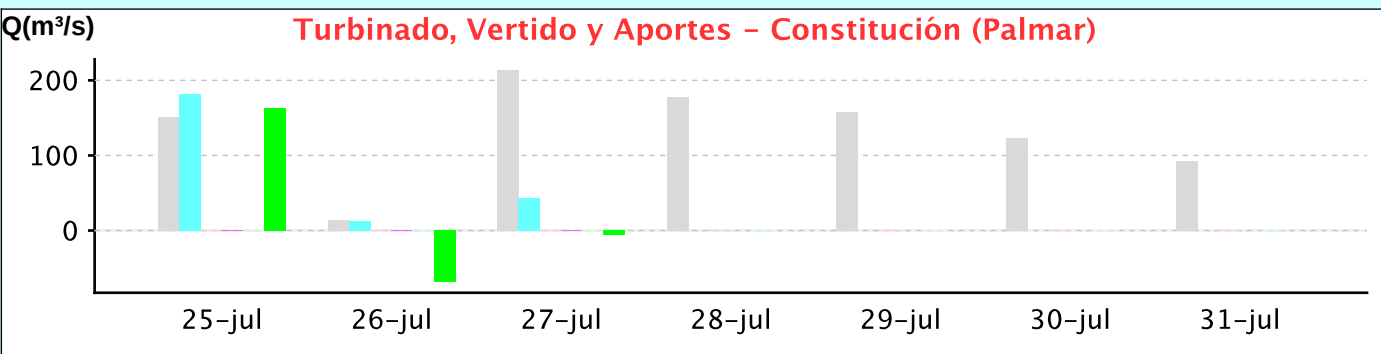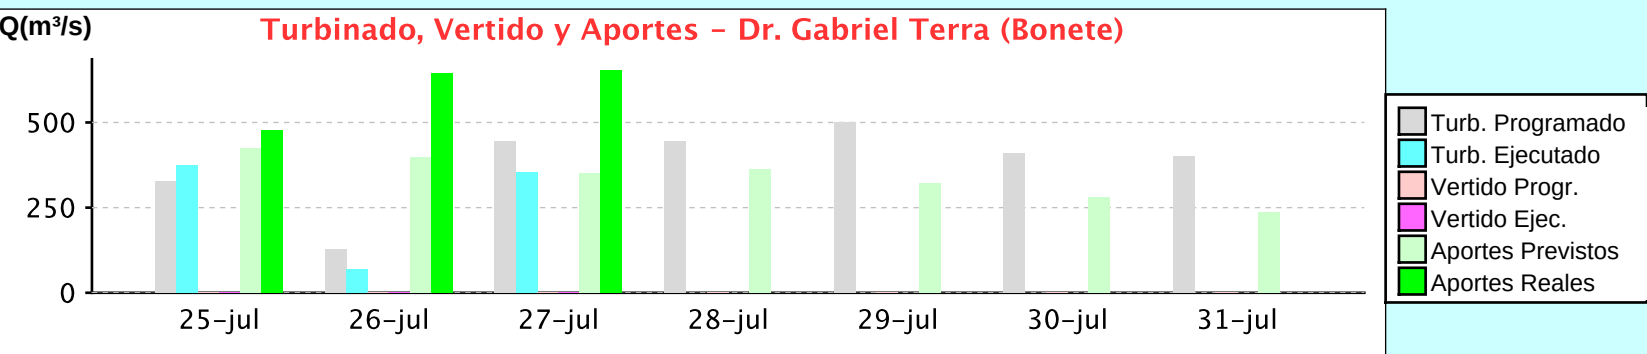

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

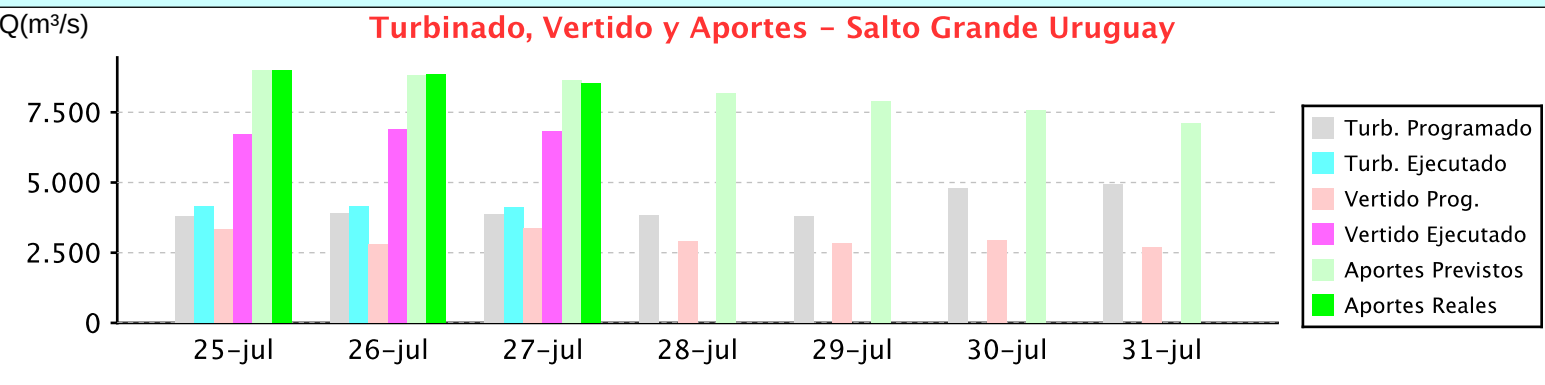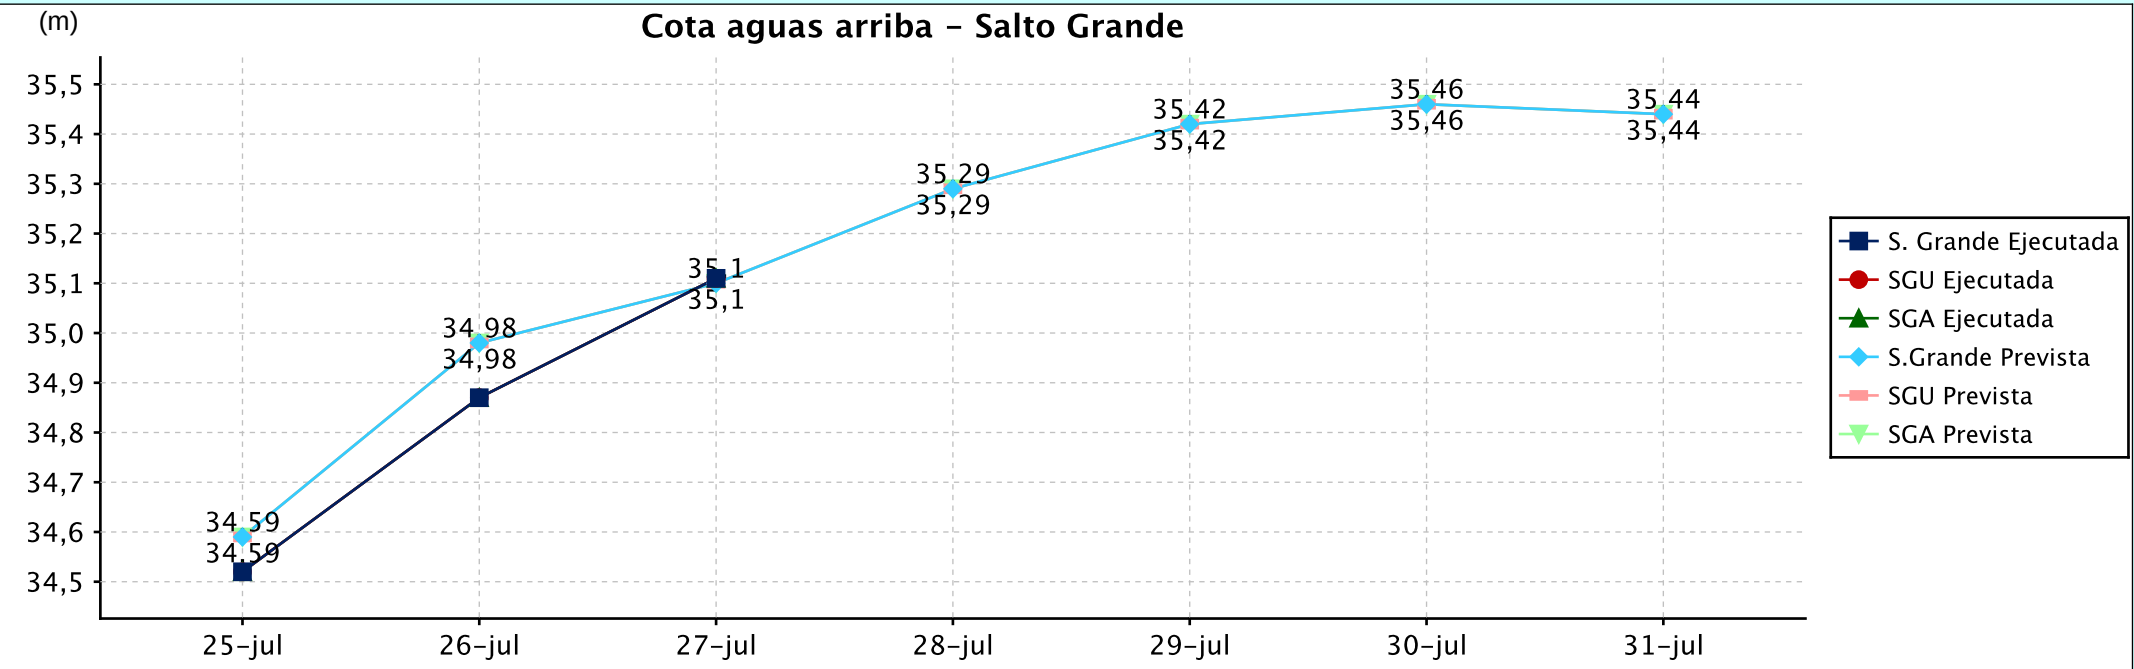

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,11
Cota Vista Arg	35,11
Cota real	35,11
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	0

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	443	353
Baygorria	440	189
Palmar	214	43
SGU	3.869	4.115

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	351	653
Baygorria	0	17
Palmar	0	-6
SGU	8.625	8.516

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	3.354	6.803

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
