




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

viernes 31 de julio de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-0
Central La Tablada	-83
Central P. del Tigre	-9
APR A	-2
APR B	-2
APR C	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	1.006
C. Baygorria	529
C. Palmar	216
C. Salto Grande	17.665
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	13.020
TOTAL Generación	32.337

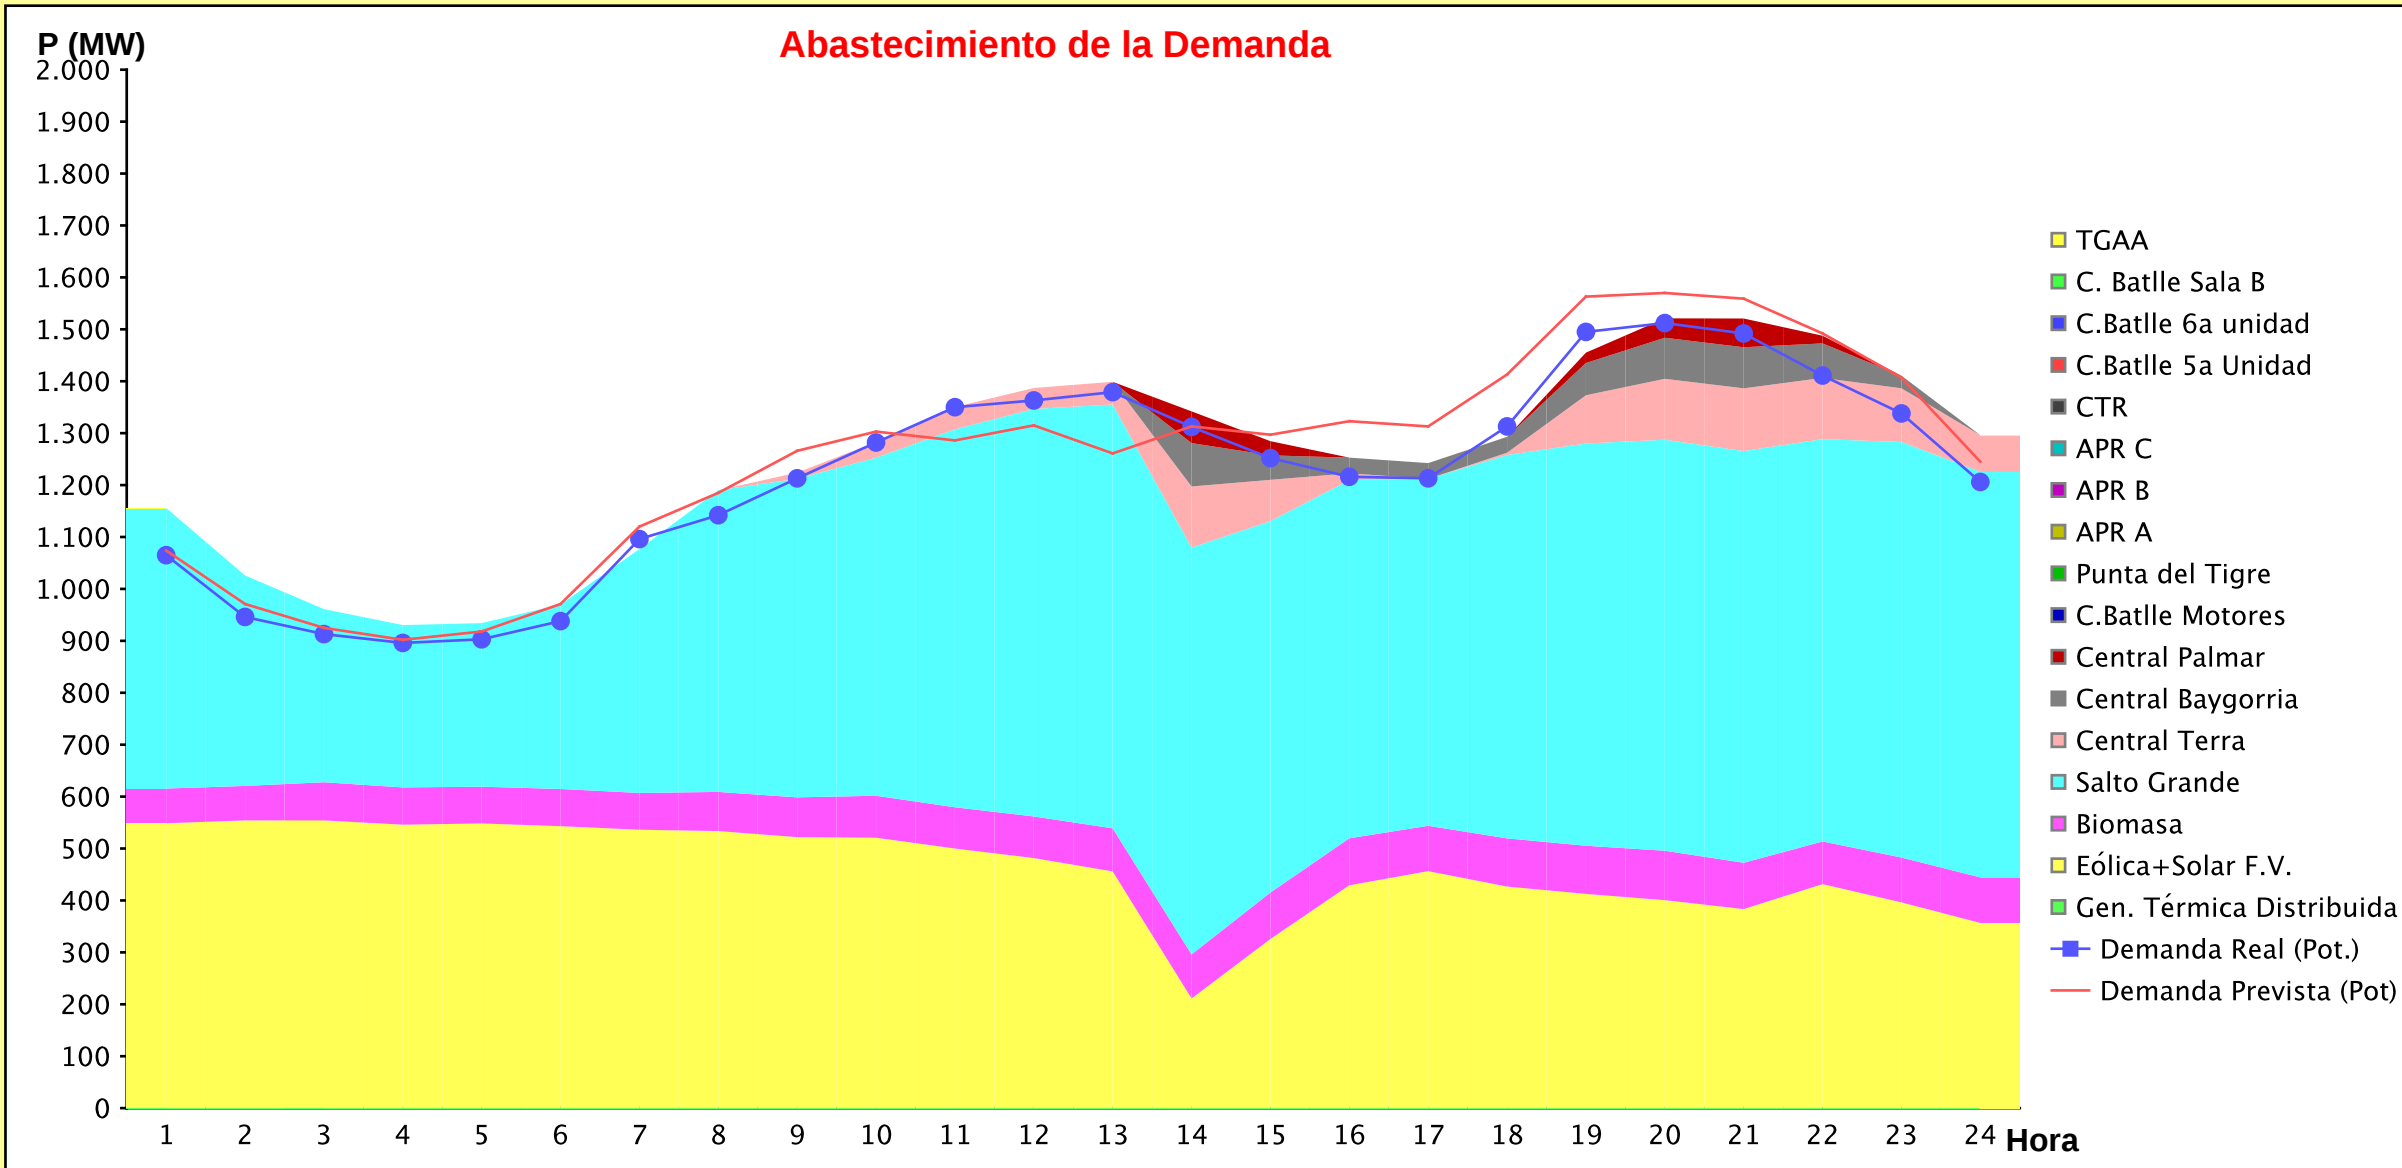

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	2.448
Hidráulica	2.448
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	2.448




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	29.889
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	29.992
Diferencia (MWh)	-103
Ejecutada - Programada	-0,34 %

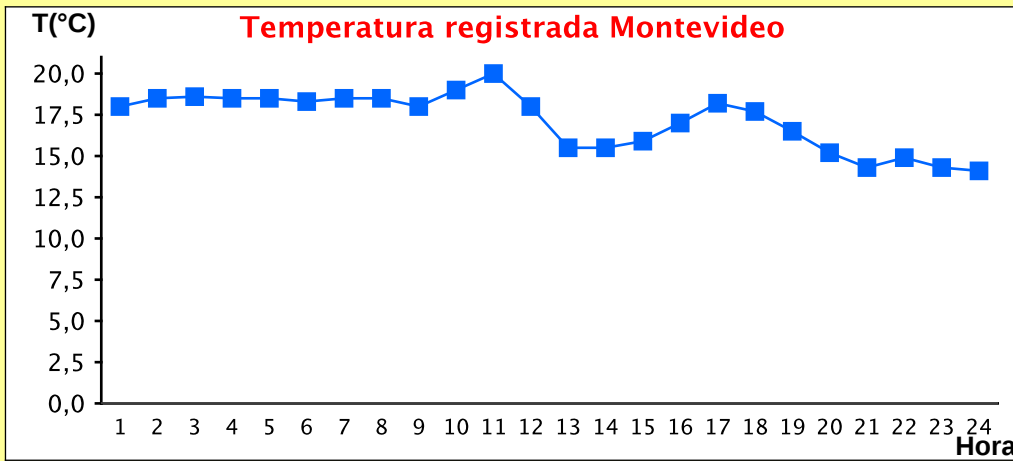



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1399 Hora 11:47
Potencia mínima:	912 Hora 03:35
Pico noche:	1533 Hora 19:48

Generación Media (MW)	
Eólica	459,1
Biomasa	81,5
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

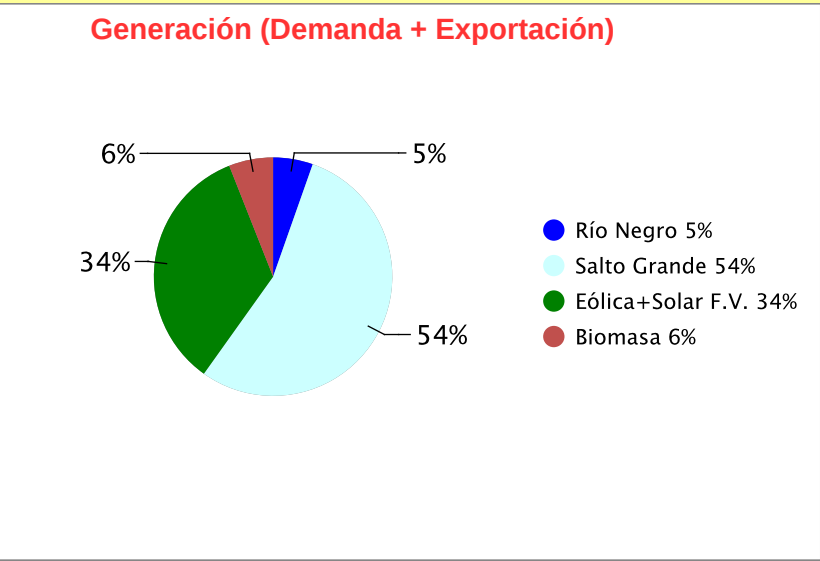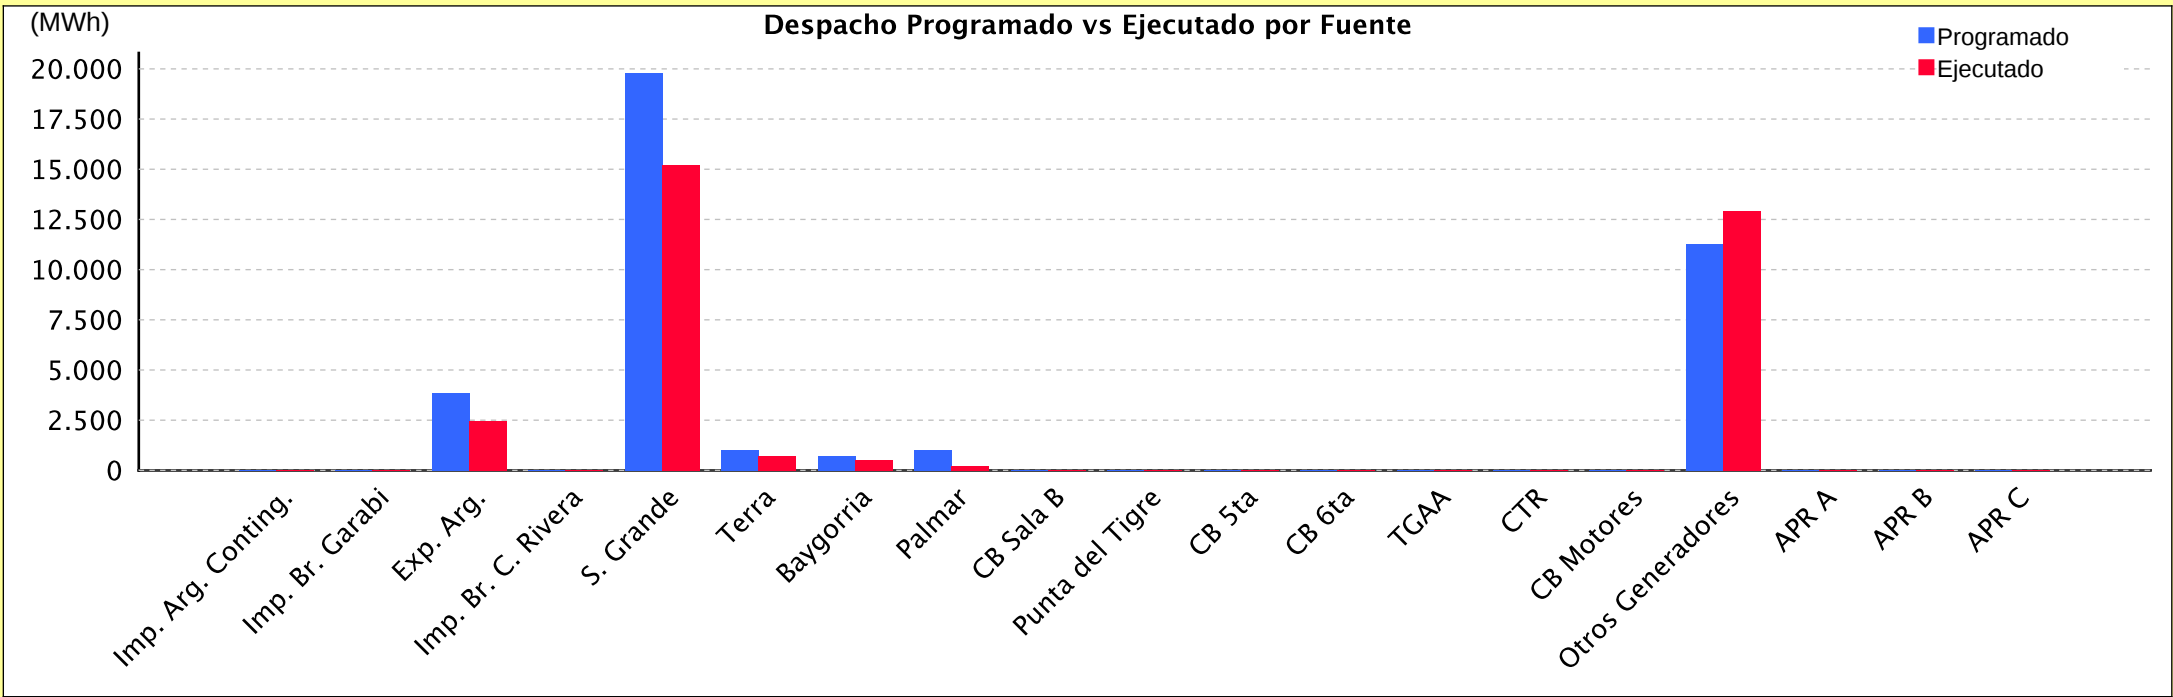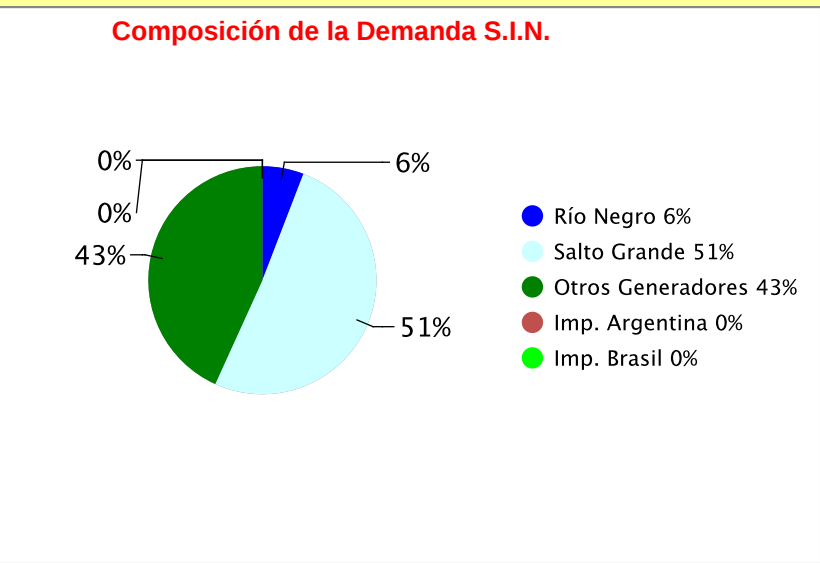



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

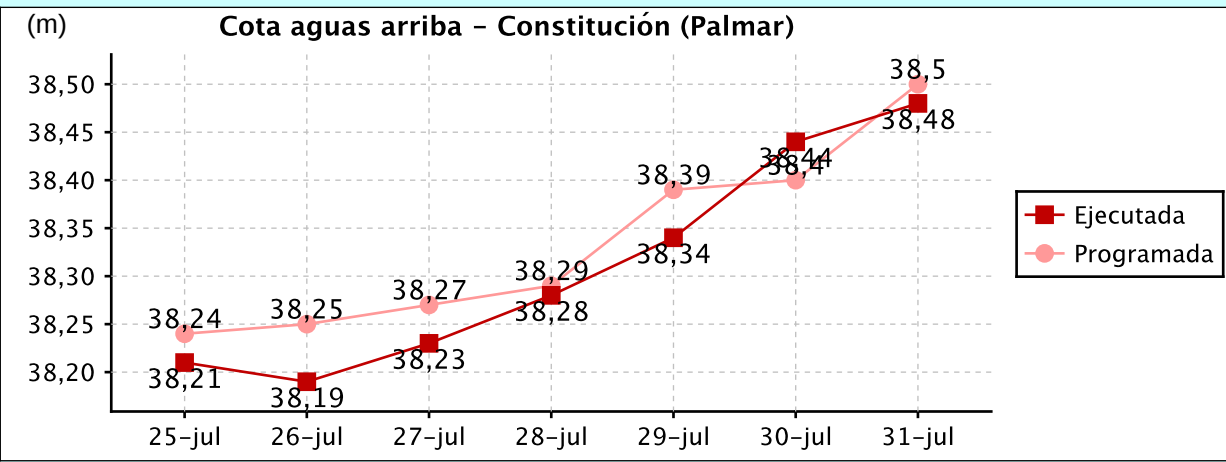
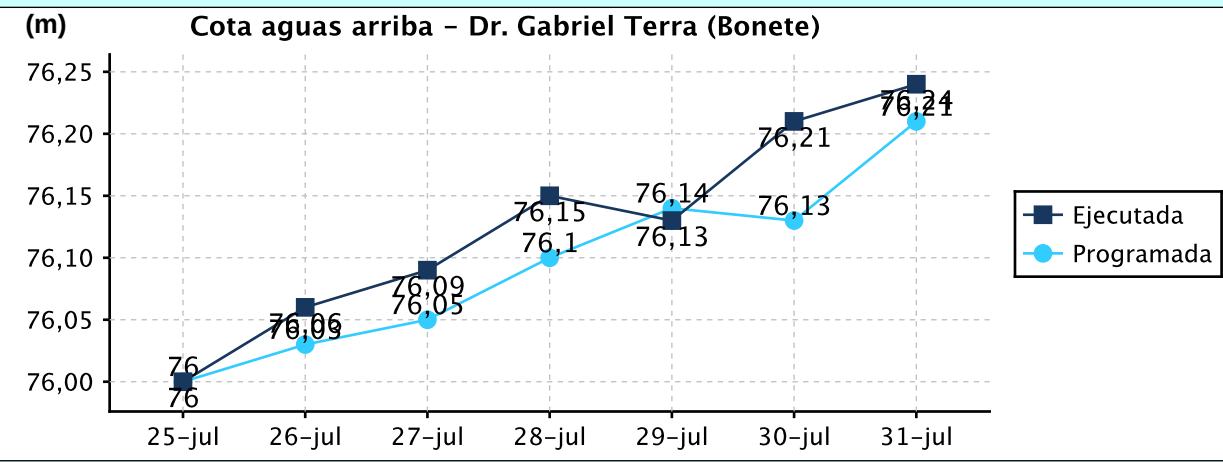


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,21	76,24
Baygorria	53,90	53,84
Palmar	38,50	38,48
SGU	35,46	35,42

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

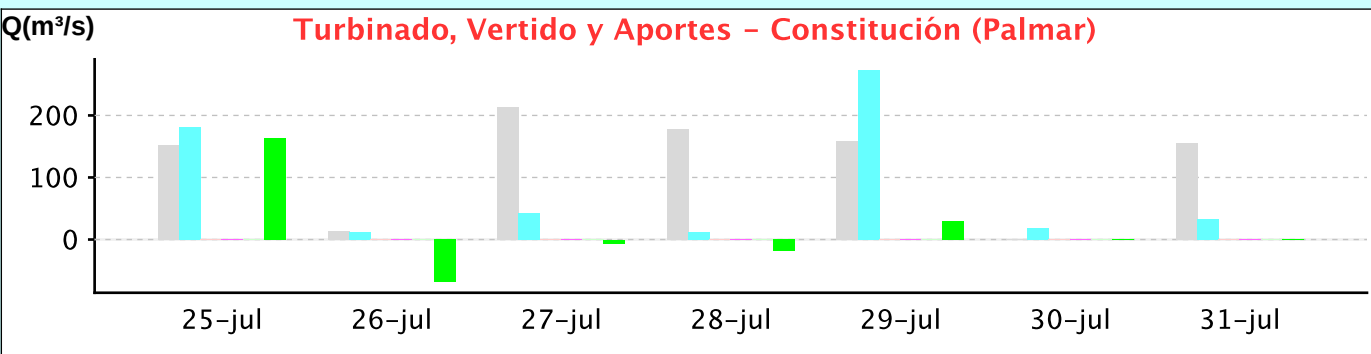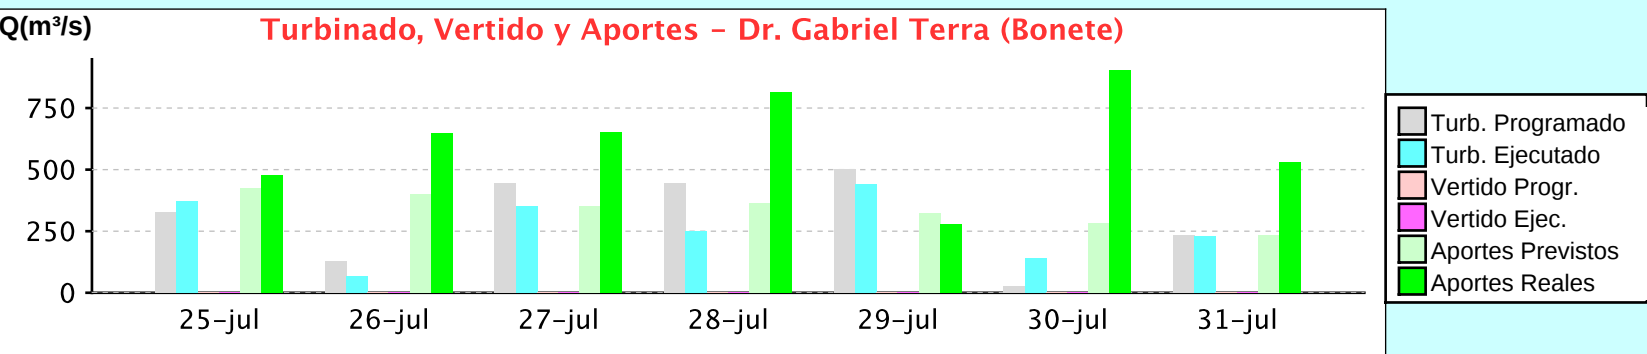

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

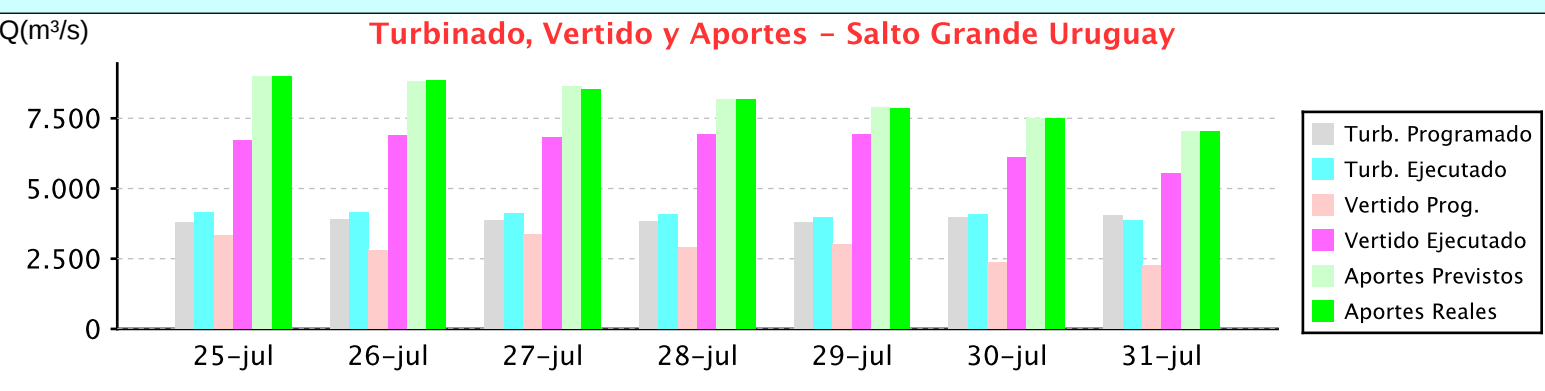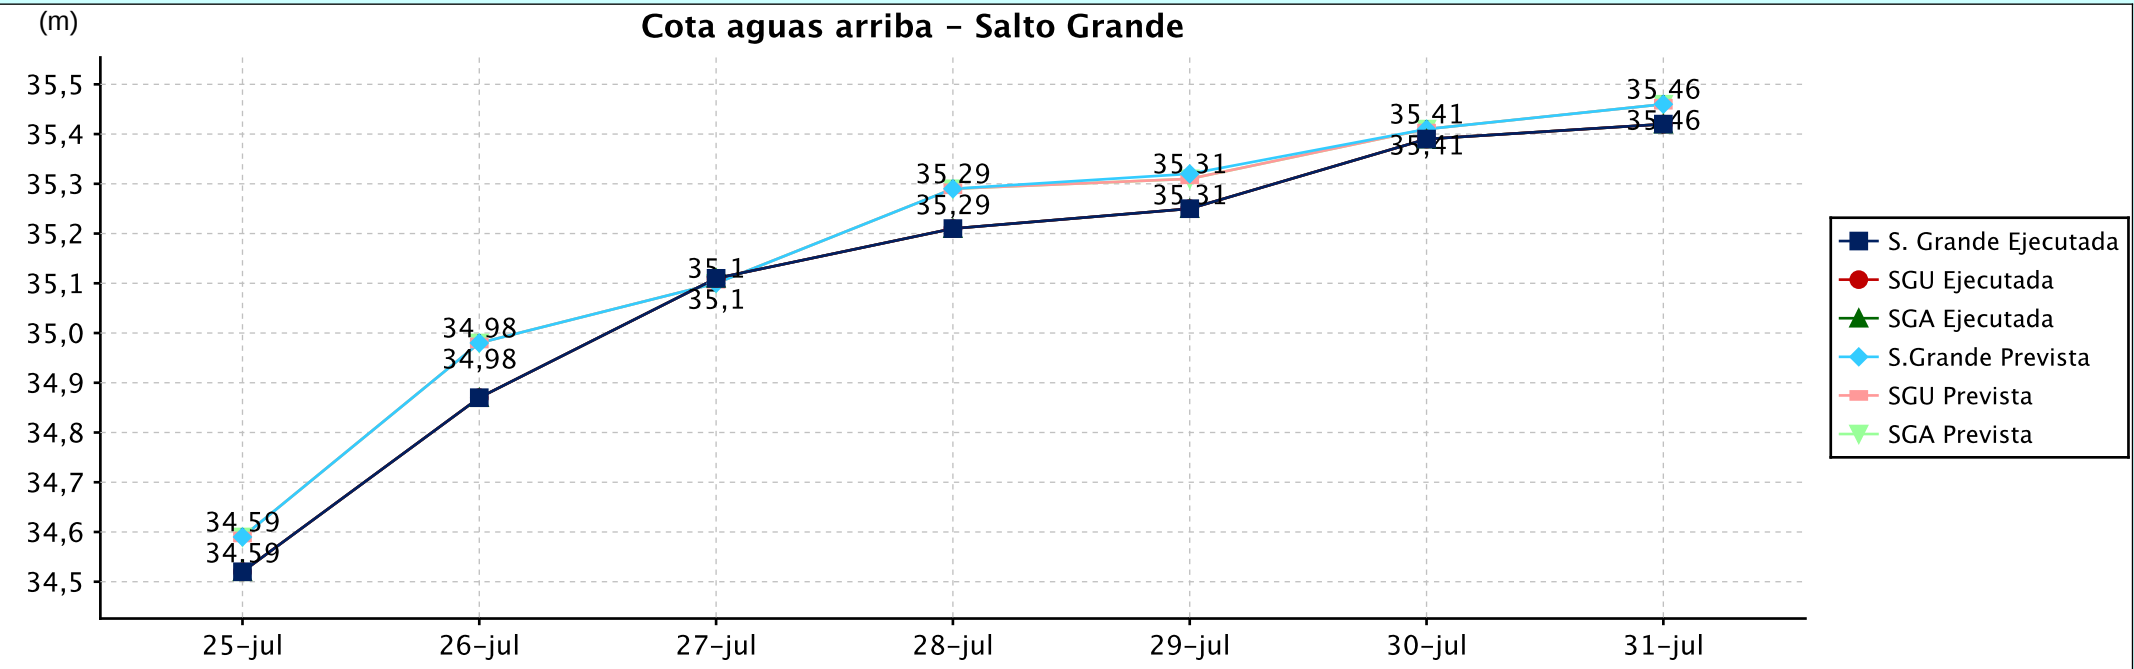

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,42
Cota Vista Arg	35,42
Cota real	35,42
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	0

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	235	231
Baygorria	250	172
Palmar	156	34
SGU	4.057	3.859

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	235	530
Baygorria	0	-98
Palmar	0	1
SGU	7.050	7.032

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	2.267	5.549

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
