




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

sábado 01 de agosto de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-0
Central La Tablada	-84
Central P. del Tigre	-9
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	989
C. Baygorria	545
C. Palmar	0
C. Salto Grande	19.140
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	8.589
TOTAL Generación	29.163

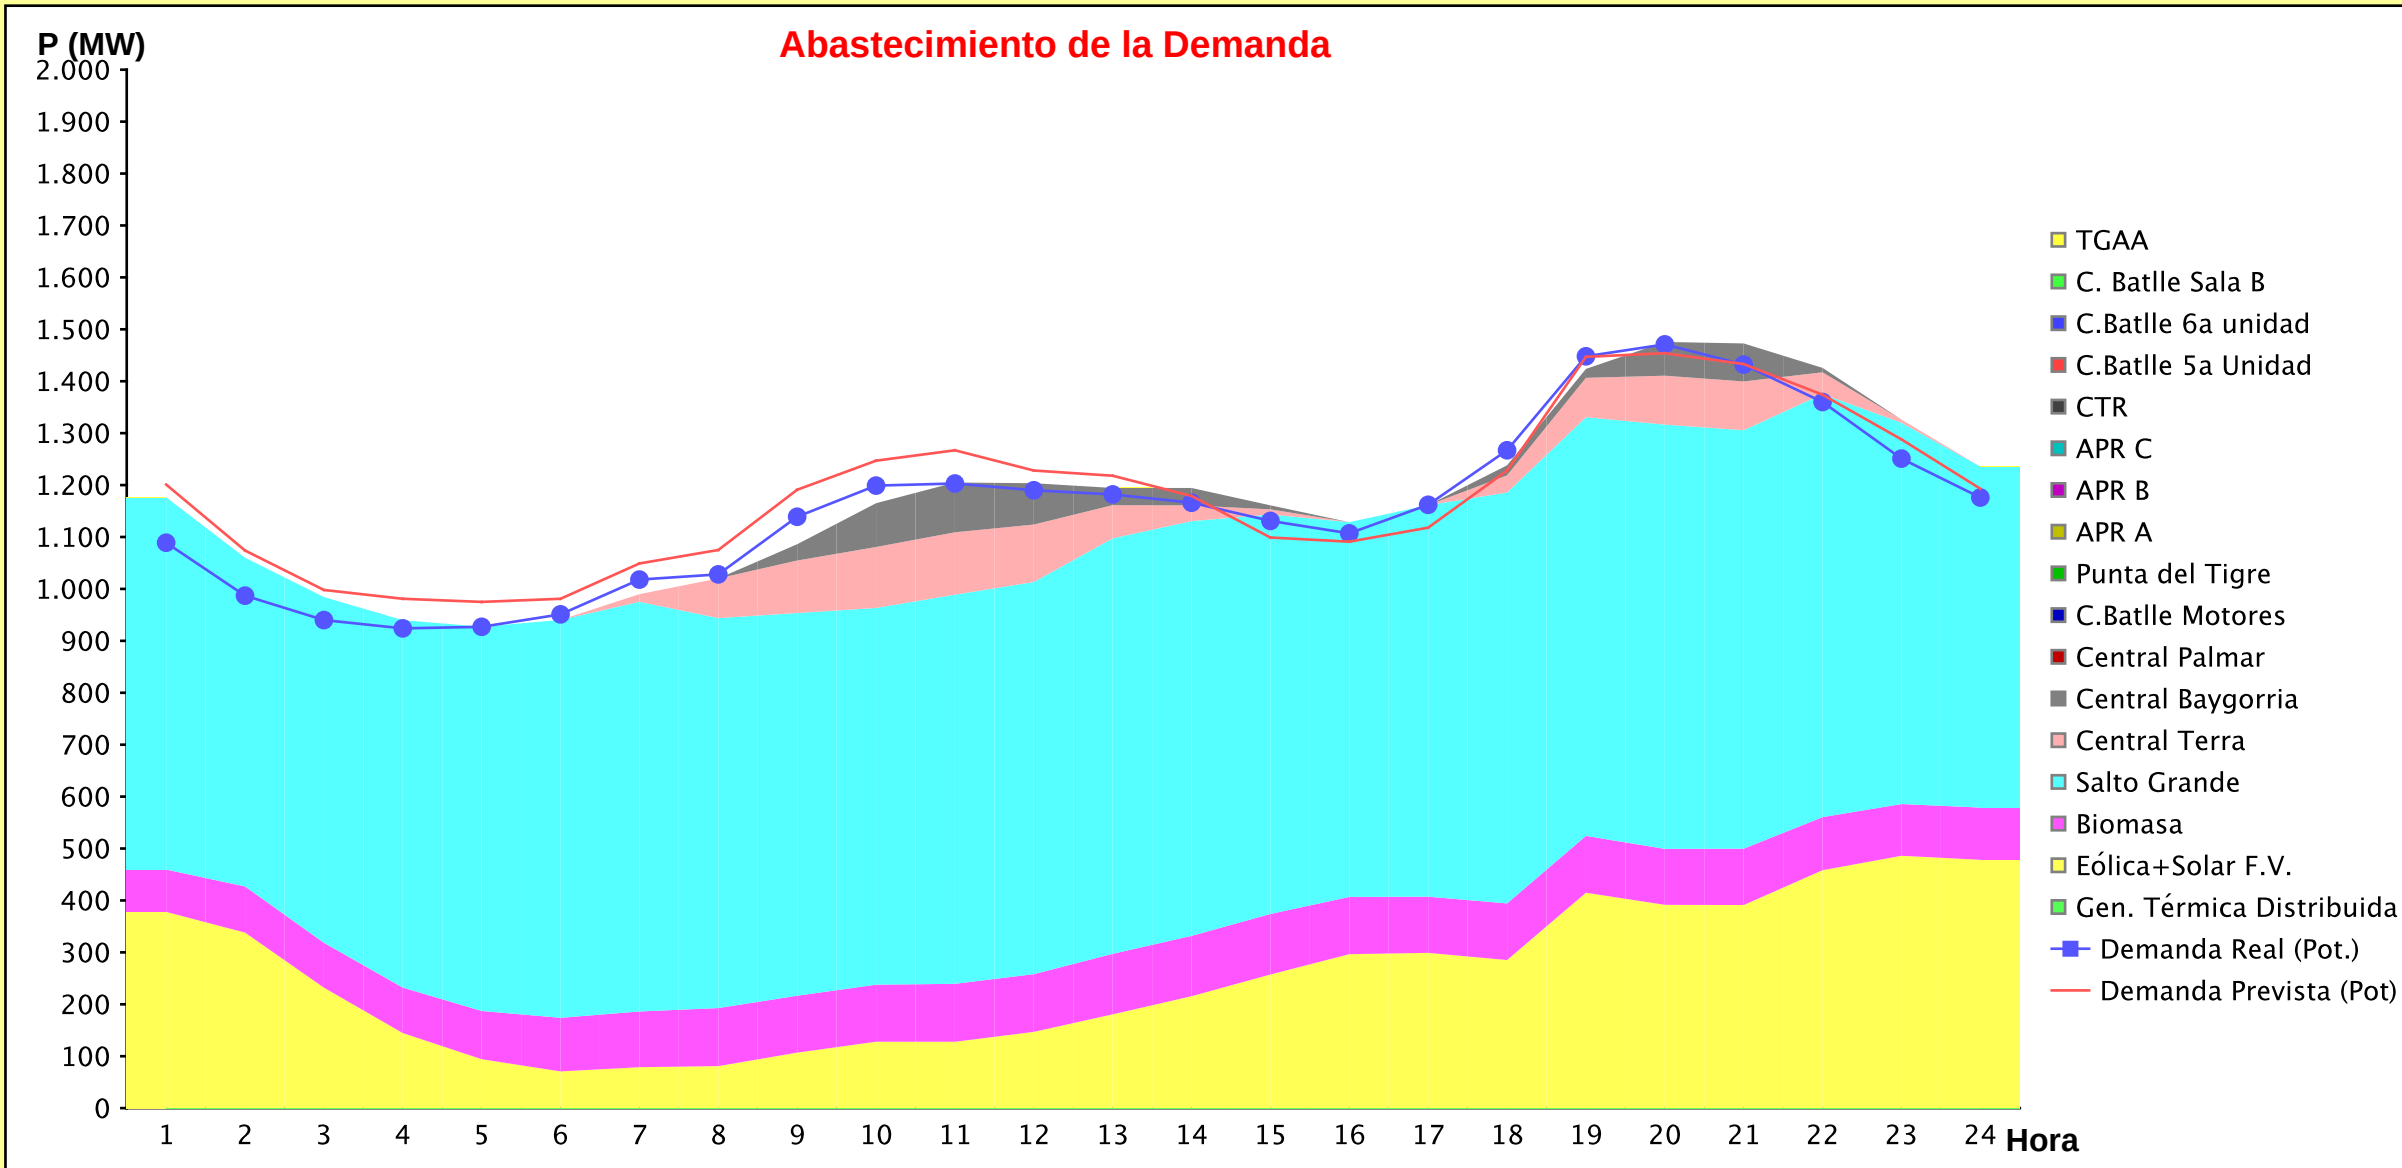

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	1.132
Hidráulica	1.132
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	1.132




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	28.031
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	28.389
Diferencia (MWh)	-358
Ejecutada - Programada	-1,26 %

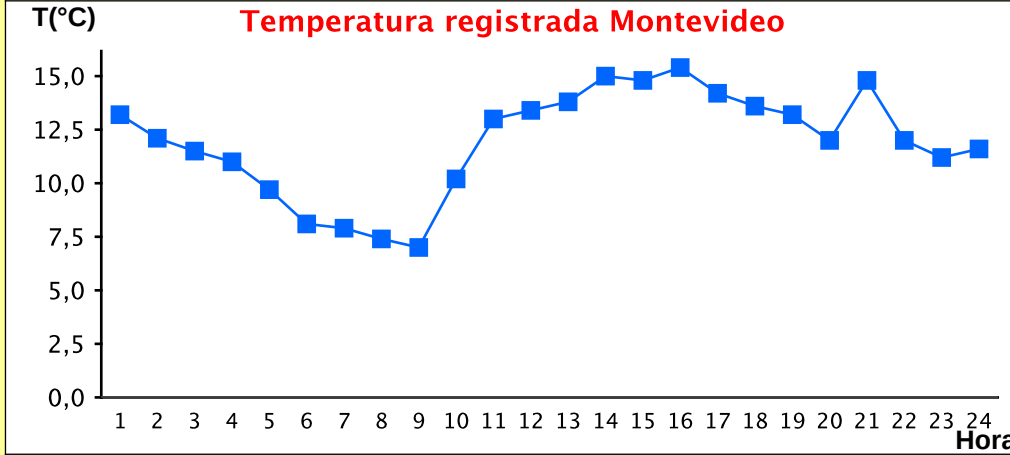



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1239 Hora 12:46
Potencia mínima:	918 Hora 04:19
Pico noche:	1482 Hora 20:15

Generación Media (MW)	
Eólica	253,7
Biomasa	105,0
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

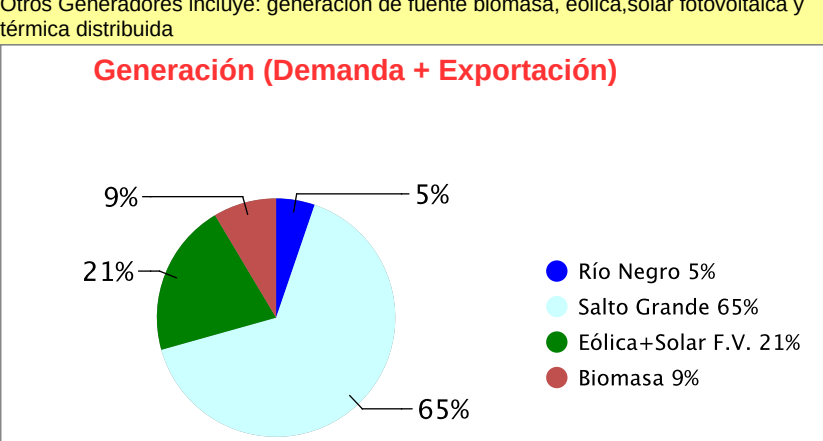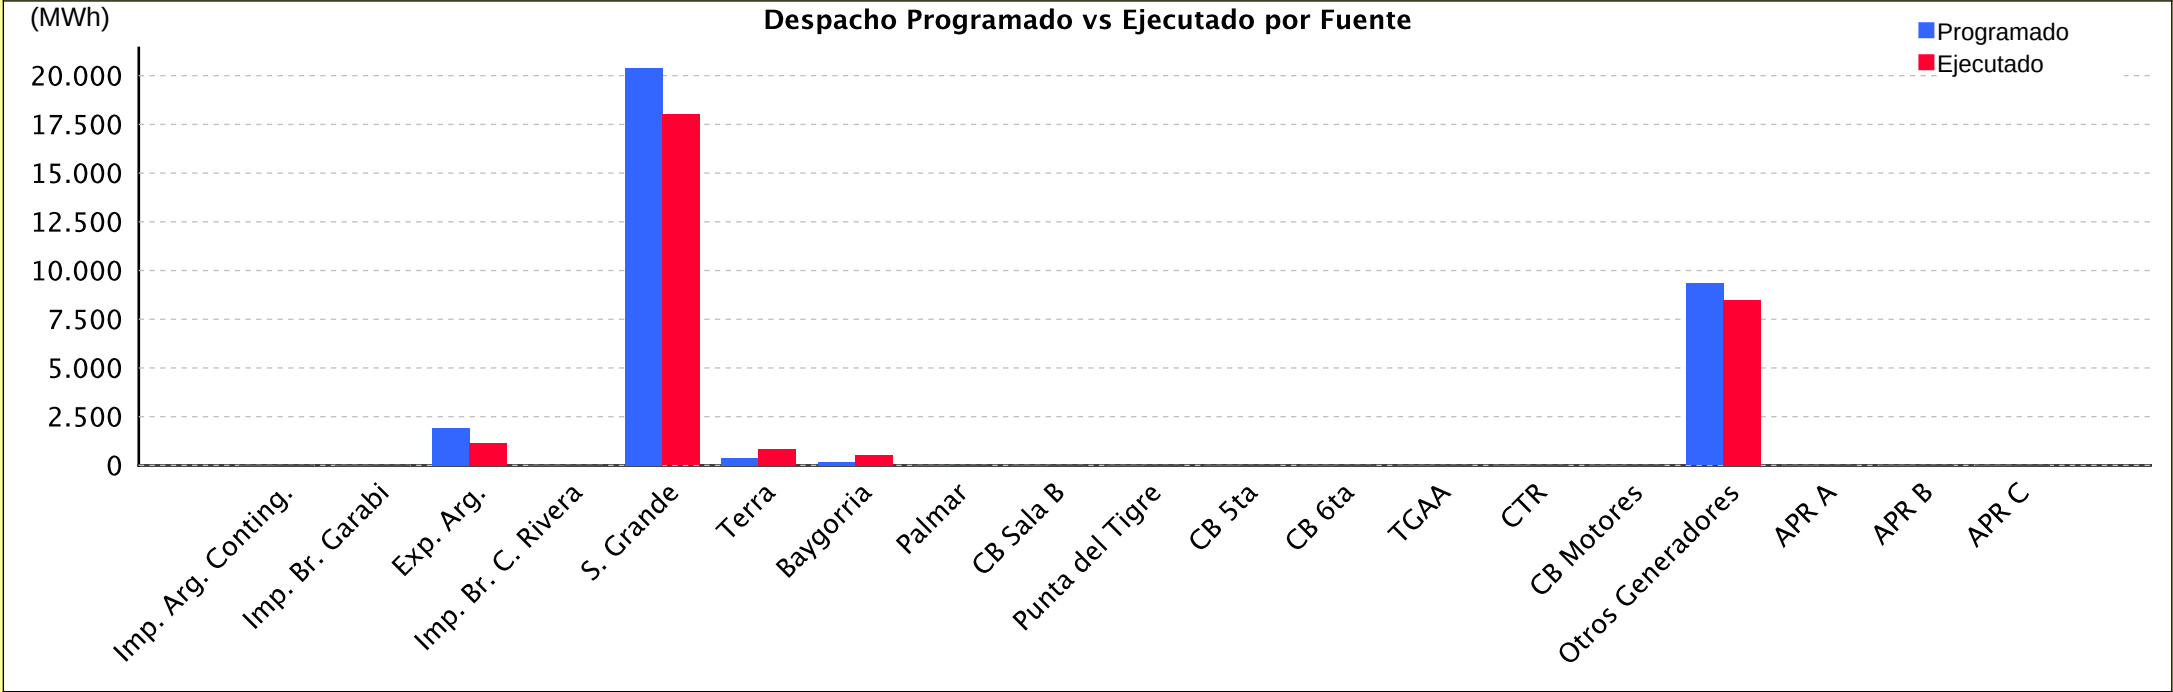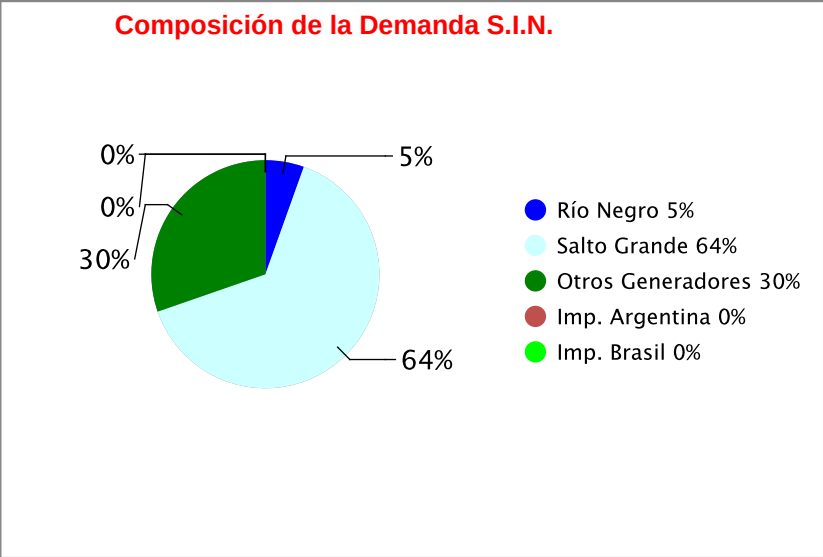



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

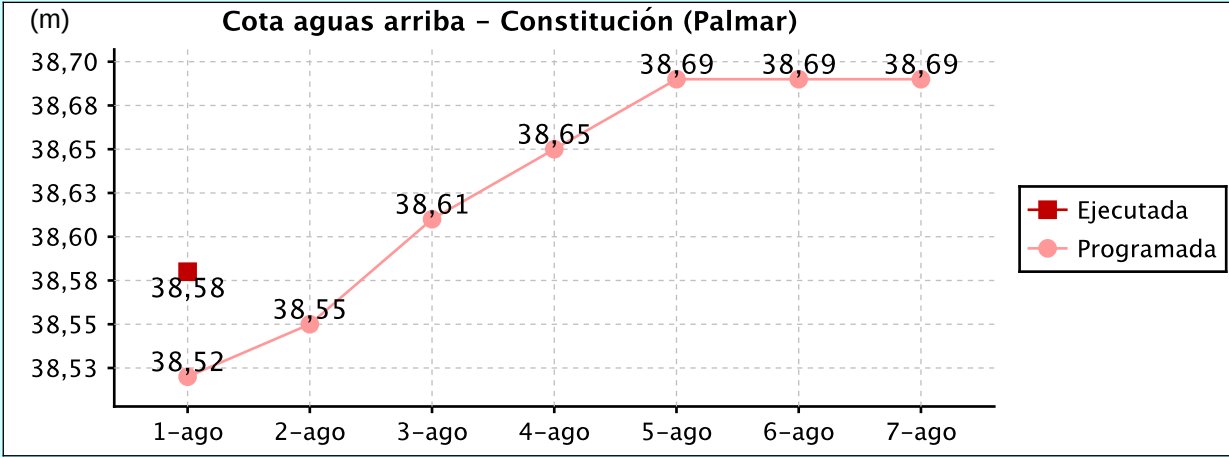
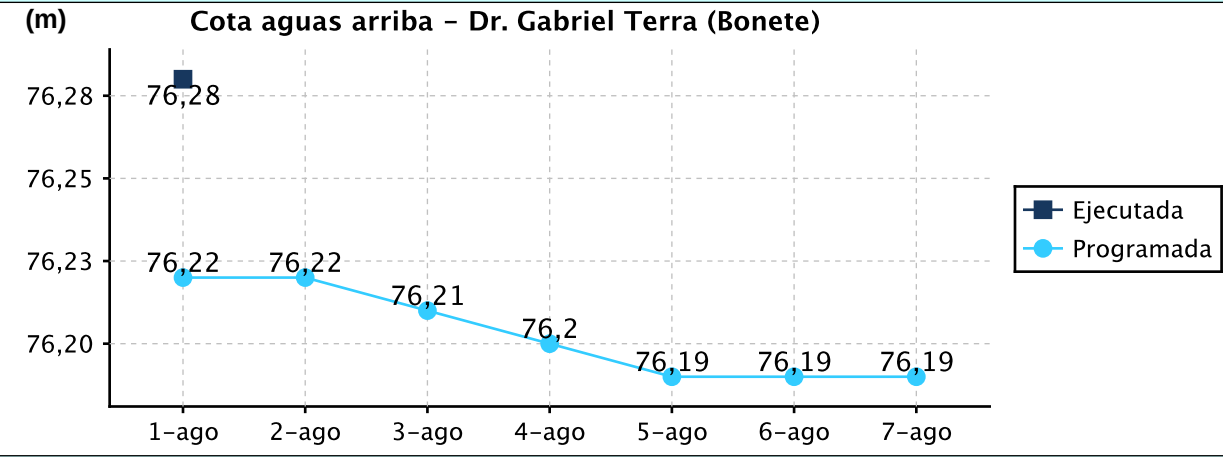


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,22	76,28
Baygorria	53,94	53,94
Palmar	38,52	38,58
SGU	35,51	35,45

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

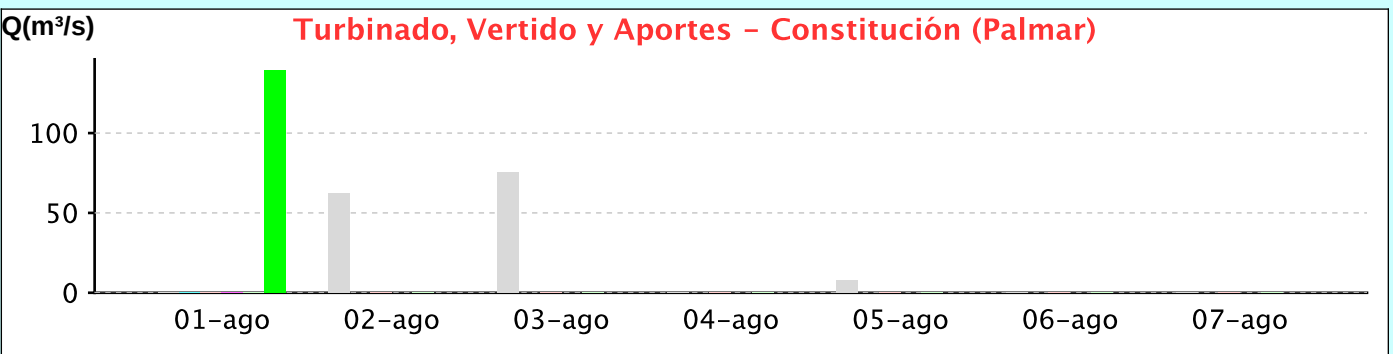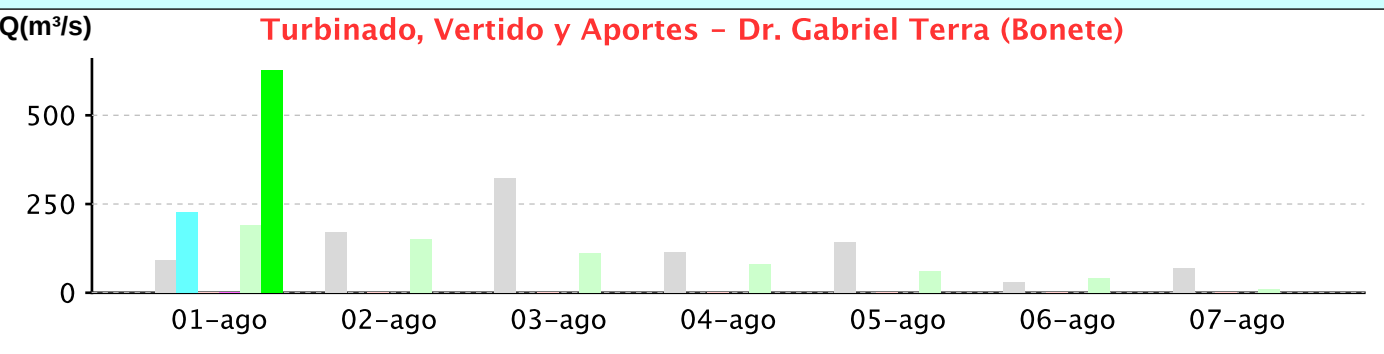

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

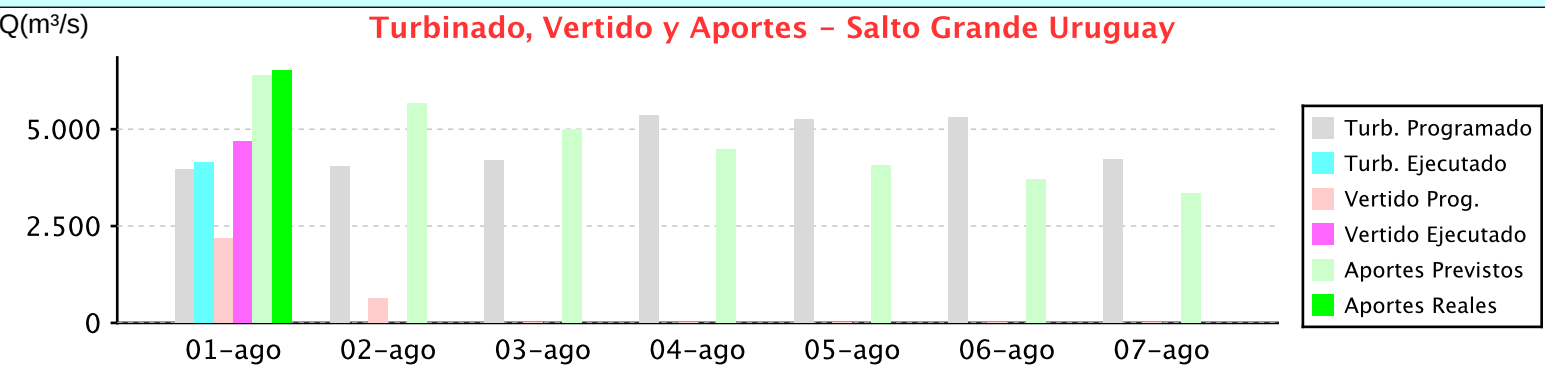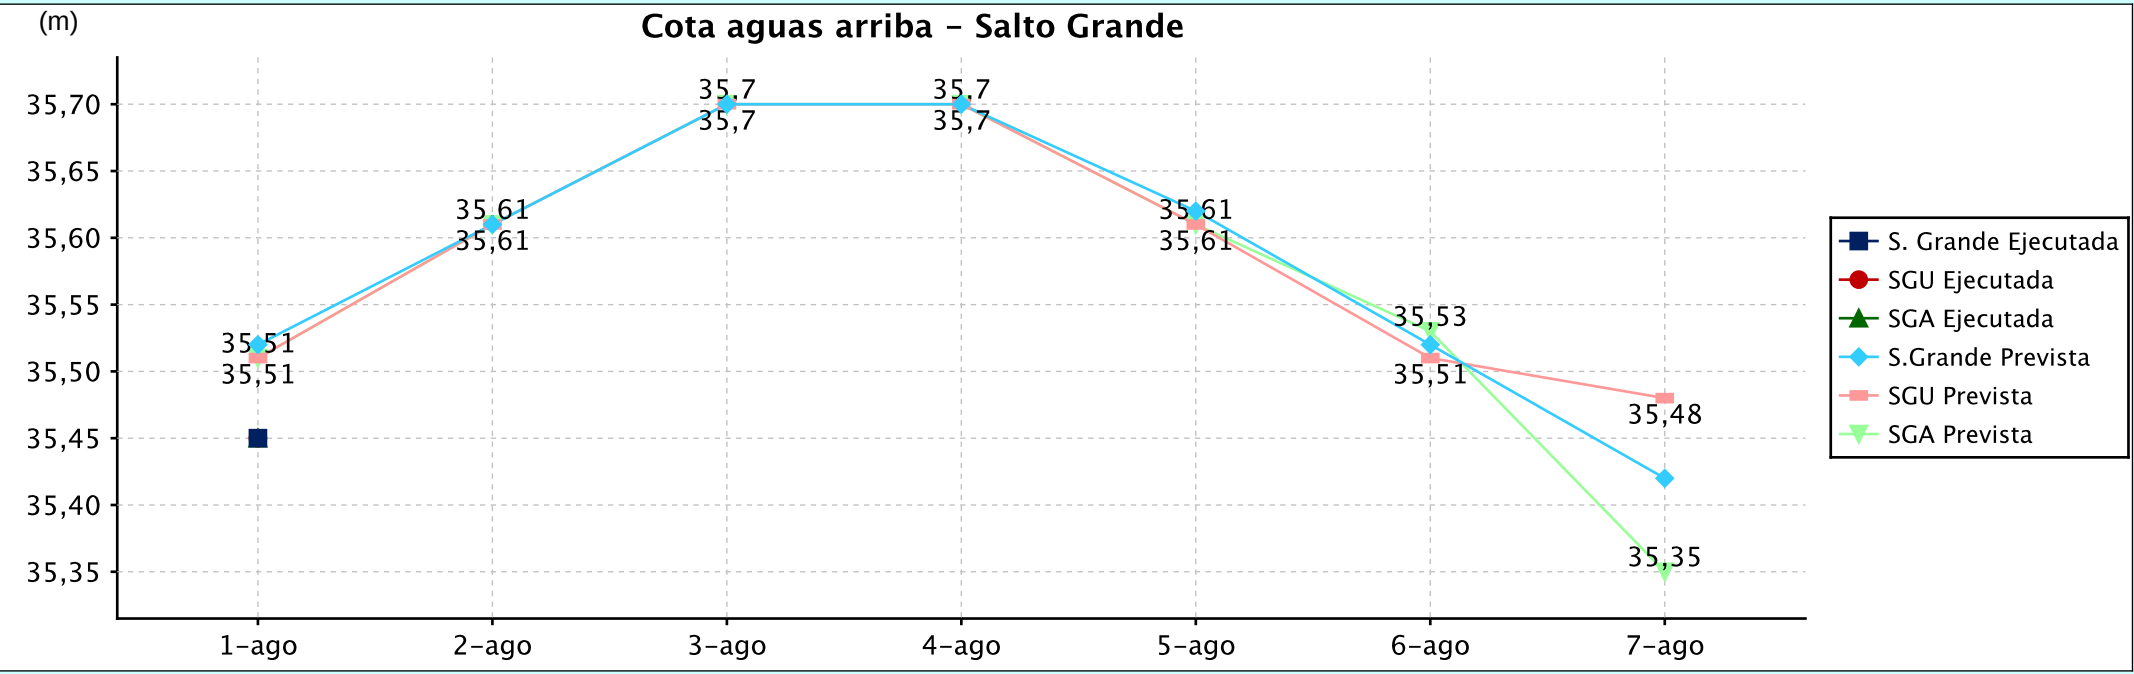

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,45
Cota Vista Arg	35,45
Cota real	35,45
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
0	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	90	228
Baygorria	55	176
Palmar	0	0
SGU	3.952	4.140

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	190	626
Baygorria	0	71
Palmar	0	139
SGU	6.400	6.524

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	2.177	4.676

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
