




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

lunes 03 de agosto de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	0
Central La Tablada	-82
Central P. del Tigre	-9
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	1.466
C. Baygorria	1.373
C. Palmar	1.089
C. Salto Grande	20.992
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	5.709
TOTAL Generación	30.530

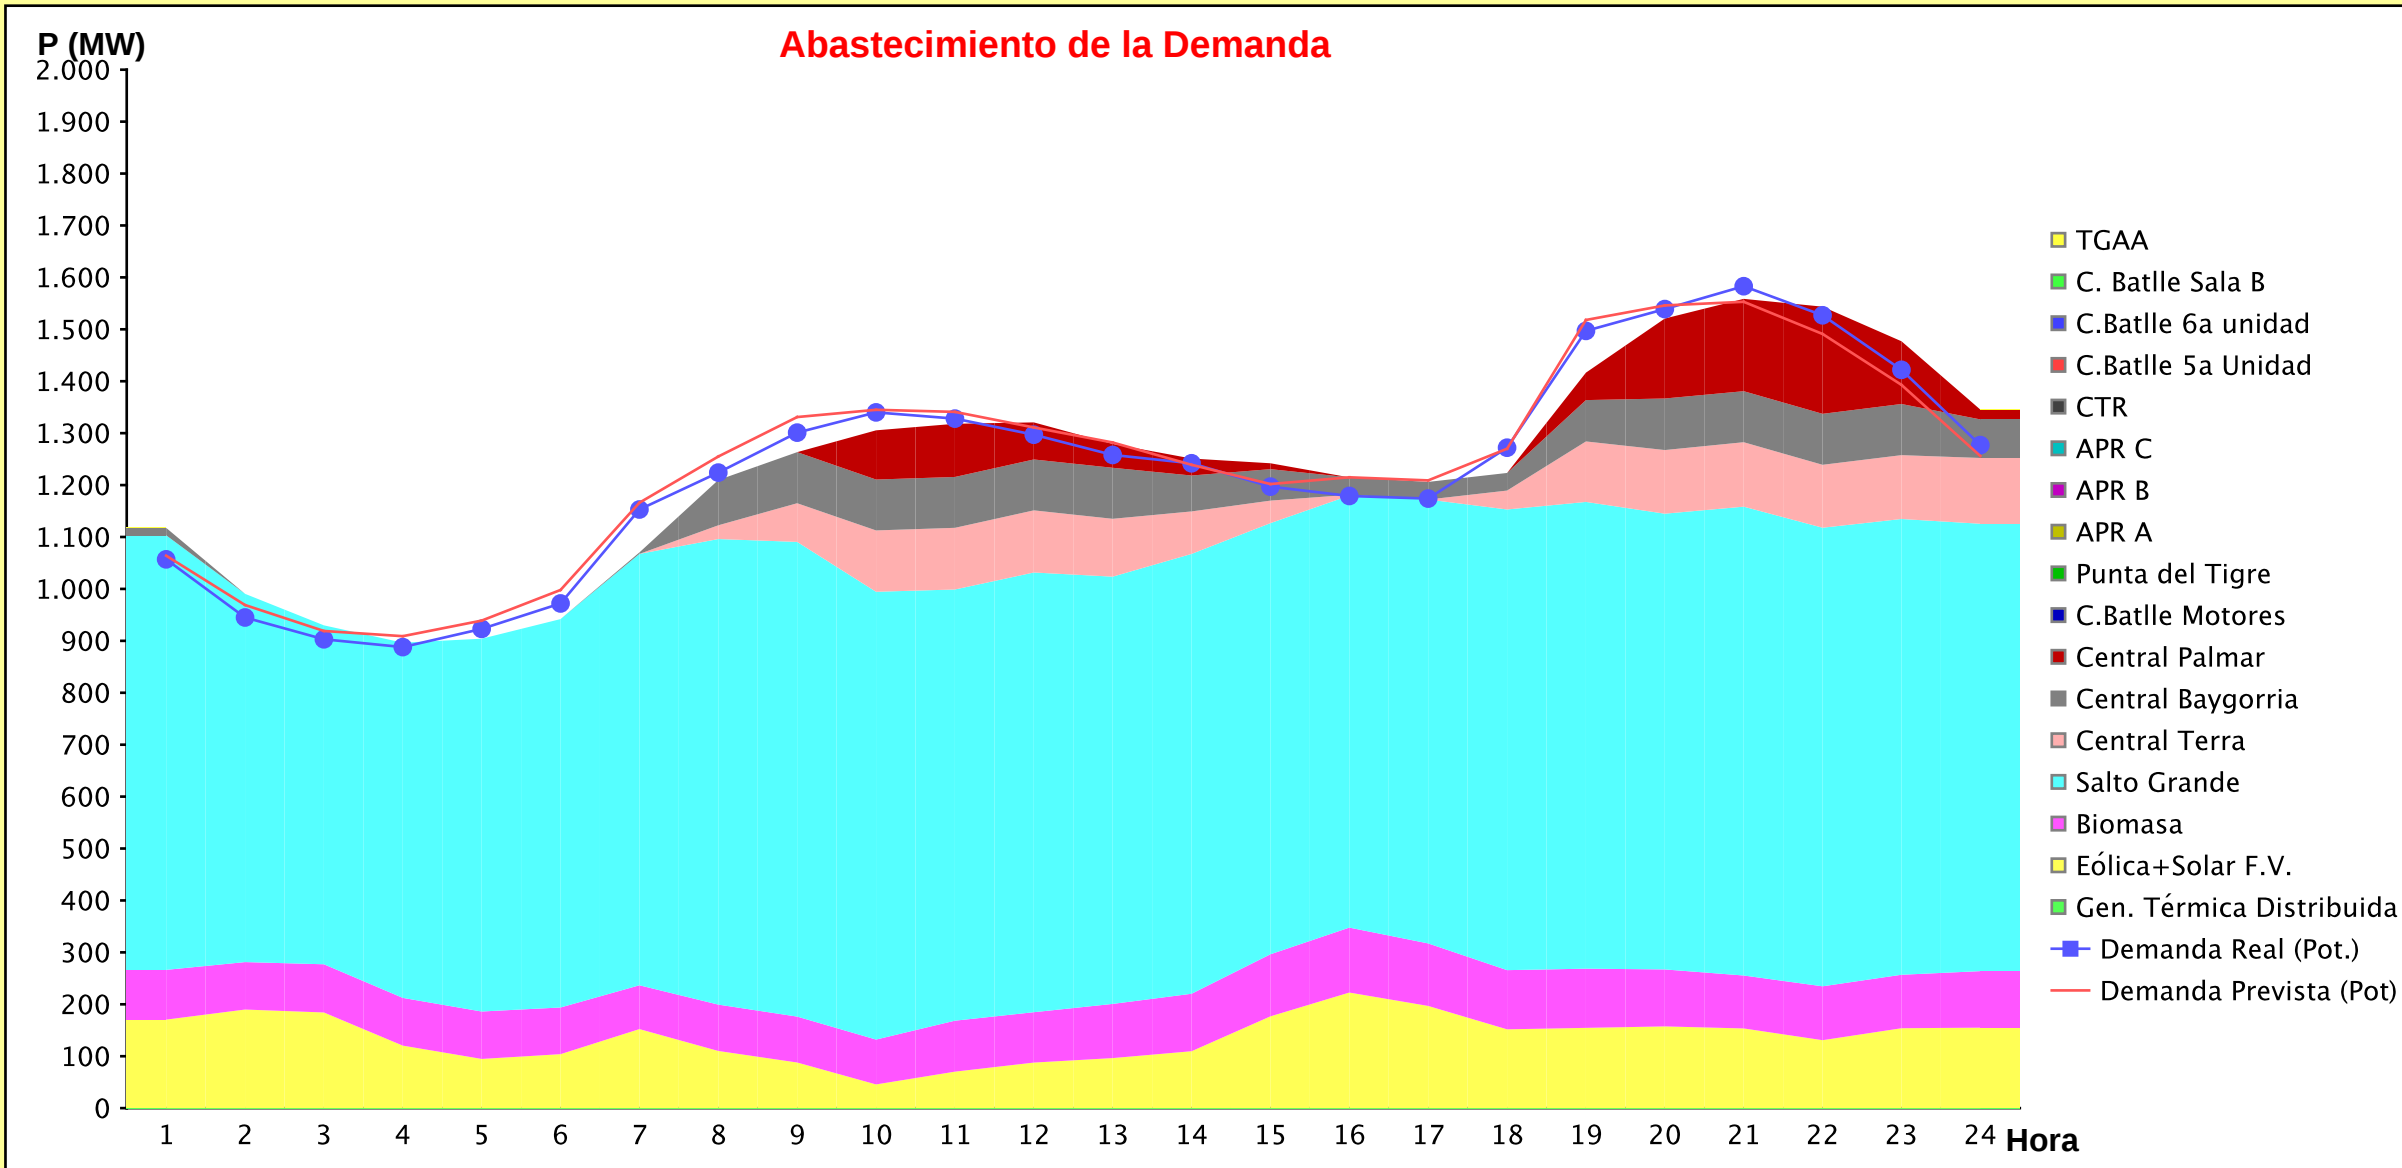

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	1.084
Hidráulica	1.084
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	1.084

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	29.446
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	


Demanda Programada (MWh)	29.721
Diferencia (MWh)	-275
Ejecutada - Programada	-0,92 %

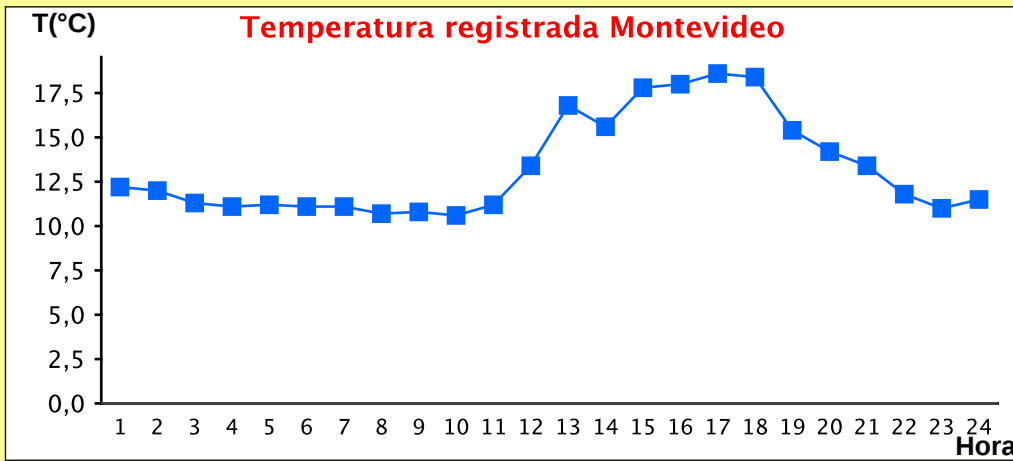

Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1363 Hora 11:45
Potencia mínima:	880 Hora 03:57
Pico noche:	1588 Hora 20:58



Generación Media (MW)	
Eólica	138,4
Biomasa	101,5
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

Composición de la Demanda S.I.N.

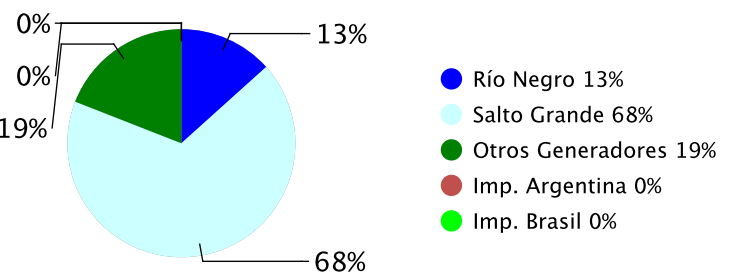



Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

Generación (Demanda + Exportación)

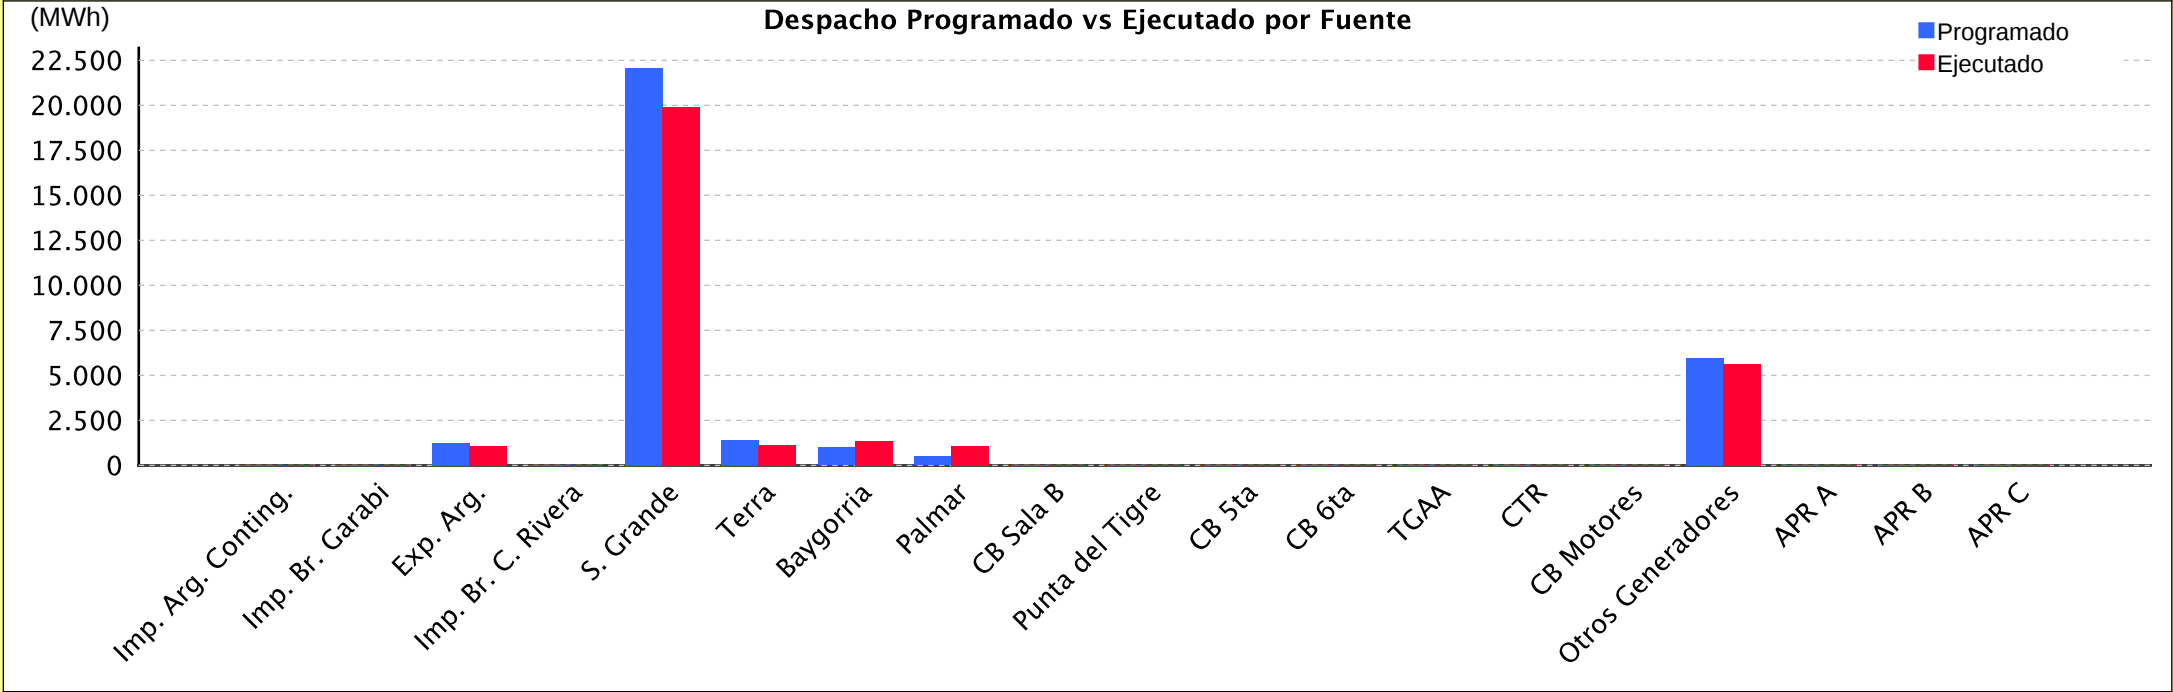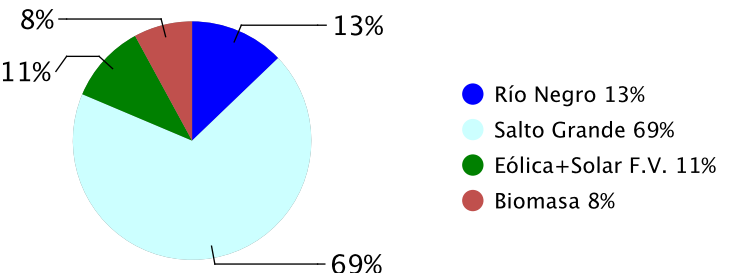



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

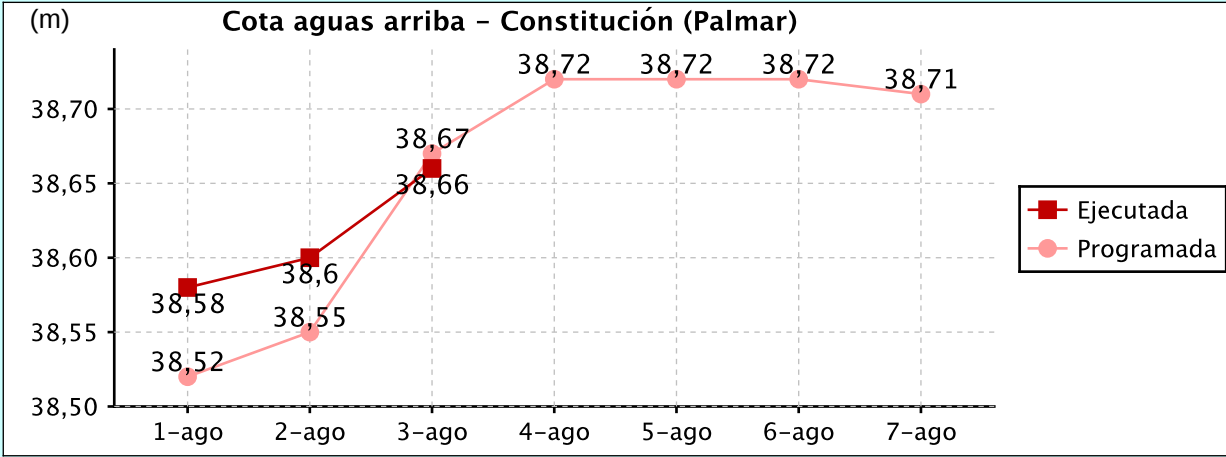
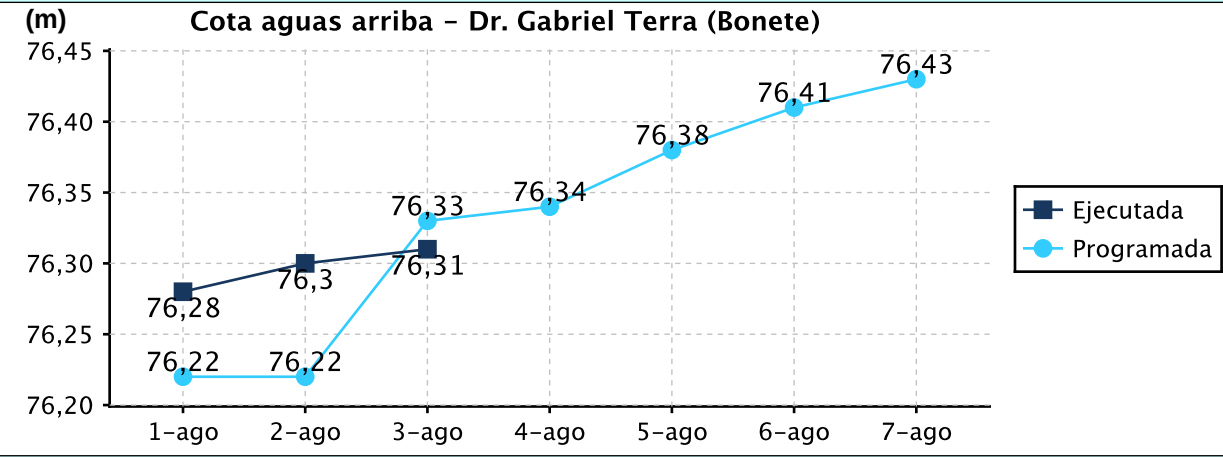


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,33	76,31
Baygorria	53,95	53,78
Palmar	38,67	38,66
SGU	35,47	35,44

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

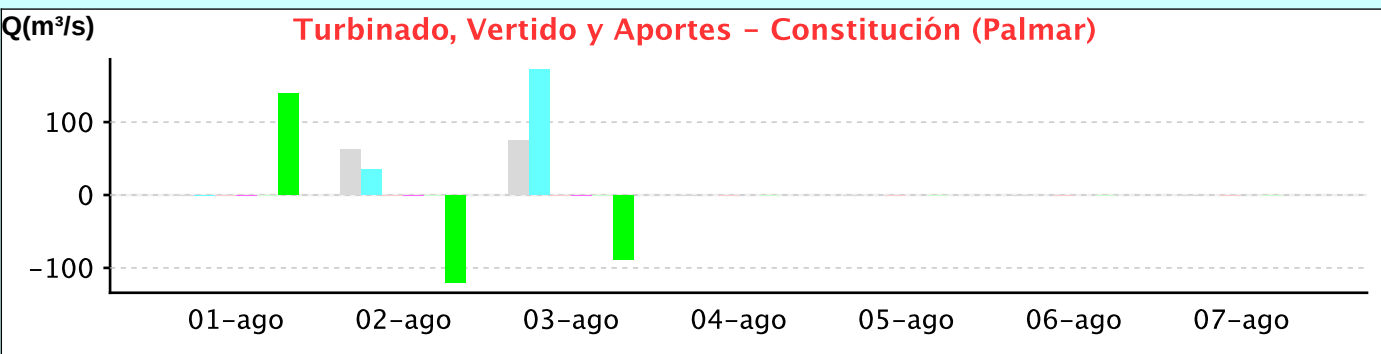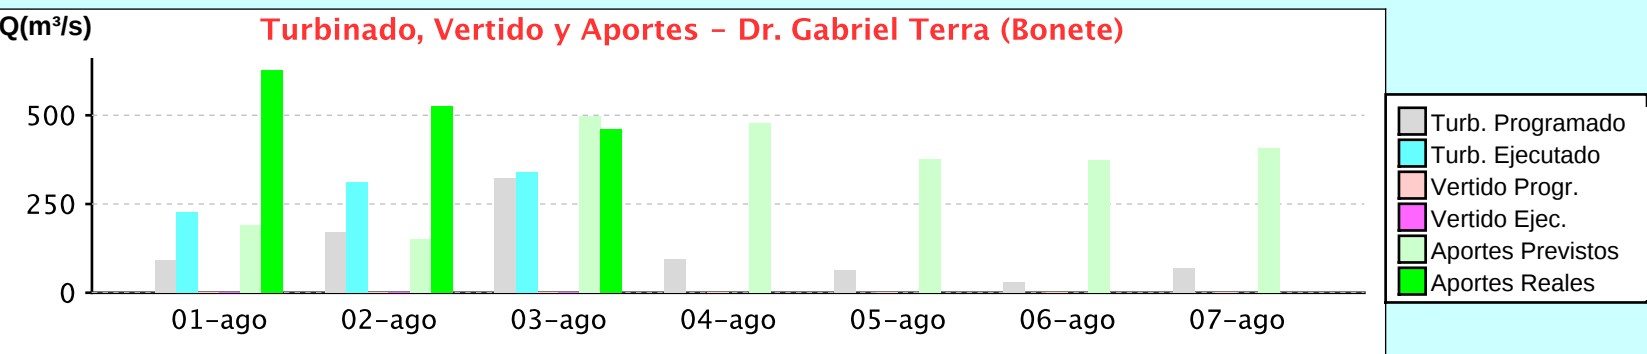

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

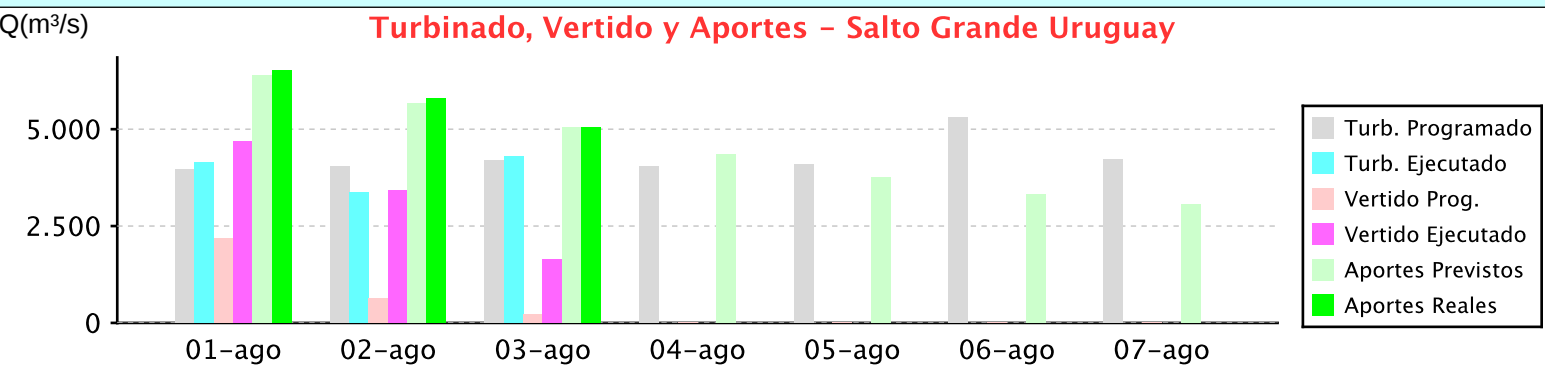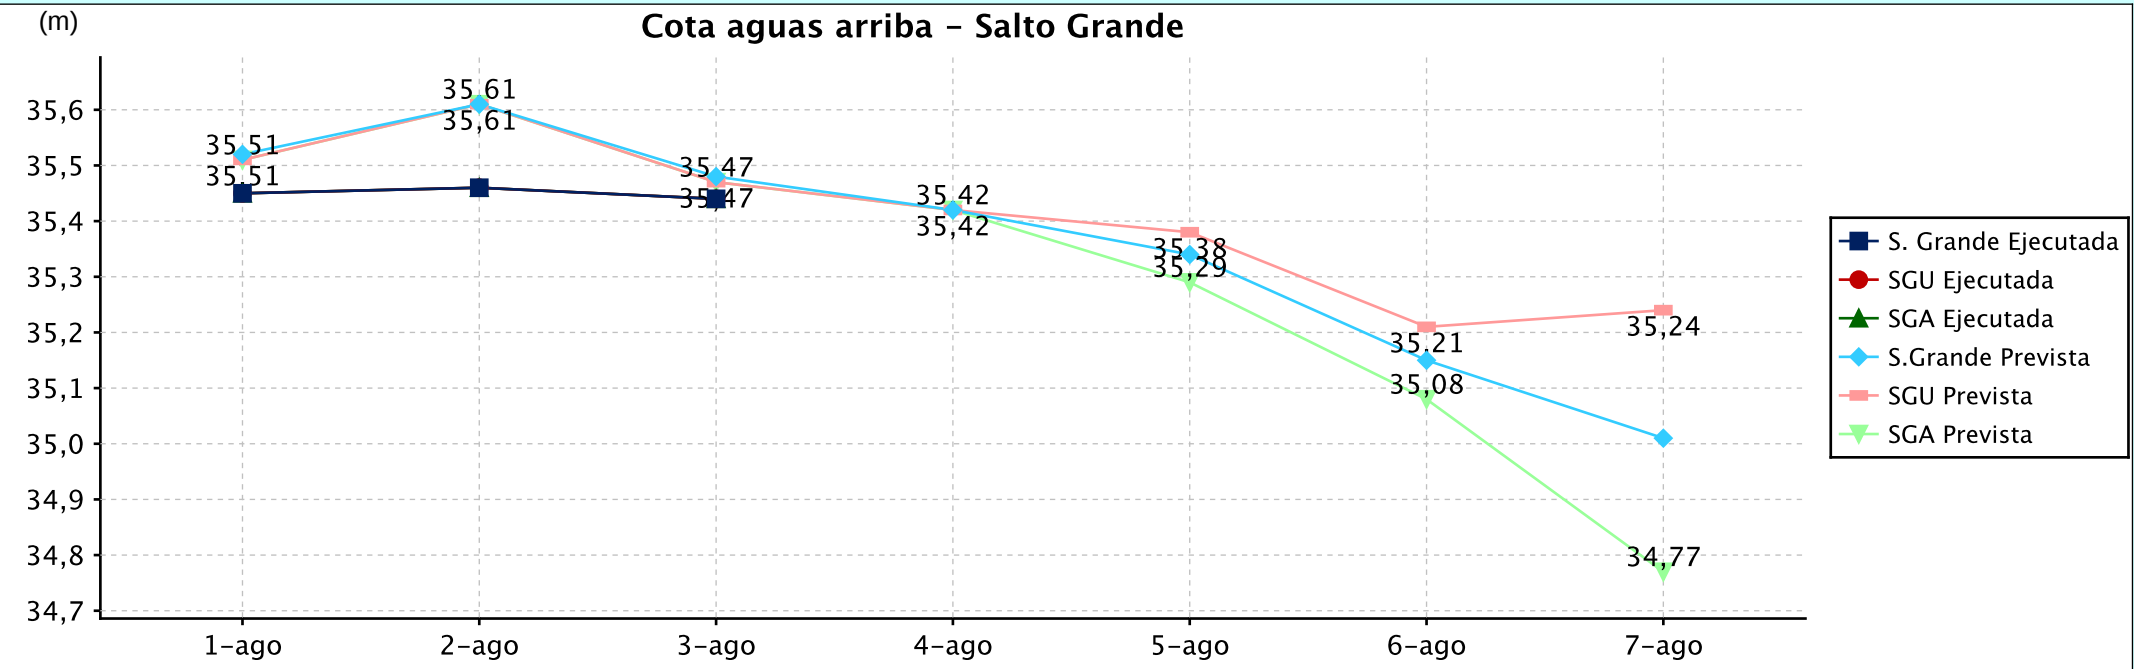

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,44
Cota Vista Arg	35,44
Cota real	35,44
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
0	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	322	339
Baygorria	343	460
Palmar	75	172
SGU	4.198	4.299

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	497	460
Baygorria	0	-57
Palmar	0	-89
SGU	5.050	5.044

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	222	1.634

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
