




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

martes 04 de agosto de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-0
Central La Tablada	-62
Central P. del Tigre	-9
APR A	-2
APR B	-3
APR C	-0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	895
C. Baygorria	469
C. Palmar	90
C. Salto Grande	20.978
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	10.206
TOTAL Generación	32.558

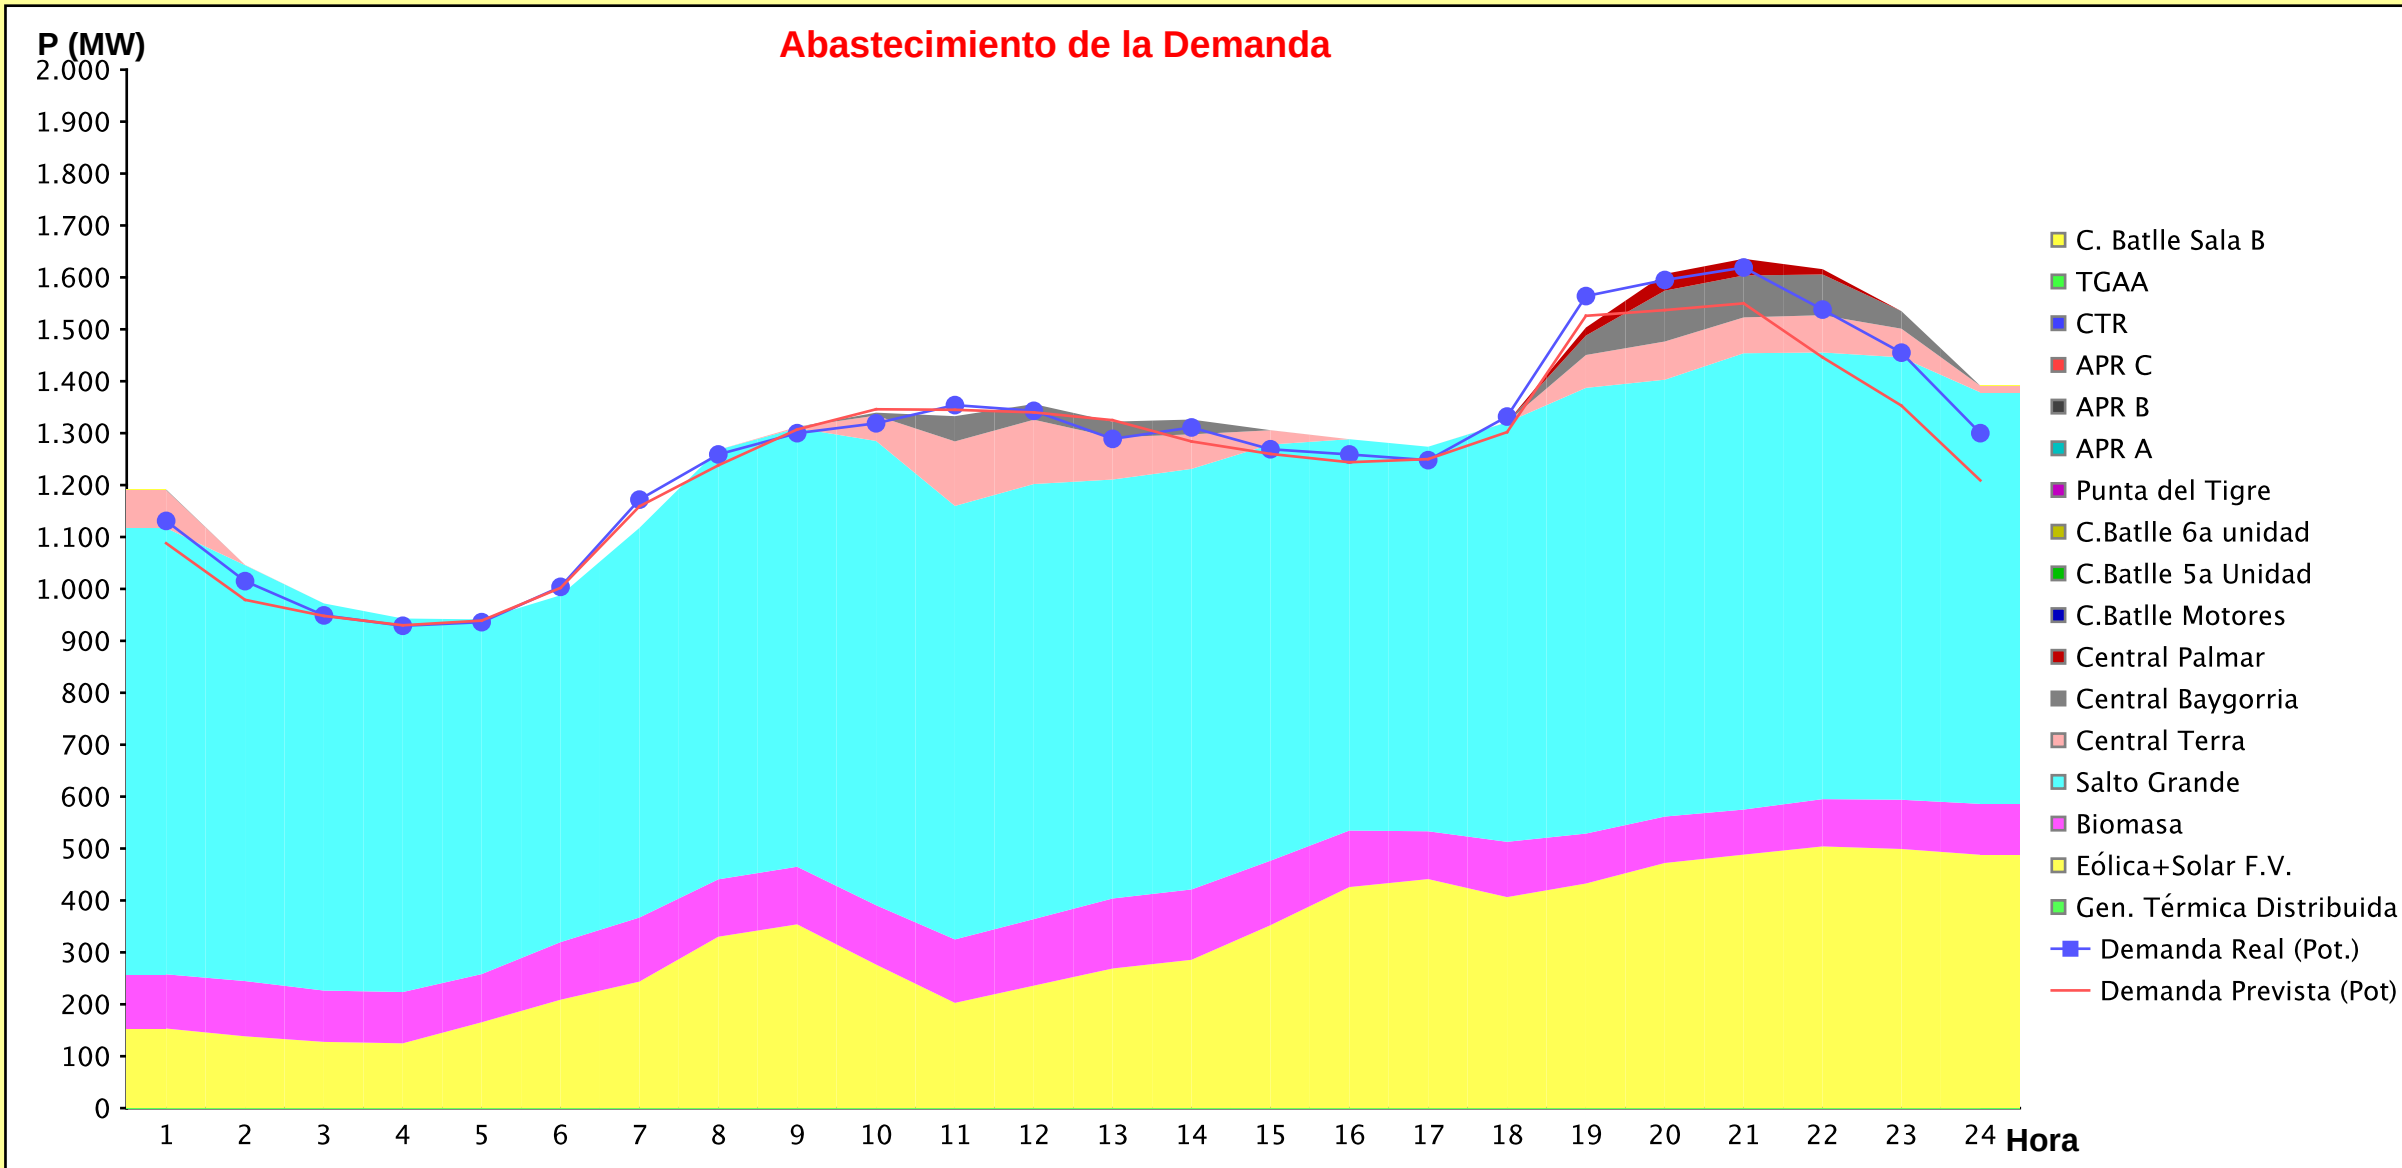

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	1.708
Hidráulica	1.708
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	1.708




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	30.850
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	29.907
Diferencia (MWh)	943
Ejecutada - Programada	3,15 %

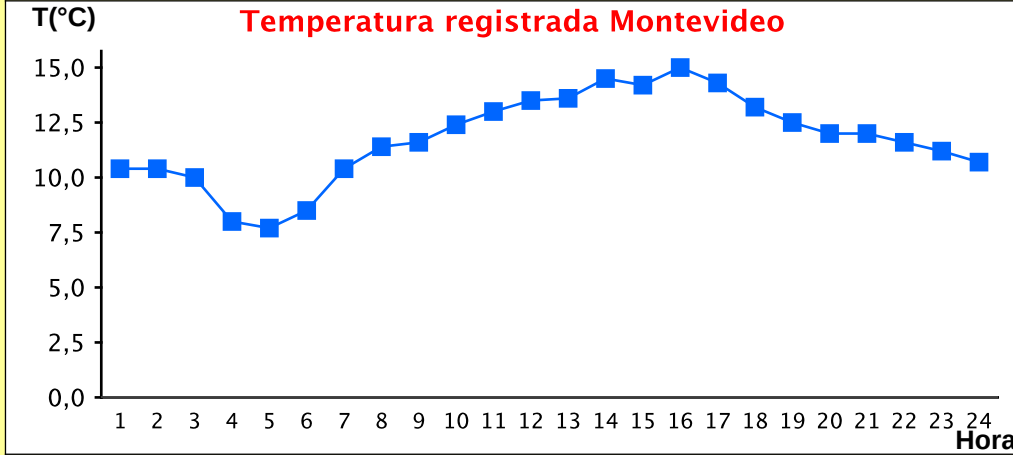



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1407 Hora 11:29
Potencia mínima:	930 Hora 03:53
Pico noche:	1652 Hora 20:56

Generación Media (MW)	
Eólica	317,5
Biomasa	107,6
Solar fotovoltaica	0,0
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

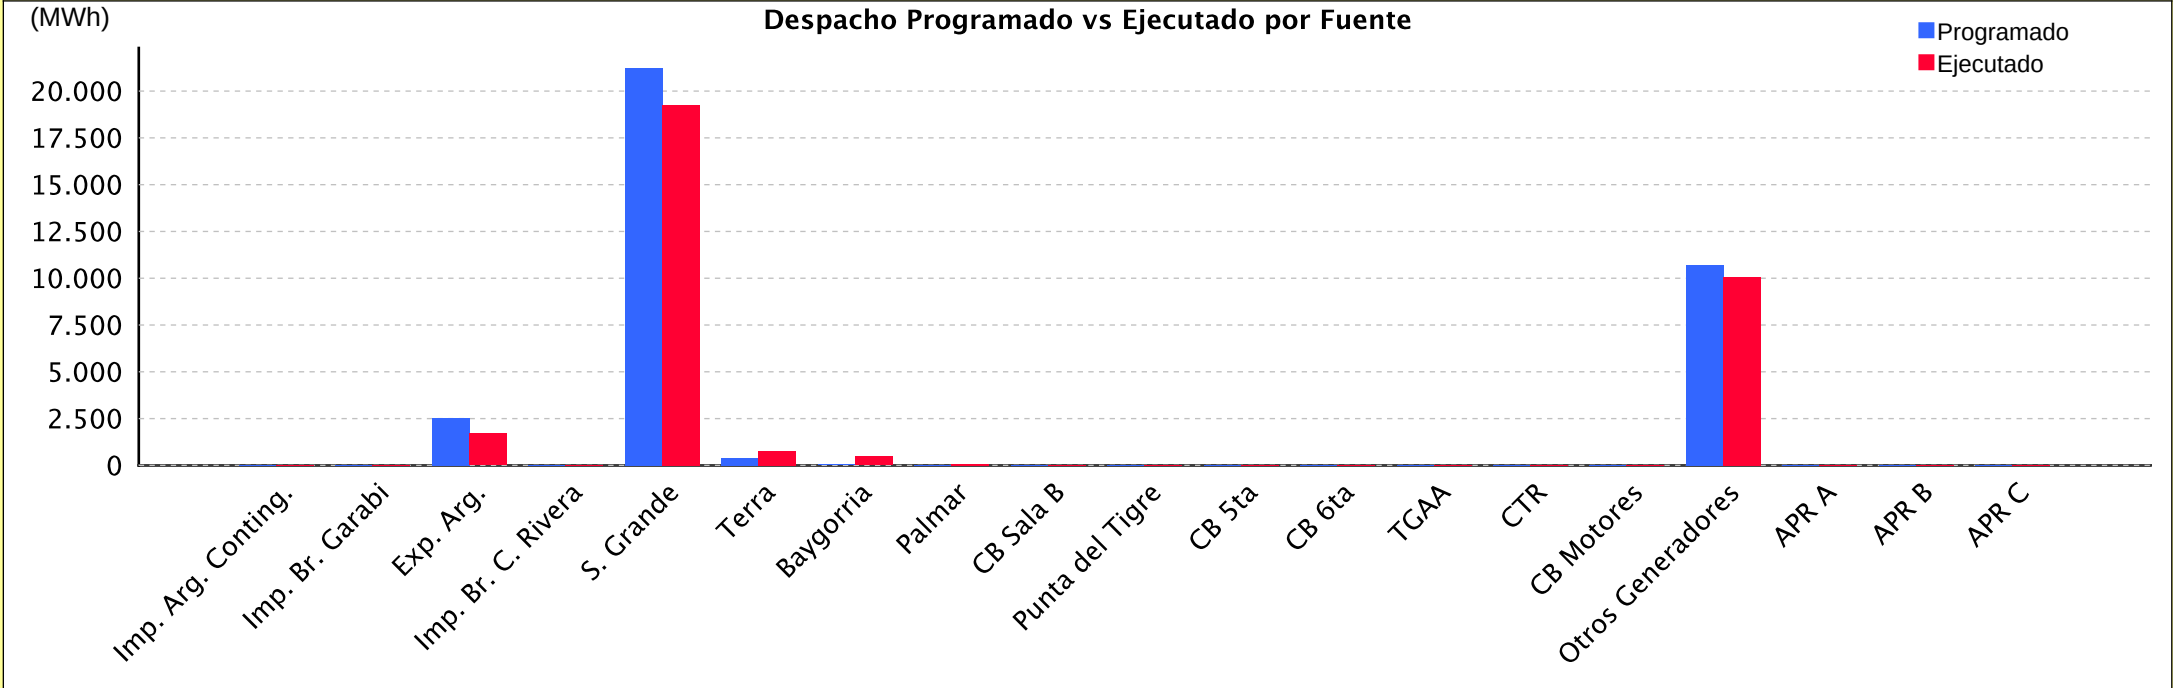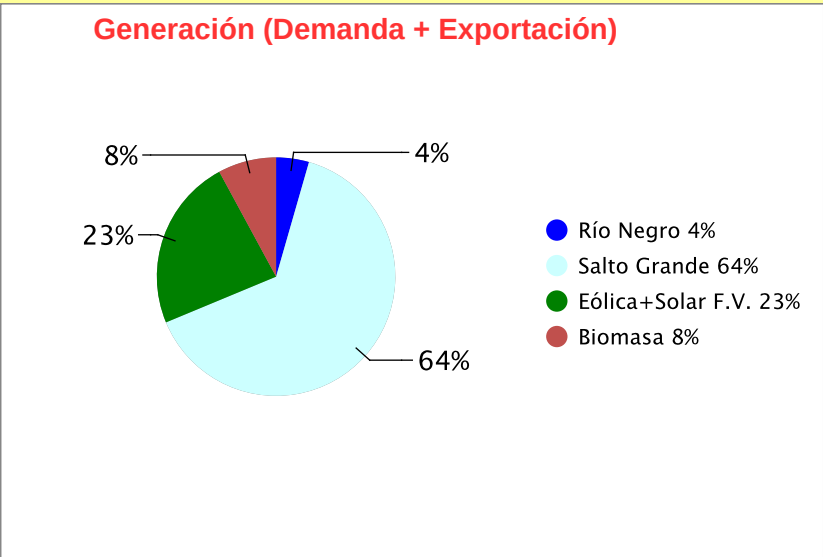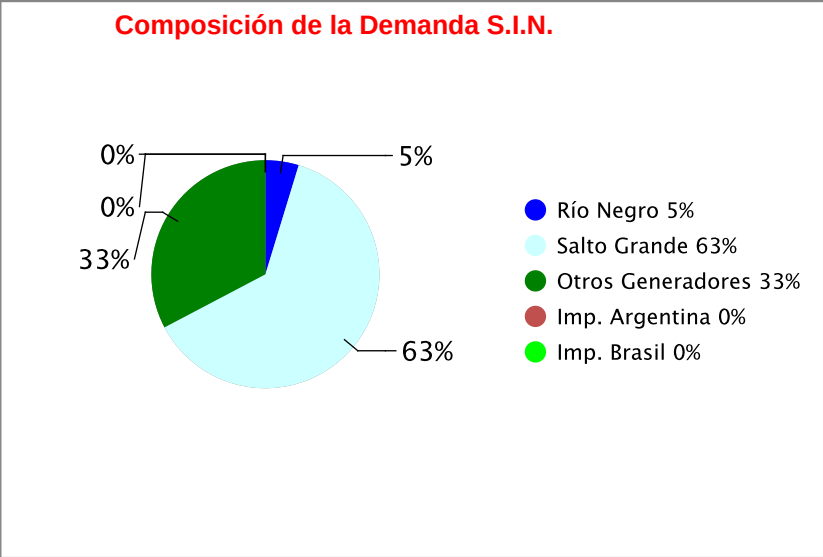



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

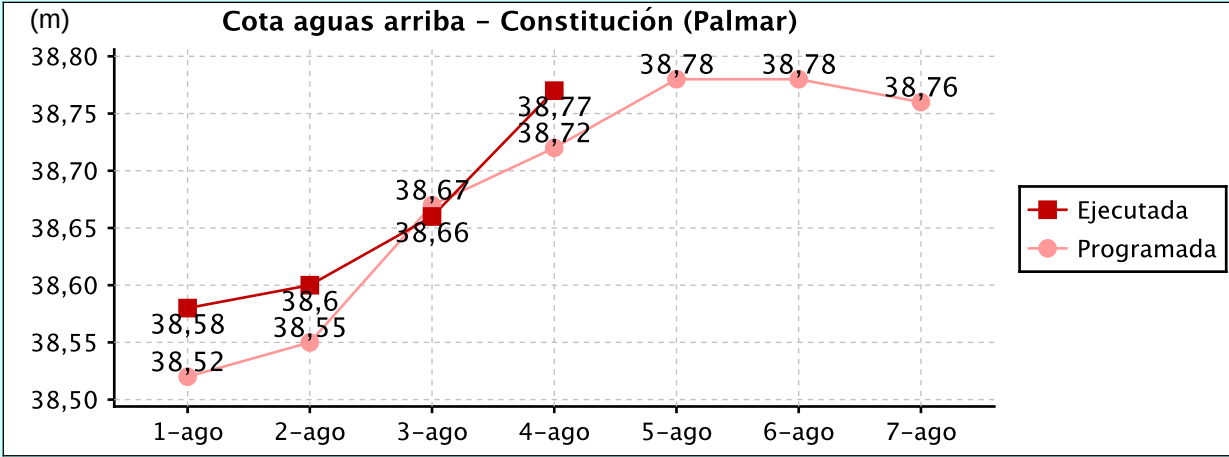
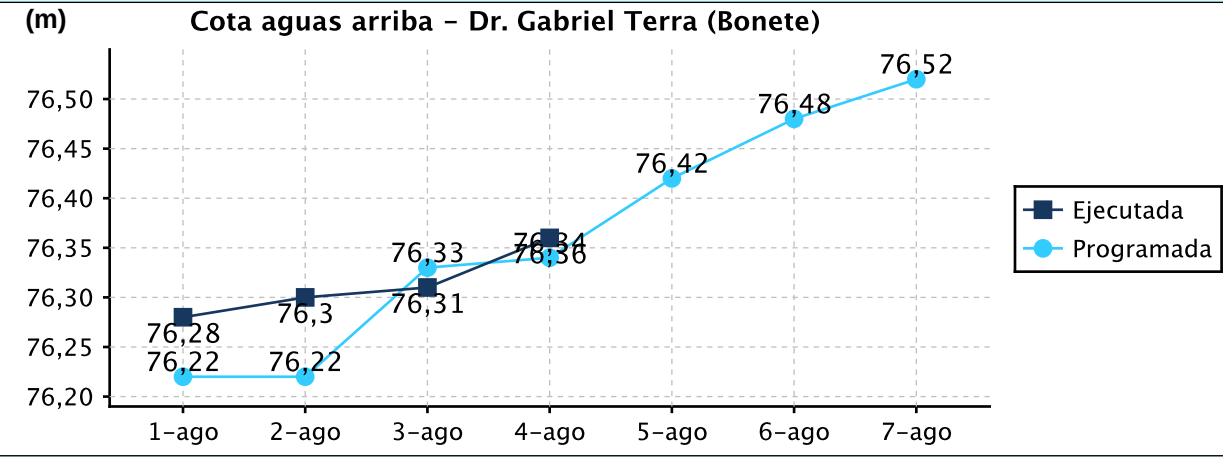


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,34	76,36
Baygorria	53,80	53,93
Palmar	38,72	38,77
SGU	35,42	35,49

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

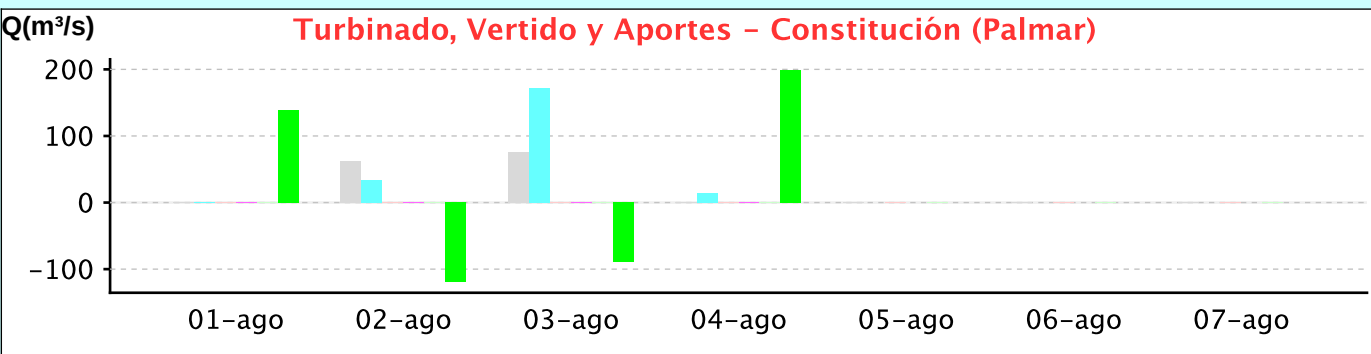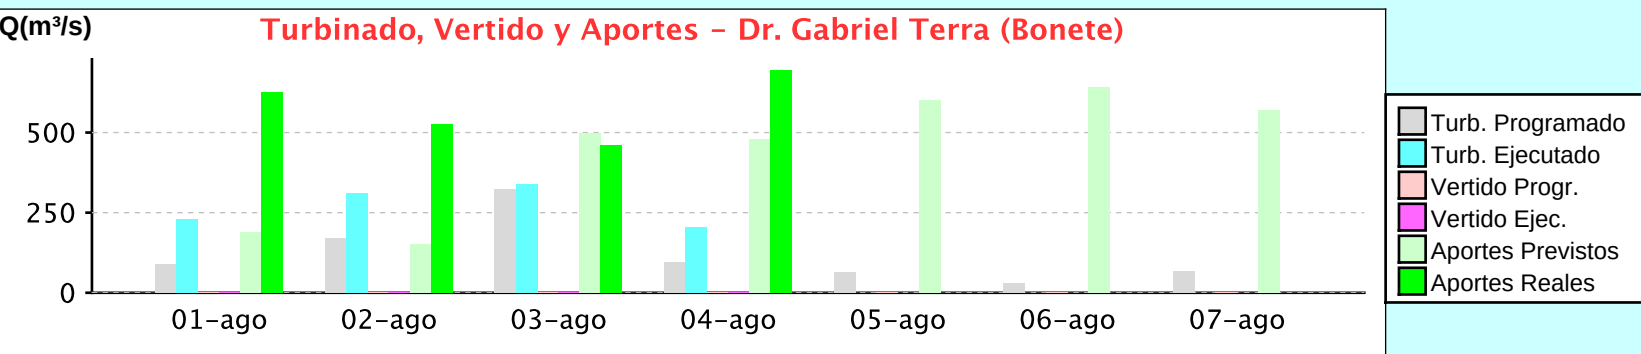

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

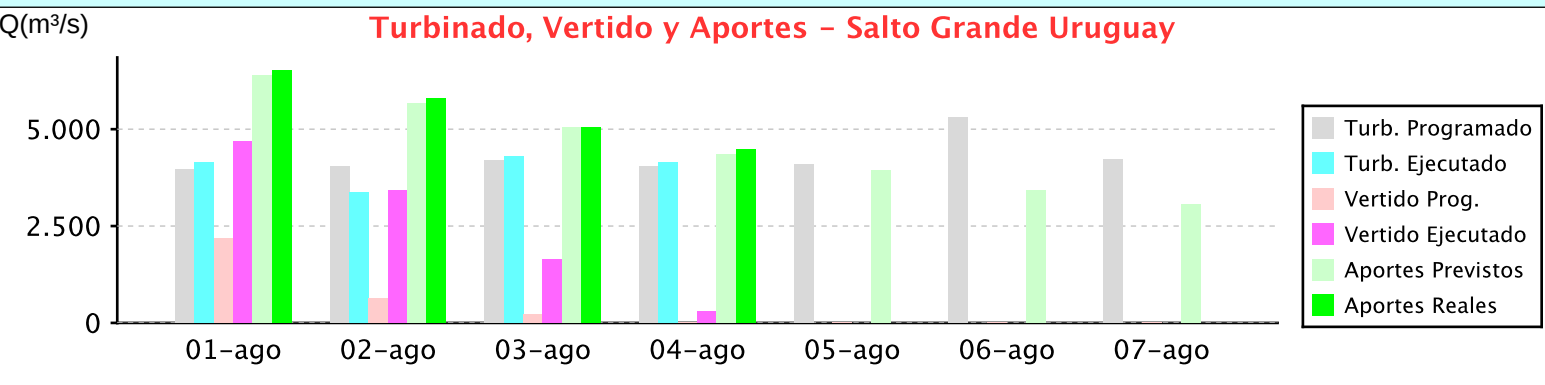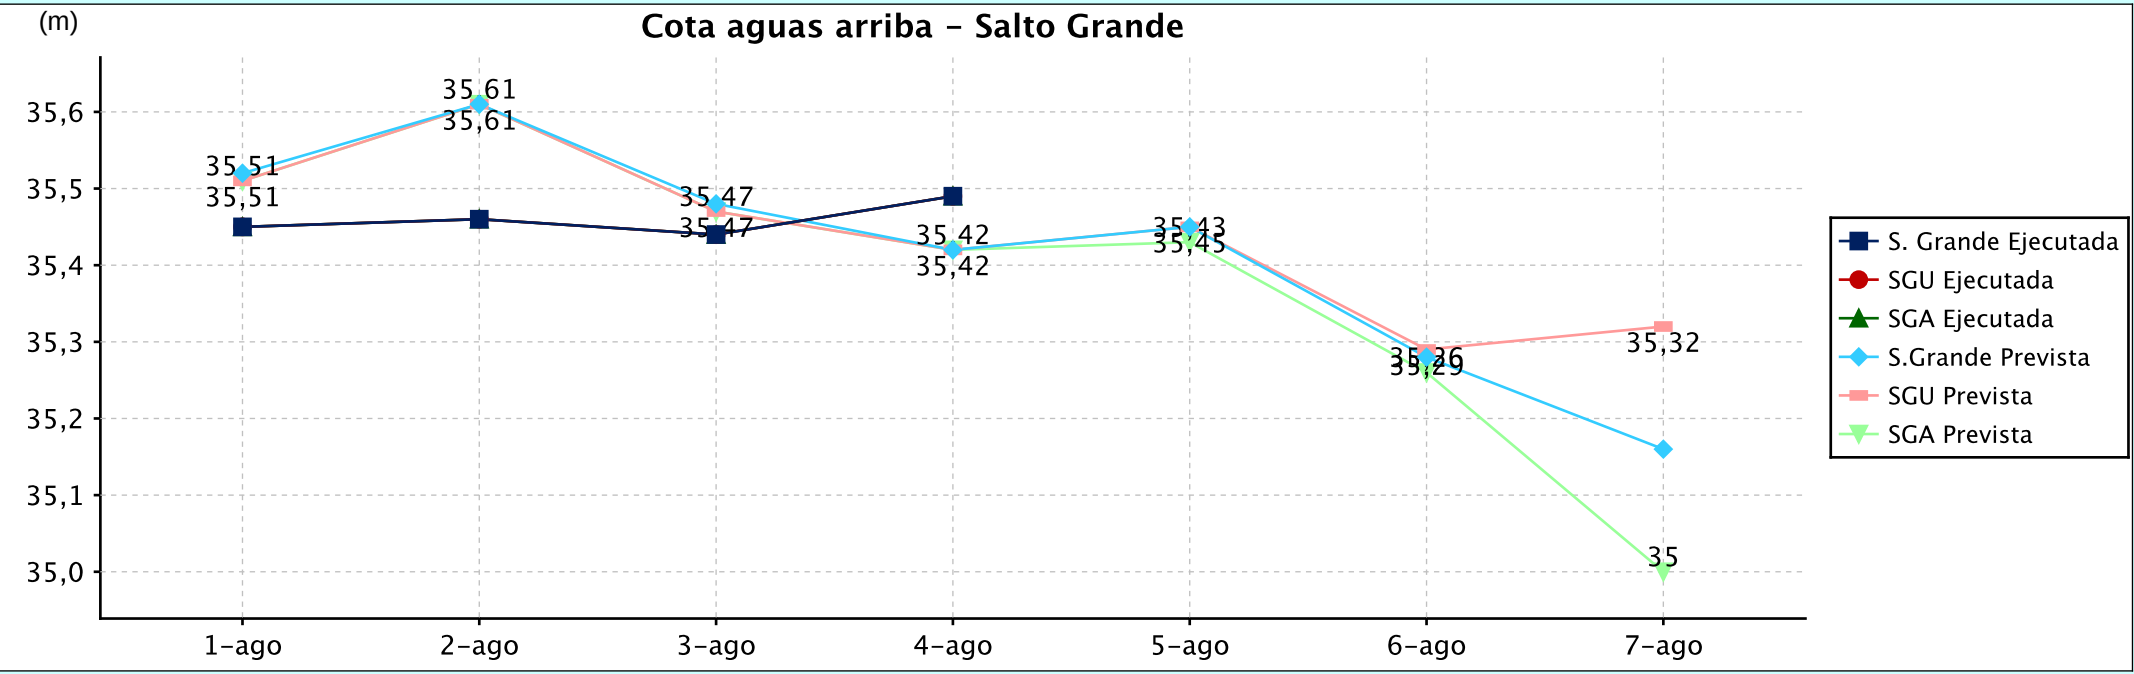

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,49
Cota Vista Arg	35,49
Cota real	35,49
Dif. Energ. (U-A)	
Acumulado MWh	0

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	94	203
Baygorria	16	154
Palmar	0	14
SGU	4.030	4.132

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	478	694
Baygorria	0	132
Palmar	0	199
SGU	4.350	4.476

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	287

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
