




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

viernes 07 de agosto de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	-5
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-1
Central La Tablada	-48
Central P. del Tigre	-9
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	34
C. Baygorria	61
C. Palmar	2.980
C. Salto Grande	17.298
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	9.209
TOTAL Generación	29.518

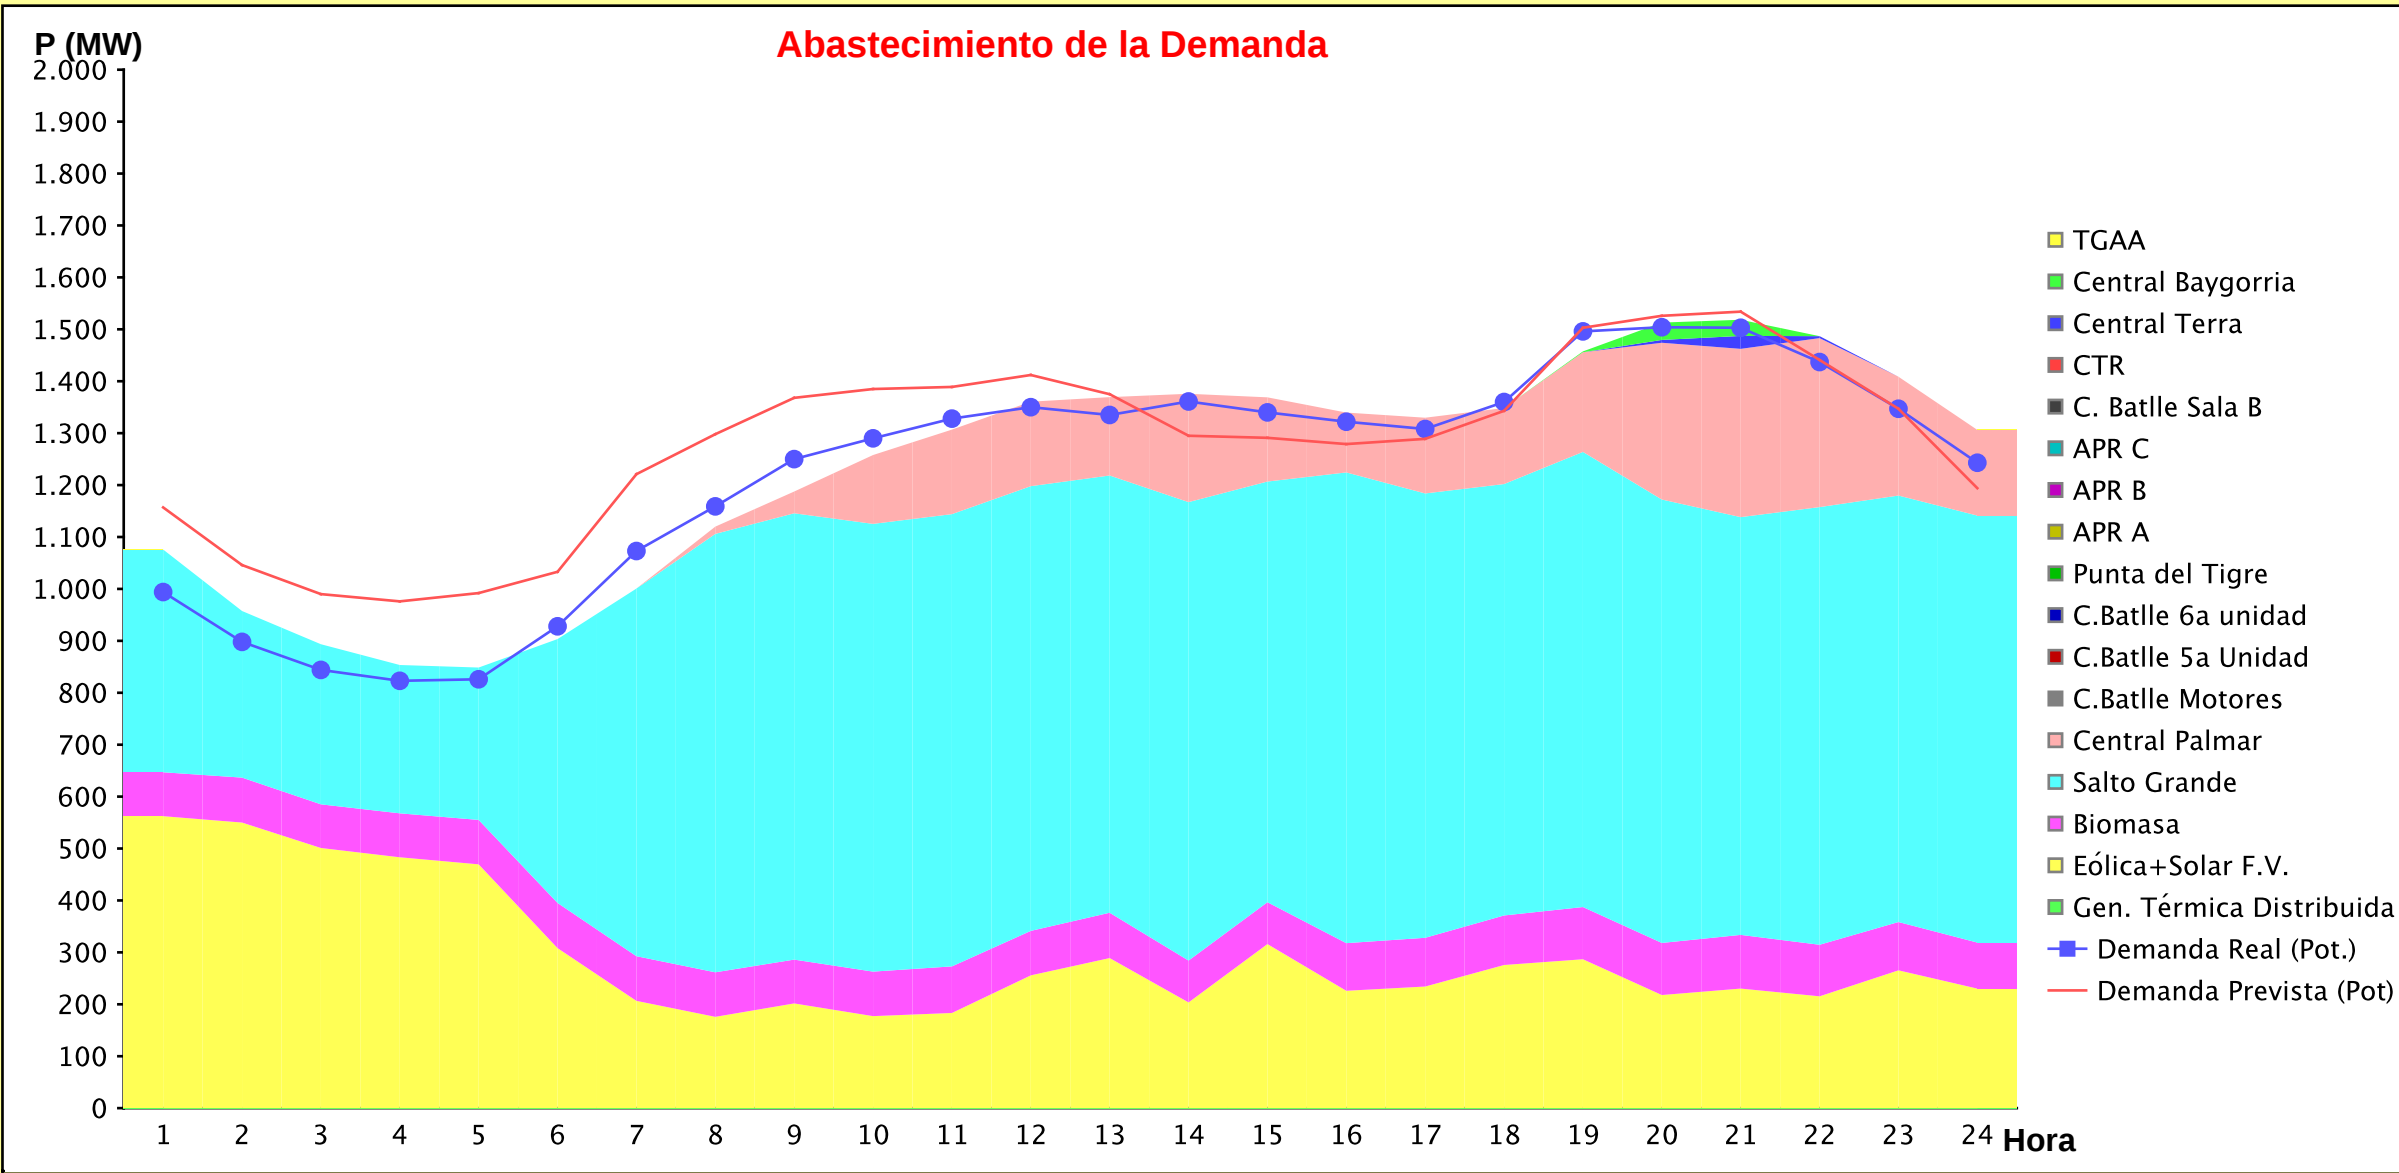

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	29.518
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	


Demanda Programada (MWh)	30.684
Diferencia (MWh)	-1.166
Ejecutada - Programada	-3,80 %

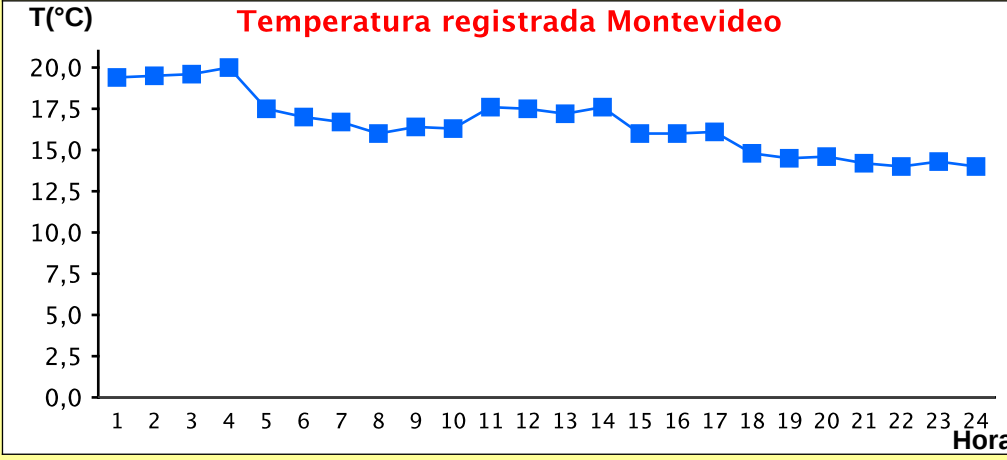

Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1411 Hora 12:22
Potencia mínima:	835 Hora 04:29
Pico noche:	1531 Hora 19:31



Generación Media (MW)	
Eólica	290,1
Biomasa	90,5
Solar fotovoltaica	4,3
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

Composición de la Demanda S.I.N.

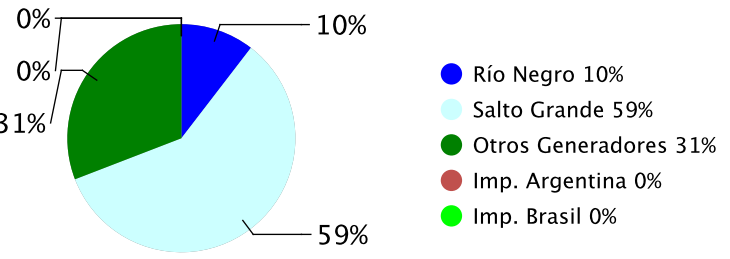



Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

Generación (Demanda + Exportación)

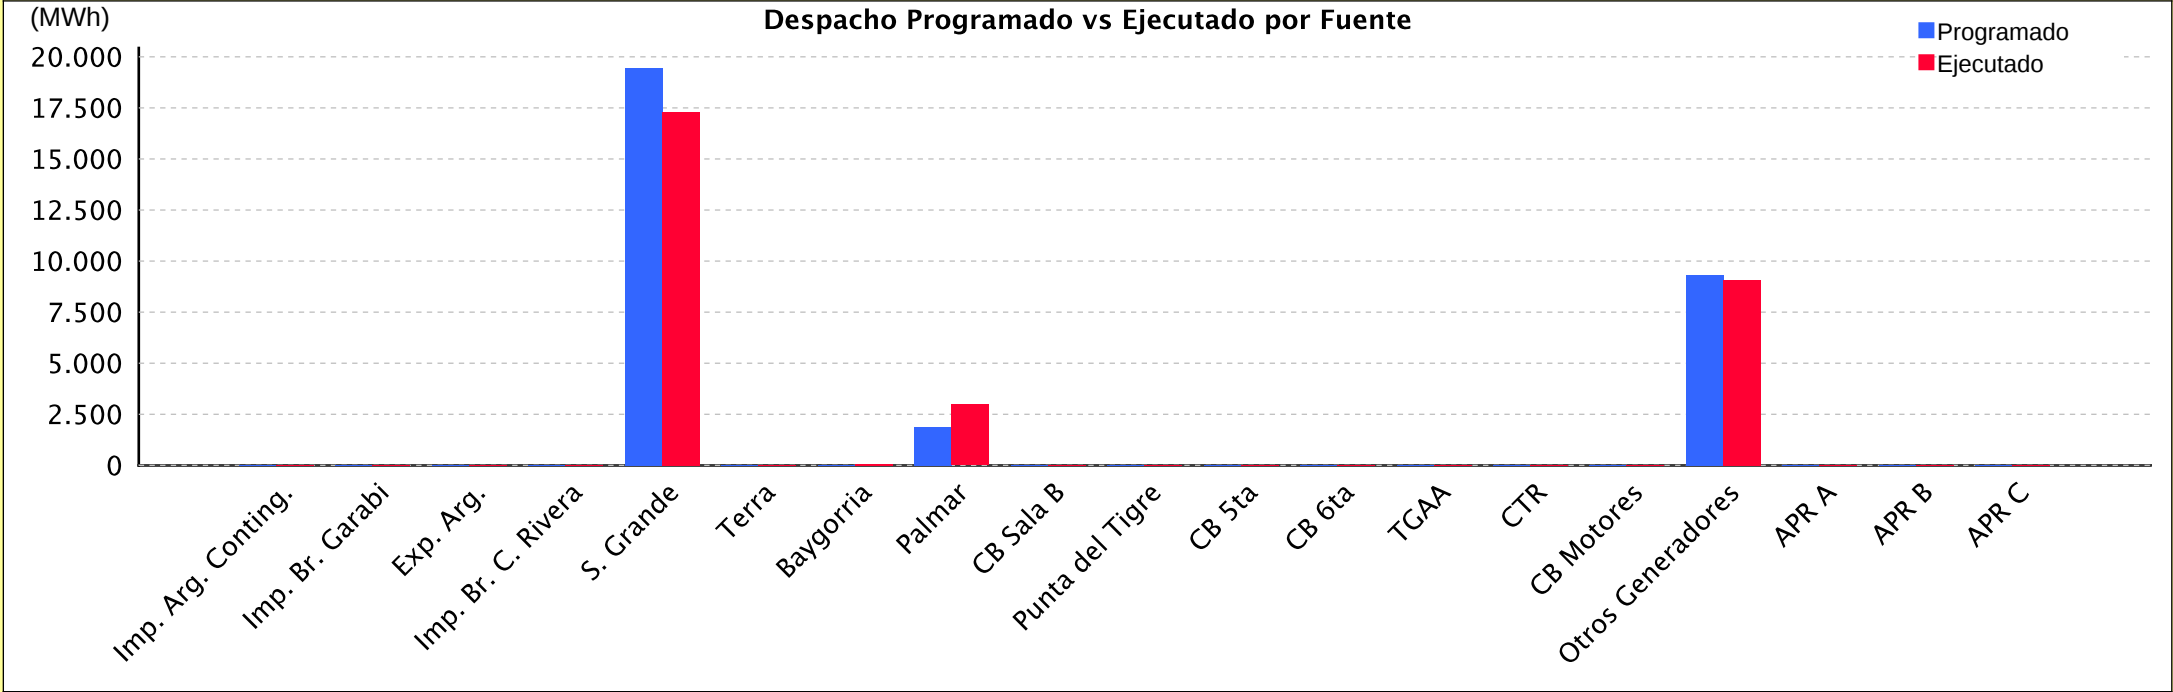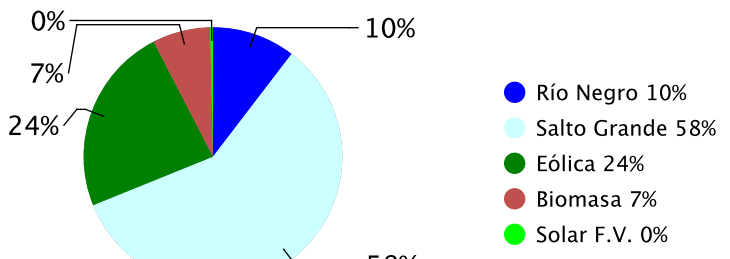



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

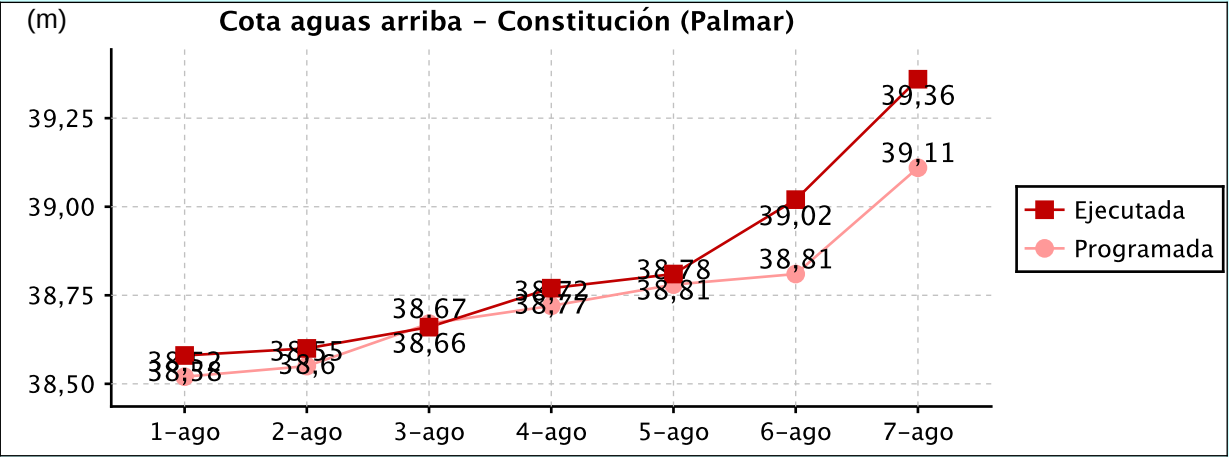
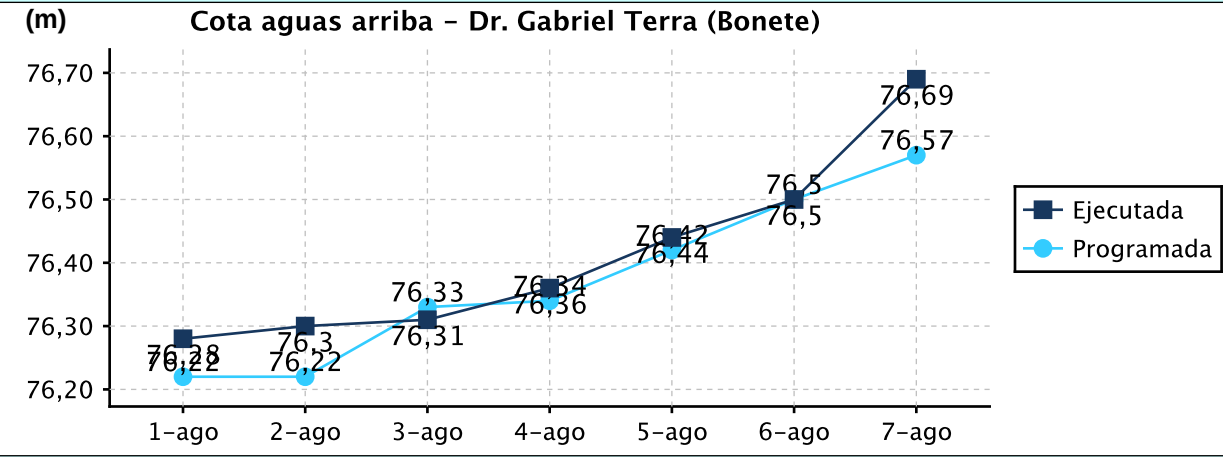


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,57	76,69
Baygorria	53,95	53,92
Palmar	39,11	39,36
SGU	35,18	35,29

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

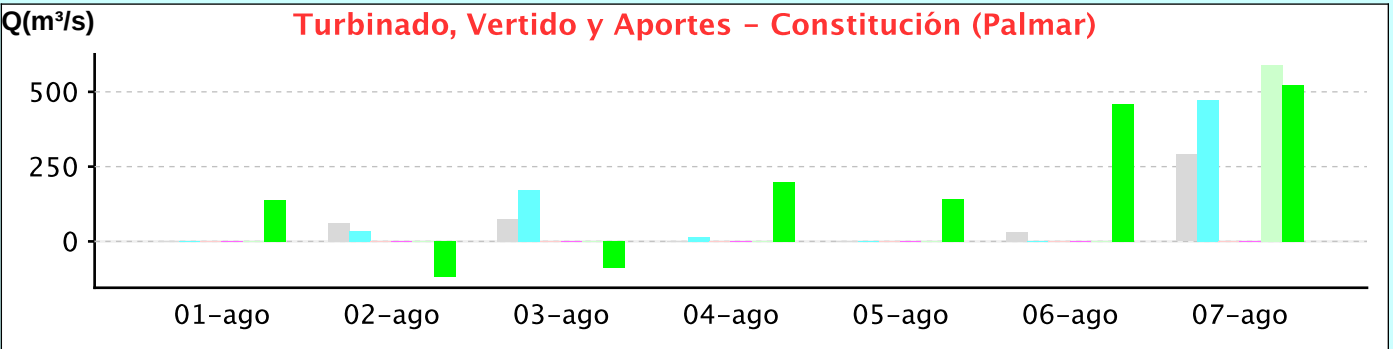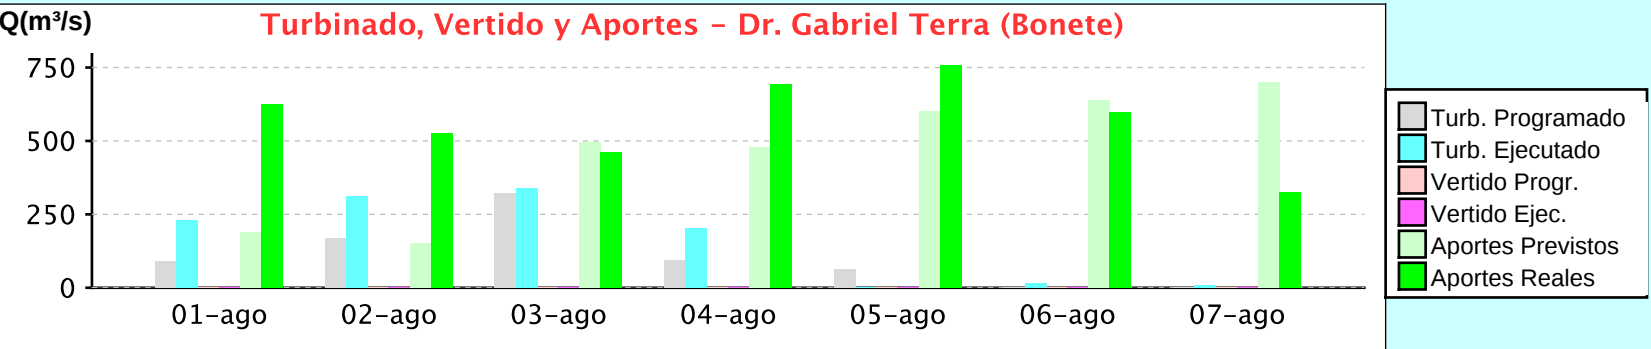

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

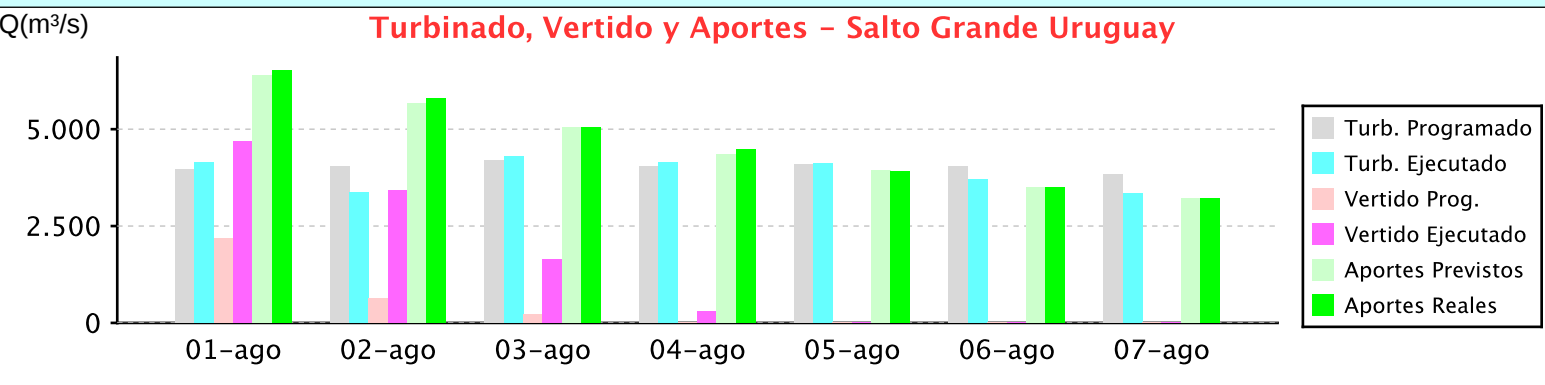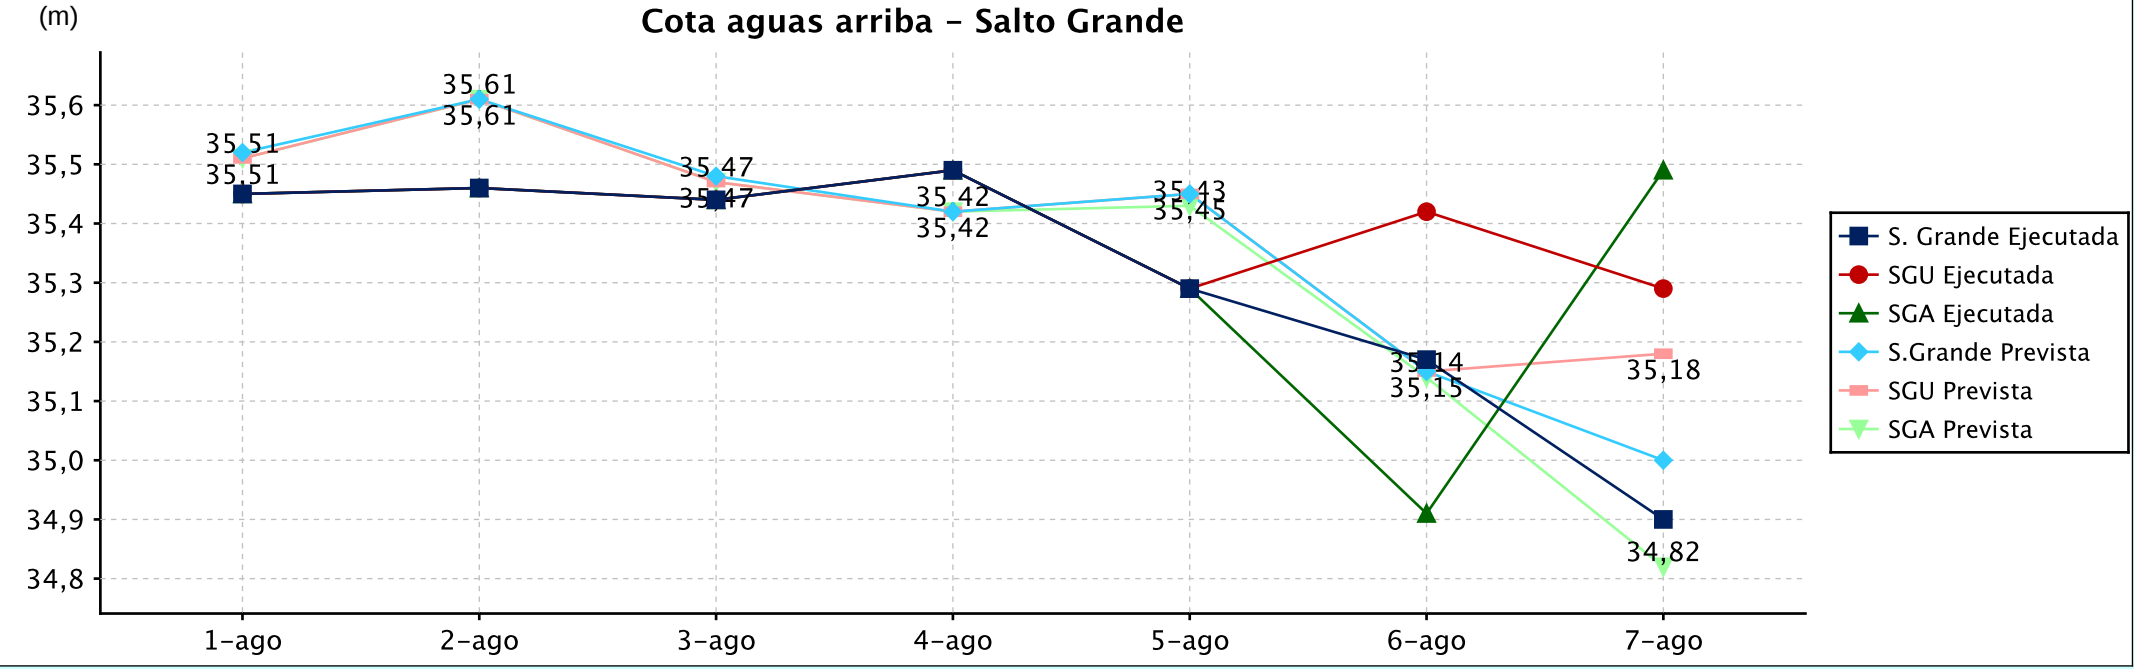

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,29
Cota Vista Arg	35,49
Cota real	34,90
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
18.648	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	8
Baygorria	0	22
Palmar	291	472
SGU	3.827	3.341

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	700	326
Baygorria	100	68
Palmar	590	524
SGU	3.225	3.226

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
