




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

domingo 09 de agosto de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	0
Central La Tablada	-90
Central P. del Tigre	-9
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	0
C. Baygorria	-6
C. Palmar	59
C. Salto Grande	9.291
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	15.340
TOTAL Generación	24.577

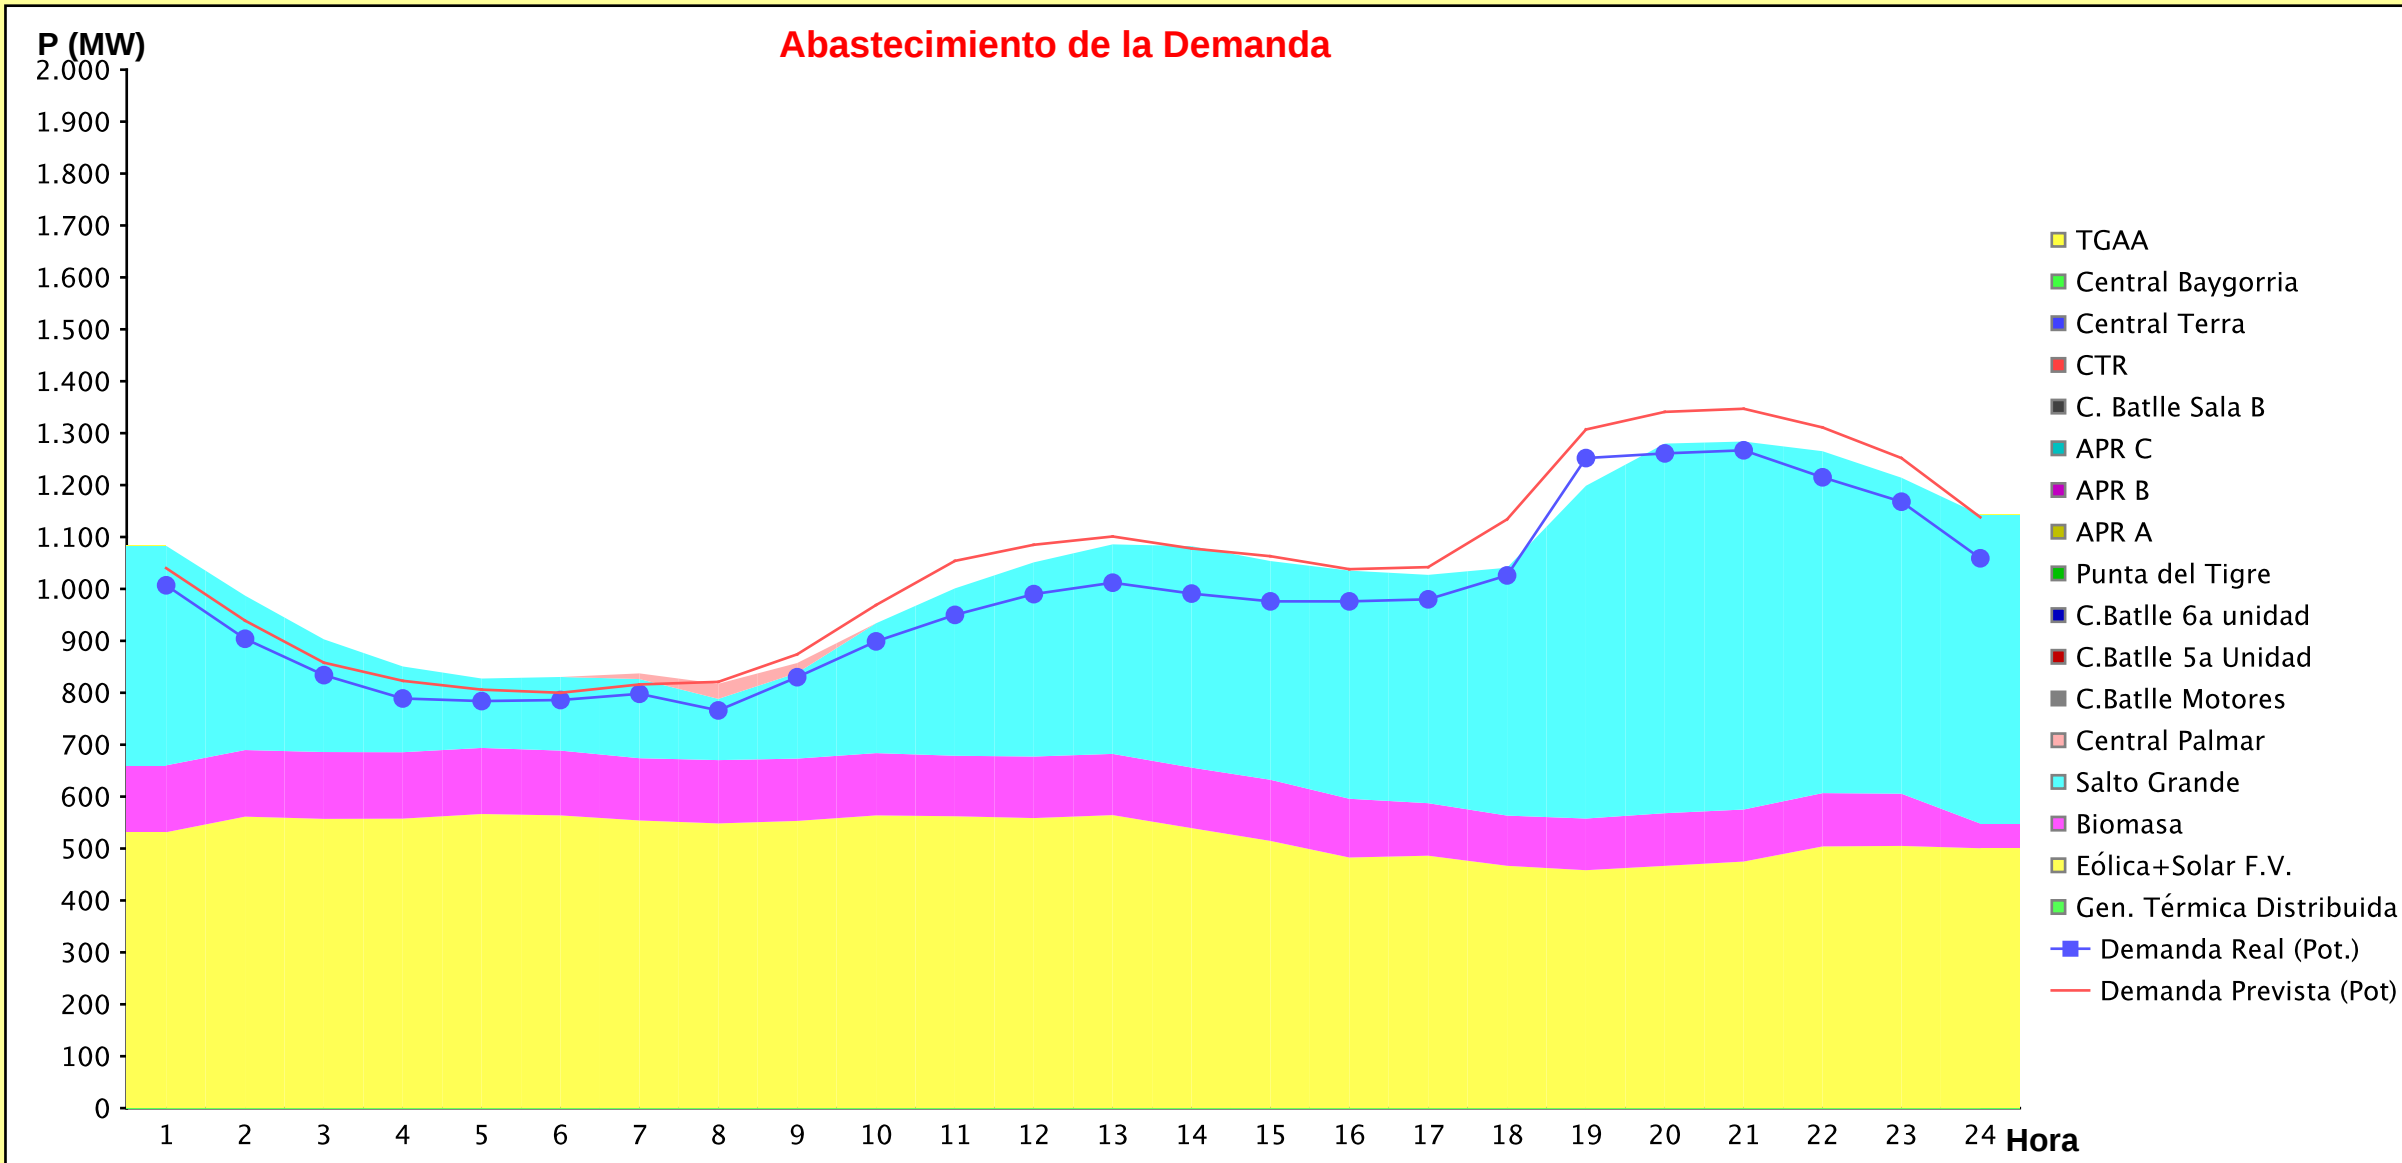

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0


DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	24.577
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	25.037
Diferencia (MWh)	-460
Ejecutada - Programada	-1,84 %


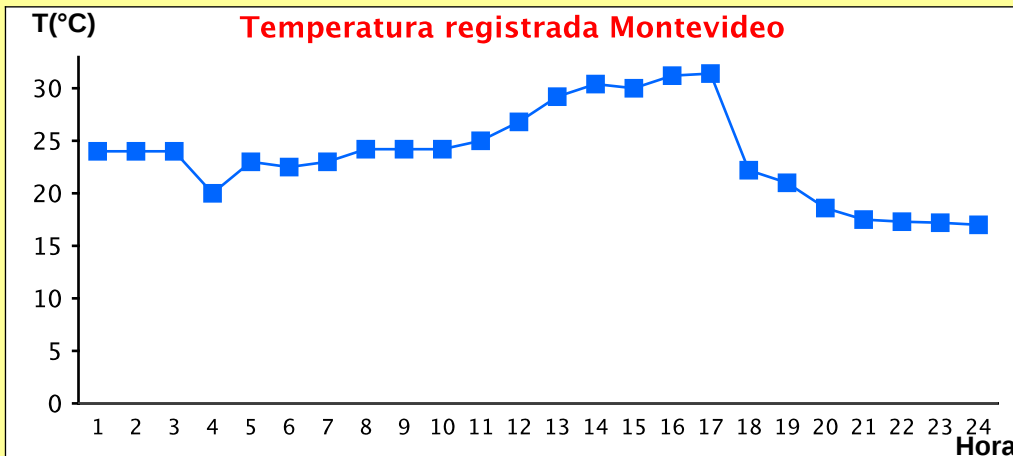


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1136 Hora 13:23
Potencia mínima:	794 Hora 07:49
Pico noche:	1296 Hora 21:00

Generación Media (MW)	
Eólica	512,6
Biomasa	112,7
Solar fotovoltaica	12,3
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0


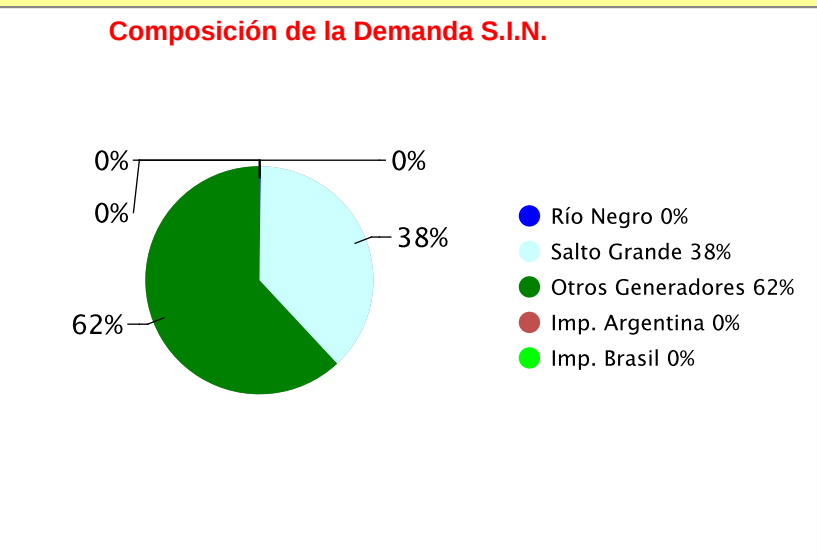


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

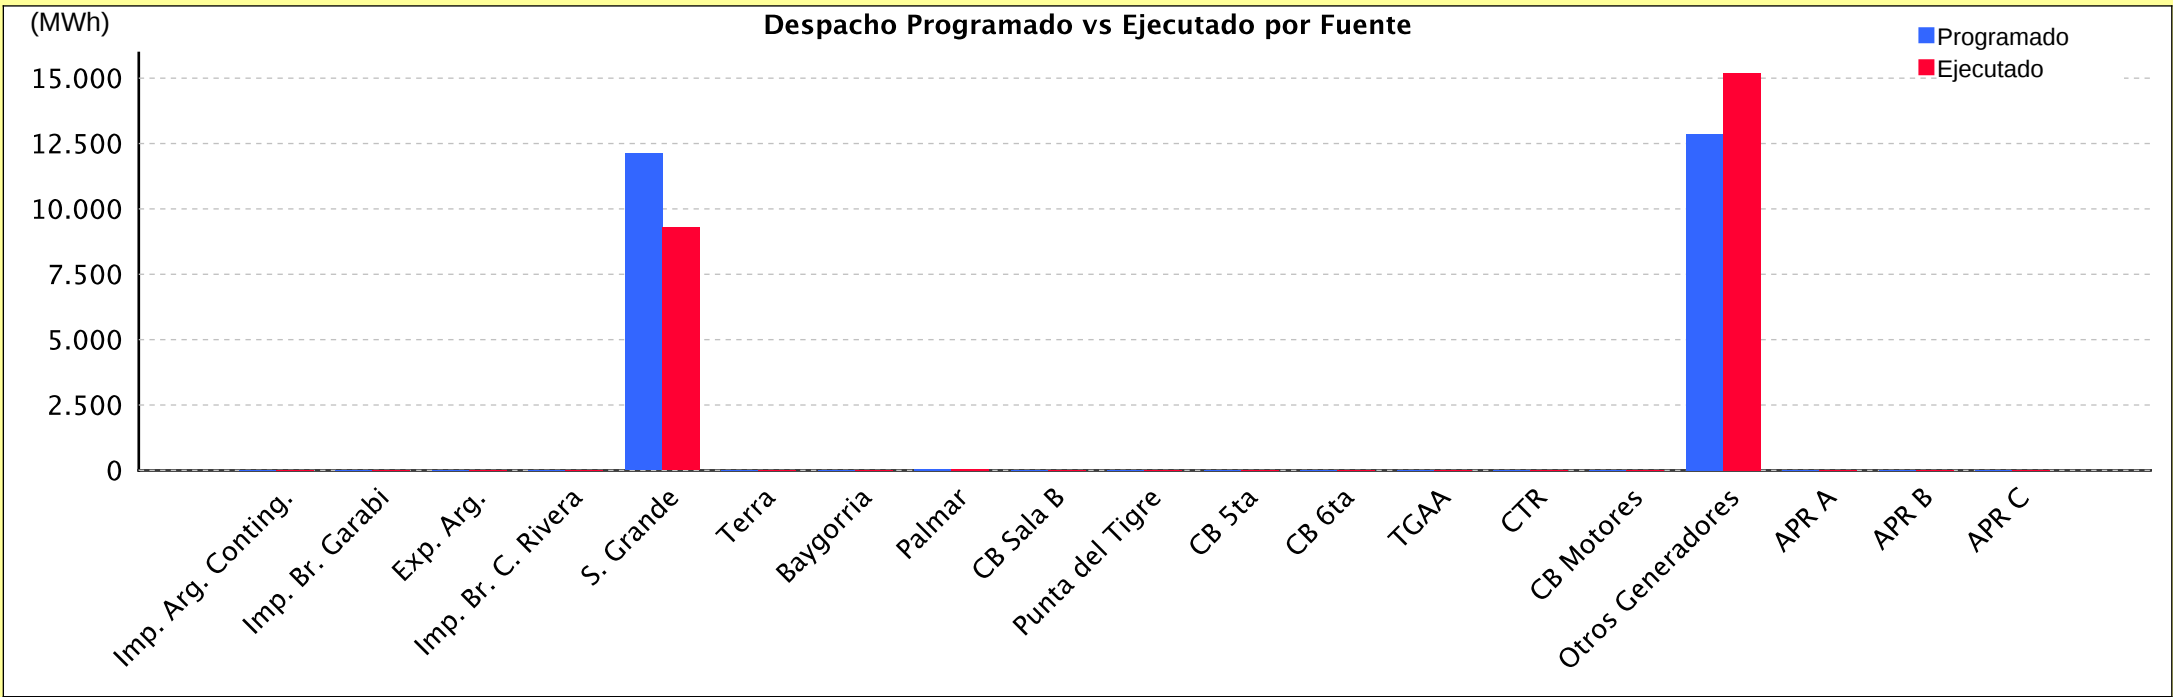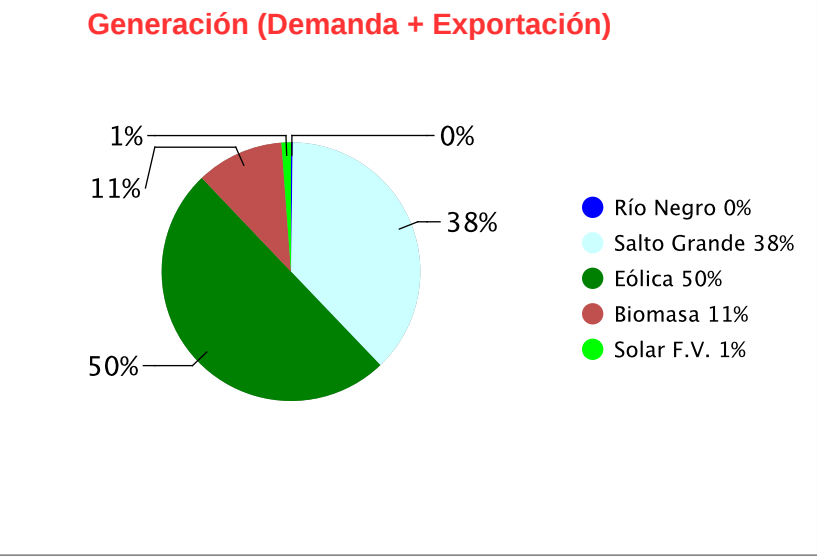



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

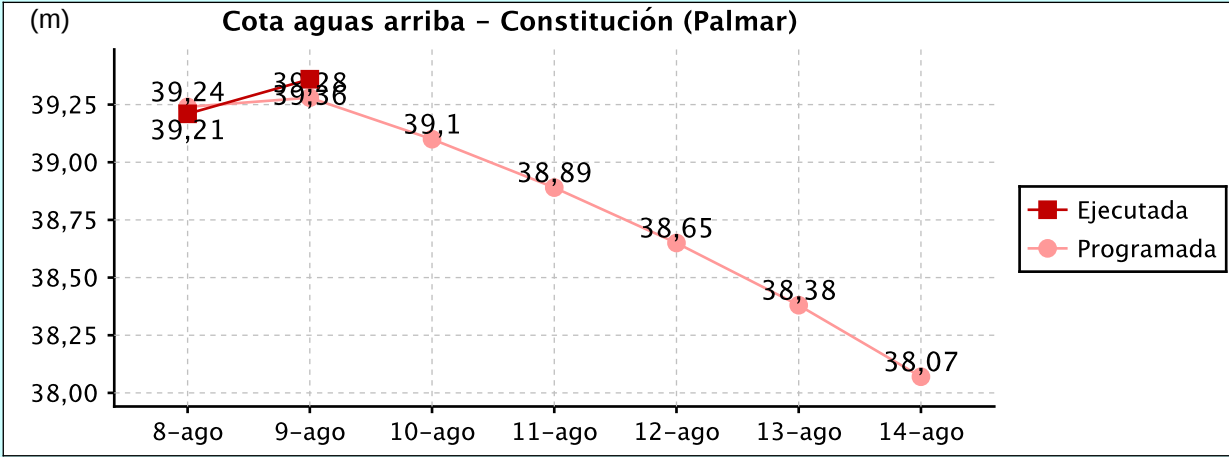
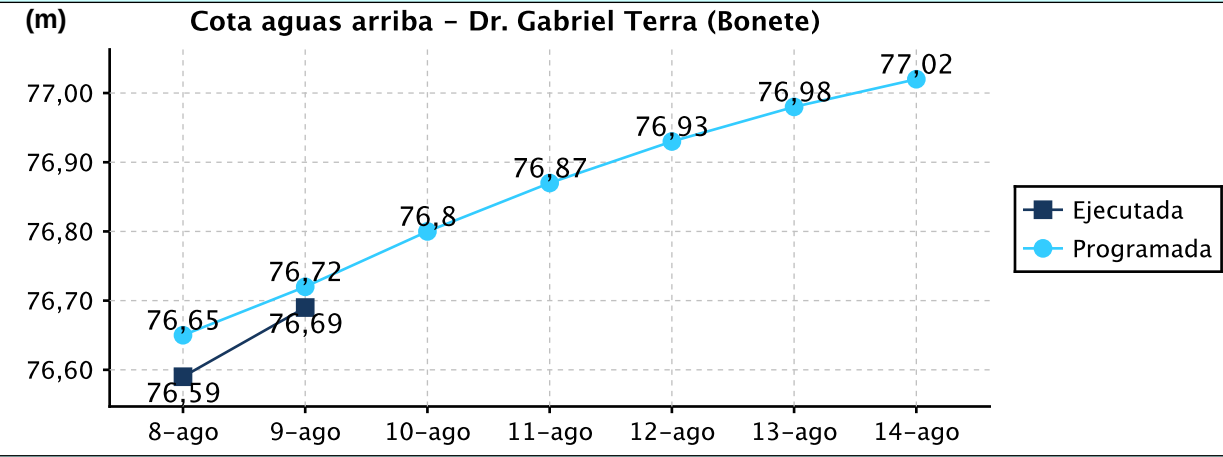


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,72	76,69
Baygorria	53,97	53,92
Palmar	39,28	39,36
SGU	35,20	35,51

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

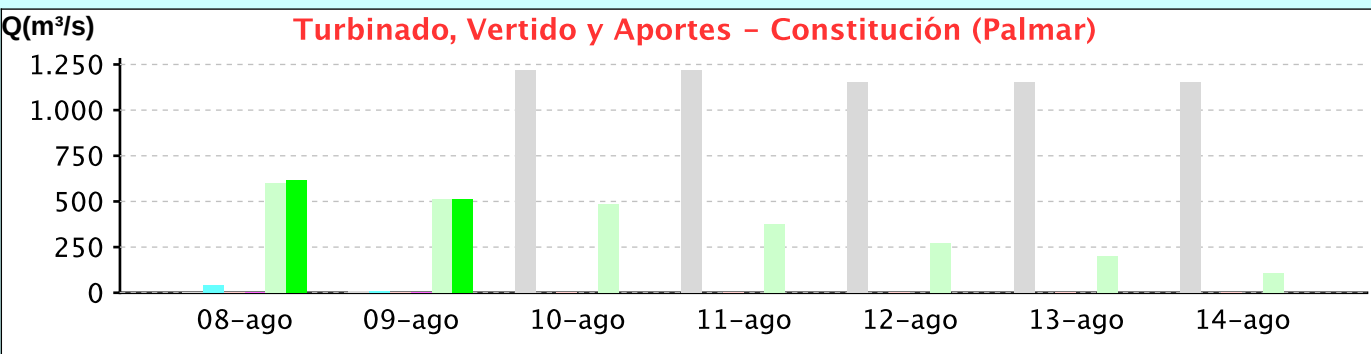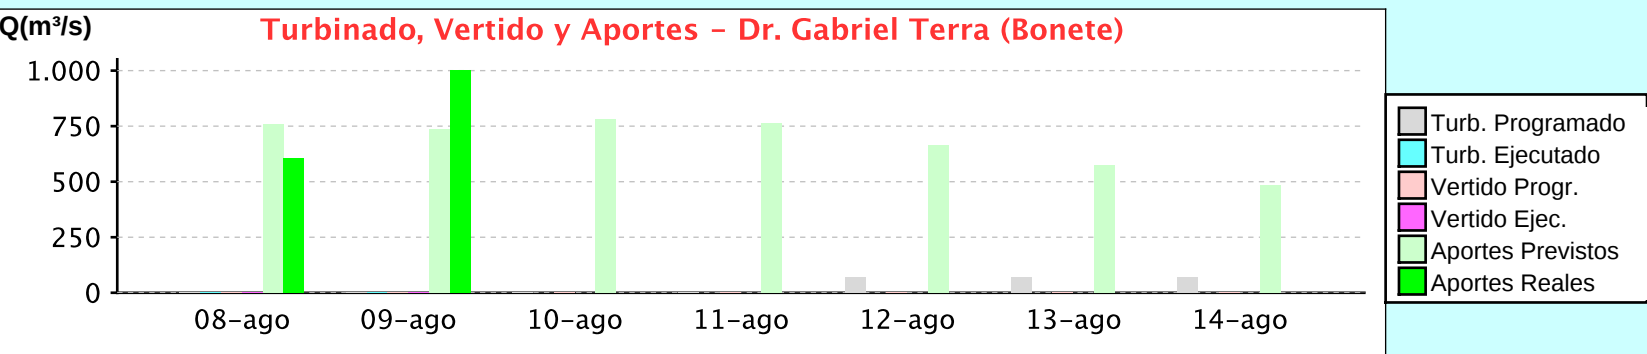

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

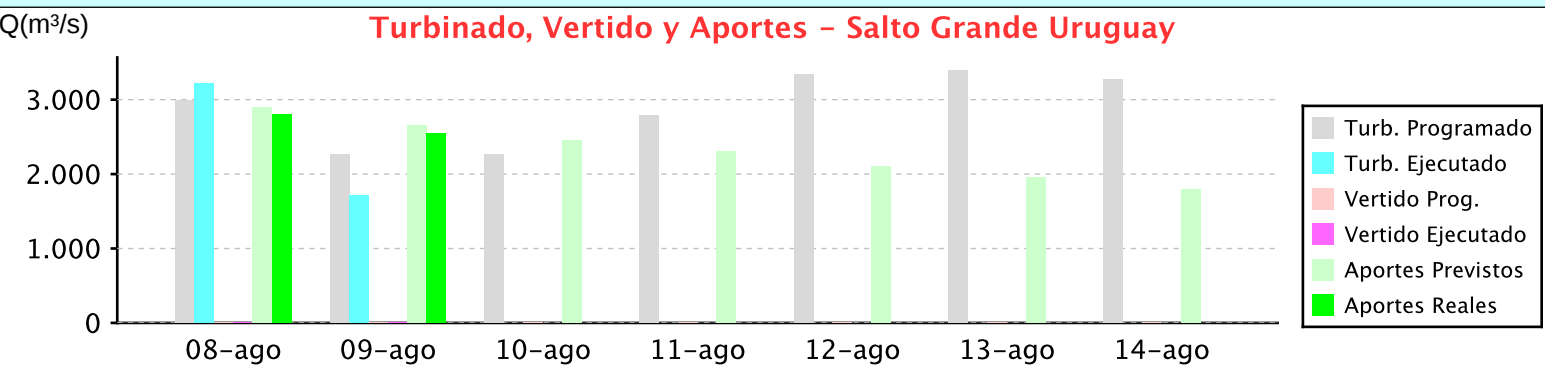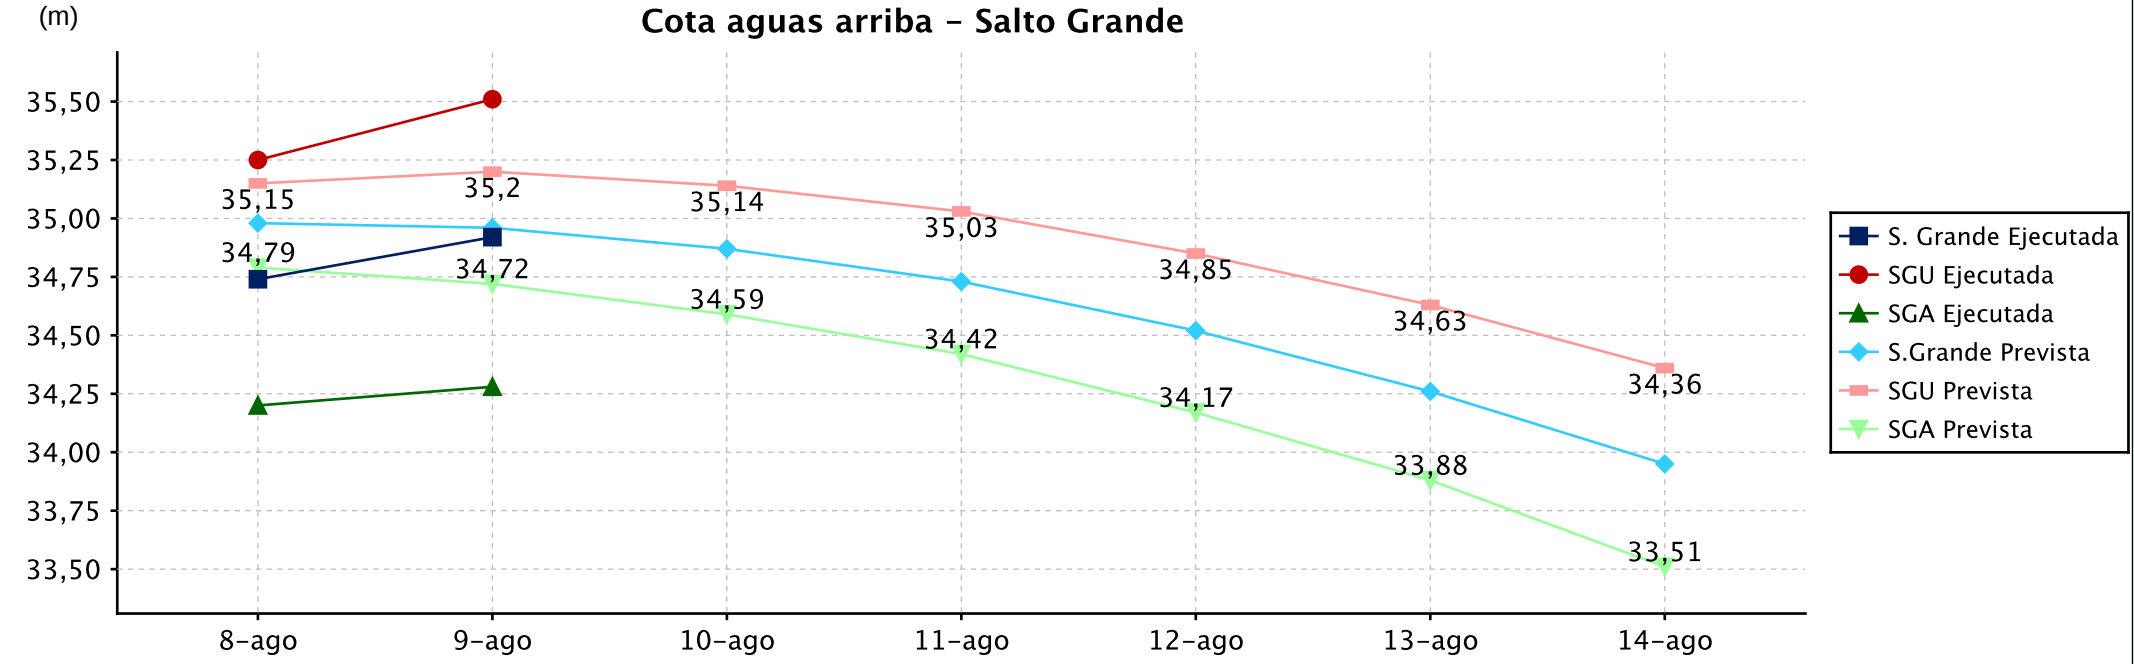

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,51
Cota Vista Arg	34,28
Cota real	34,92
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
28.559	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	9	9
SGU	2.263	1.711

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	737	1.001
Baygorria	0	19
Palmar	512	512
SGU	2.650	2.543

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
