




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

lunes 10 de agosto de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	24
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	28
Central La Tablada	-81
Central P. del Tigre	-9
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	395
C. Baygorria	580
C. Palmar	7.699
C. Salto Grande	12.267
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	8.077
TOTAL Generación	28.948

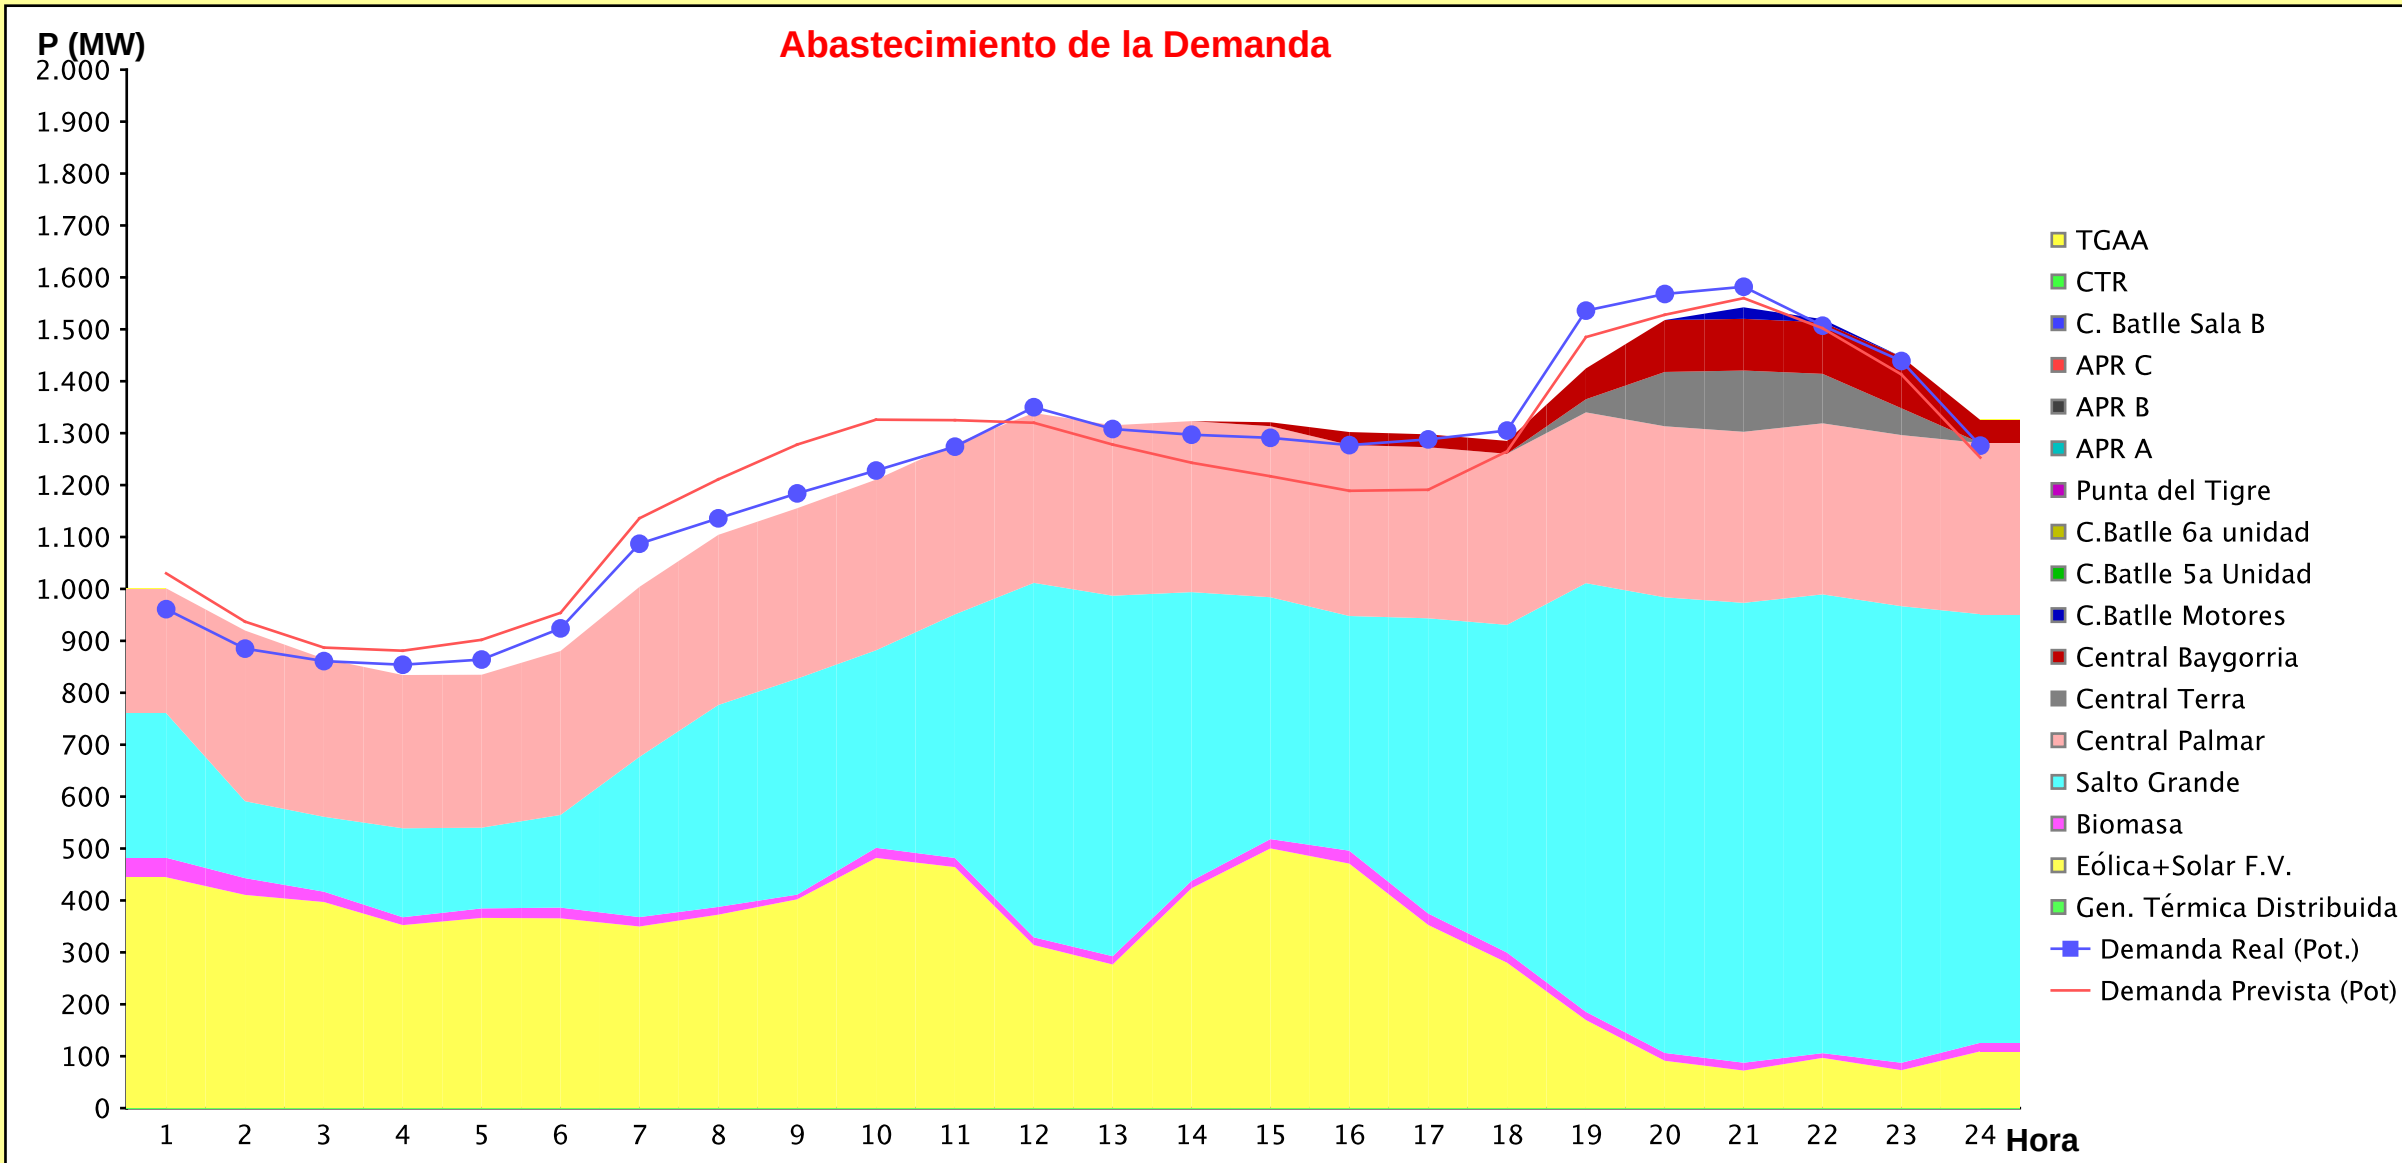

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0



DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	28.948
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	29.311
Diferencia (MWh)	-363
Ejecutada - Programada	-1,24 %

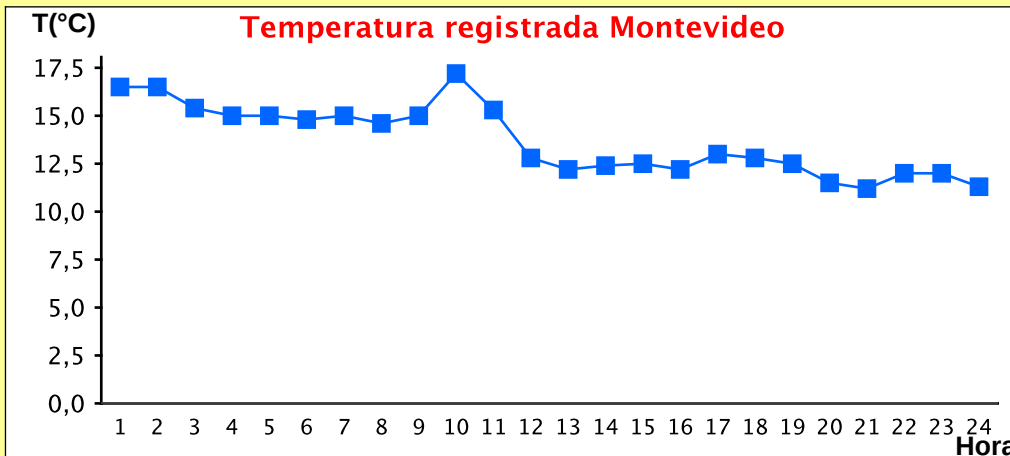


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1361 Hora 11:56
Potencia mínima:	847 Hora 03:59
Pico noche:	1585 Hora 20:42

Generación Media (MW)	
Eólica	313,9
Biomasa	39,3
Solar fotovoltaica	4,2
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

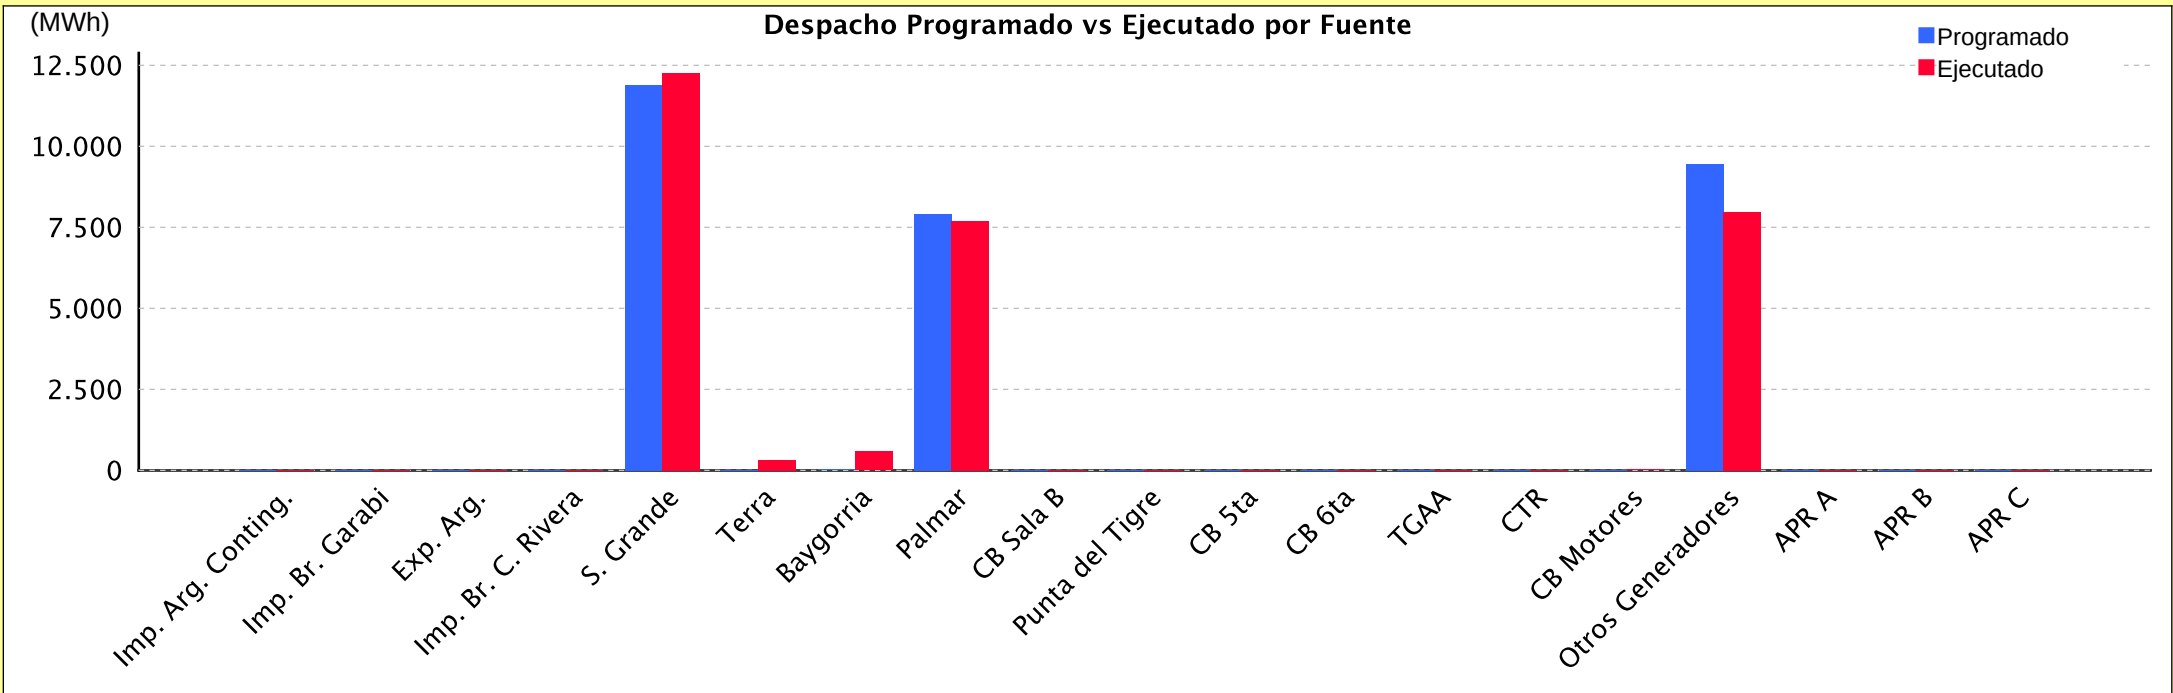
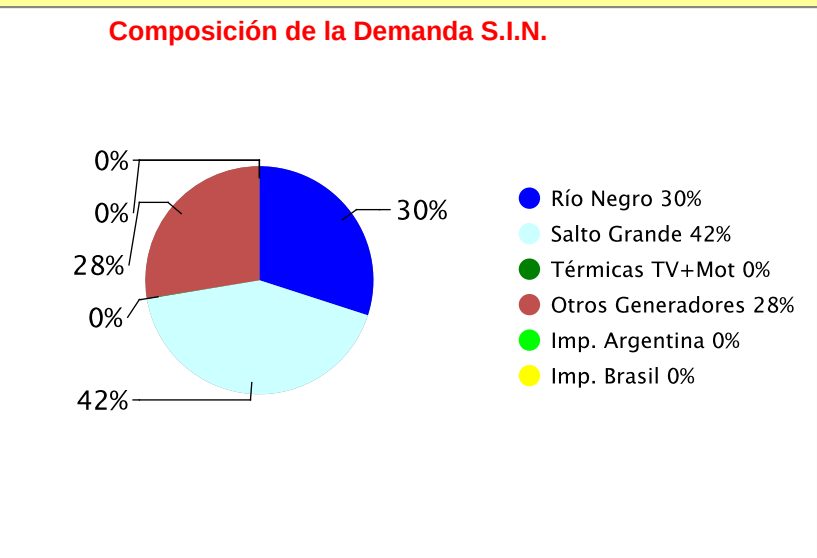


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

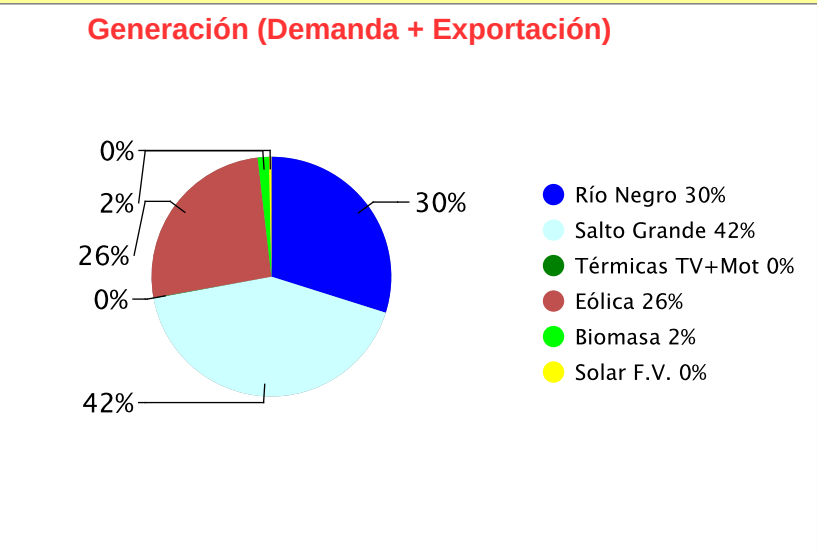



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

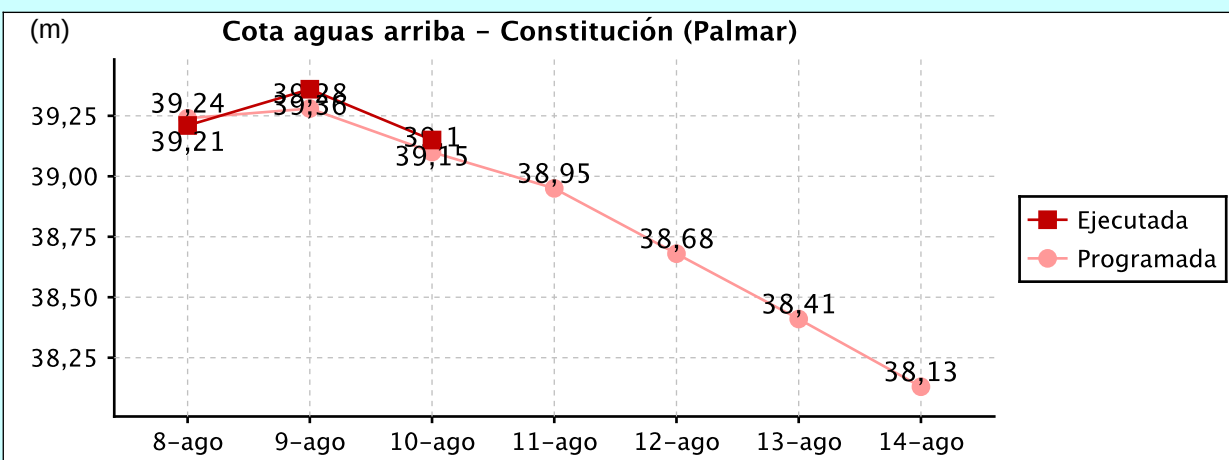
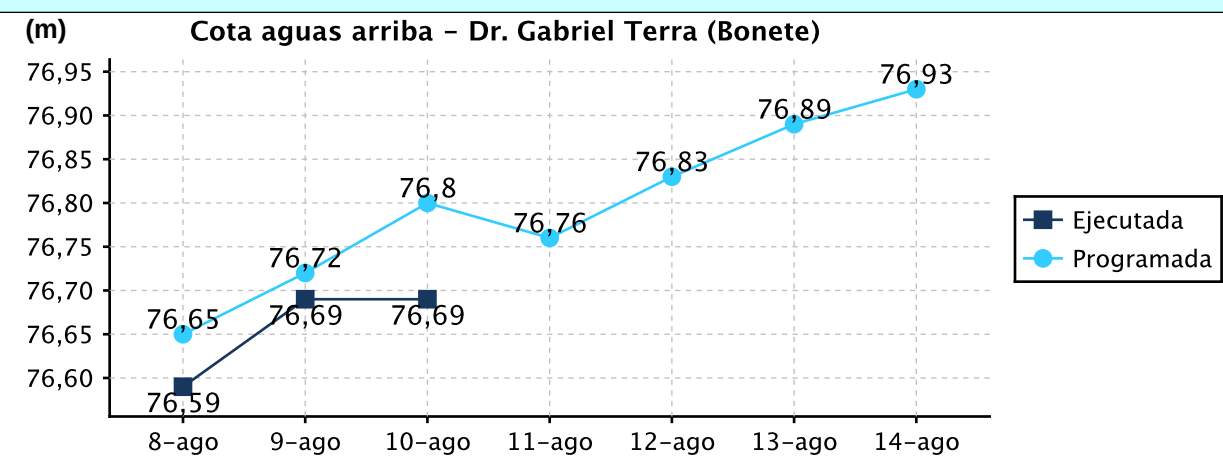


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	76,80	76,69
Baygorria	53,97	53,78
Palmar	39,10	39,15
SGU	35,14	35,47

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

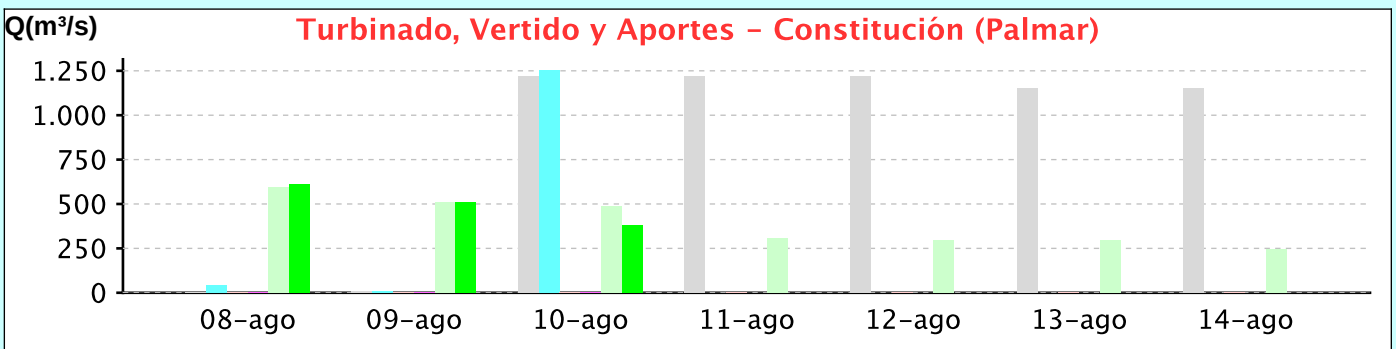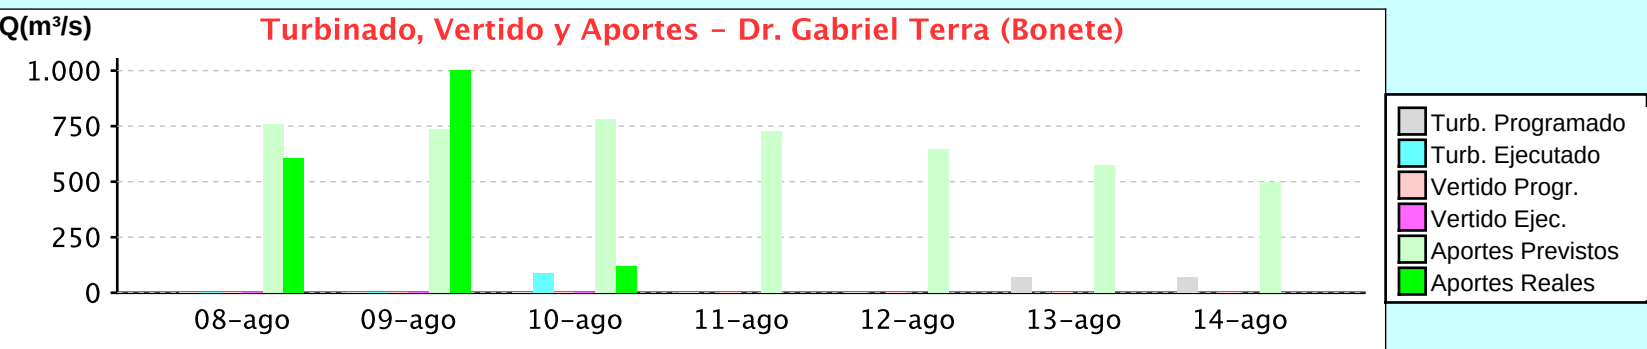

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

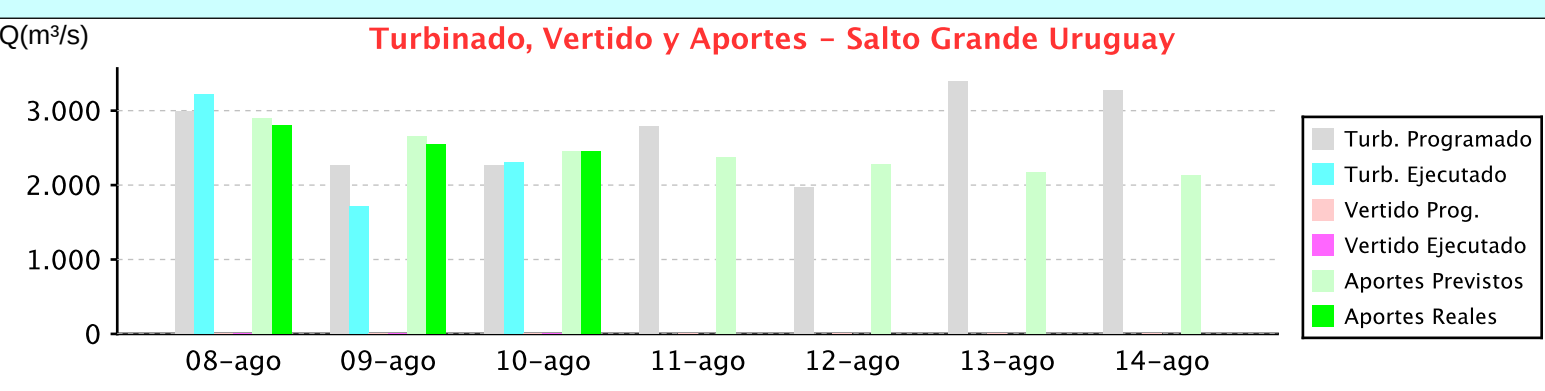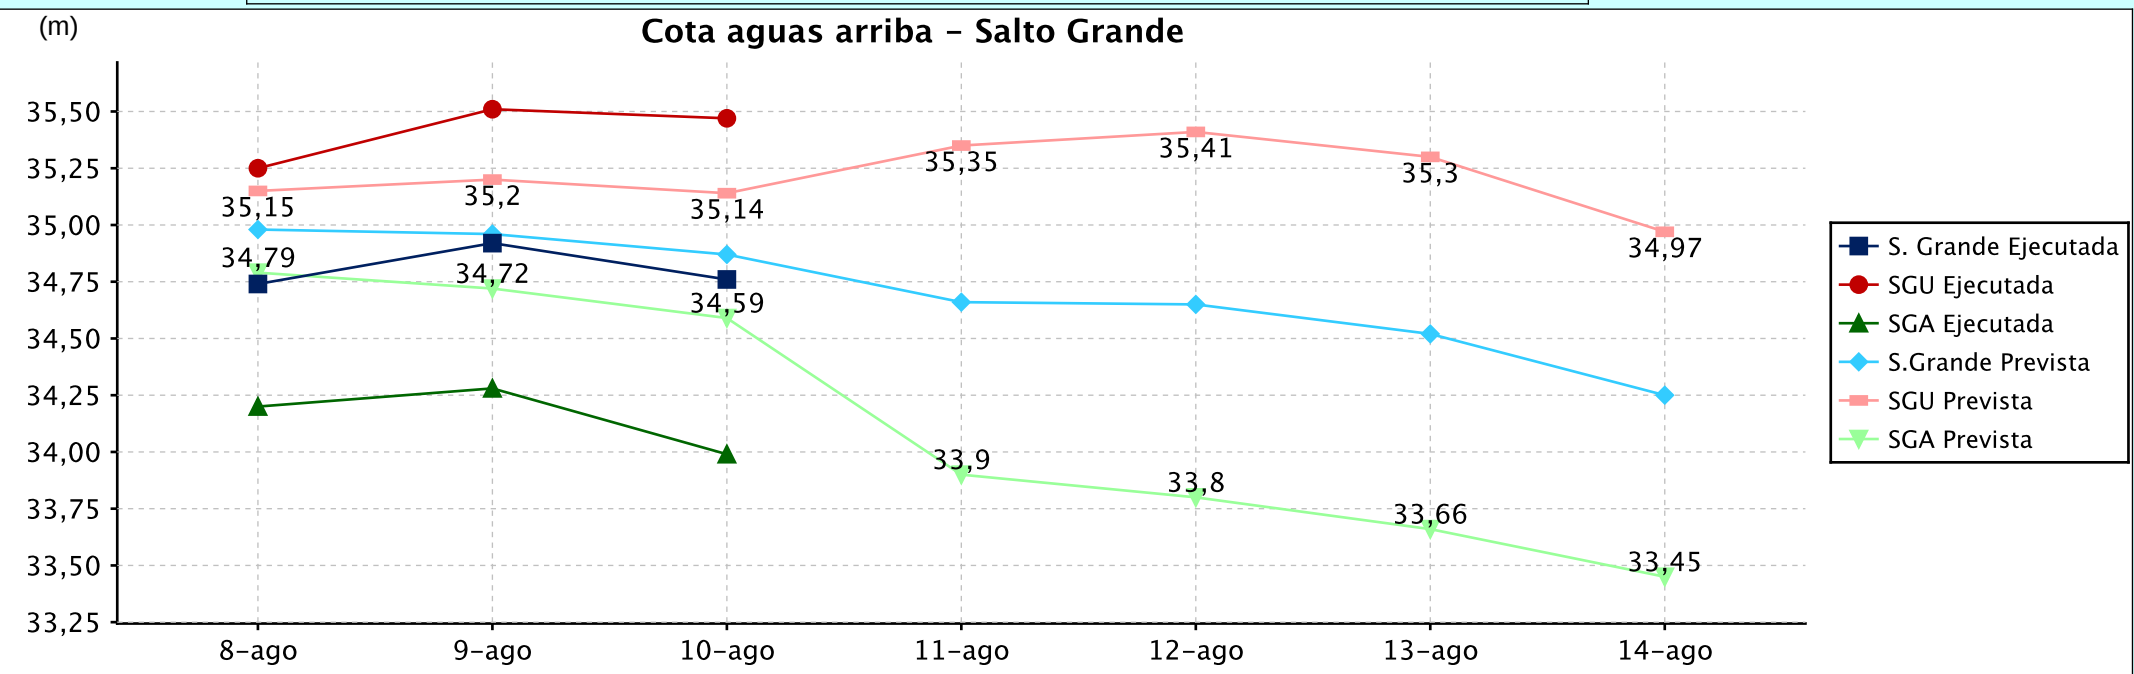

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,47
Cota Vista Arg	33,99
Cota real	34,76
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
33.853	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	89
Baygorria	10	204
Palmar	1.217	1.252
SGU	2.262	2.301

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	782	118
Baygorria	0	-39
Palmar	485	382
SGU	2.450	2.458

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
