




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

jueves 13 de agosto de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	181
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	185
Central La Tablada	-79
Central P. del Tigre	239
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	508
C. Baygorria	1.585
C. Palmar	7.843
C. Salto Grande	13.750
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	7.883
TOTAL Generación	31.907

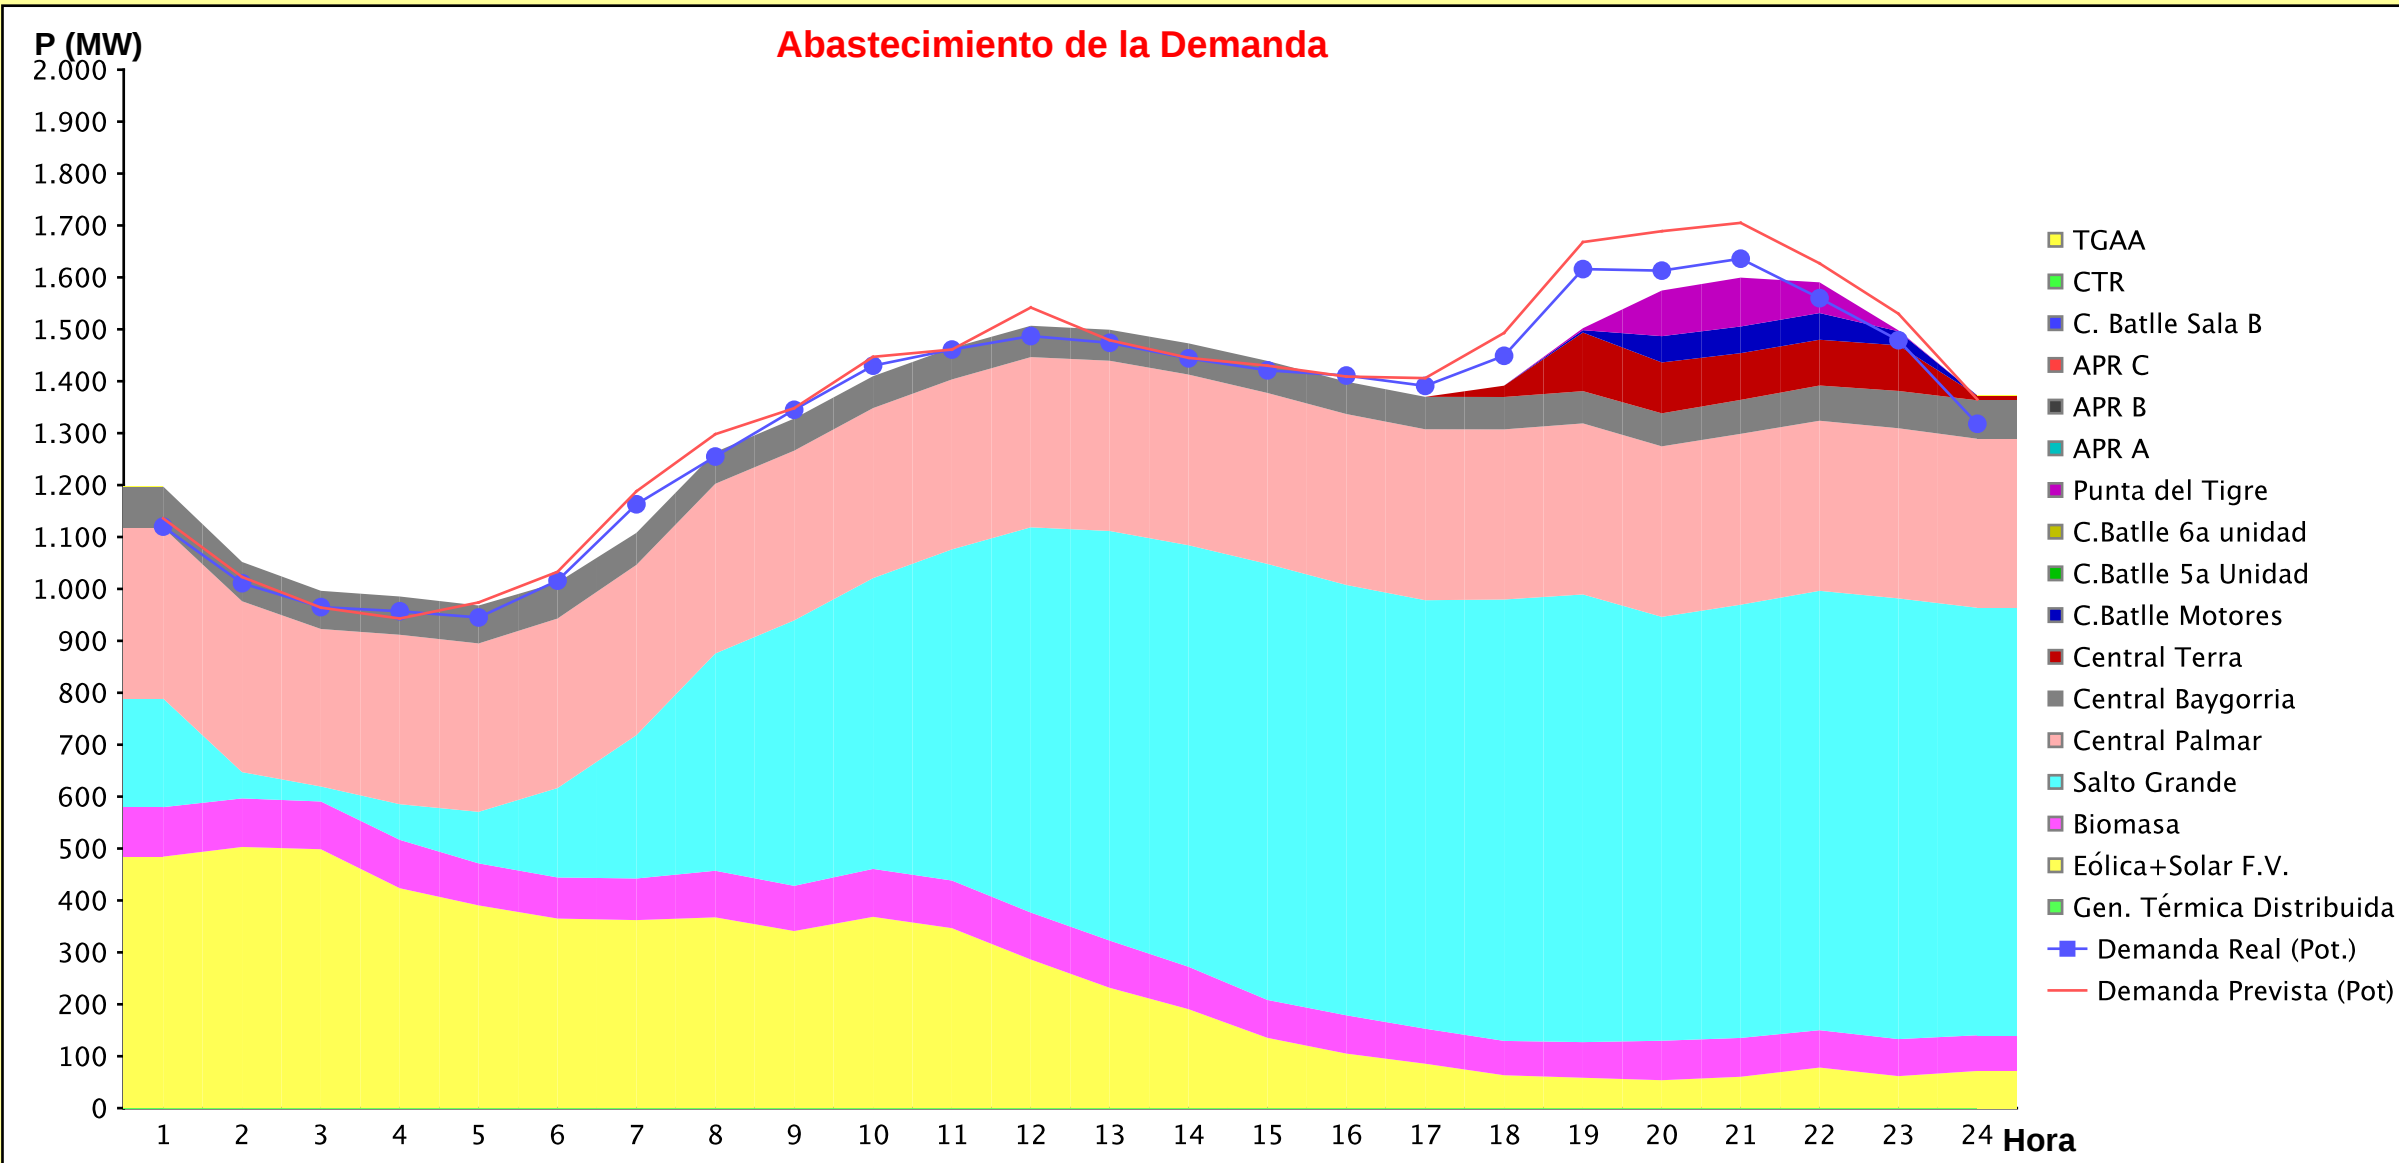

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	31.907
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	


Demanda Programada (MWh)	32.603
Diferencia (MWh)	-696
Ejecutada - Programada	-2,14 %

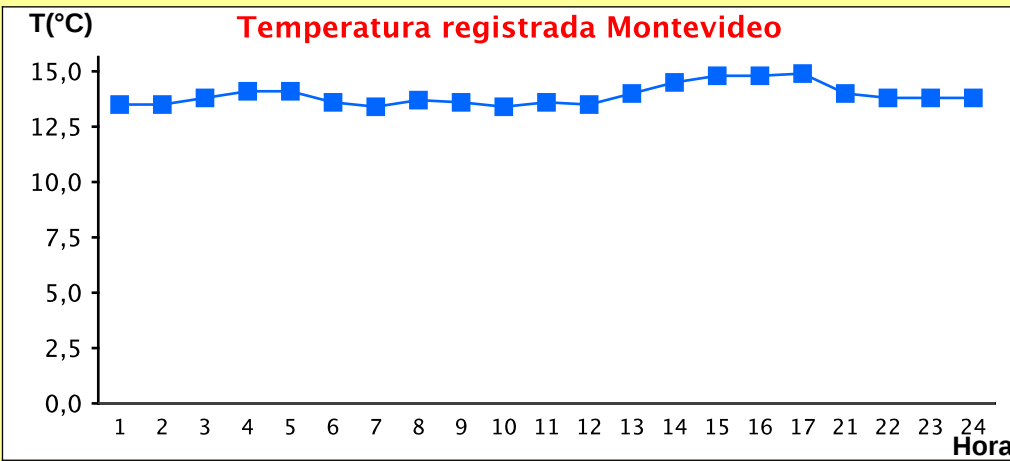

Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1521 Hora 11:54
Potencia mínima:	961 Hora 04:08
Pico noche:	1639 Hora 20:39


Generación Media (MW)	
Eólica	243,8
Biomasa	81,4
Solar fotovoltaica	3,7
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

Composición de la Demanda S.I.N.

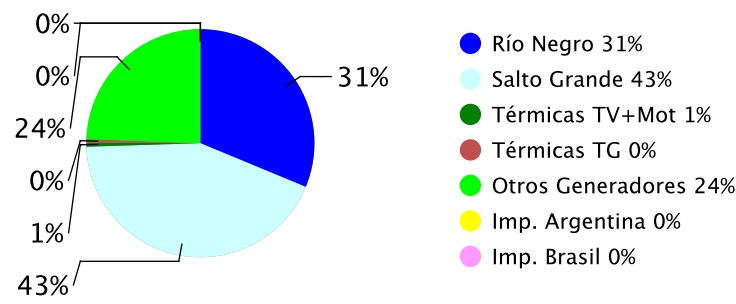



Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

Generación (Demanda + Exportación)

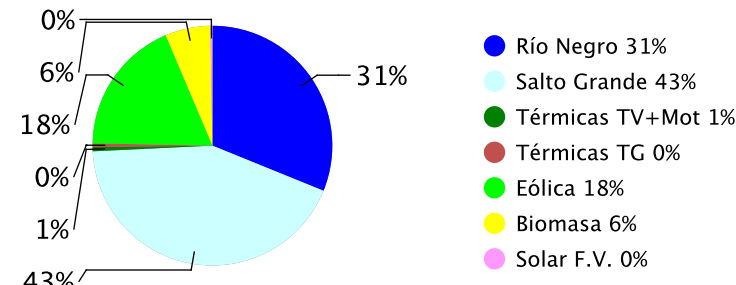



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

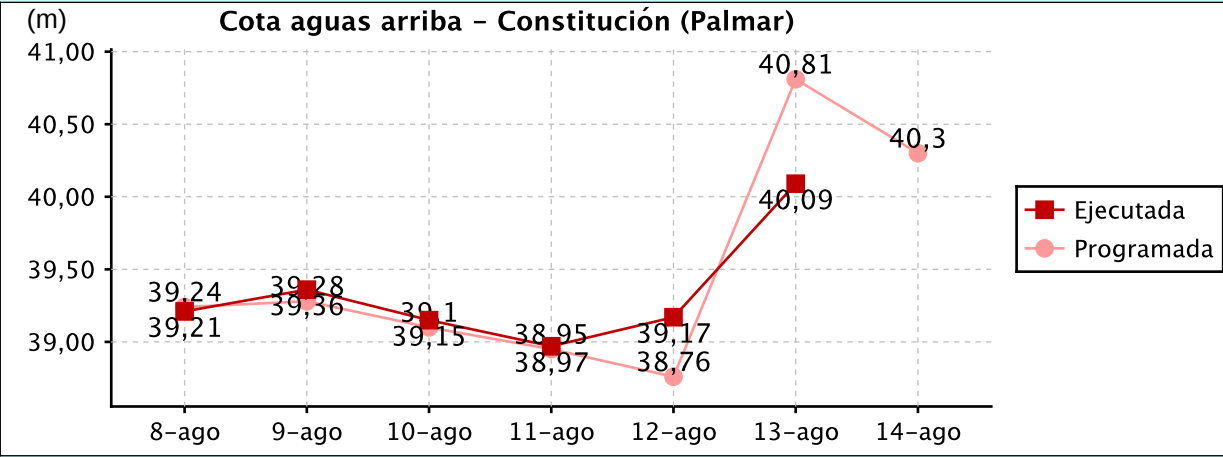
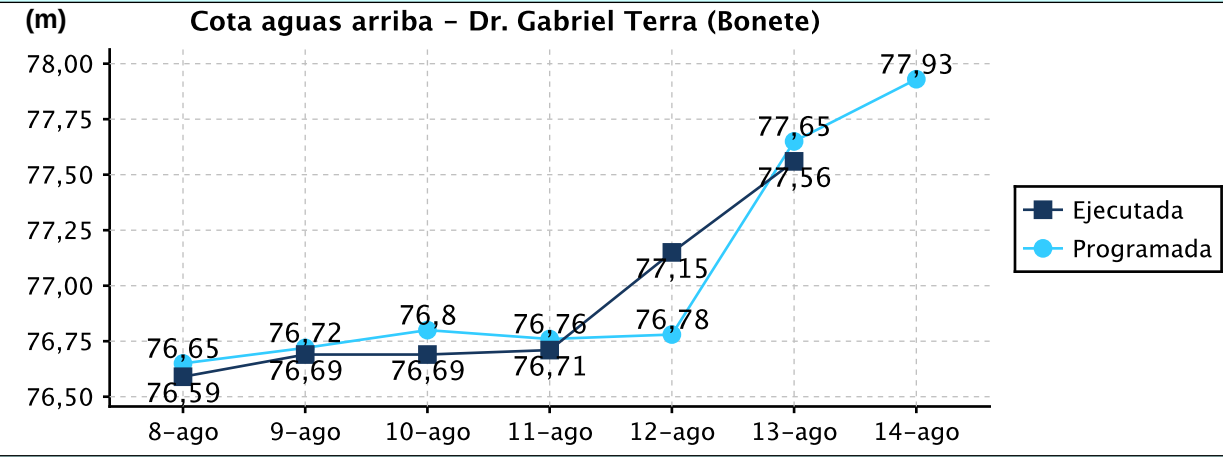


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	77,65	77,56
Baygorria	54,33	54,28
Palmar	40,81	40,09
SGU	35,13	35,87

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

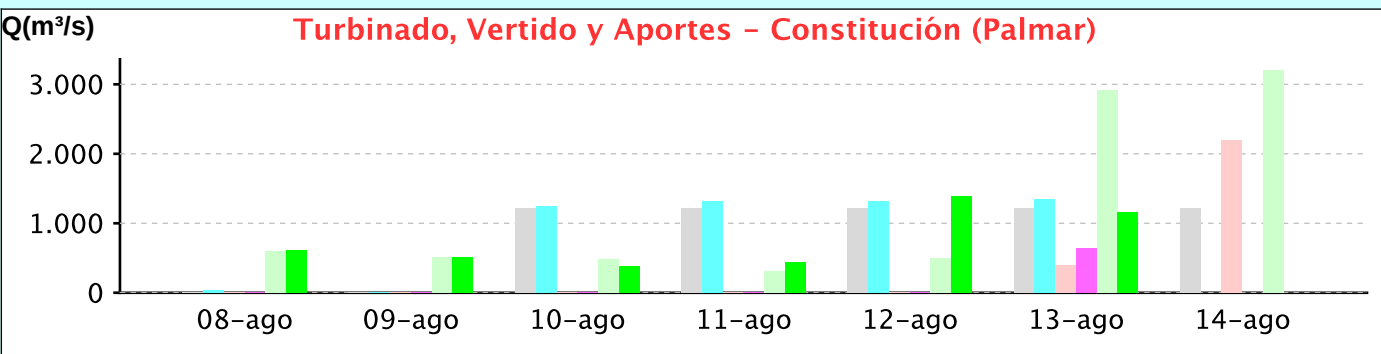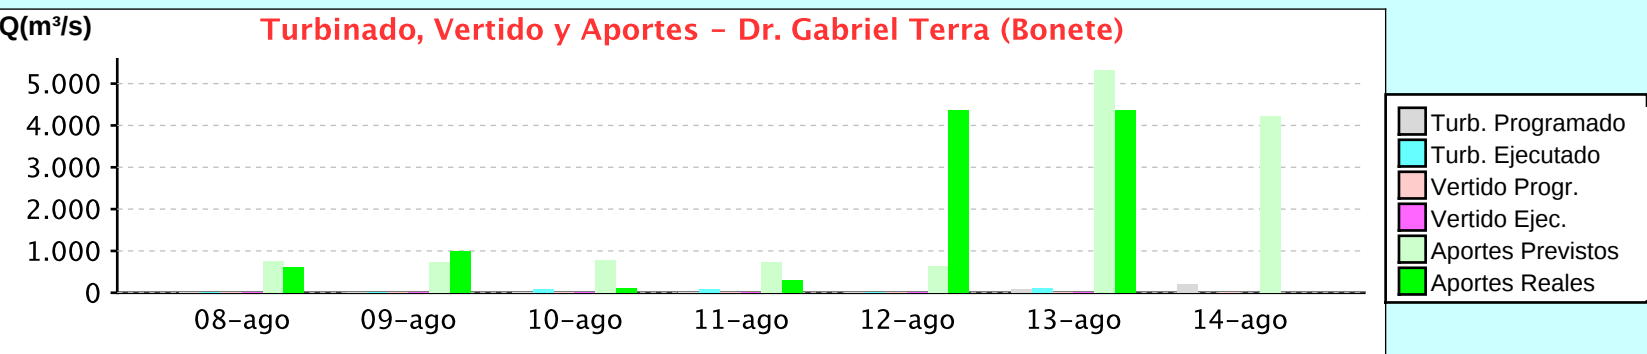

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

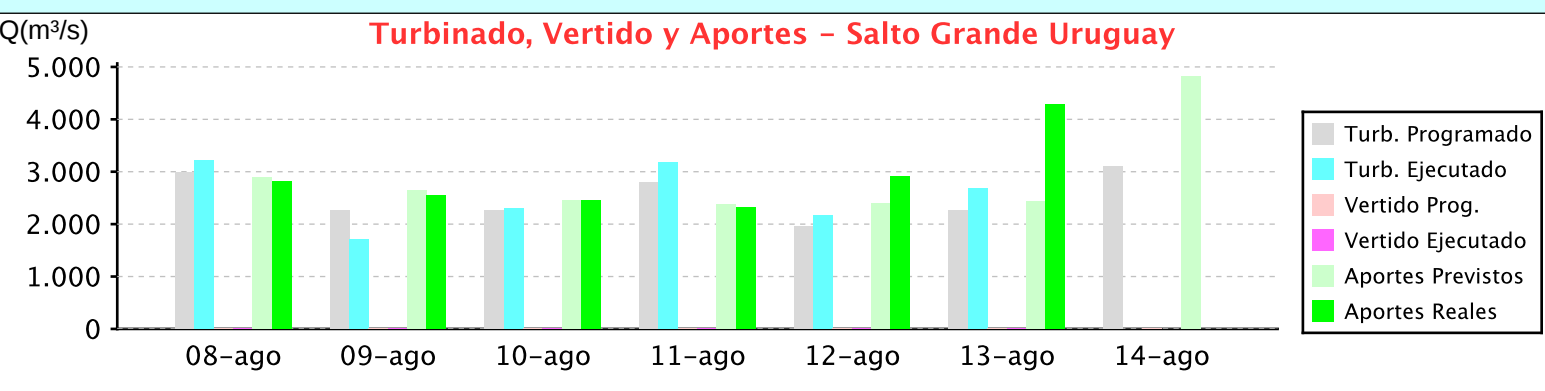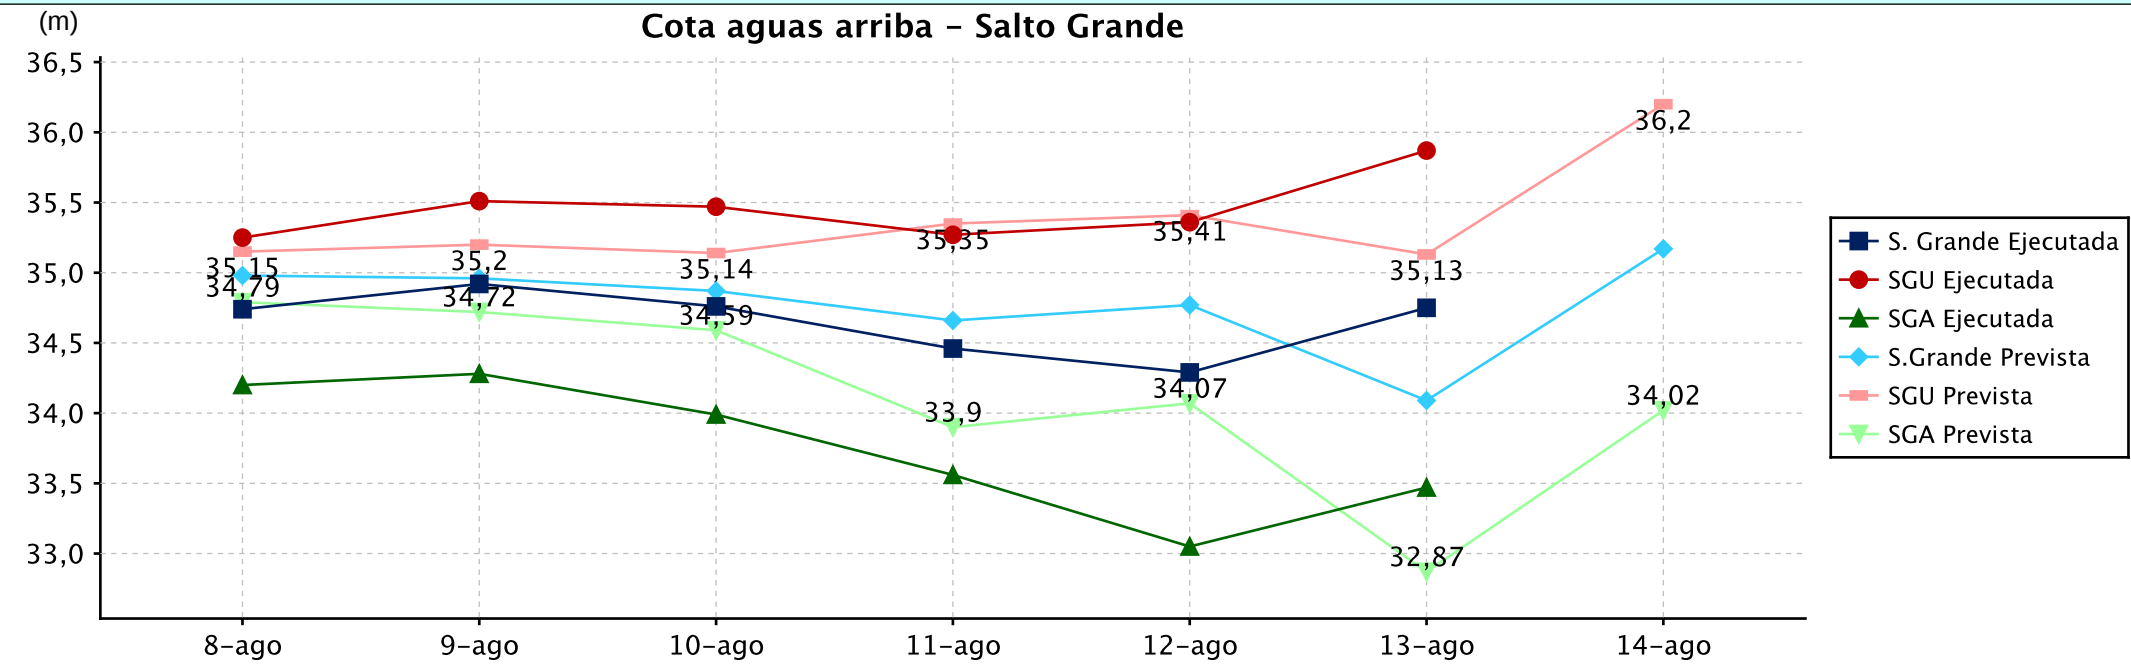

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,87
Cota Vista Arg	33,47
Cota real	34,75
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
53.913	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	80	113
Baygorria	317	745
Palmar	1.217	1.345
SGU	2.263	2.673

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	5.315	4.367
Baygorria	4.600	3.942
Palmar	2.919	1.161
SGU	2.425	4.294

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	4.000	3.302
Palmar	400	640
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
