




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

domingo 16 de agosto de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	0
Central La Tablada	-82
Central P. del Tigre	-8
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	0
C. Baygorria	818
C. Palmar	7.569
C. Salto Grande	20.748
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	6.388
TOTAL Generación	35.426

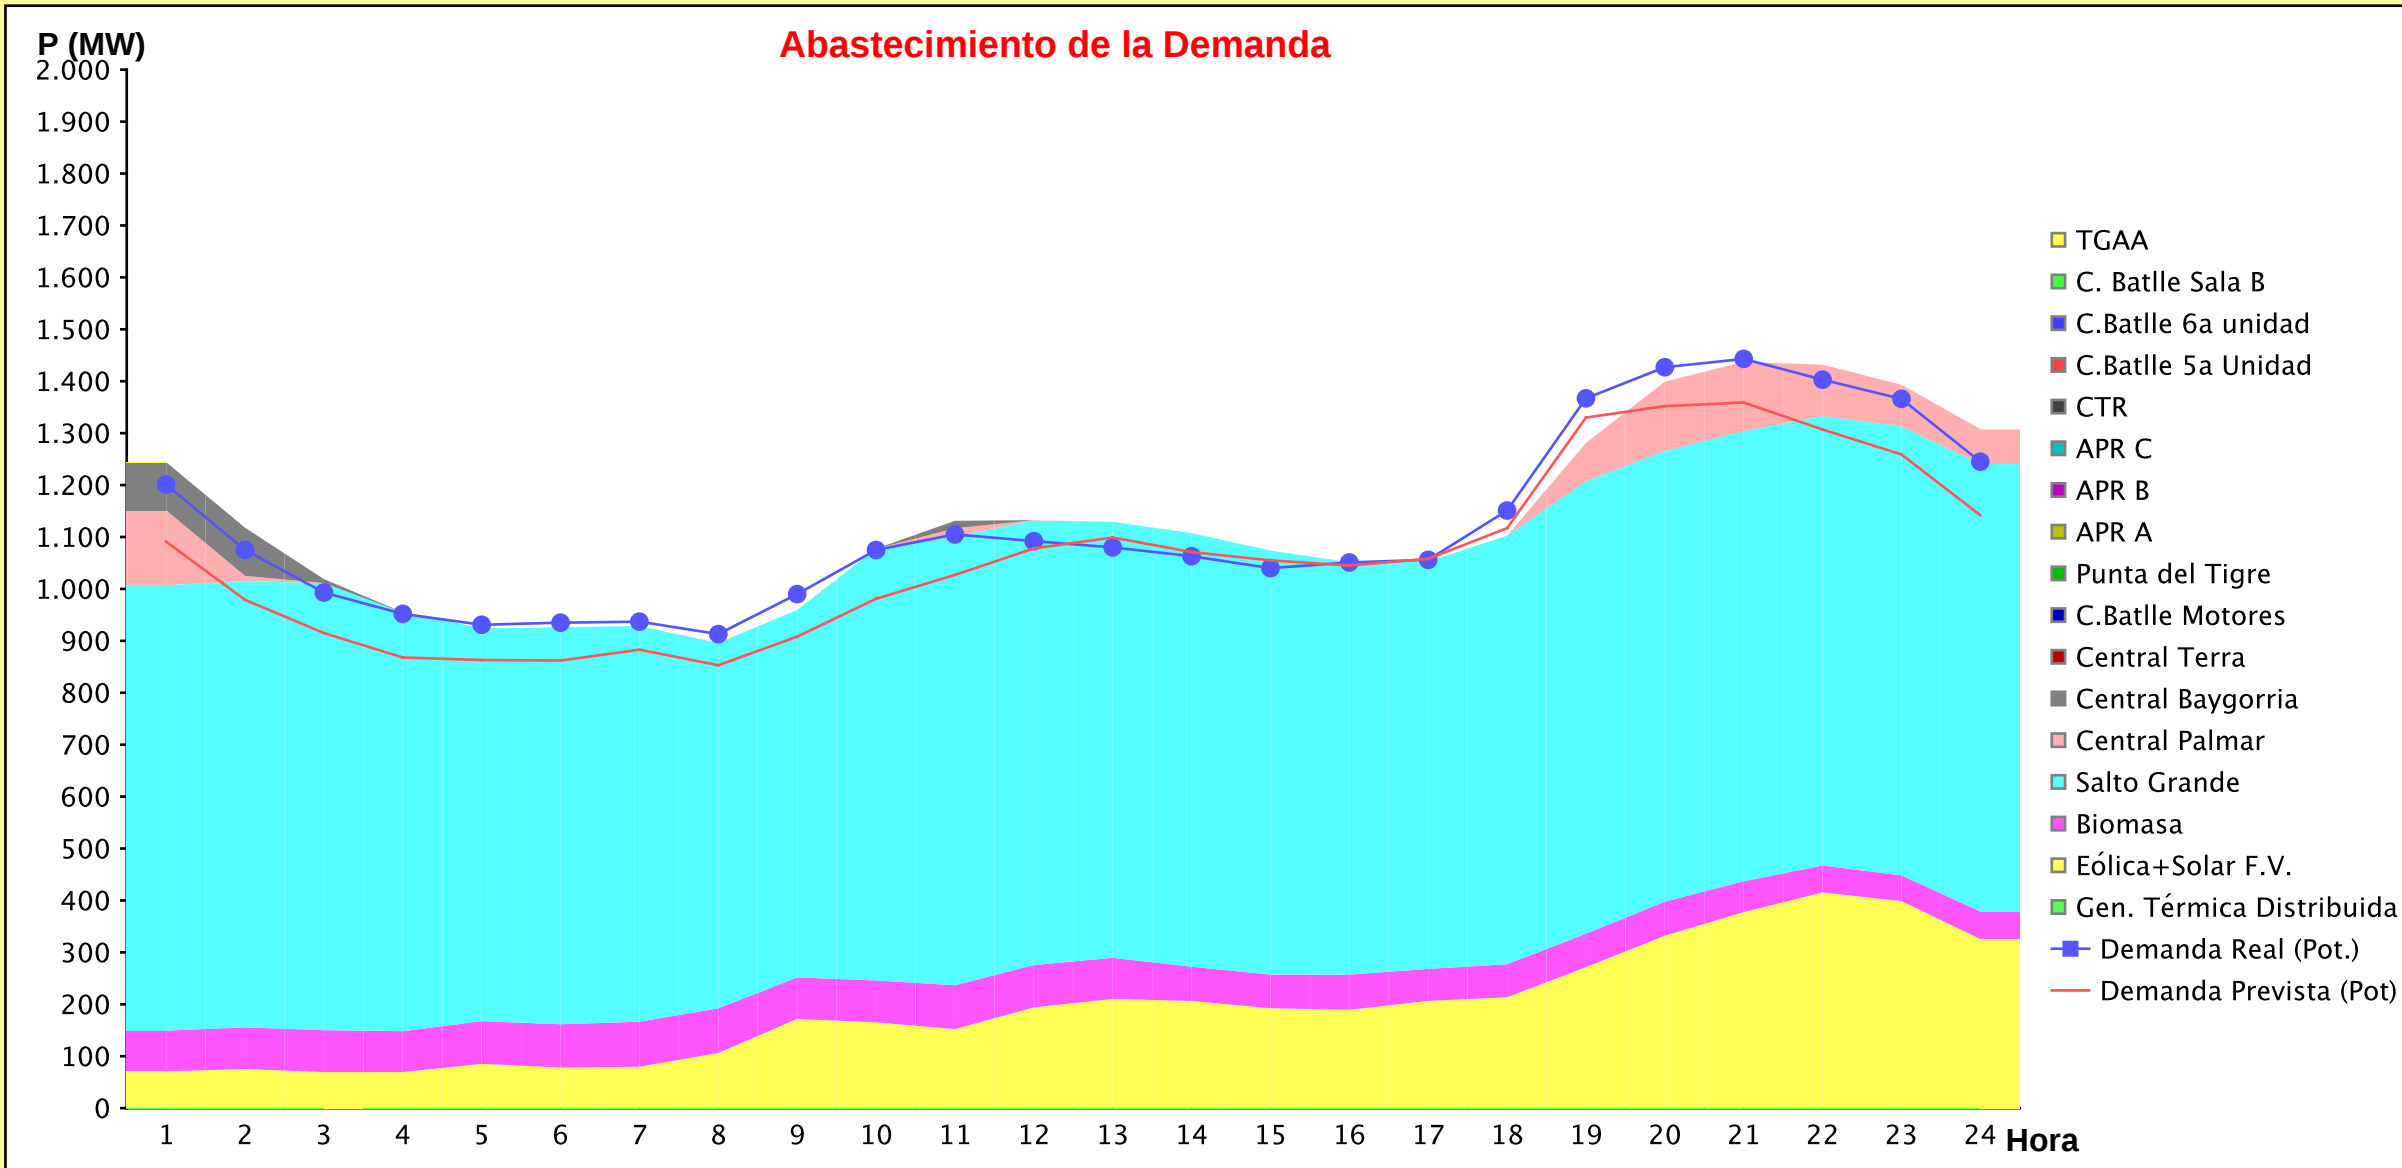

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	8.449
Hidráulica	8.449
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	8.449



DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	26.977
(en bormes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	25.502
Diferencia (MWh)	1.475
Ejecutada - Programada	5,78 %

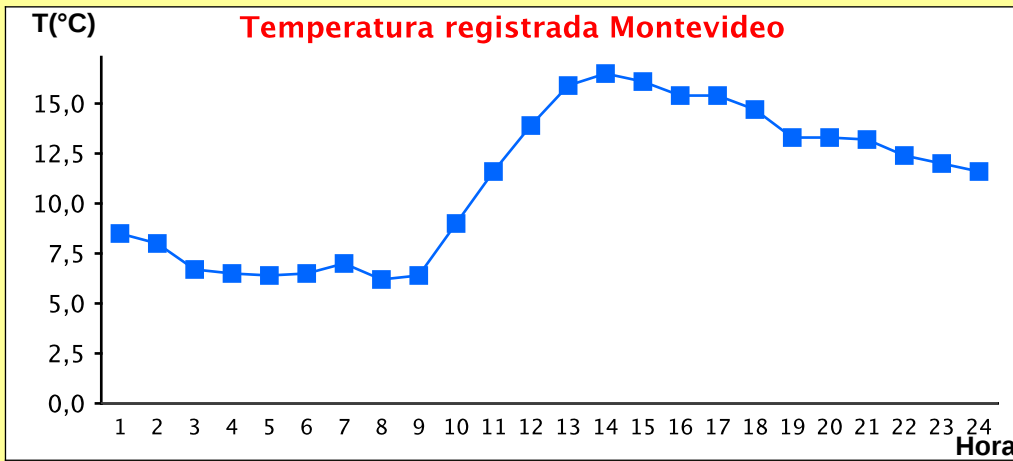


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1162 Hora 11:07
Potencia mínima:	895 Hora 07:33
Pico noche:	1473 Hora 21:08

Generación Media (MW)	
Eólica	182,3
Biomasa	73,5
Solar fotovoltaica	12,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

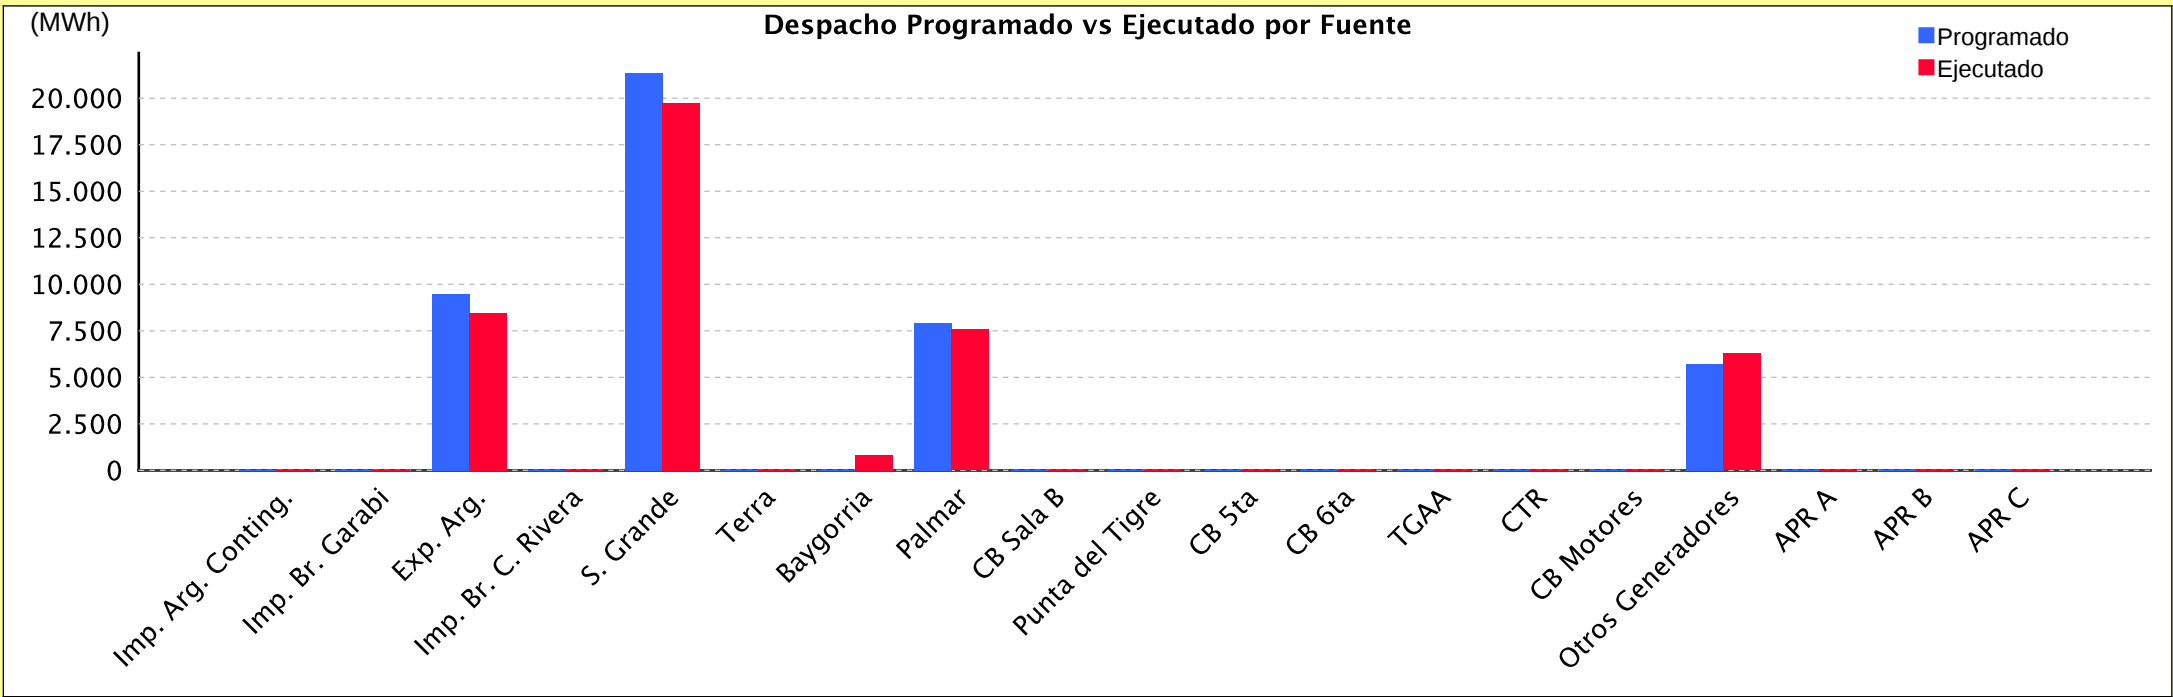
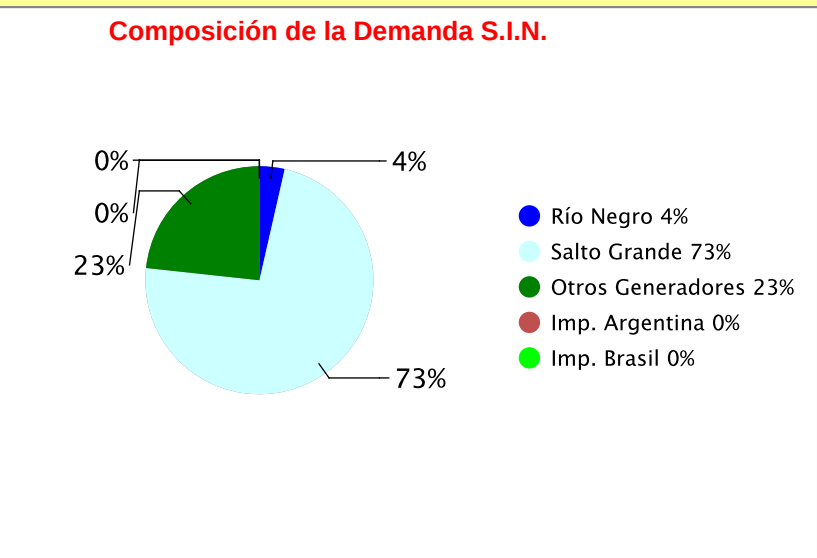


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

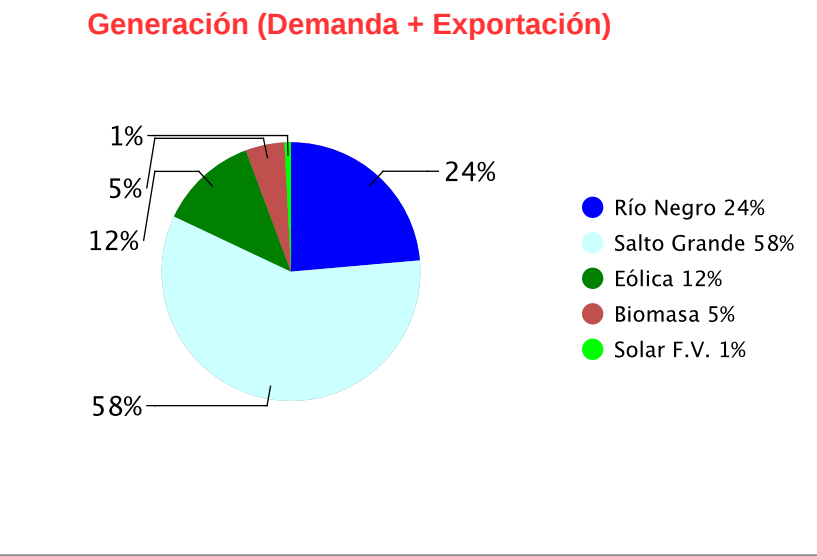



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

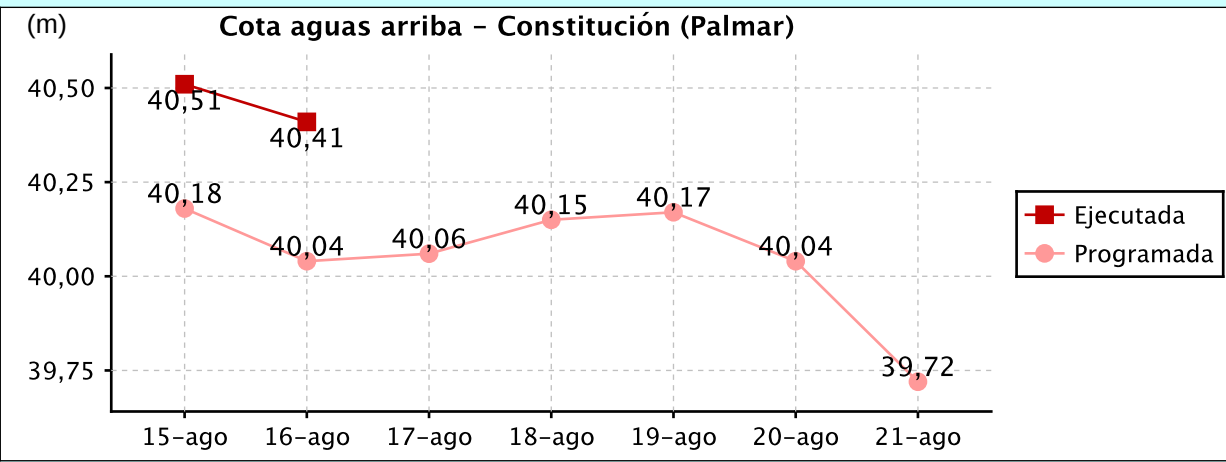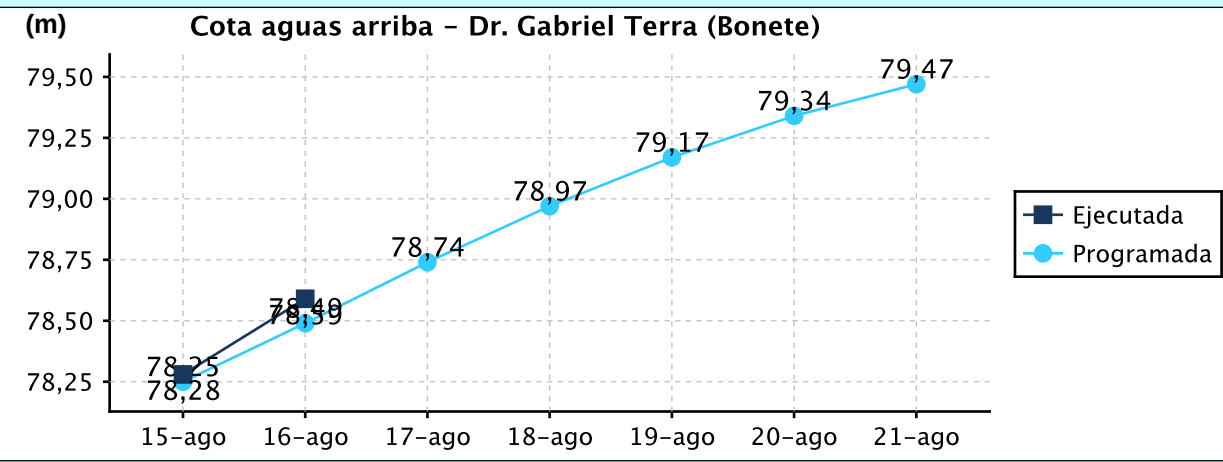


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	78,49	78,59
Baygorria	54,16	54,09
Palmar	40,04	40,41
SGU	36,23	36,24

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

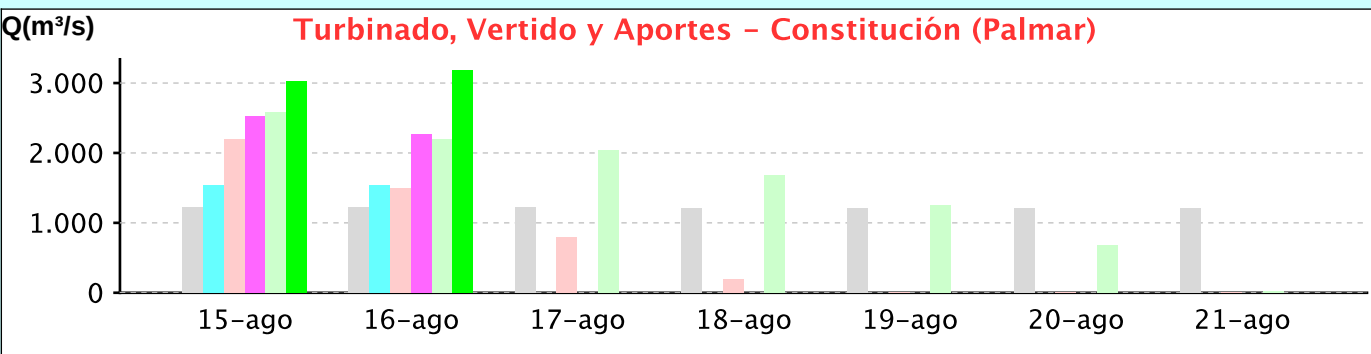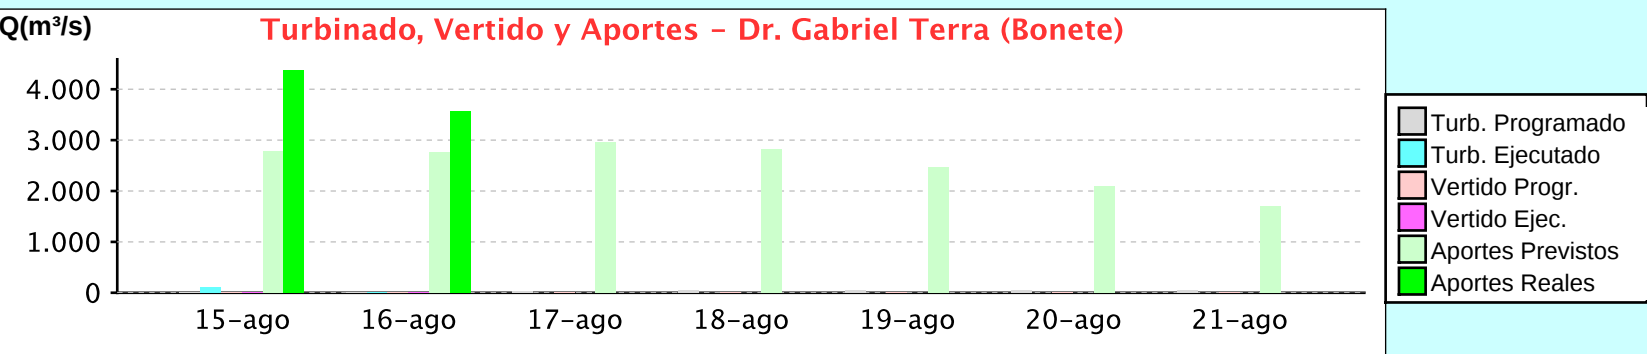

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

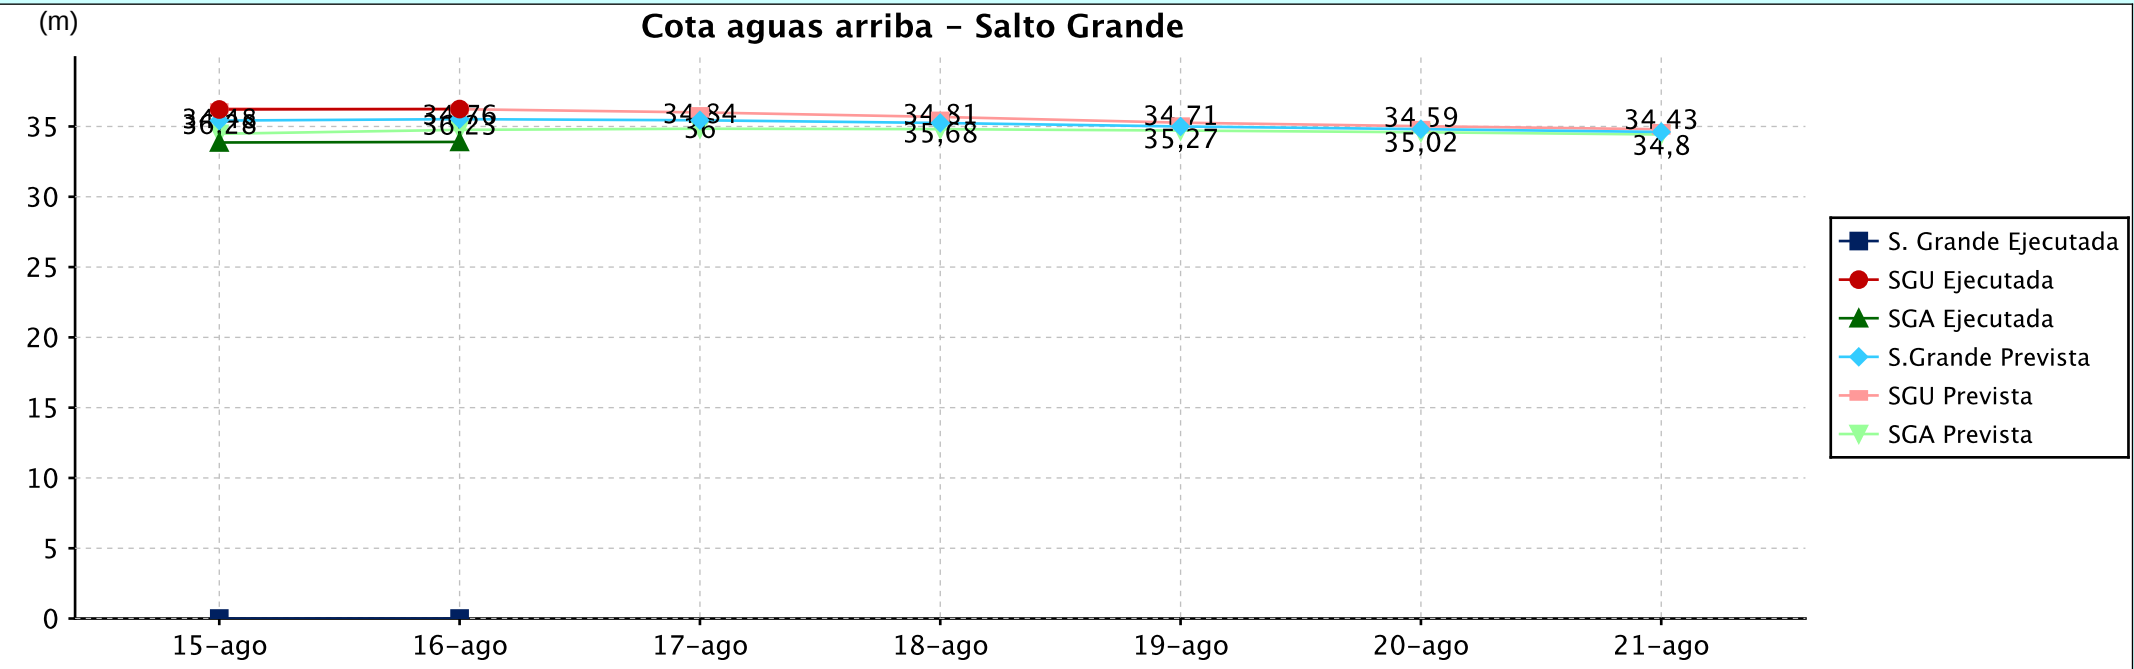


TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	315
Palmar	1.217	1.545
SGU	4.061	0

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	2.771	3.575
Baygorria	0	264
Palmar	2.201	3.181
SGU	3.800	0

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	1.500	2.266
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

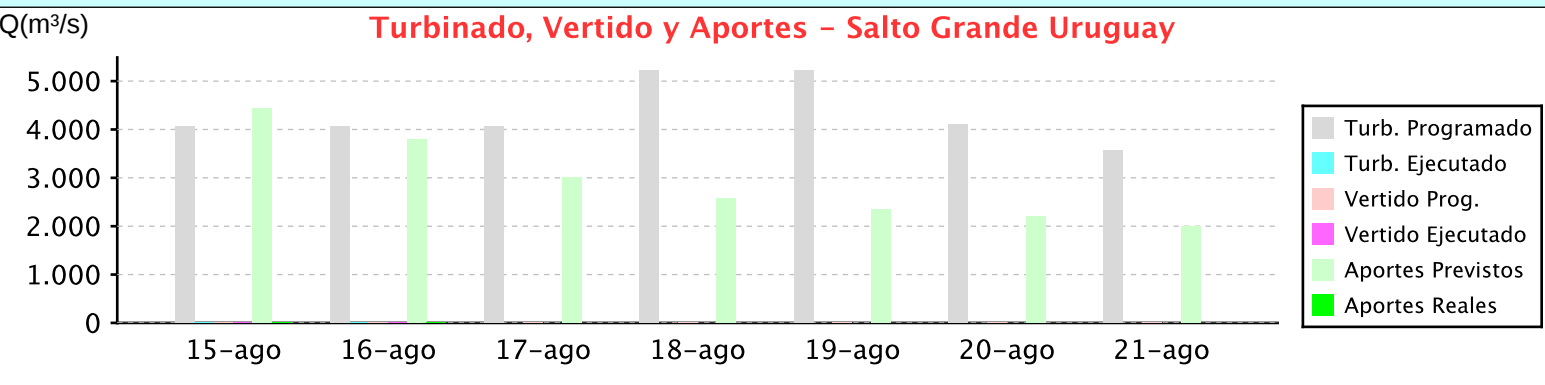

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	36,24
Cota Vista Arg	33,90
Cota real	0,00
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	55.149

OBSERVACIONES
