




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

lunes 17 de agosto de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	143
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	147
Central La Tablada	-77
Central P. del Tigre	-8
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	360
C. Baygorria	1.252
C. Palmar	7.831
C. Salto Grande	20.943
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	5.325
TOTAL Generación	35.764

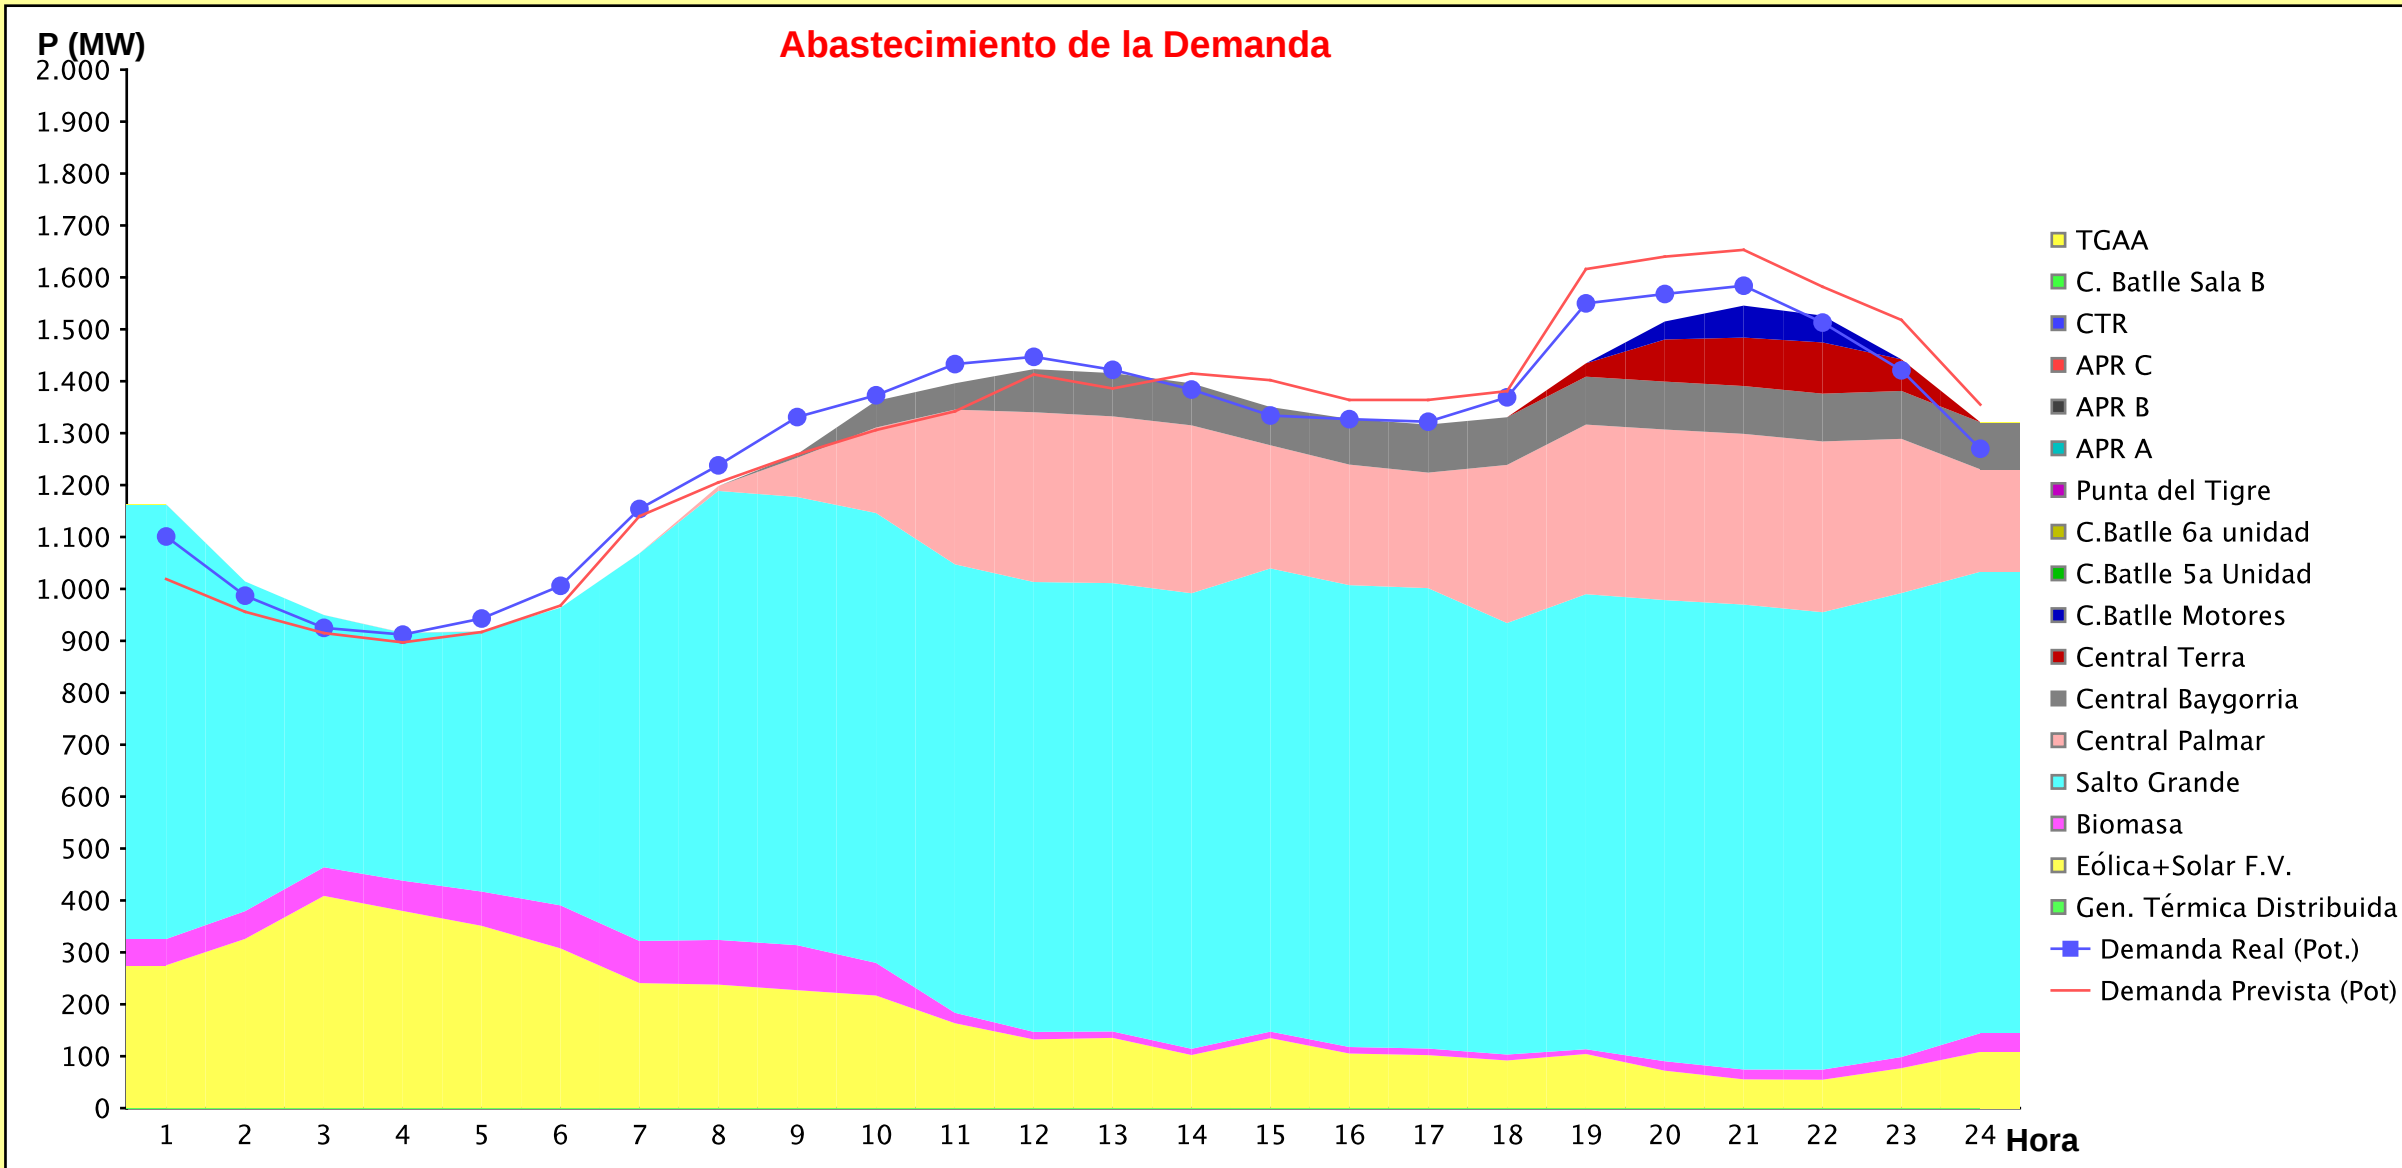

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	5.306
Hidráulica	5.306
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	5.306


DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	30.458
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	31.013
Diferencia (MWh)	-555
Ejecutada - Programada	-1,79 %

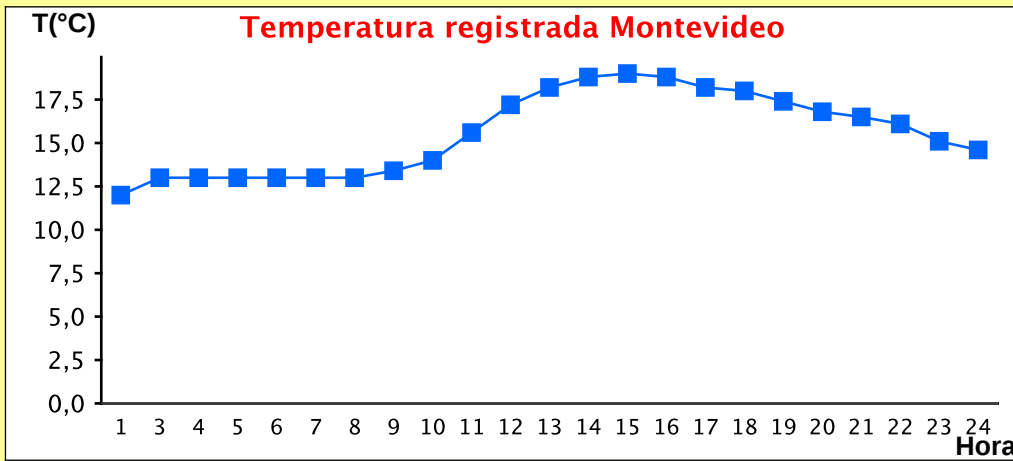


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1451 Hora 11:47
Potencia mínima:	915 Hora 03:46
Pico noche:	1586 Hora 20:56

Generación Media (MW)	
Eólica	184,2
Biomasa	39,9
Solar fotovoltaica	0,5
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0


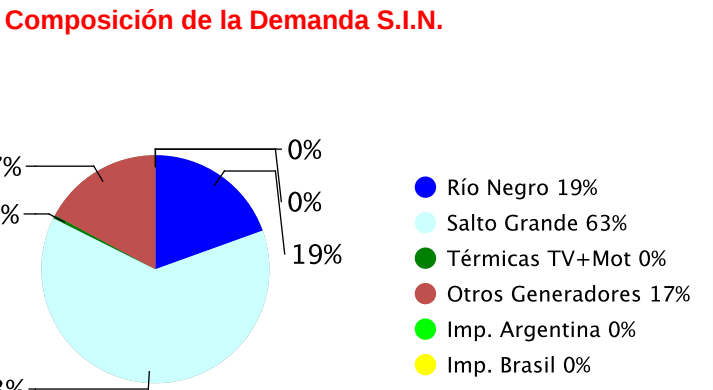


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

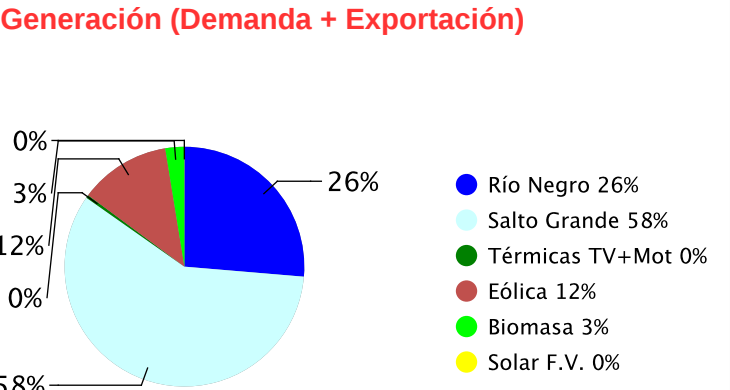



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

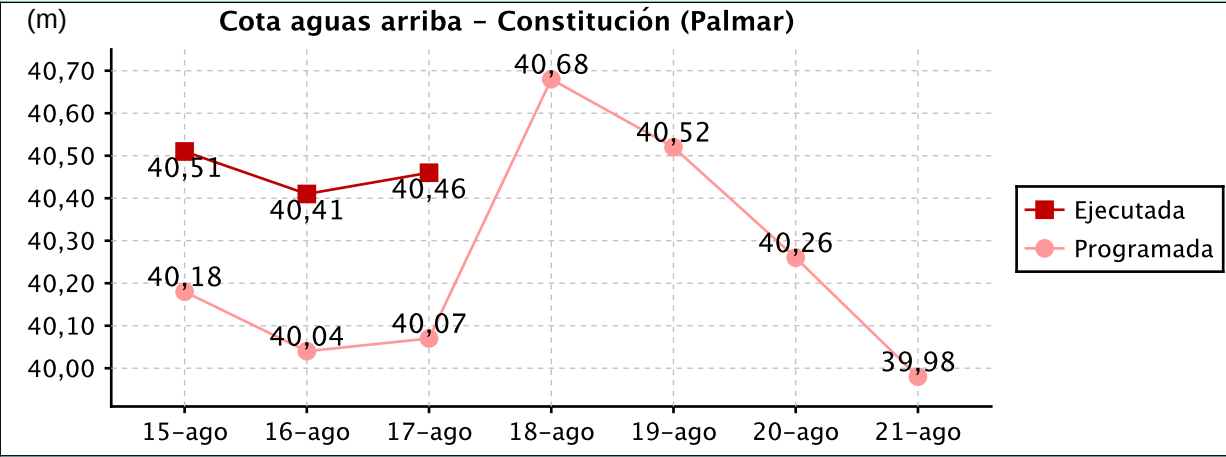
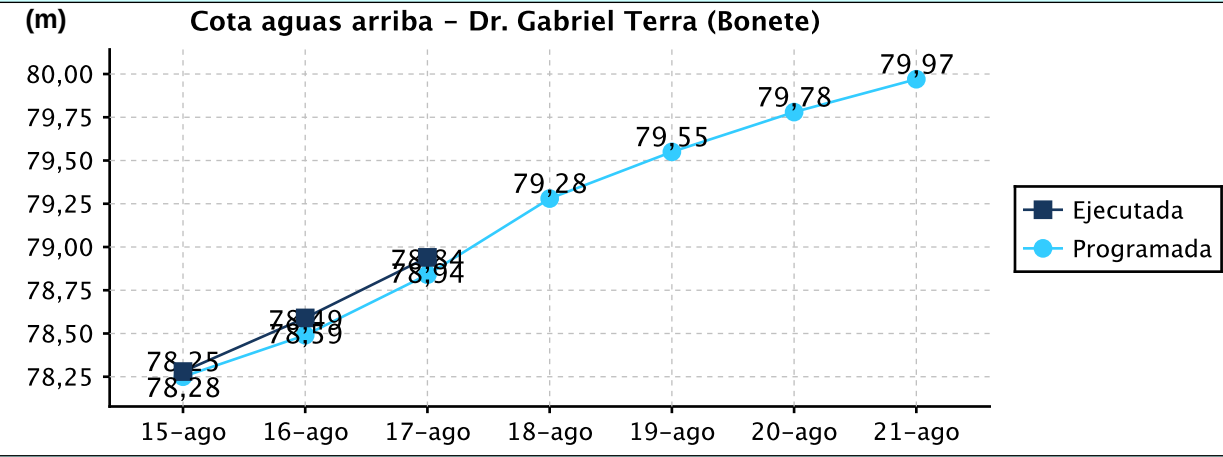


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	78,84	78,94
Baygorria	54,13	54,2
Palmar	40,07	40,46
SGU	36,21	36,53

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

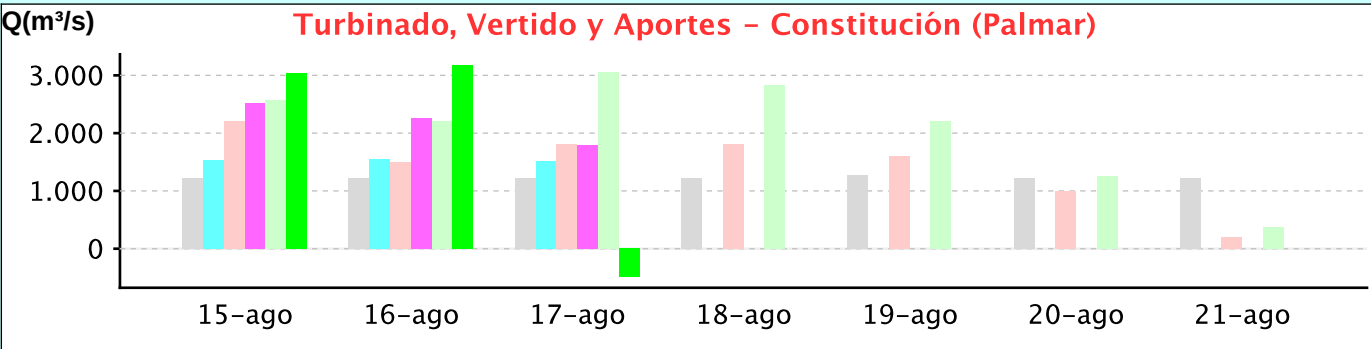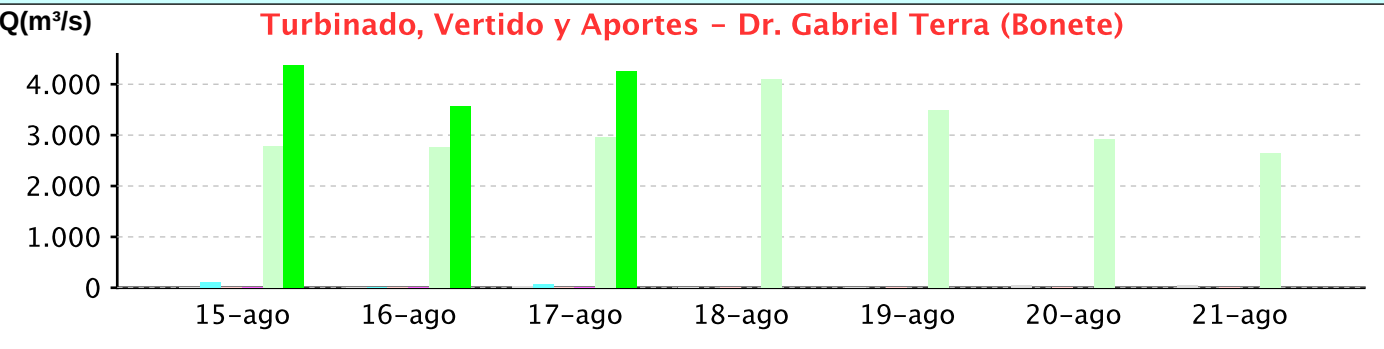

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

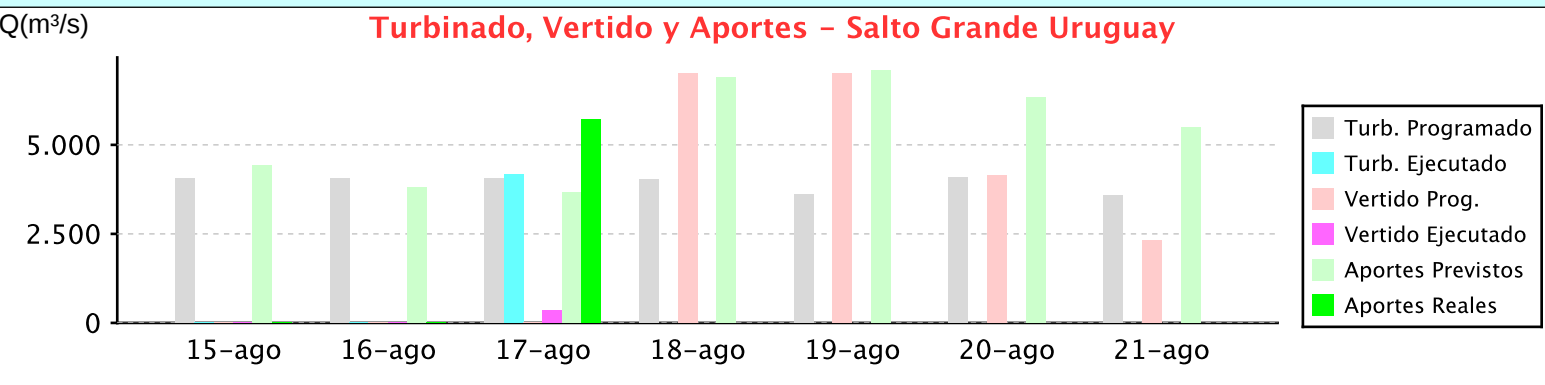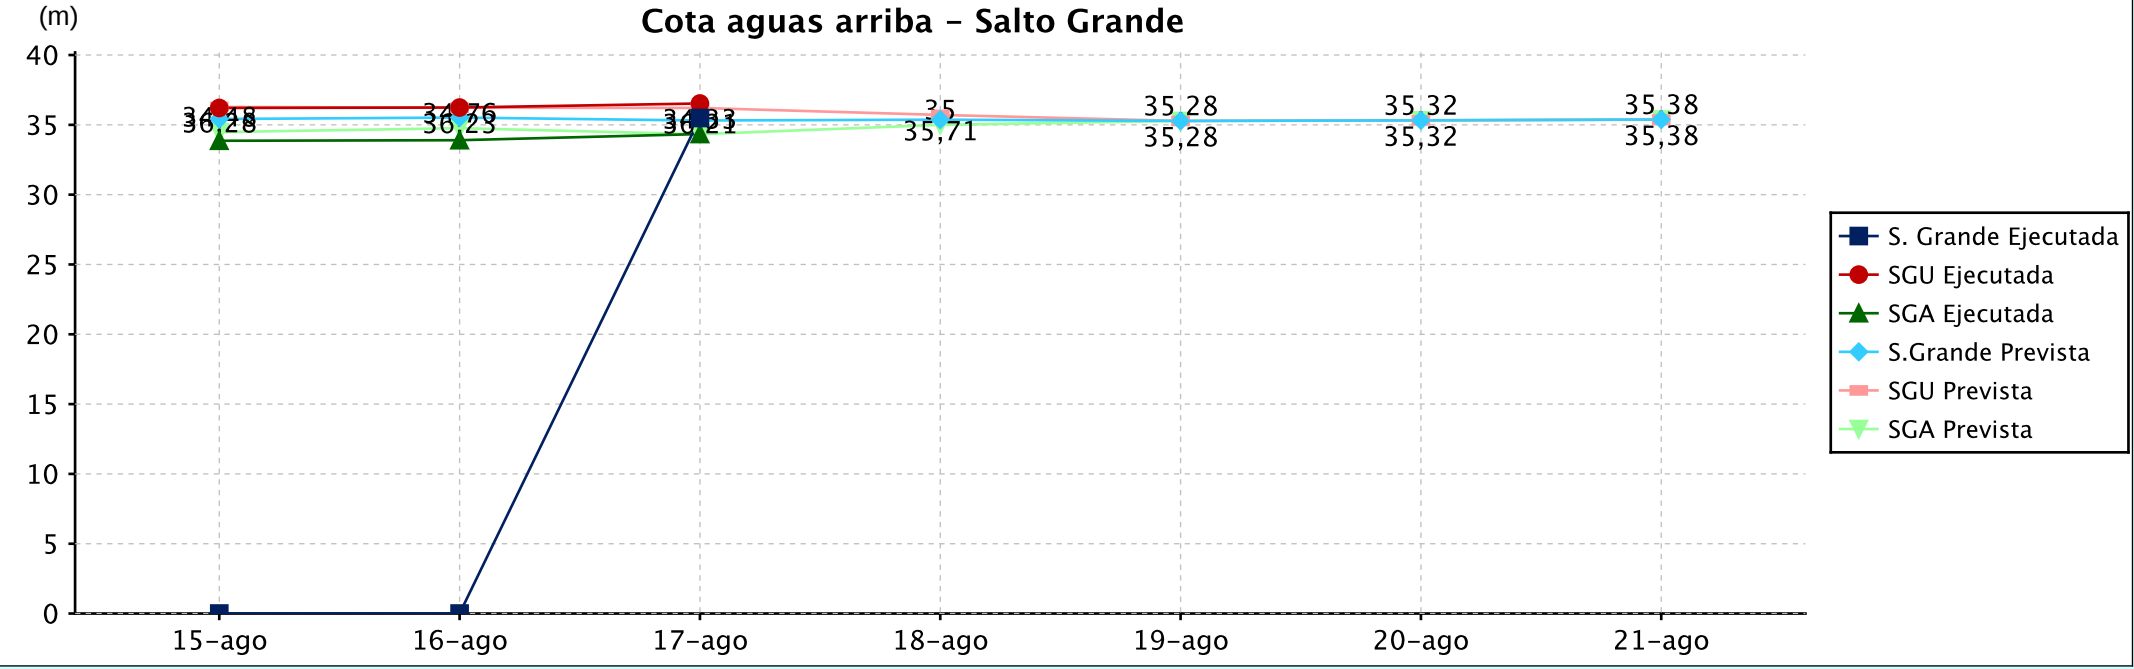

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	36,53
Cota Vista Arg	34,34
Cota real	35,49
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
53.463	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	38	73
Baygorria	169	472
Palmar	1.217	1.518
SGU	4.061	4.178

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	2.958	4.250
Baygorria	200	566
Palmar	3.056	-492
SGU	3.675	5.728

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	20
Palmar	1.800	1.786
SGU	0	347

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
