




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

viernes 21 de agosto de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	0
Central La Tablada	-78
Central P. del Tigre	-3
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	0
C. Baygorria	-7
C. Palmar	7.913
C. Salto Grande	20.739
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	8.095
TOTAL Generación	36.652

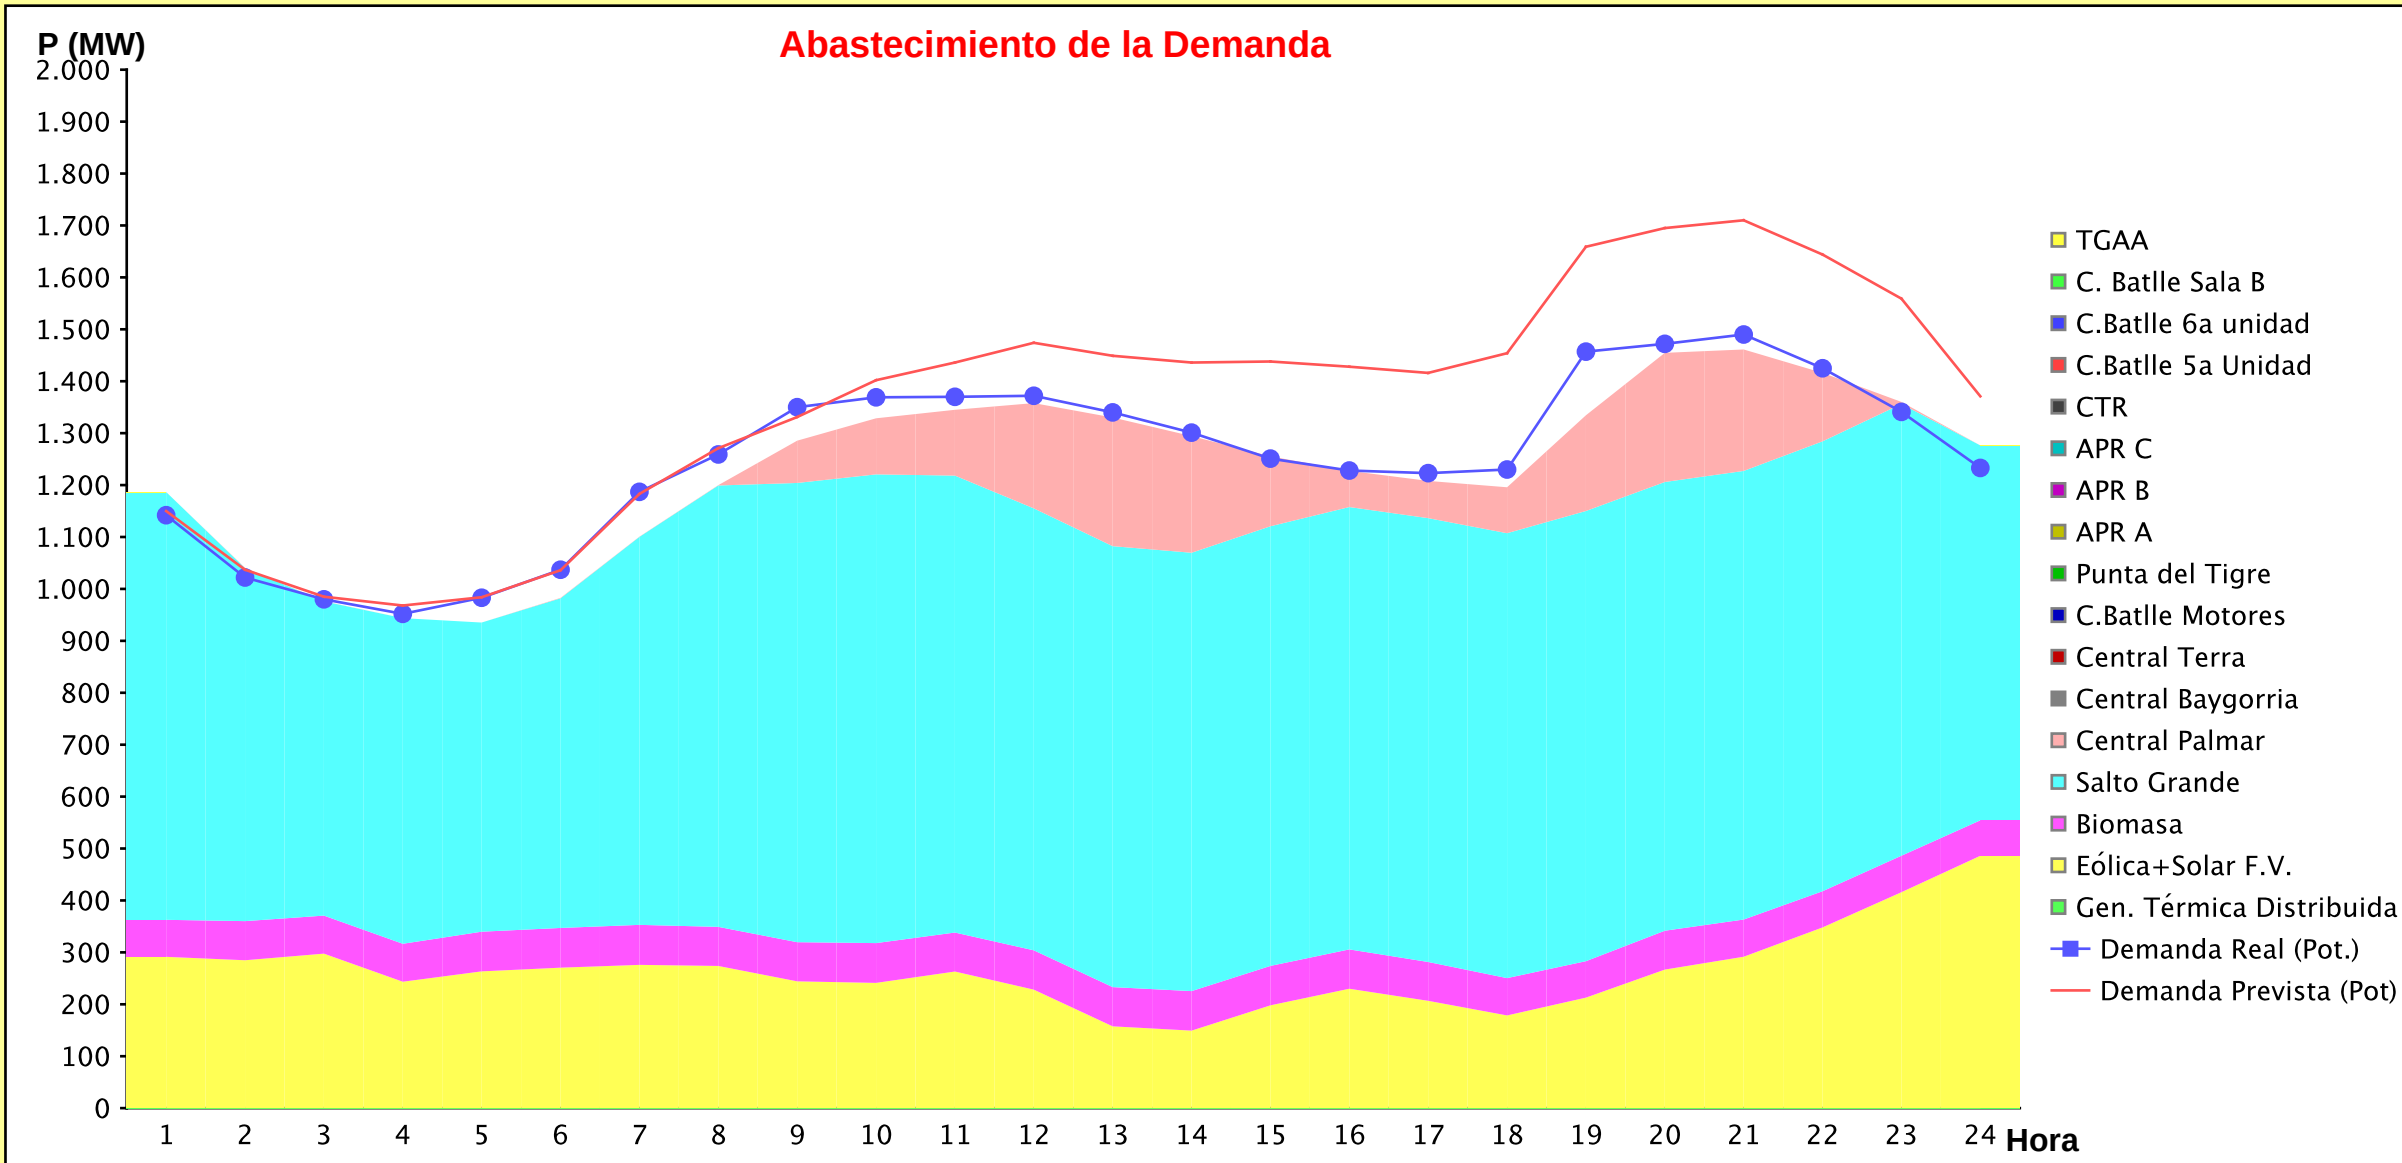

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	7.251
Hidráulica	7.251
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	7.251


DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	29.401
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	32.516
Diferencia (MWh)	-3.115
Ejecutada - Programada	-9,58 %


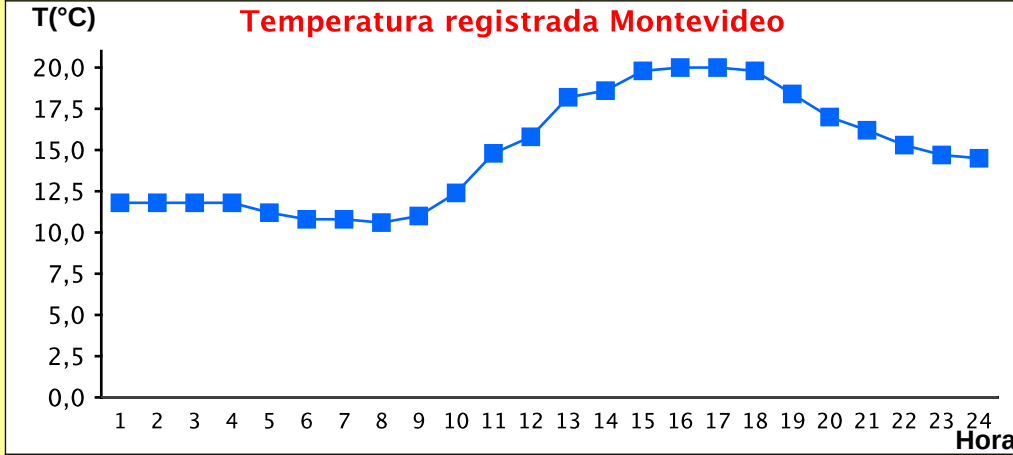


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1392 Hora 11:44
Potencia mínima:	956 Hora 04:02
Pico noche:	1505 Hora 20:47

Generación Media (MW)	
Eólica	262,7
Biomasa	88,8
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0


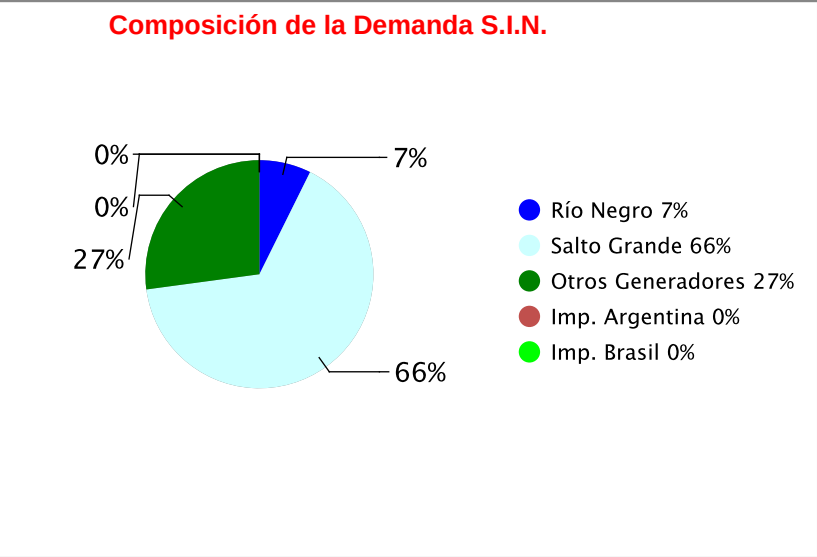


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

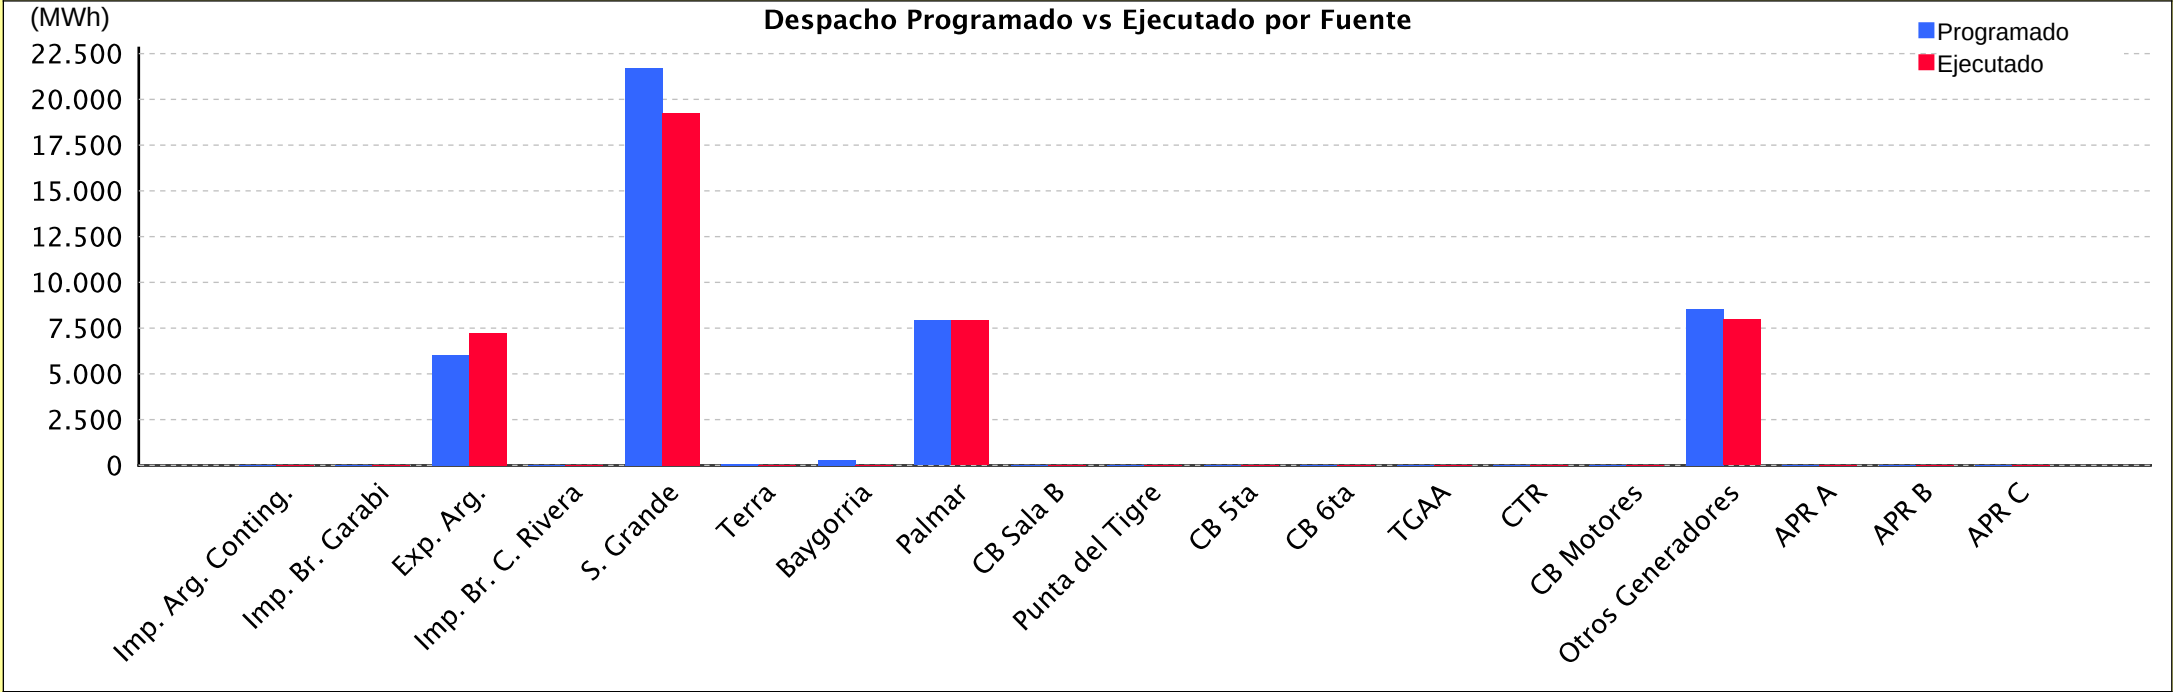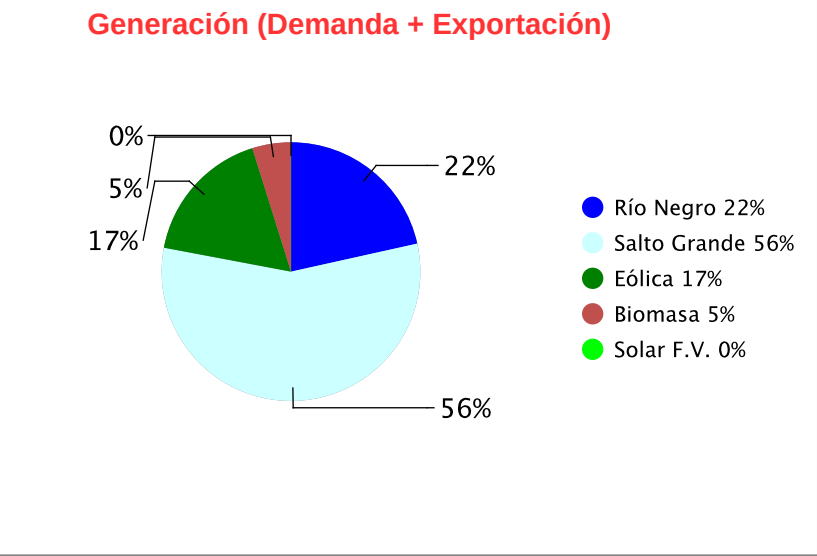



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

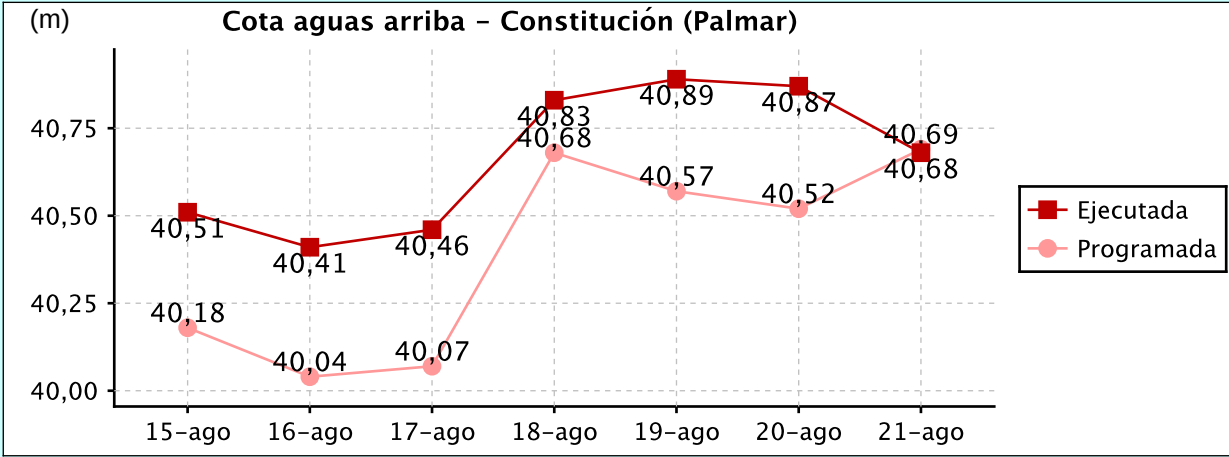
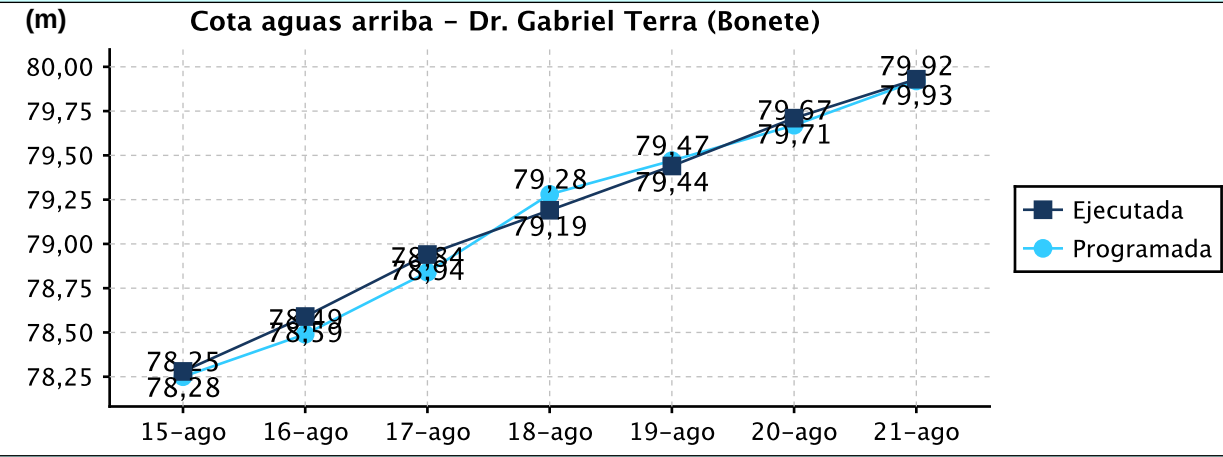


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	79,92	79,93
Baygorria	53,93	54,04
Palmar	40,69	40,68
SGU	35,33	35,45

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

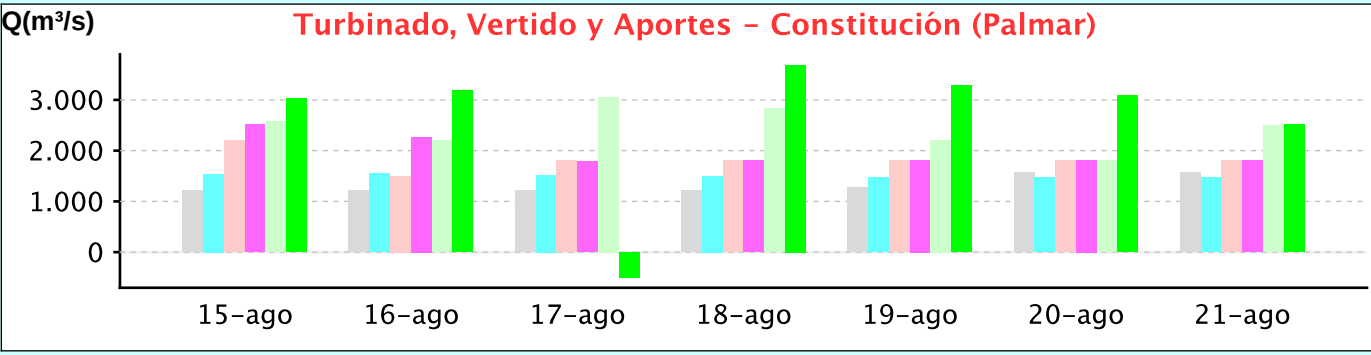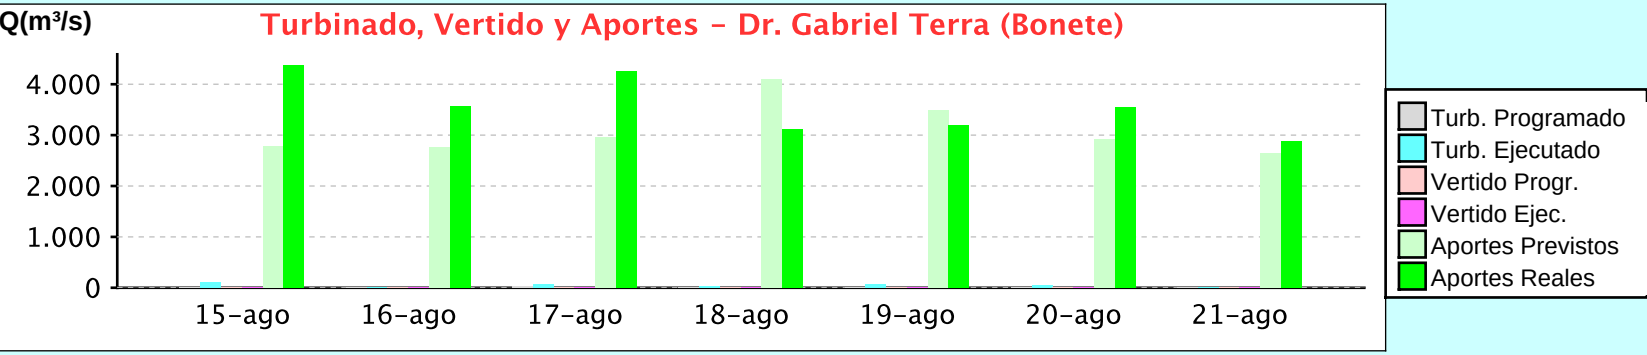

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

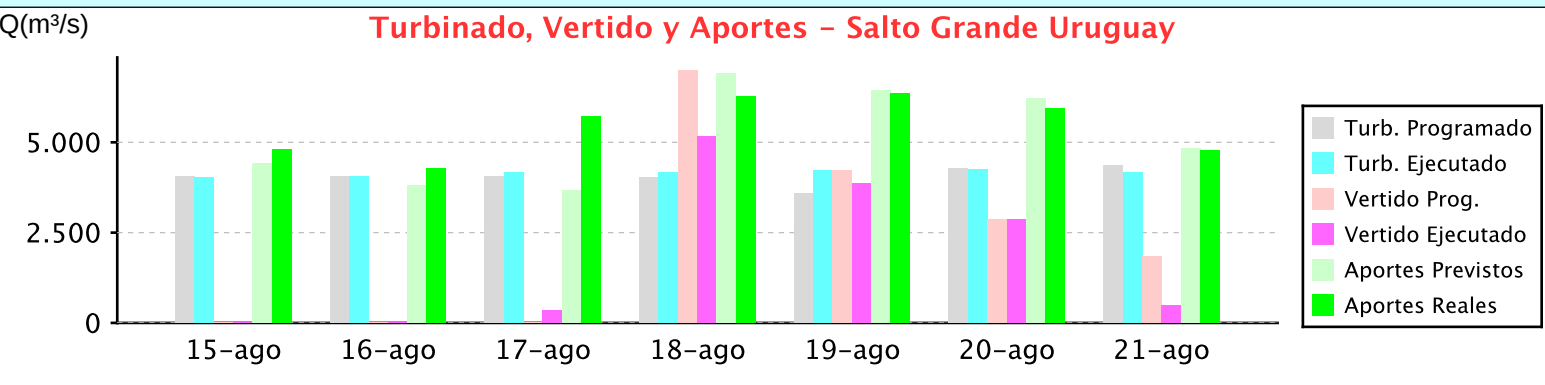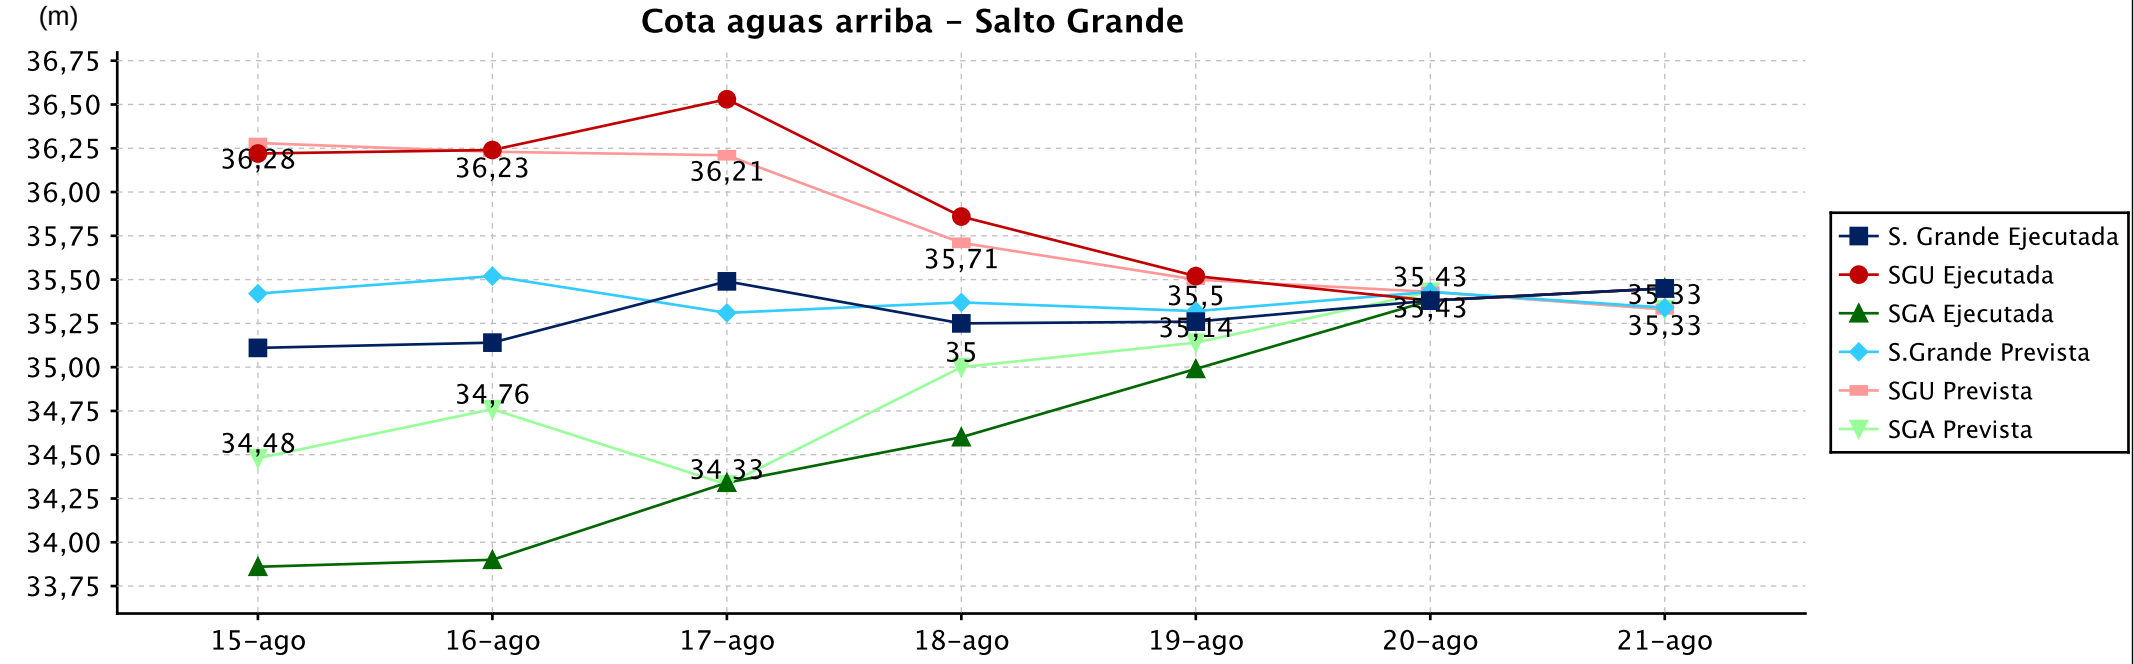

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,45
Cota Vista Arg	35,45
Cota real	35,45
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
0	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	14	0
Baygorria	110	0
Palmar	1.569	1.470
SGU	4.351	4.161

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	2.649	2.884
Baygorria	0	-4
Palmar	2.500	2.514
SGU	4.825	4.765

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	1.800	1.811
SGU	1.830	482

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
