




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

sábado 22 de agosto de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	0
Central La Tablada	-79
Central P. del Tigre	-3
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	0
C. Baygorria	-6
C. Palmar	7.878
C. Salto Grande	21.067
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	11.211
TOTAL Generación	40.061

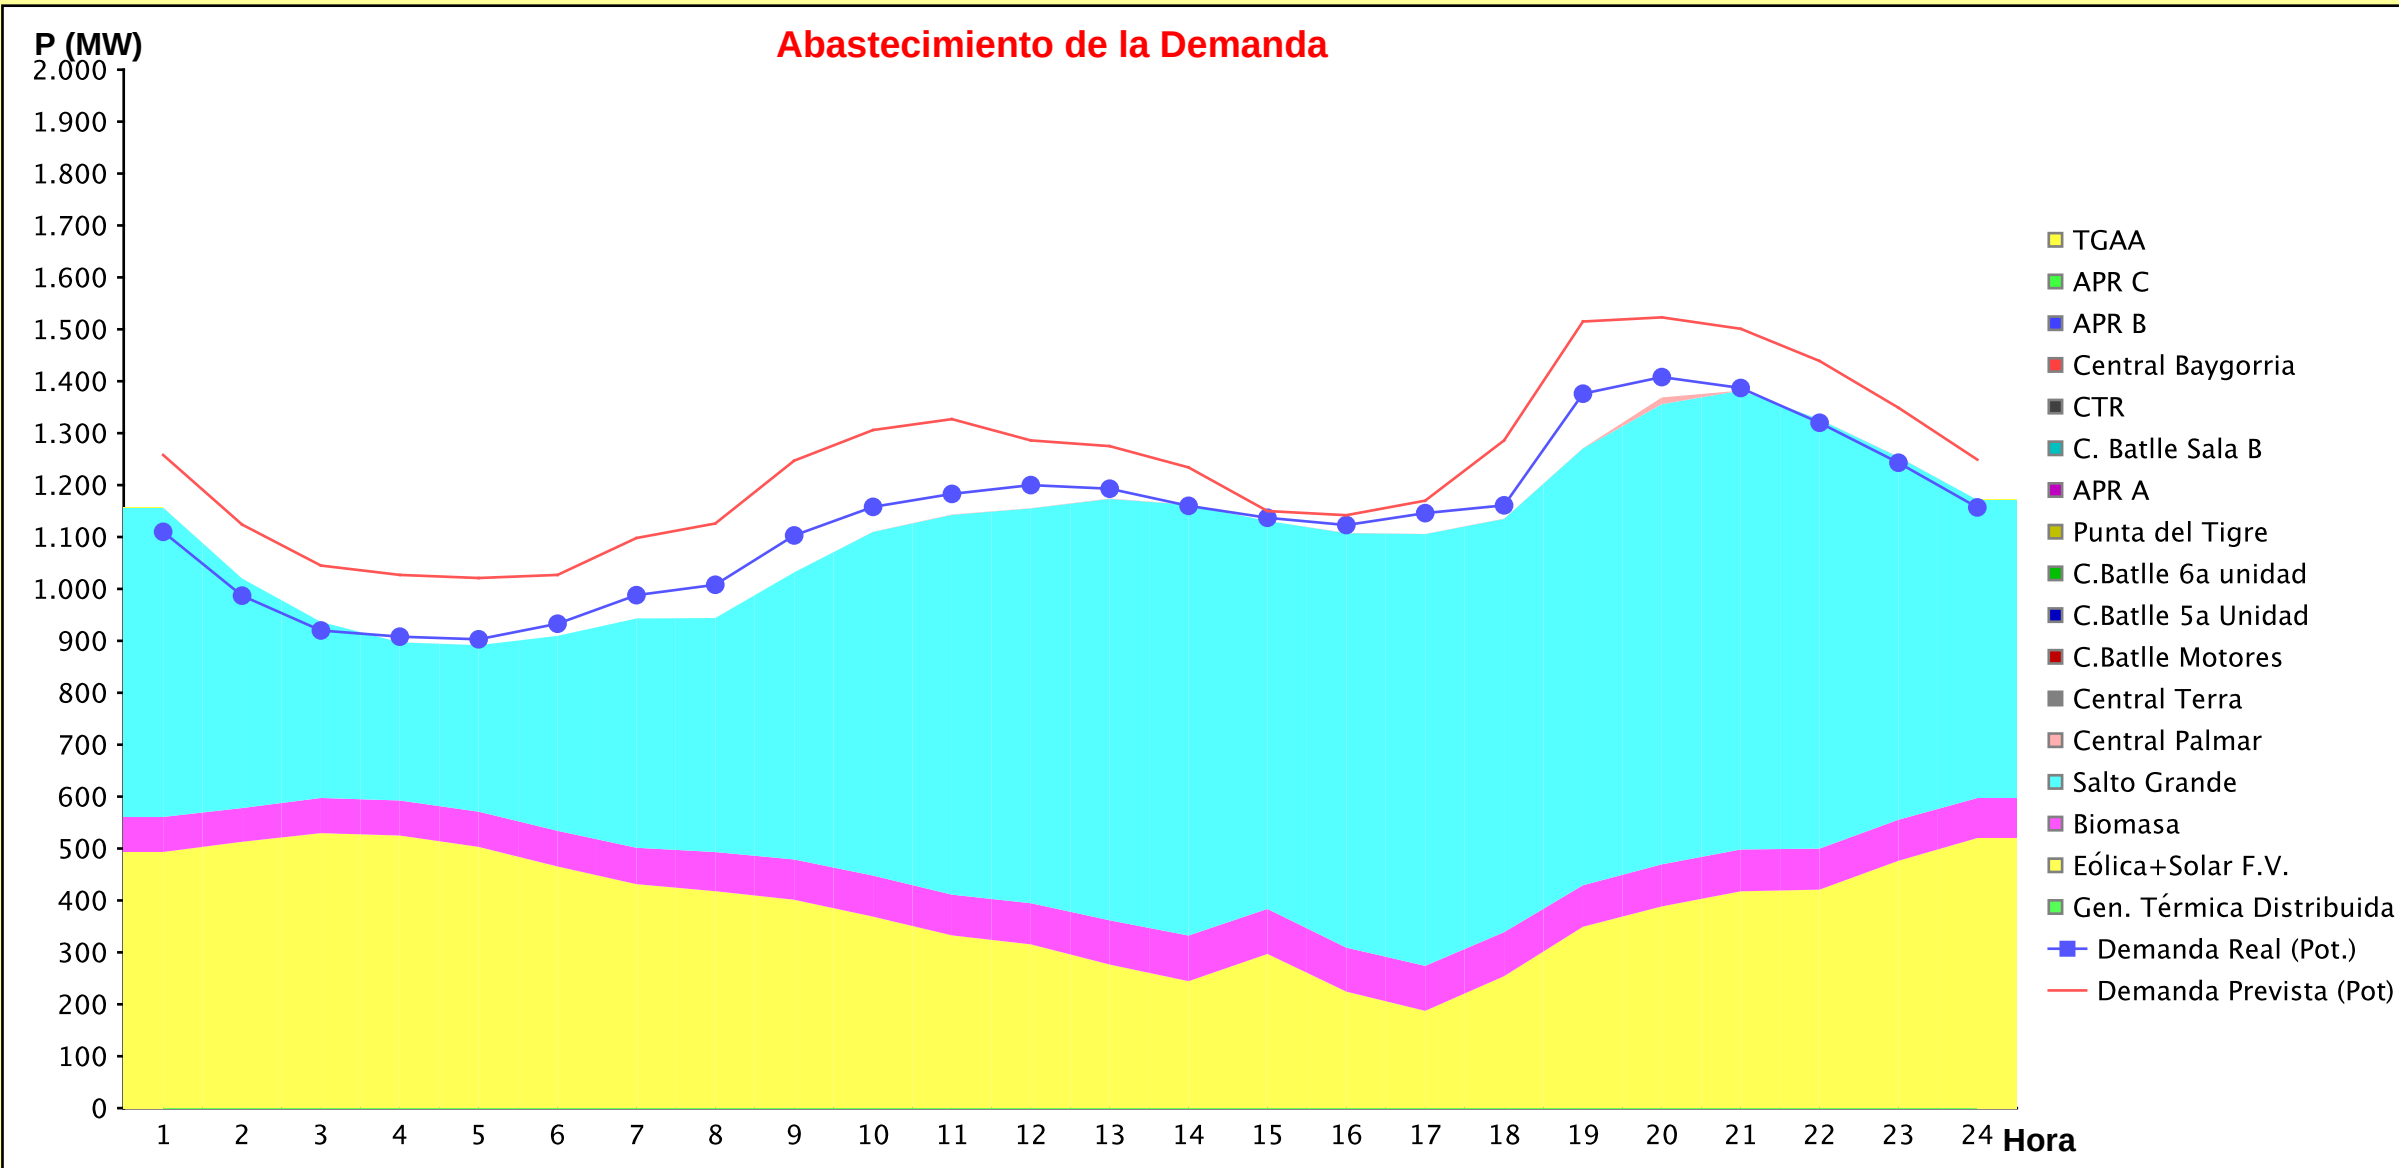

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	13.425
Hidráulica	13.425
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	13.425




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	26.636
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	29.725
Diferencia (MWh)	-3.089
Ejecutada - Programada	-10,39 %

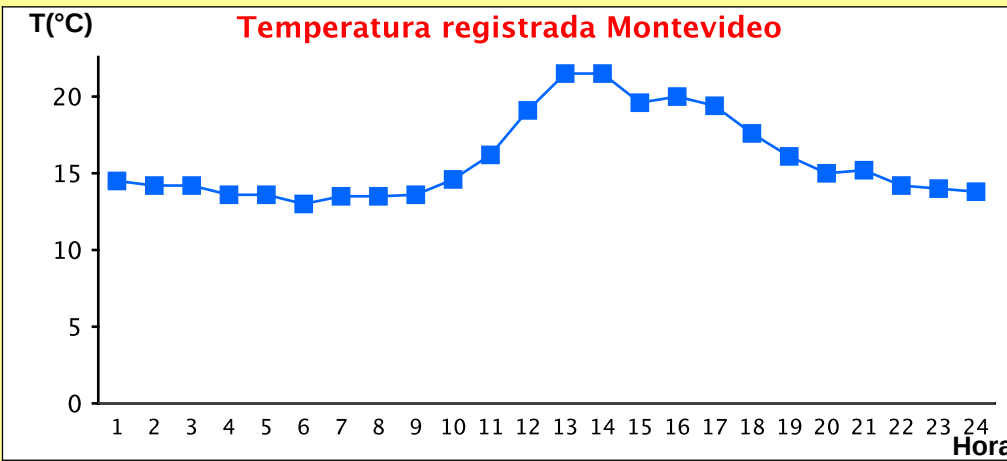



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1213 Hora 12:48
Potencia mínima:	932 Hora 04:30
Pico noche:	1441 Hora 19:34

Generación Media (MW)	
Eólica	388,4
Biomasa	91,2
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

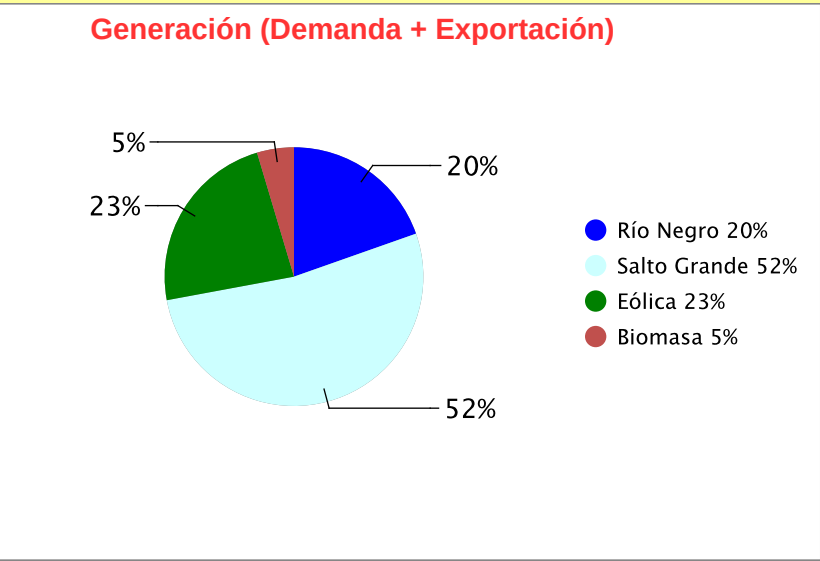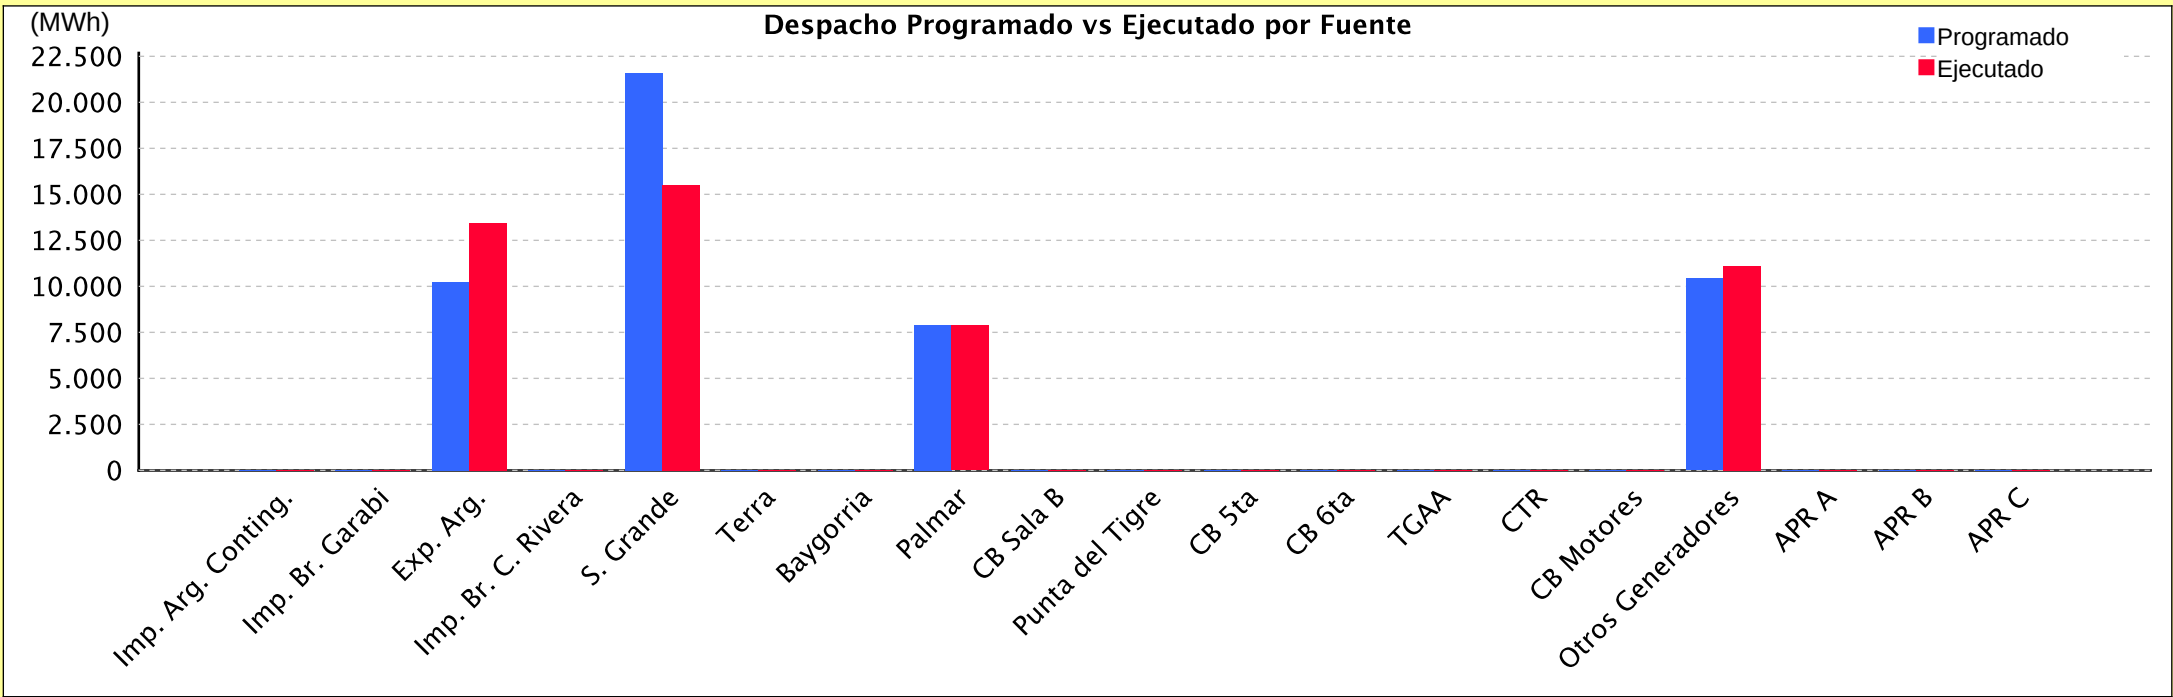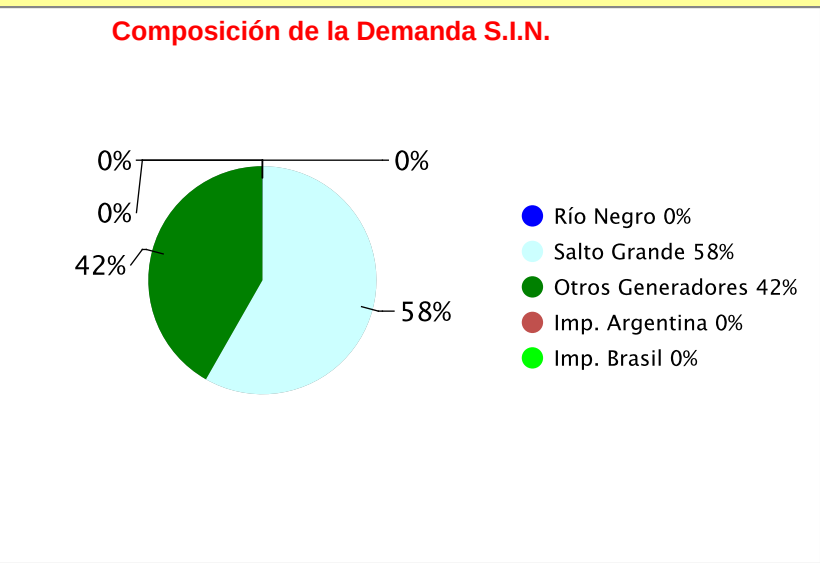



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

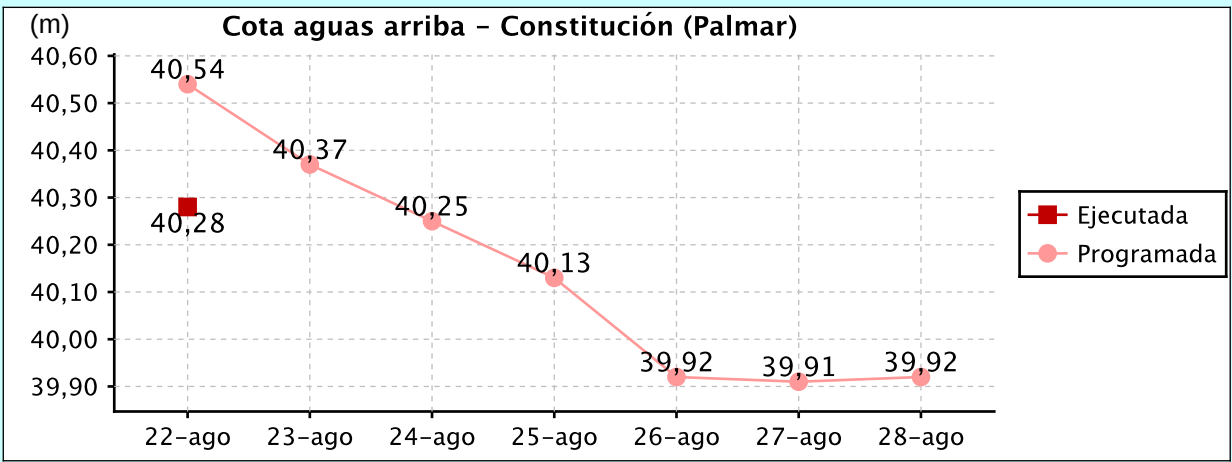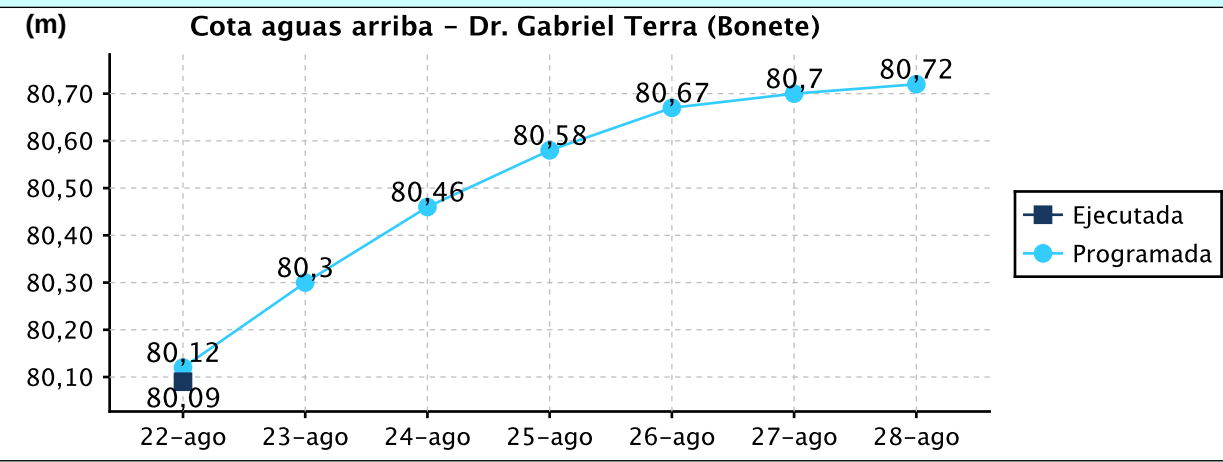


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,12	80,09
Baygorria	53,96	54,06
Palmar	40,54	40,28
SGU	35,41	35,39

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

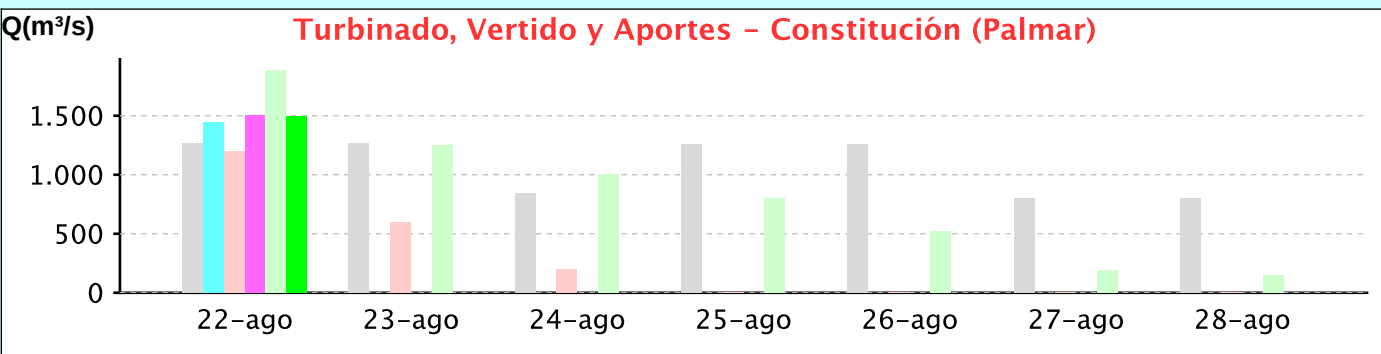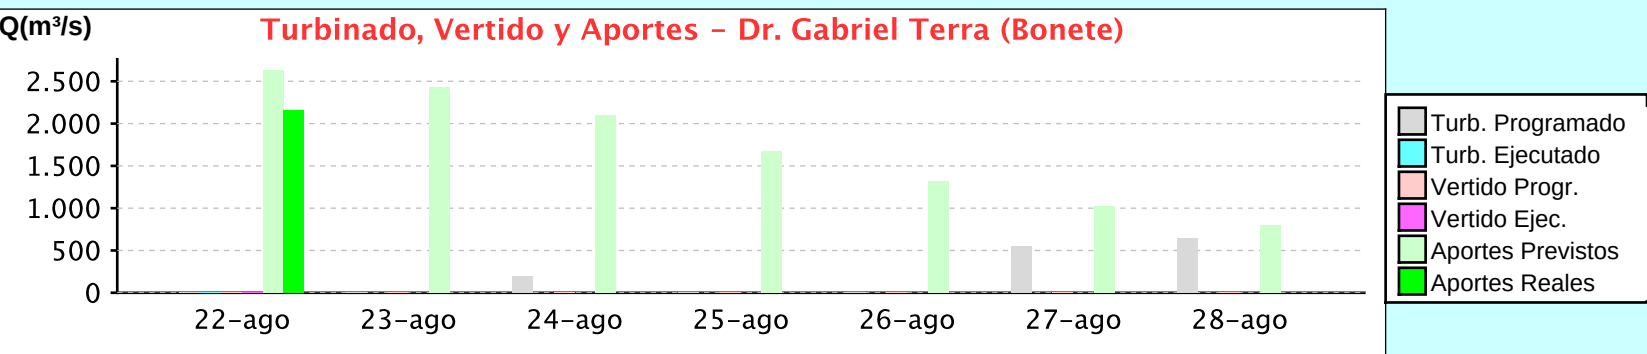

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

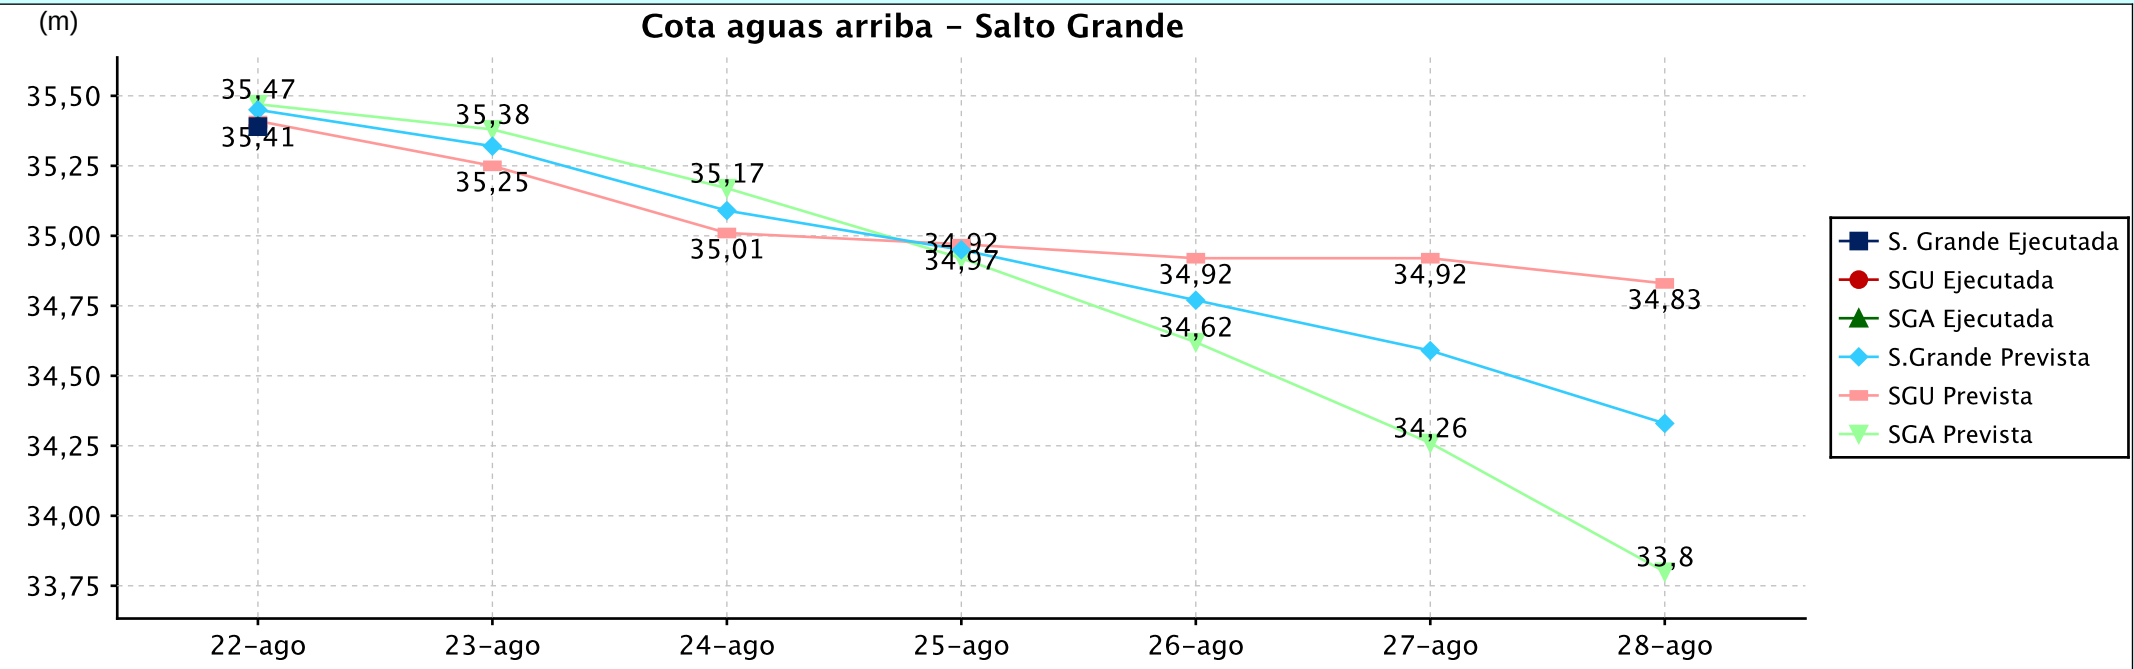


TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	1.264	1.449
SGU	4.184	4.074

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	2.629	2.155
Baygorria	0	31
Palmar	1.884	1.499
SGU	4.050	4.120

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	1.200	1.500
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

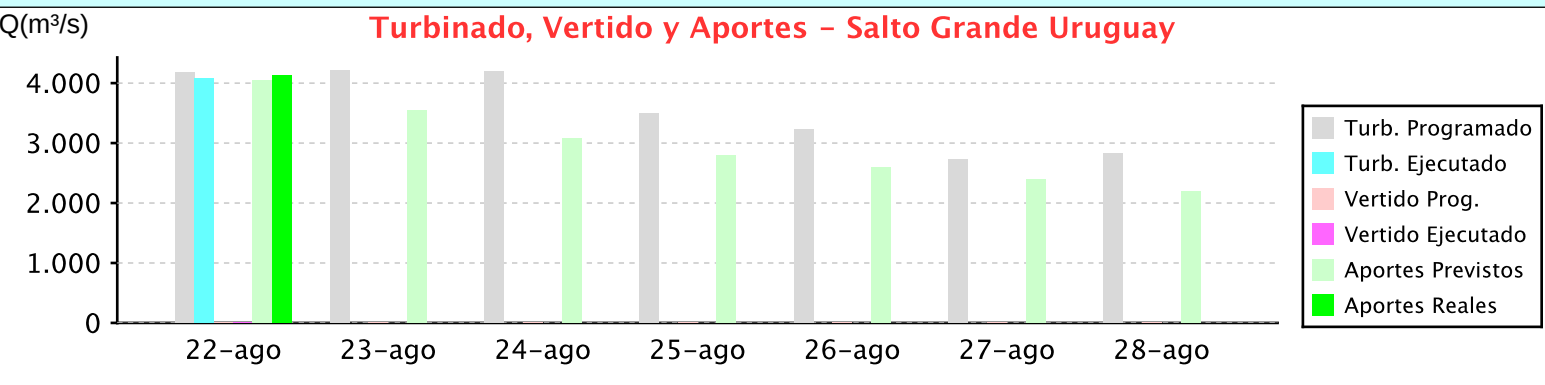

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,39
Cota Vista Arg	35,39
Cota real	35,39
Dif. Energ. (U-A)	
Acumulado MWh	57

OBSERVACIONES
