




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

domingo 23 de agosto de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	0
Central La Tablada	-92
Central P. del Tigre	-2
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	0
C. Baygorria	-6
C. Palmar	7.645
C. Salto Grande	17.494
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	13.333
TOTAL Generación	38.364

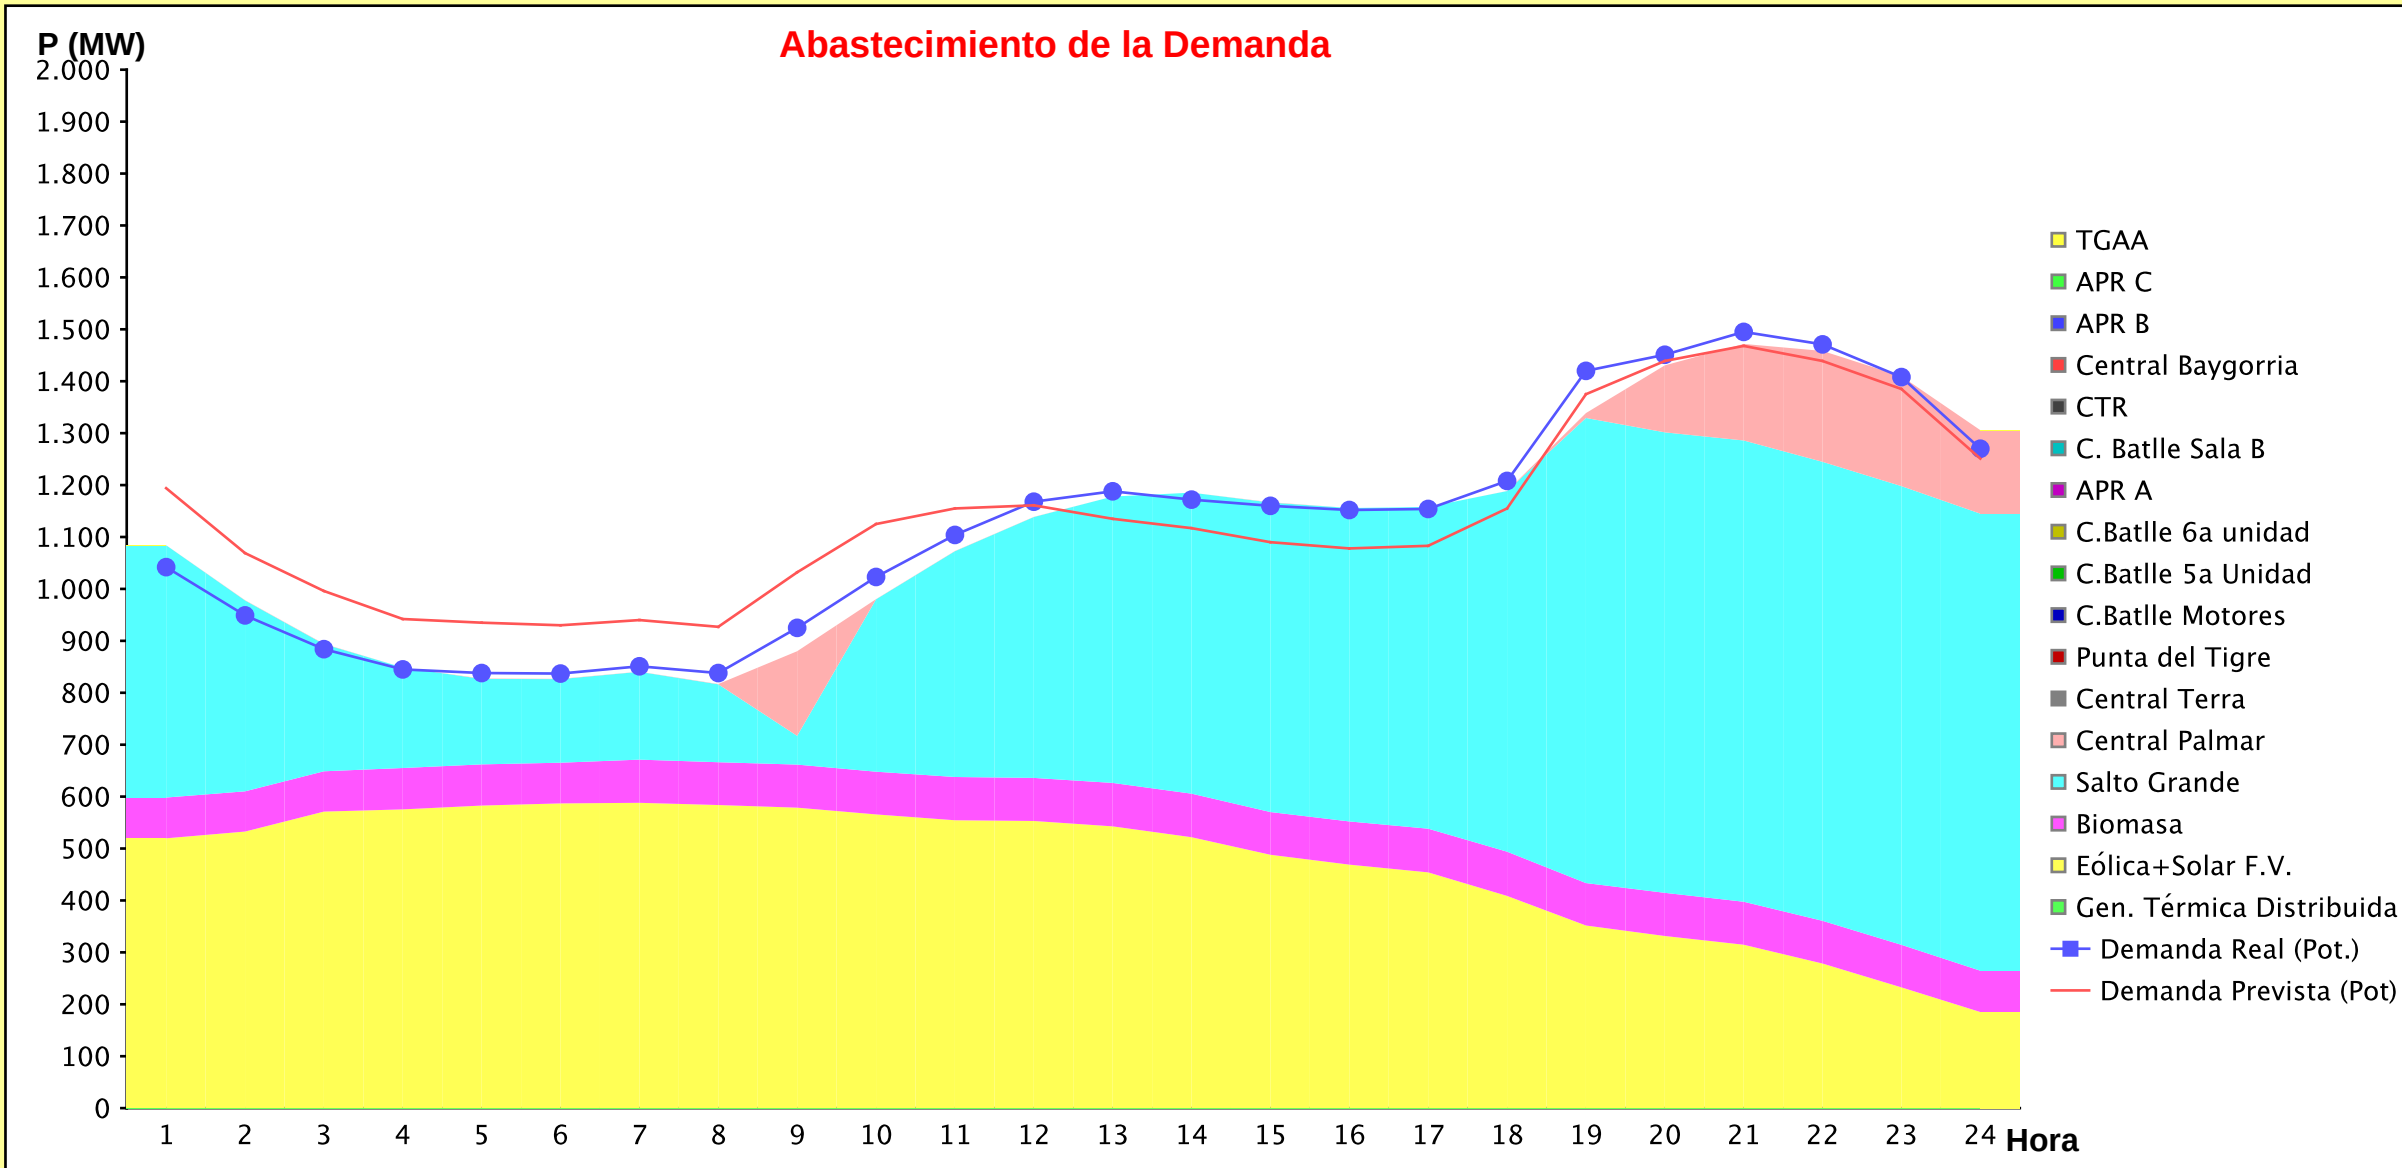

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	11.836
Hidráulica	11.836
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	11.836




DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	26.528
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	27.421
Diferencia (MWh)	-893
Ejecutada - Programada	-3,26 %

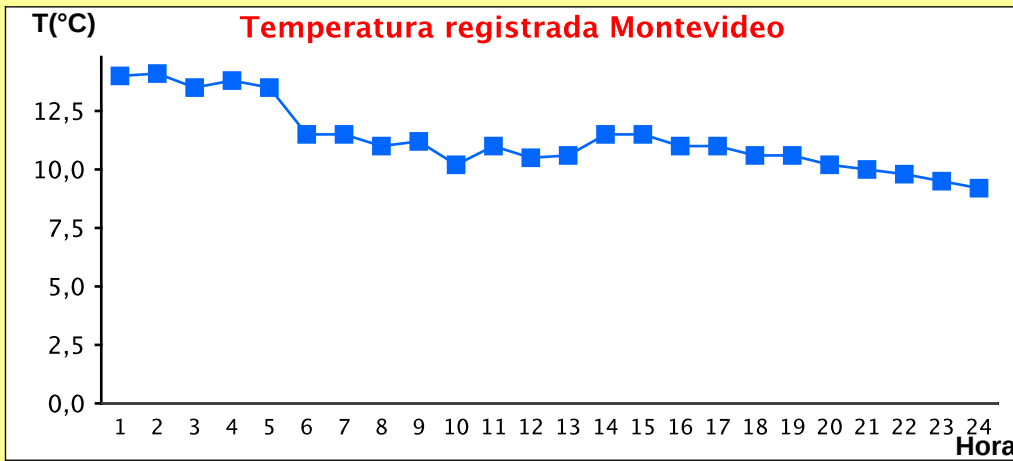



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1237 Hora 13:04
Potencia mínima:	863 Hora 07:30
Pico noche:	1519 Hora 20:55

Generación Media (MW)	
Eólica	472,6
Biomasa	96,6
Solar fotovoltaica	0,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

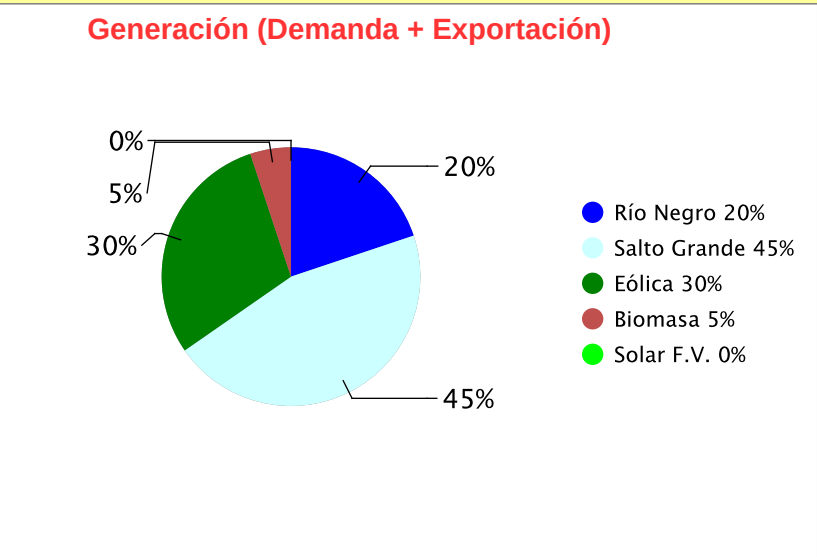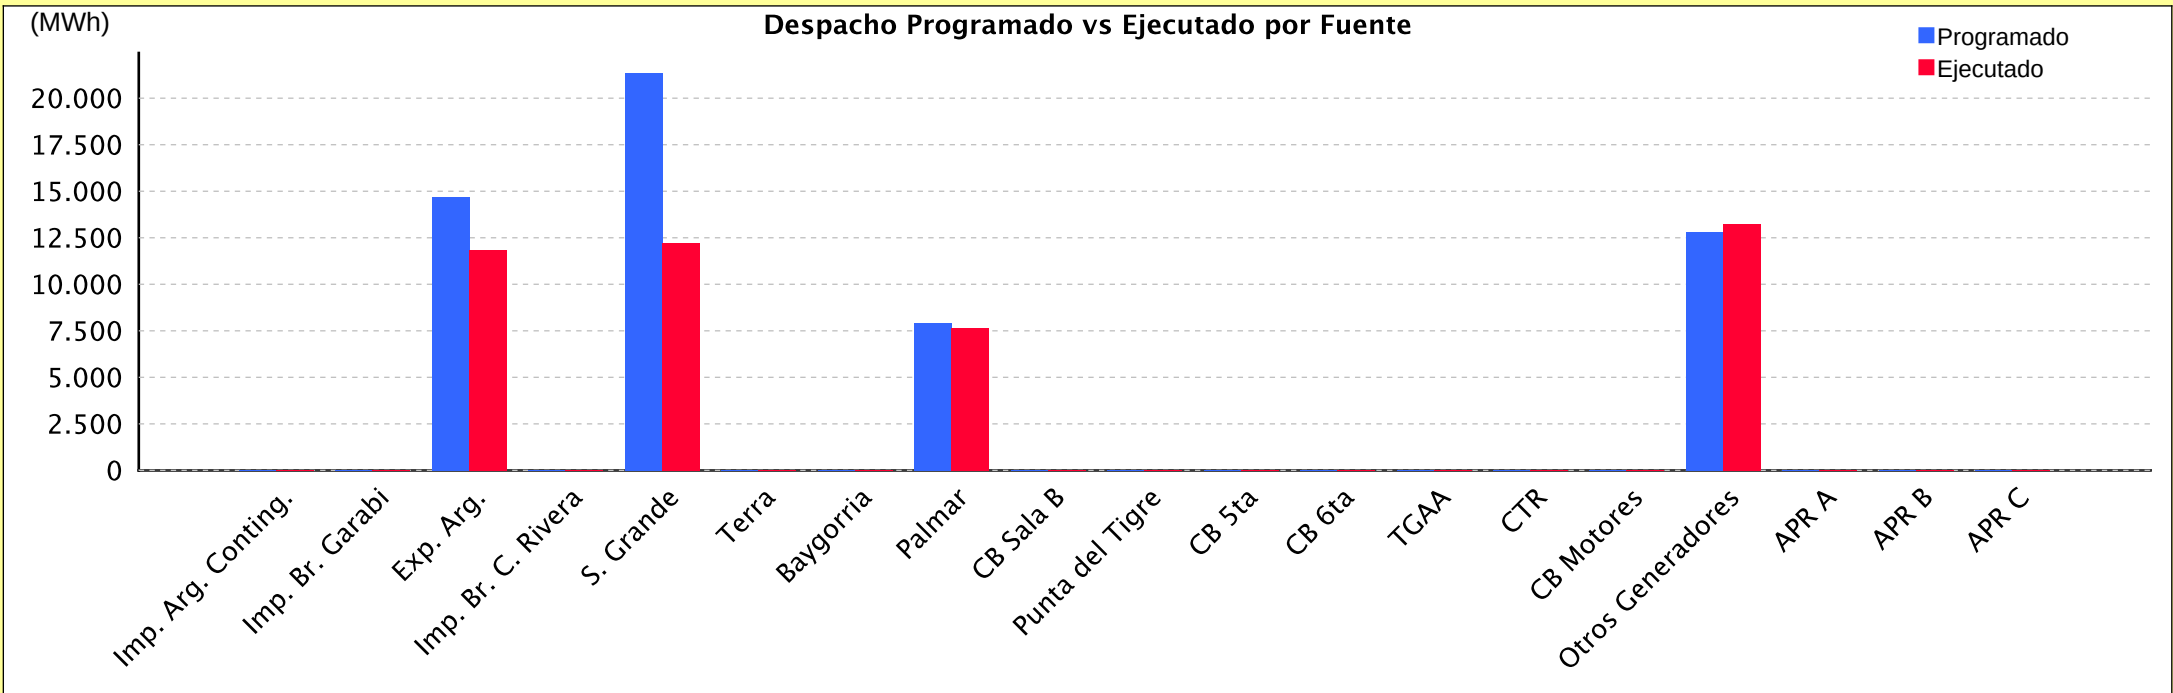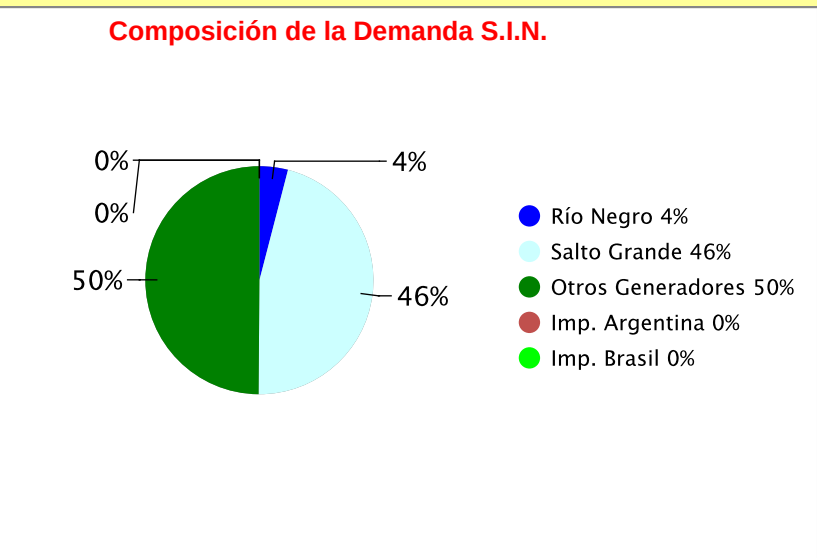



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

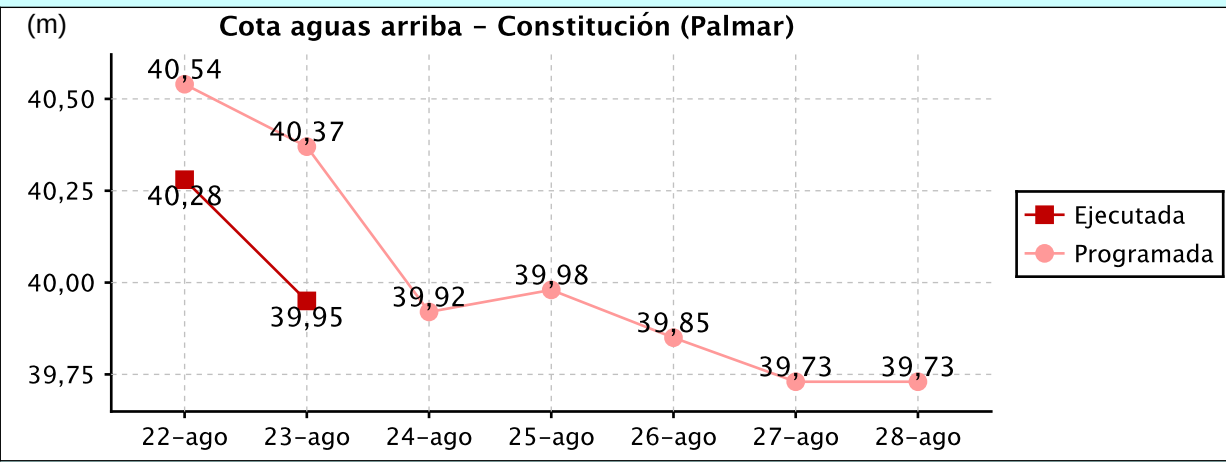
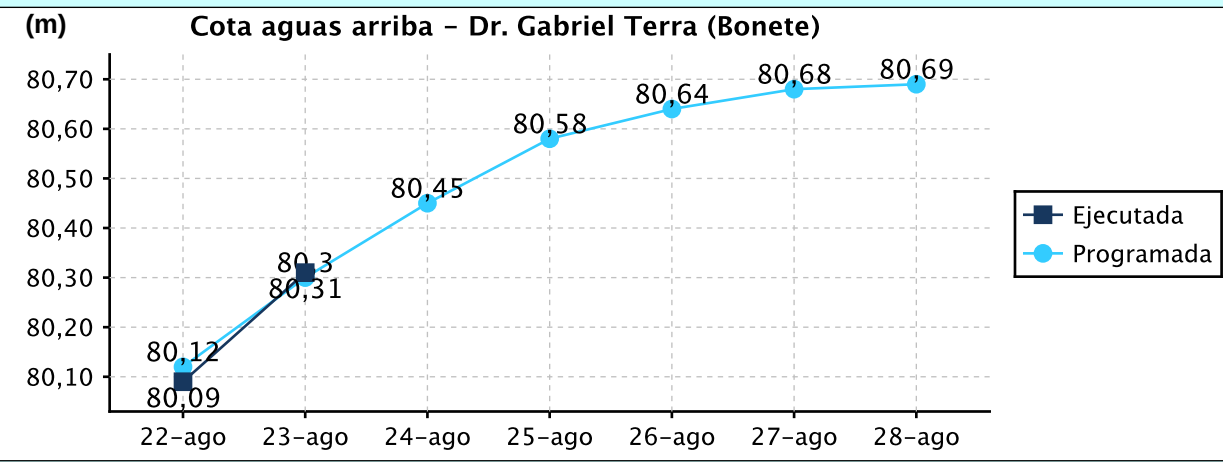


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,30	80,31
Baygorria	53,96	54,08
Palmar	40,37	39,95
SGU	35,25	35,5

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

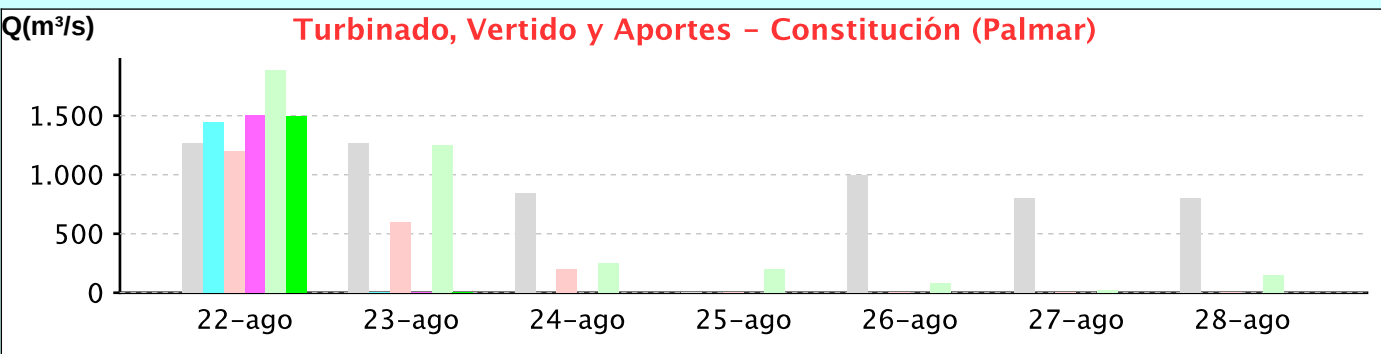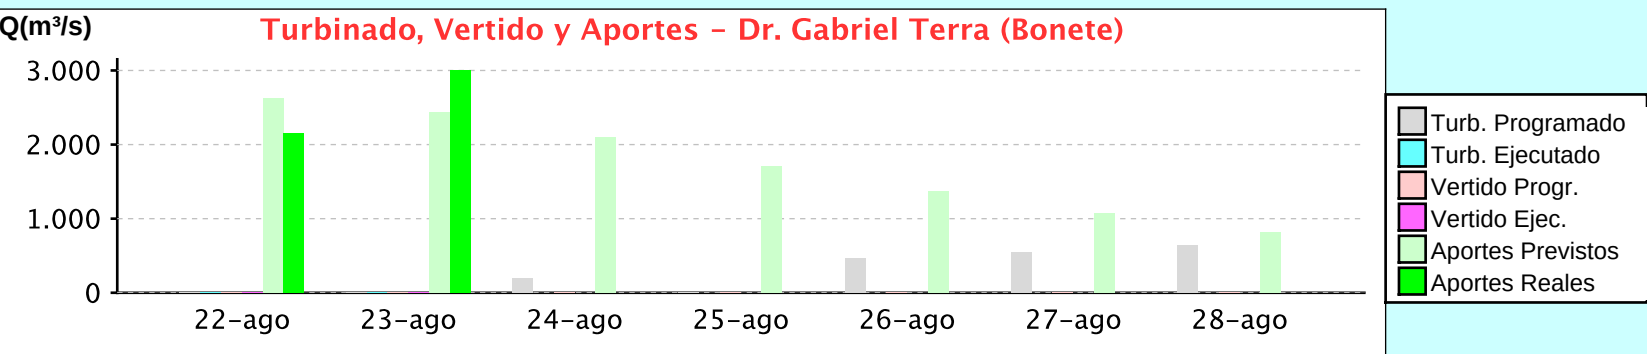

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

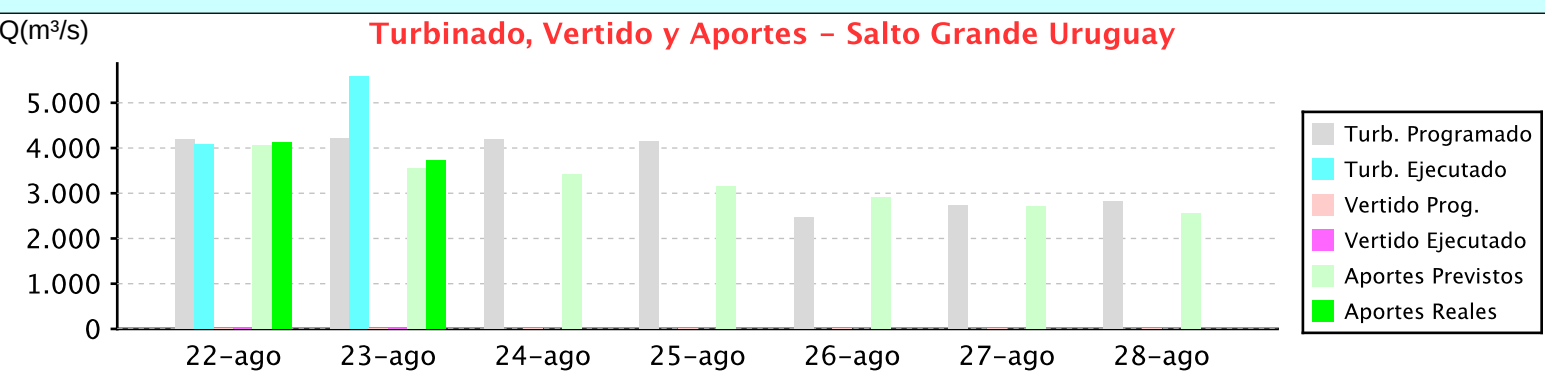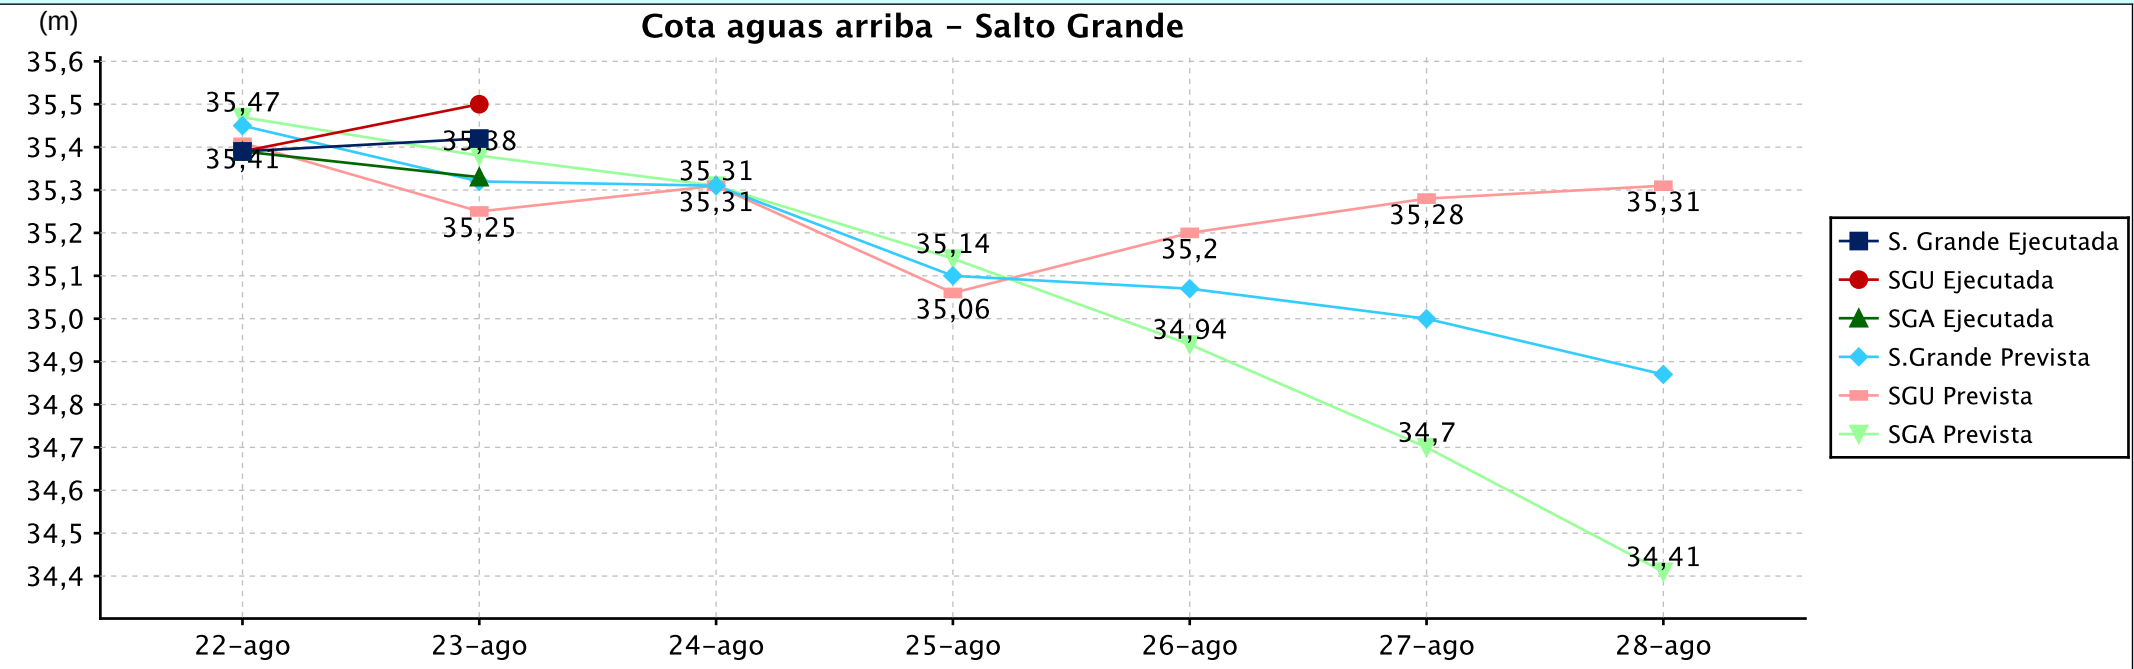

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,50
Cota Vista Arg	35,33
Cota real	35,42
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	4.166

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	1.264	0
SGU	4.217	5.590

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	2.435	3.001
Baygorria	0	42
Palmar	1.249	0
SGU	3.550	3.720

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	600	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES

LOS DATOS HIDRAULICOS PUEDEN LLEGAR A SER MODIFICADOS

Los datos presentados en este informe son preliminares y su objetivo es ponerlos a disposición de forma inmediata

24/08/2015 15:55
