




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

lunes 24 de agosto de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-0
Central La Tablada	-80
Central P. del Tigre	-2
APR A	-2
APR B	-2
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	820
C. Baygorria	860
C. Palmar	4.248
C. Salto Grande	20.877
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	5.974
TOTAL Generación	32.690

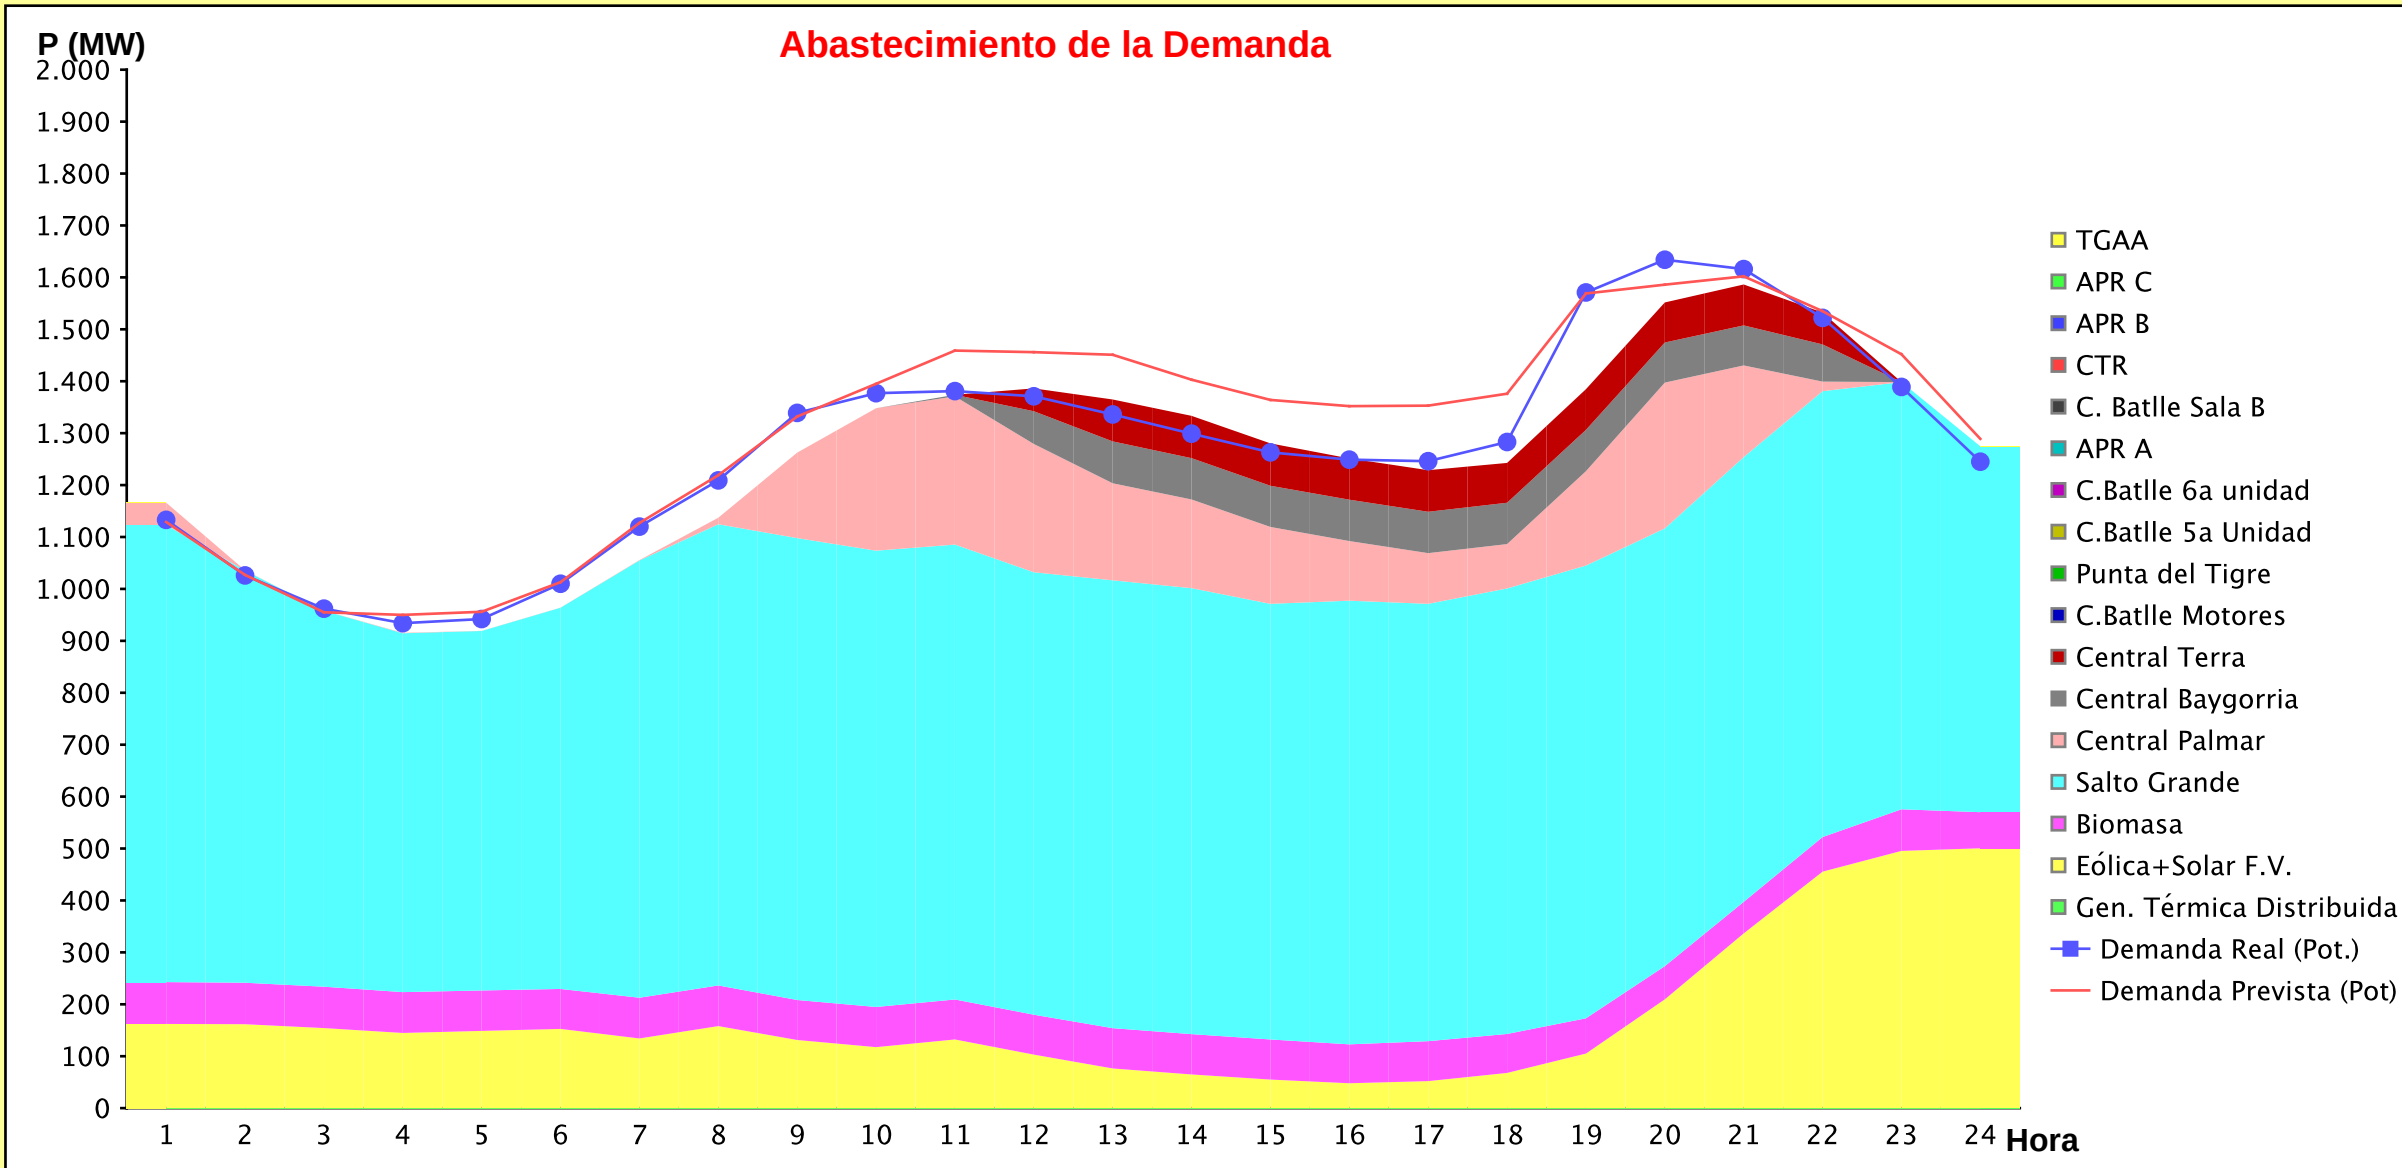

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	2.832
Hidráulica	2.832
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	2.832



DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	29.858
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	

Demanda Programada (MWh)	31.350
Diferencia (MWh)	-1.492
Ejecutada - Programada	-4,76 %

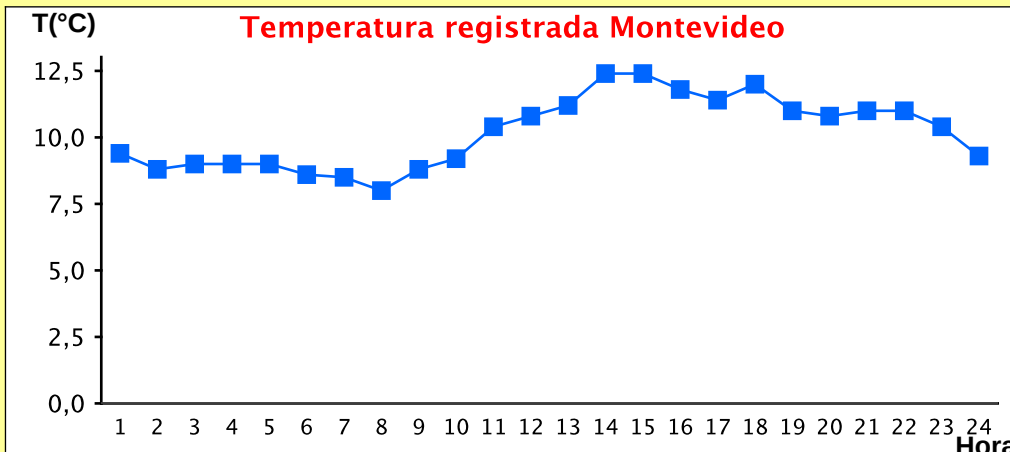


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1426 Hora 11:49
Potencia mínima:	940 Hora 03:48
Pico noche:	1654 Hora 20:43

Generación Media (MW)	
Eólica	162,9
Biomasa	94,4
Solar fotovoltaica	10,9
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

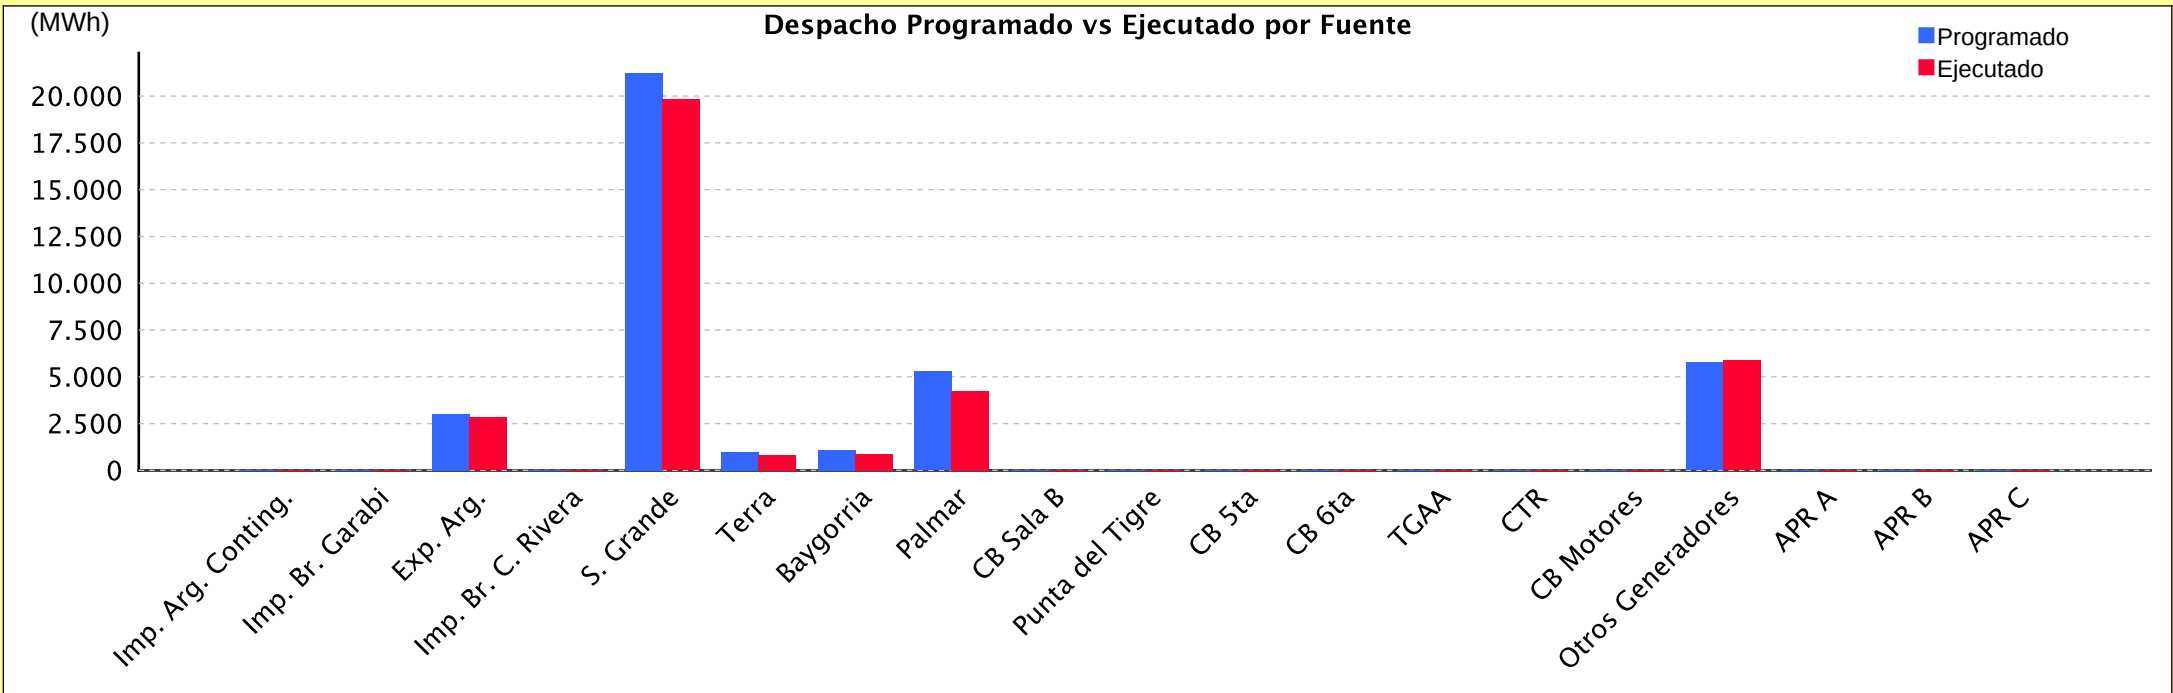
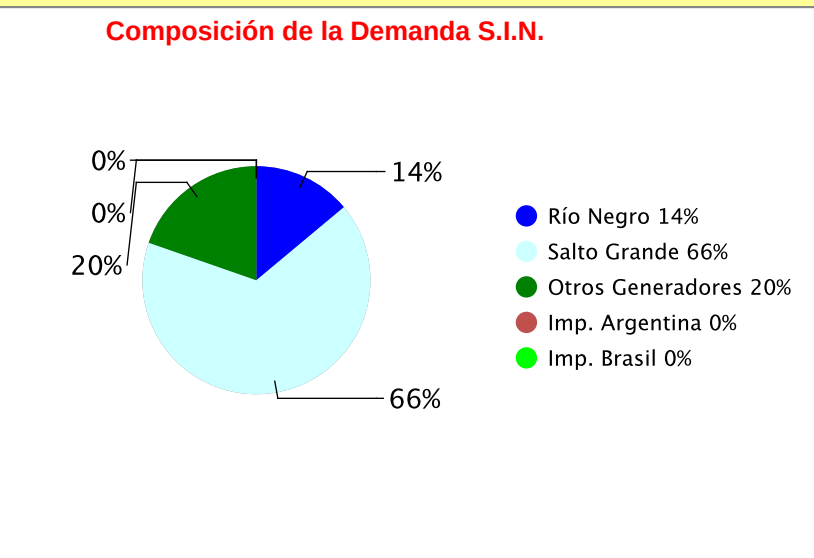


Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

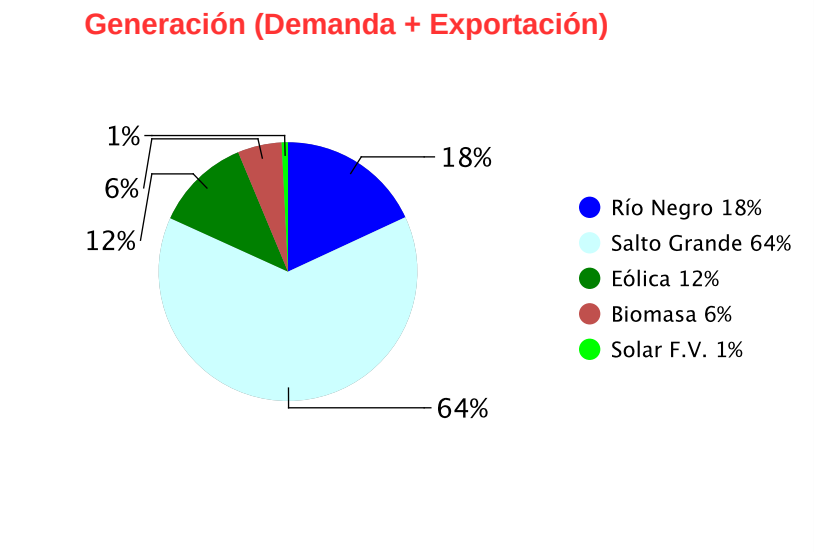



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

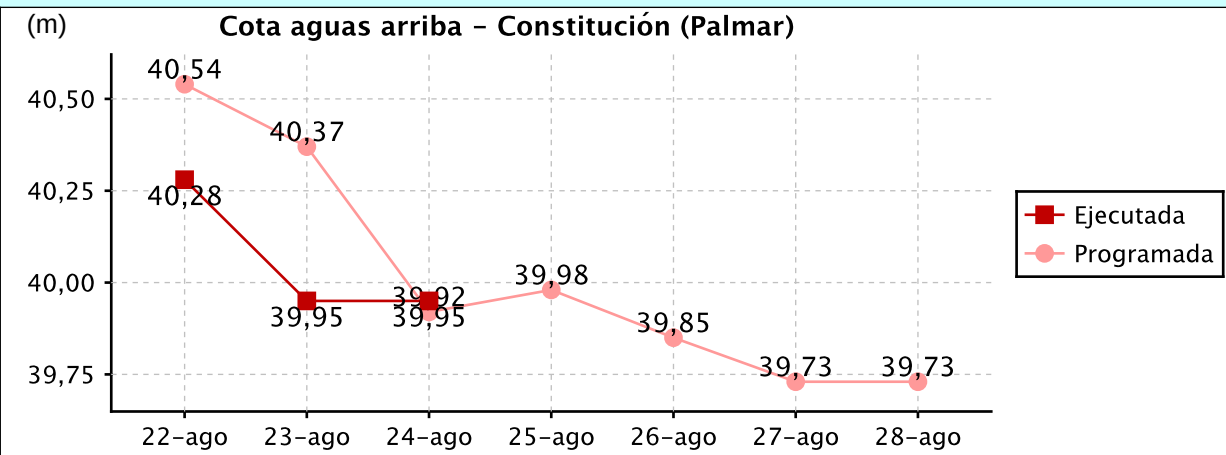
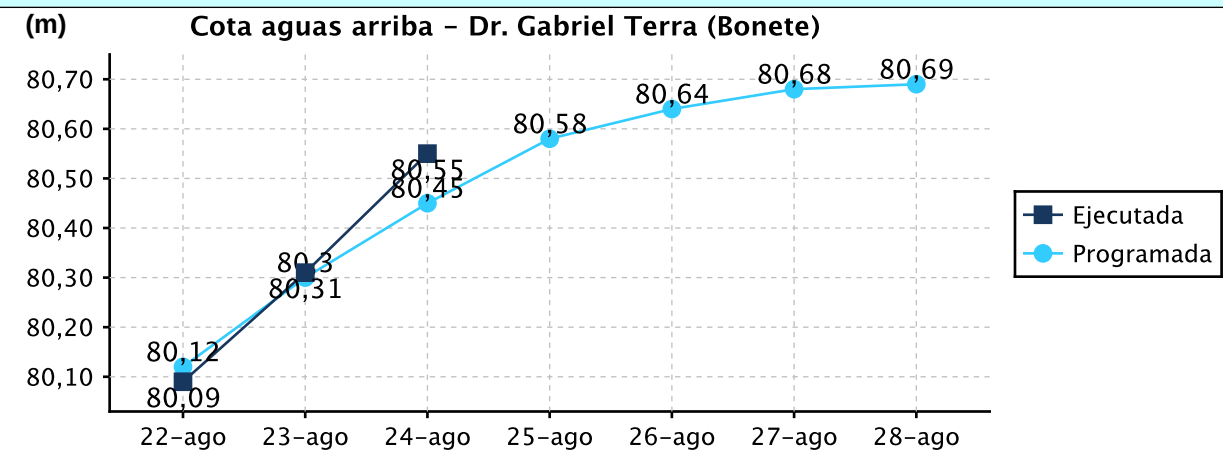


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,45	80,55
Baygorria	53,91	54
Palmar	39,92	39,95
SGU	35,31	35,43

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

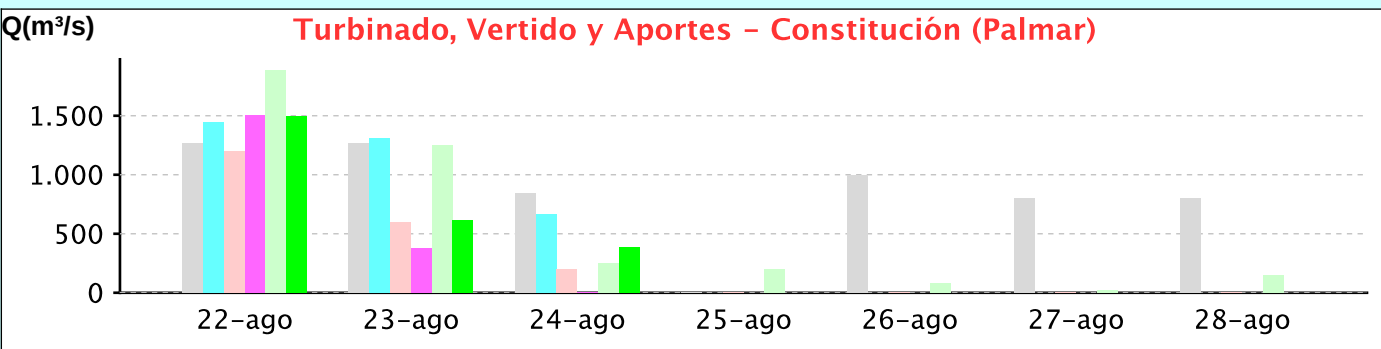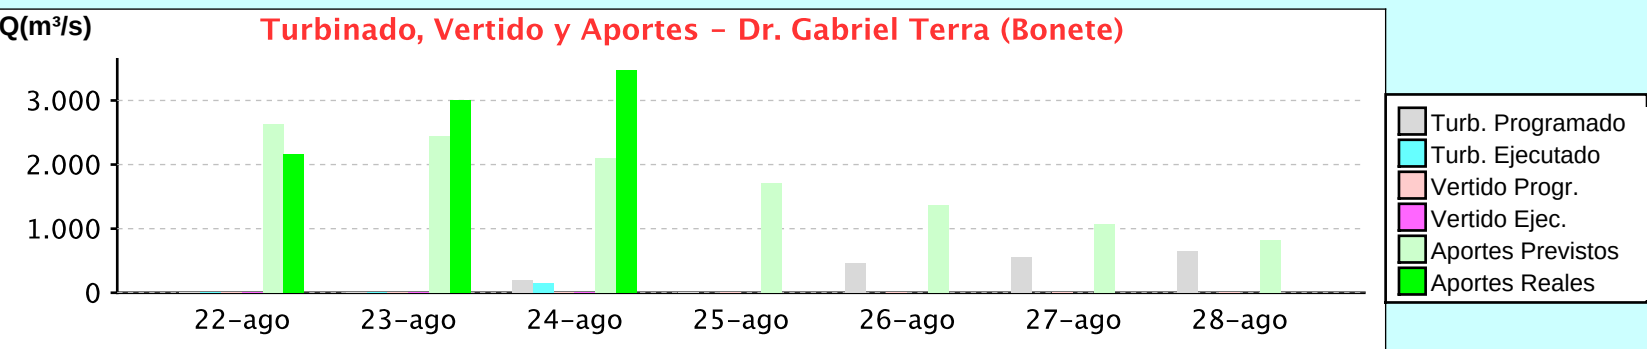

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

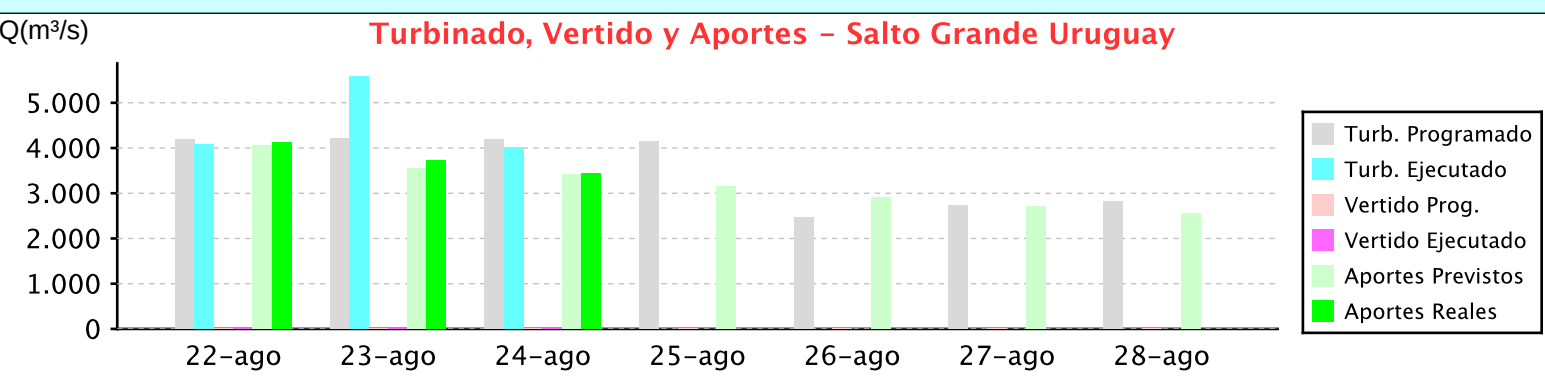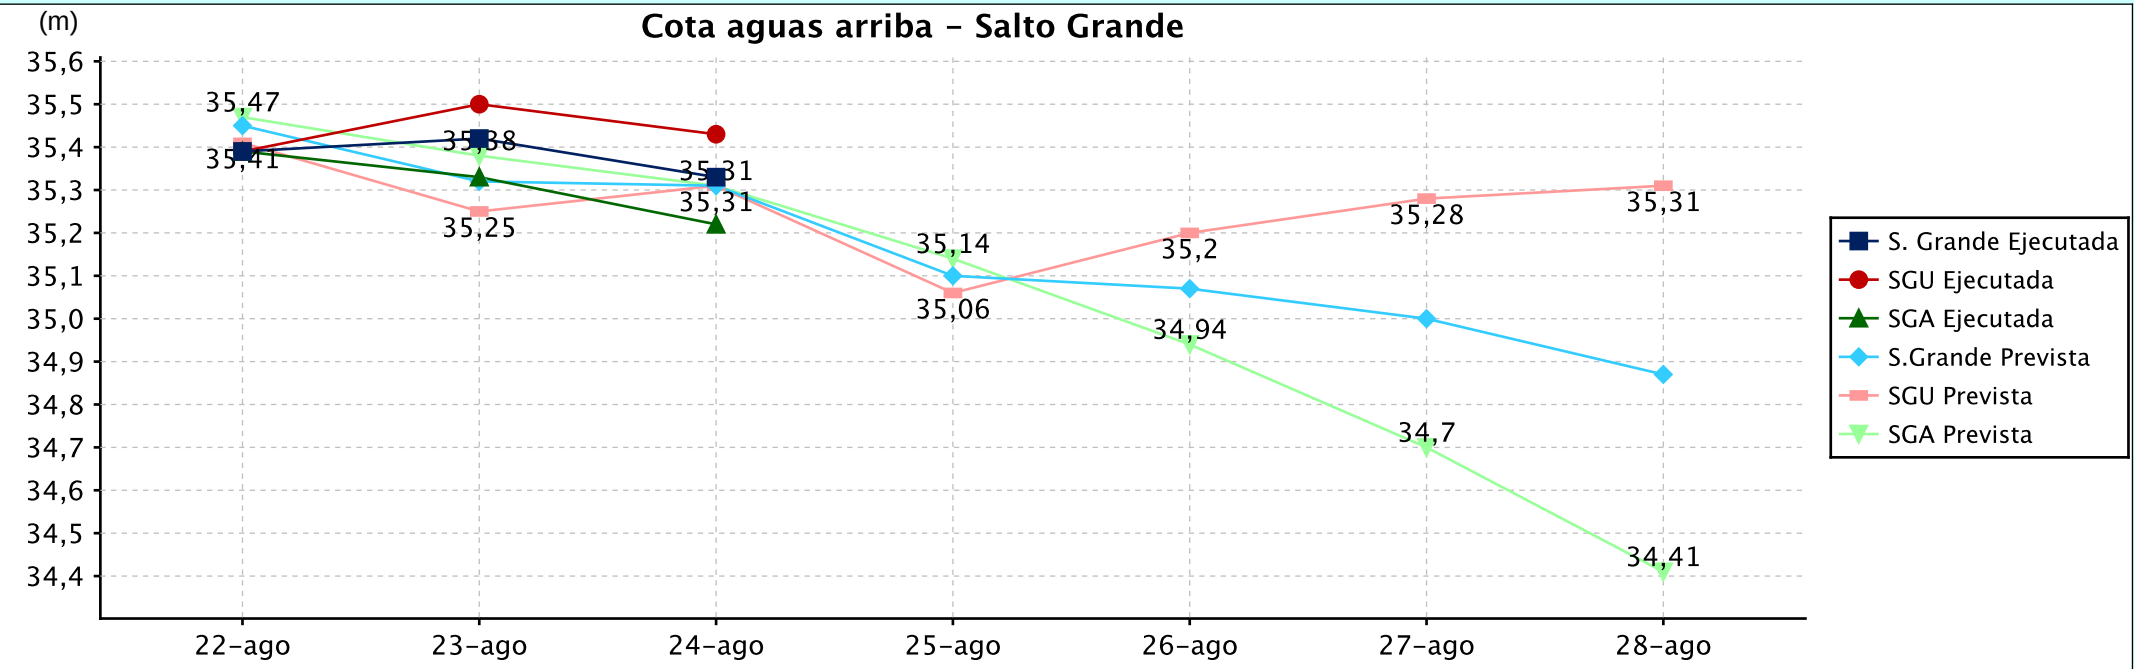

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,43
Cota Vista Arg	35,22
Cota real	35,33
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	
4.924	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	191	155
Baygorria	403	305
Palmar	843	669
SGU	4.194	4.020

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	2.102	3.469
Baygorria	0	54
Palmar	250	381
SGU	3.425	3.443

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	200	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
