




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


martes 25 de agosto de 2015

Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	0
Central La Tablada	-99
Central P. del Tigre	-1
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	486
C. Baygorria	197
C. Palmar	0
C. Salto Grande	19.990
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores	
Otros Generadores	14.329
TOTAL Generación	34.893



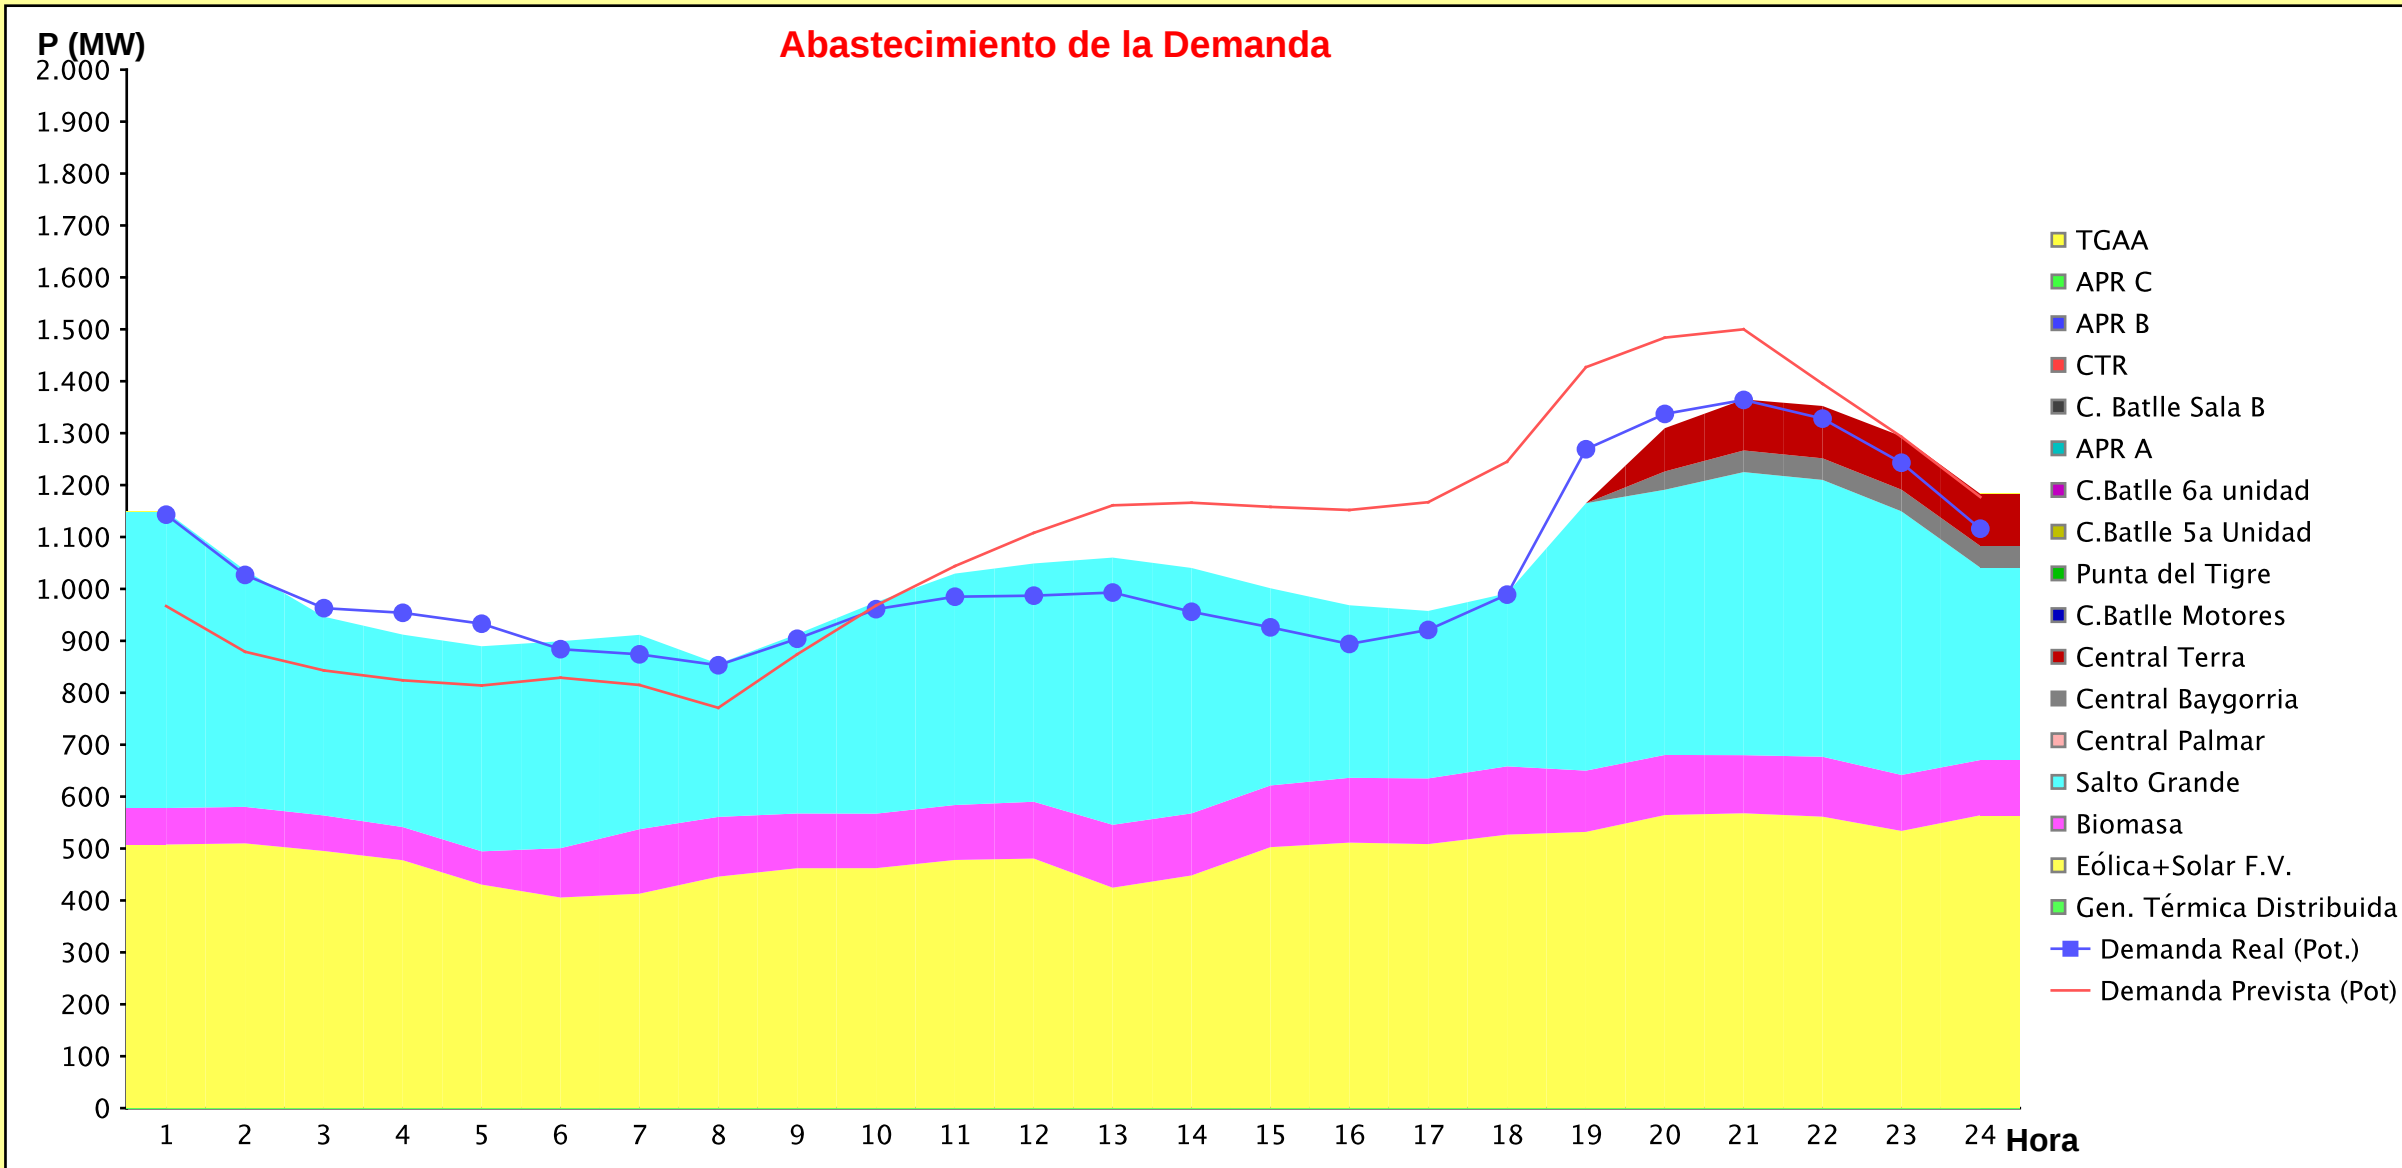


Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	9.753
Hidráulica	9.753
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	9.753

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	25.140
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	26.061
Diferencia (MWh)	-921
Ejecutada - Programada	-3,53 %


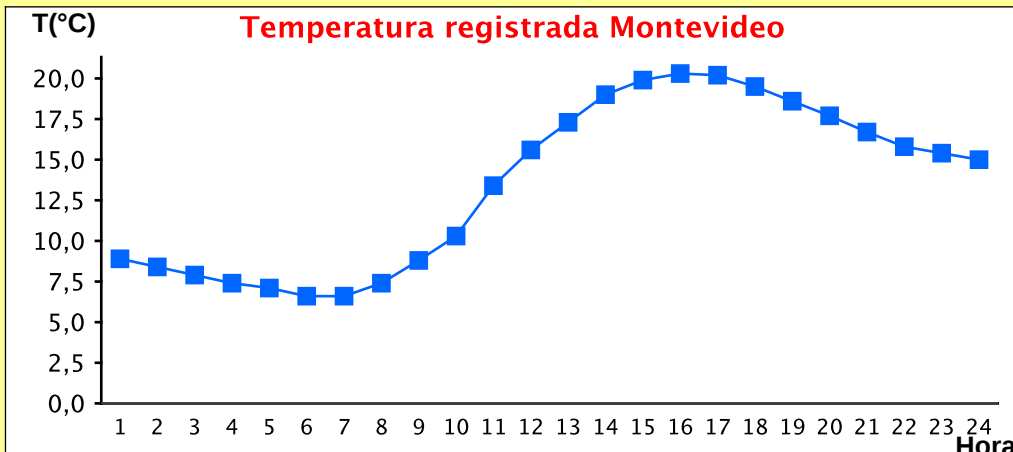


Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1104 Hora 13:09
Potencia mínima:	875 Hora 07:31
Pico noche:	1433 Hora 20:52
Generación Media (MW)	
Eólica	475,8
Biomasa	111,2
Solar fotovoltaica	14,4
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

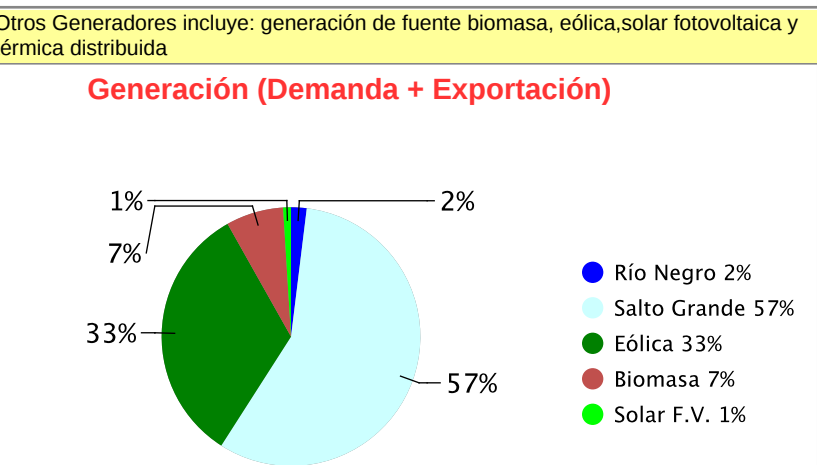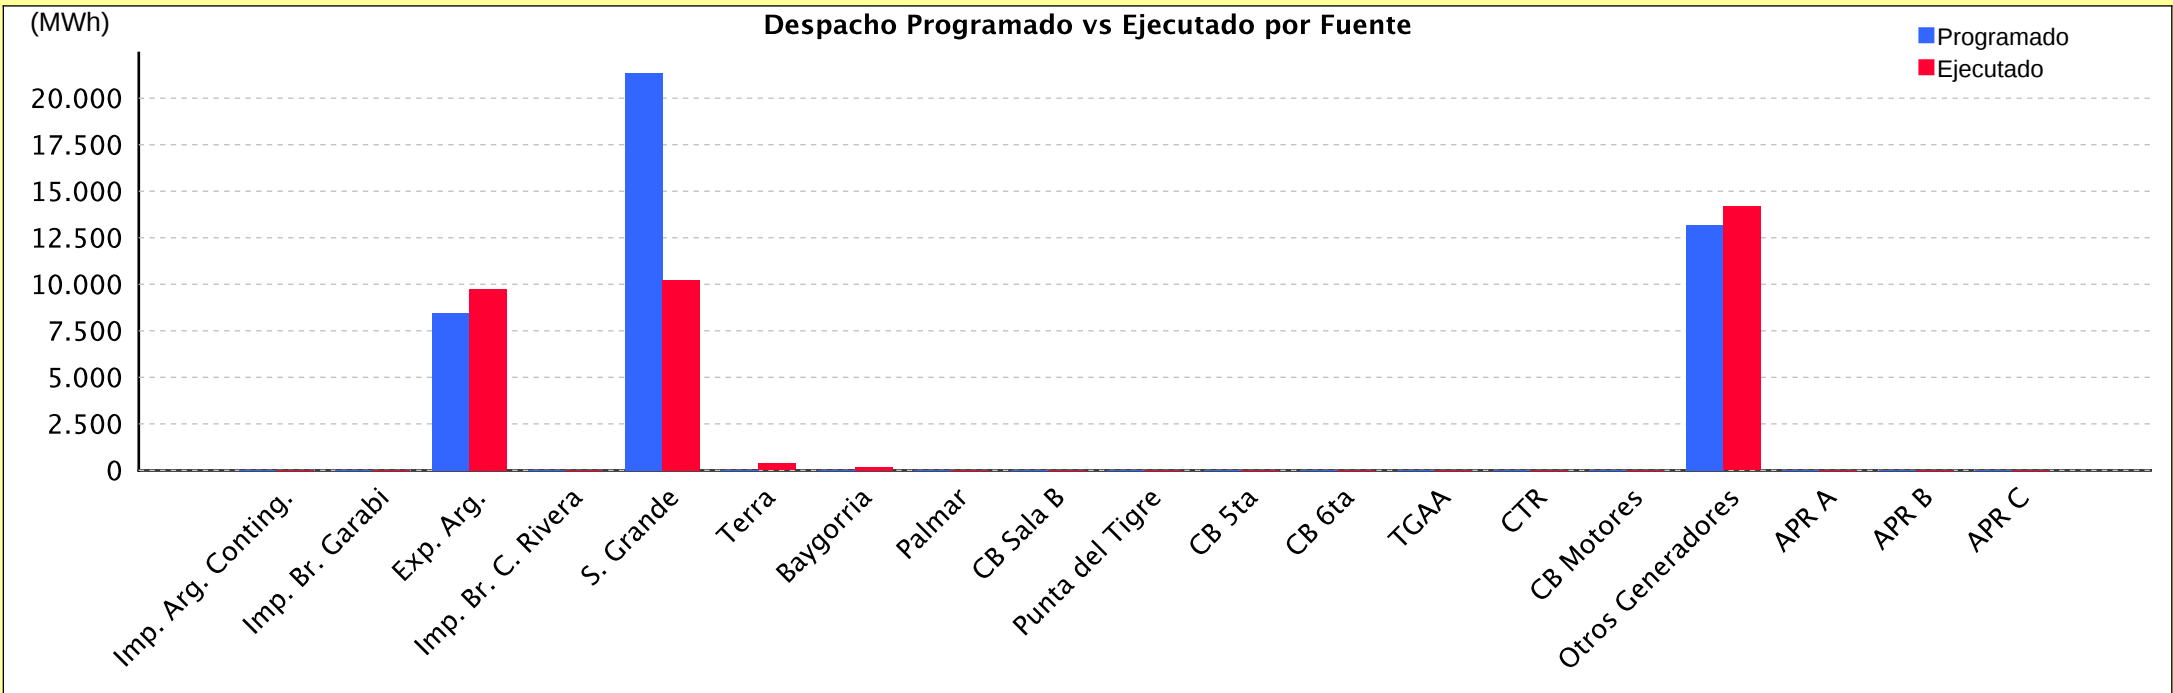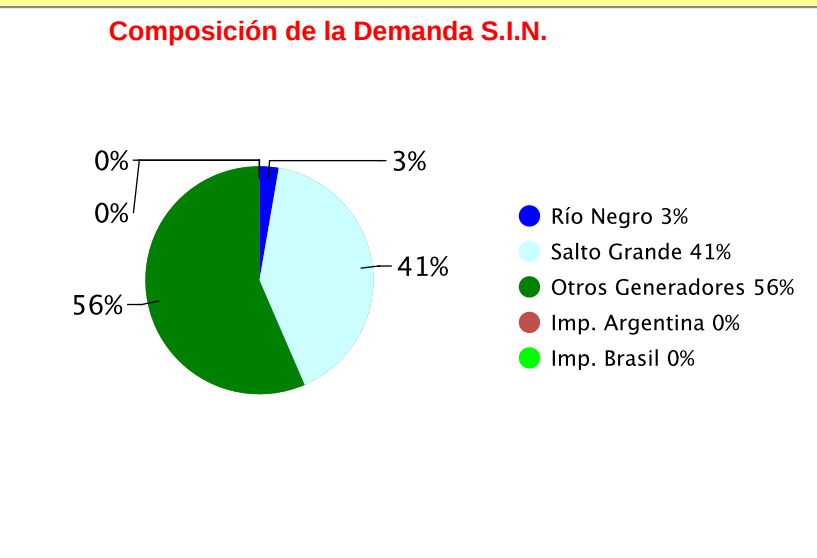



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

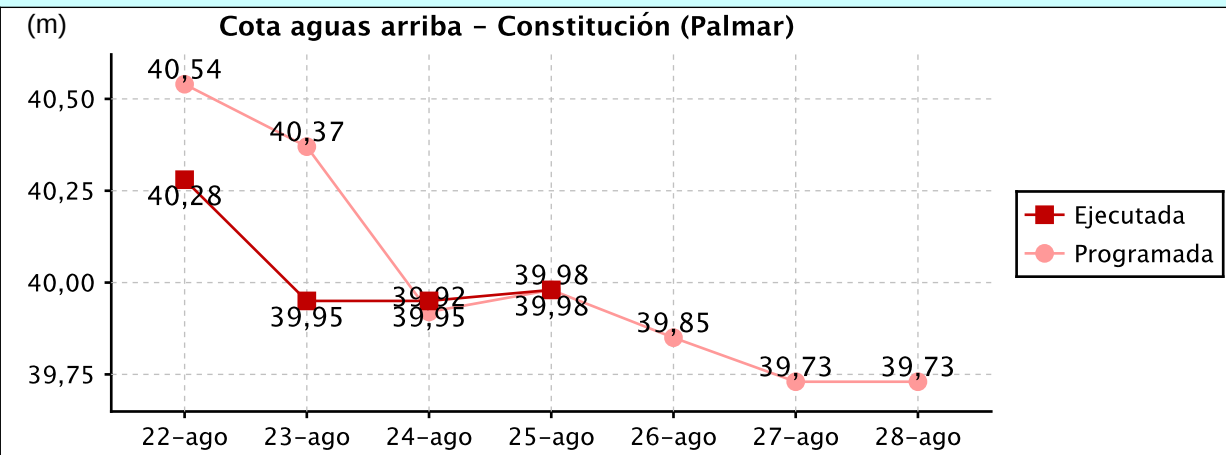
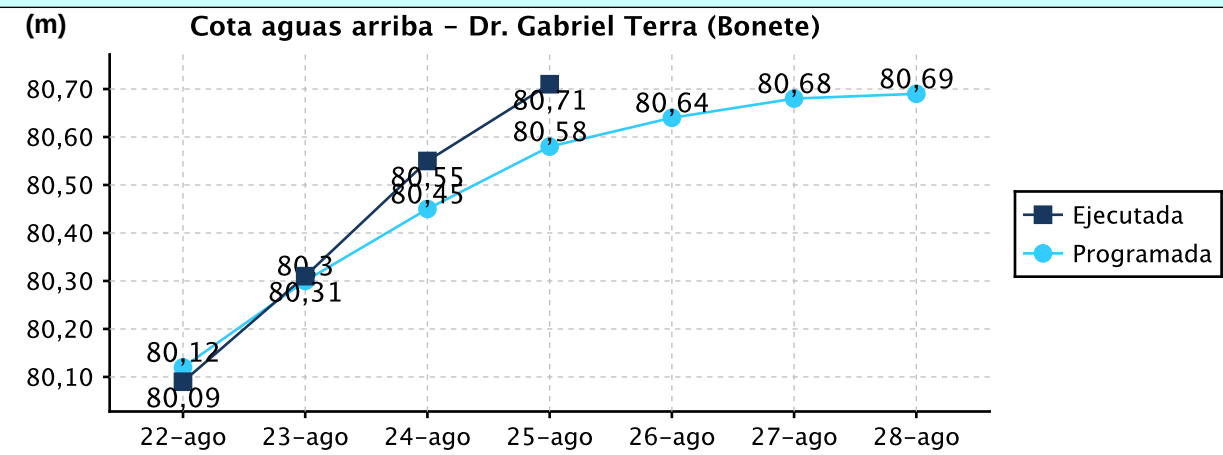


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	80,58	80,71
Baygorria	53,91	53,94
Palmar	39,98	39,98
SGU	35,06	35,28

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

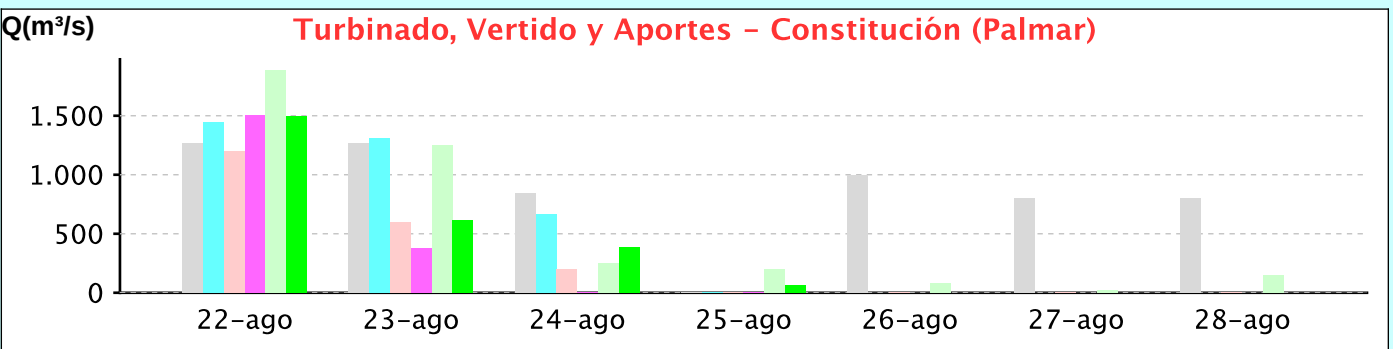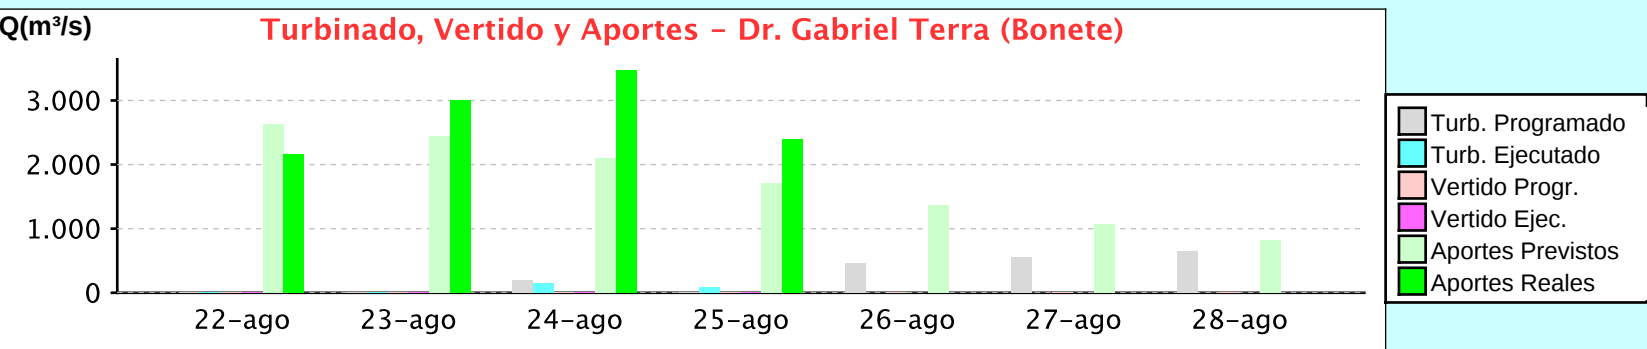

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

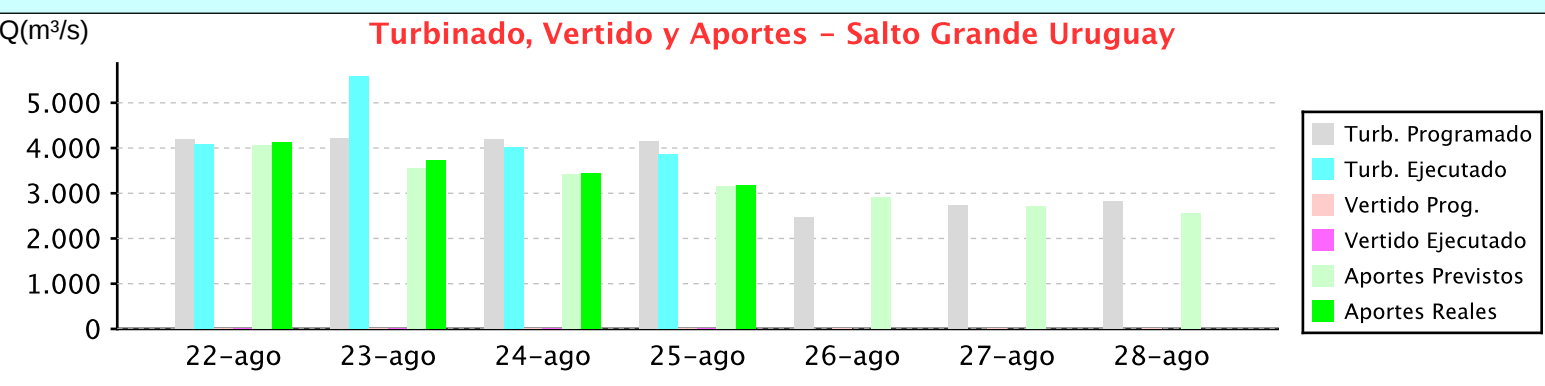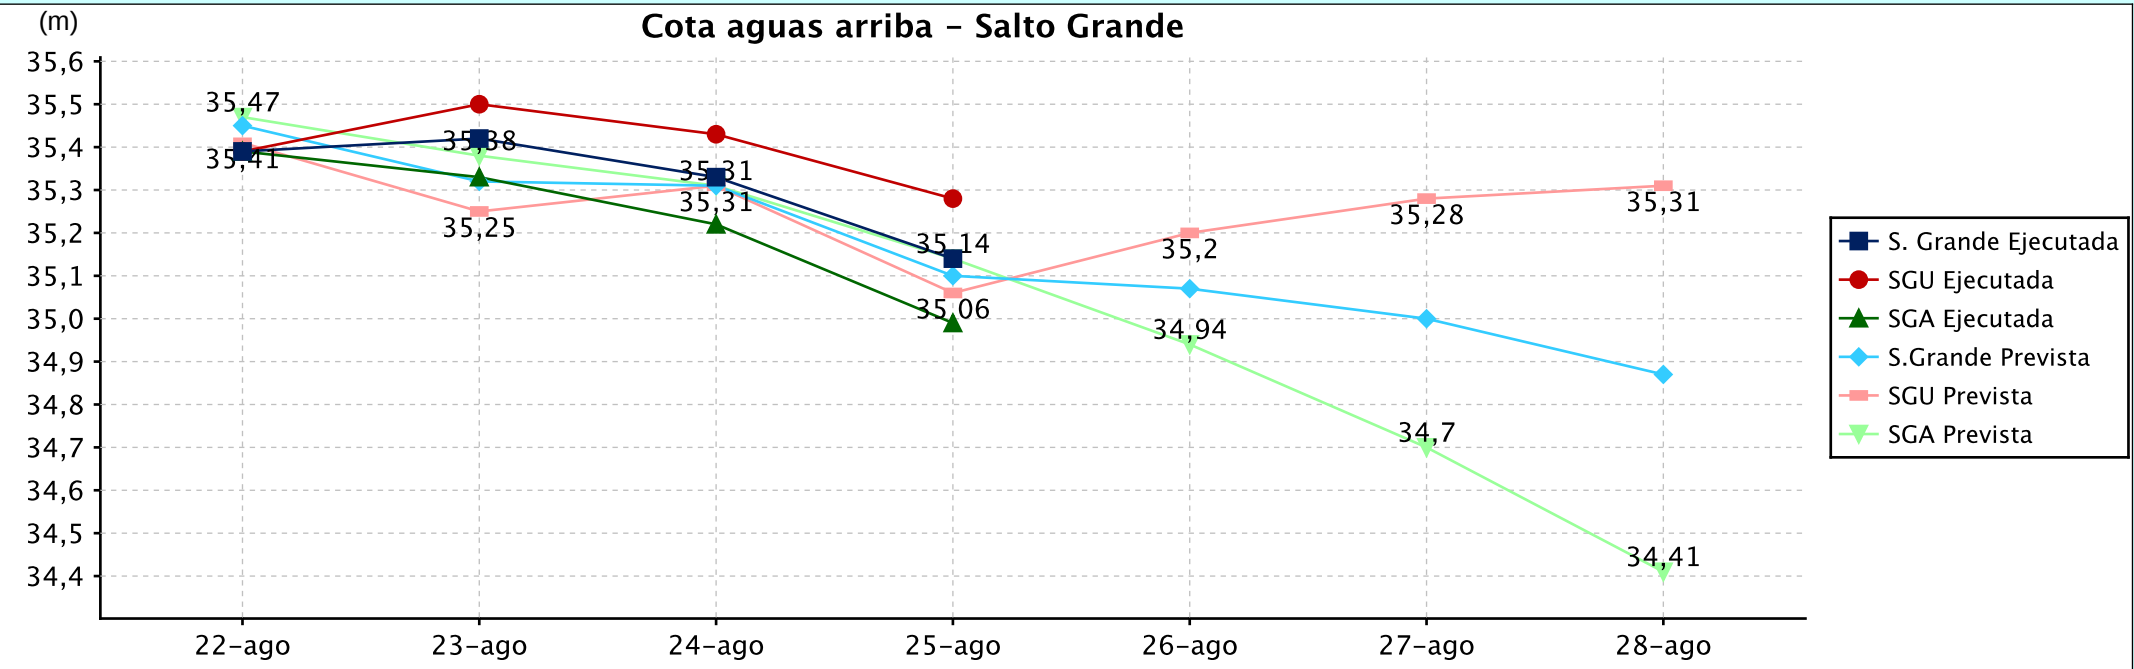

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,28
Cota Vista Arg	34,99
Cota real	35,14

Dif. Energ. (U-A)	7.053
Acumulado MWh	

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	91
Baygorria	0	72
Palmar	0	0
SGU	4.138	3.864

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	1.701	2.387
Baygorria	0	-81
Palmar	200	62
SGU	3.150	3.176

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	0	0
Baygorria	0	0
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
