




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

miércoles 02 de septiembre de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	-6
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-3
Central La Tablada	-79
Central P. del Tigre	-3
APR A	-2
APR B	-3
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
C.G.Terra	3.365
C. Baygorria	2.387
C. Palmar	7.775
C. Salto Grande	16.441
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores(MWh)	
Otros Generadores	6.469
TOTAL Generación	36.344

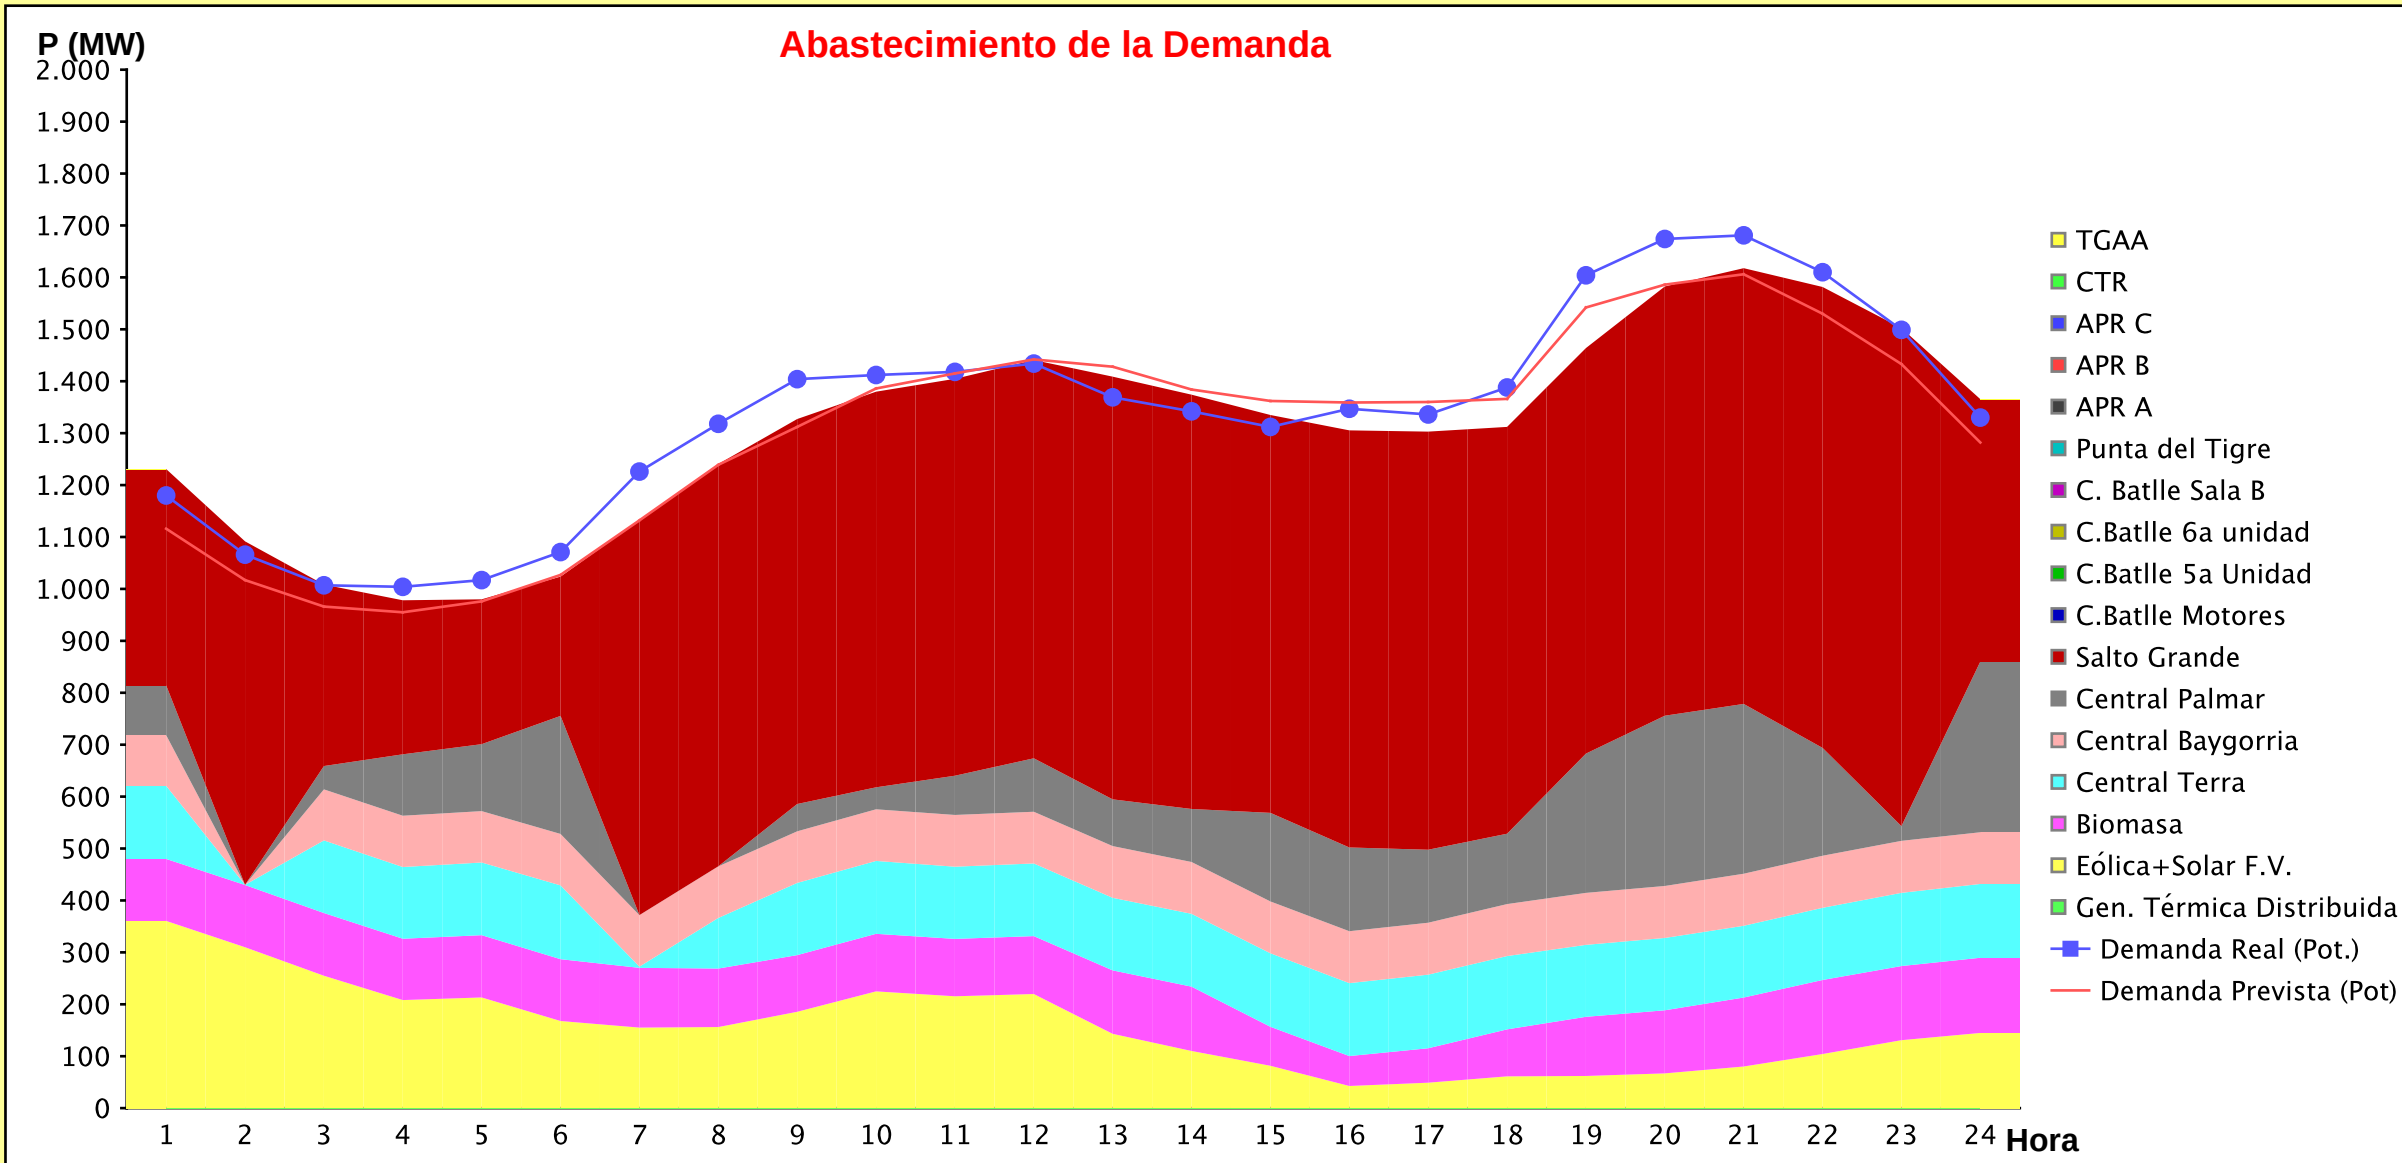

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	5.049
Hidráulica	5.049
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	5.049

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	31.295
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	


Demanda Programada (MWh)	31.221
Diferencia (MWh)	74
Ejecutada - Programada	0,24 %

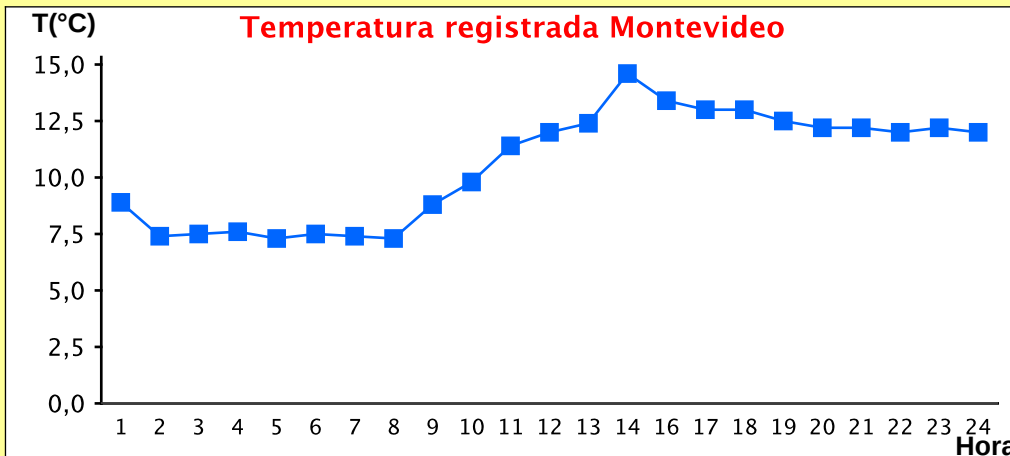

Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1469 Hora 11:46
Potencia mínima:	976 Hora 03:40
Pico noche:	1651 Hora 20:54



Generación Media (MW)	
Eólica	145,1
Biomasa	114,9
Solar fotovoltaica	12,4
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

Composición de la Demanda S.I.N.

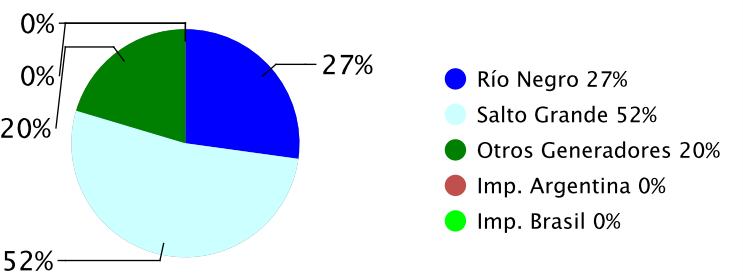



Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

Generación (Demanda + Exportación)

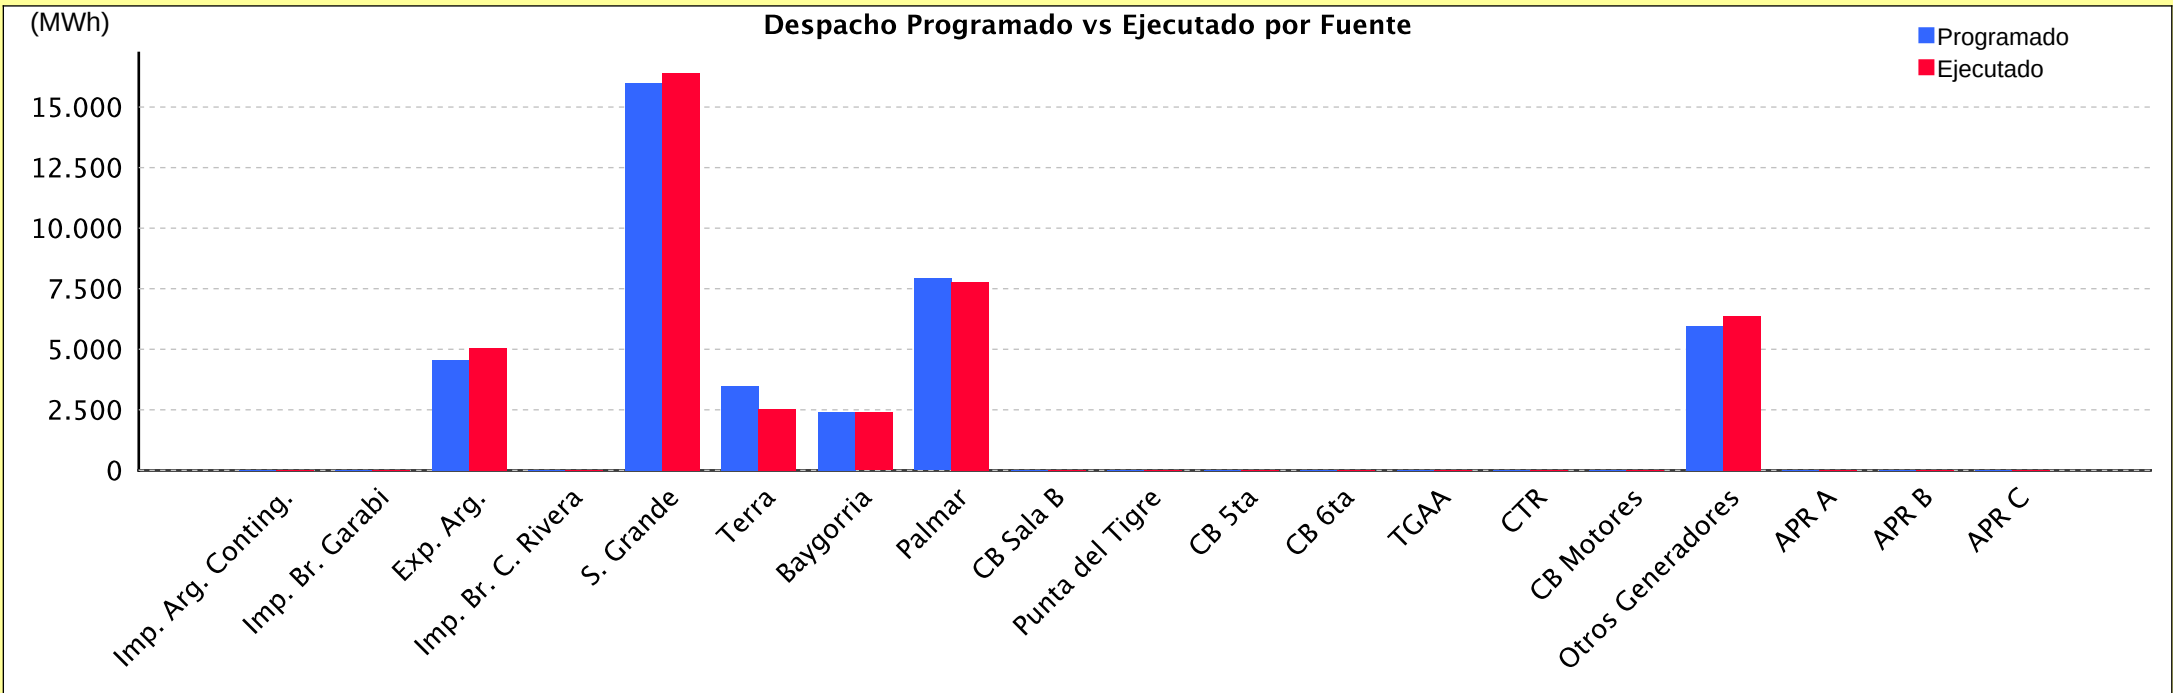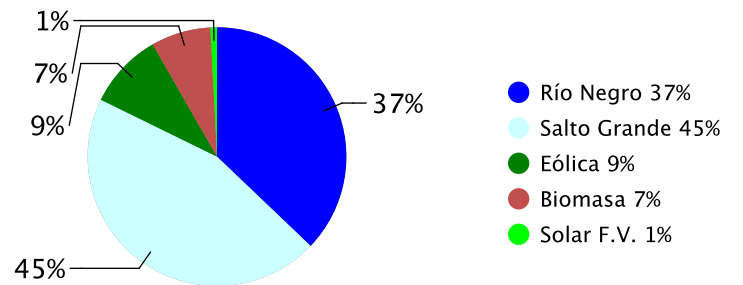



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

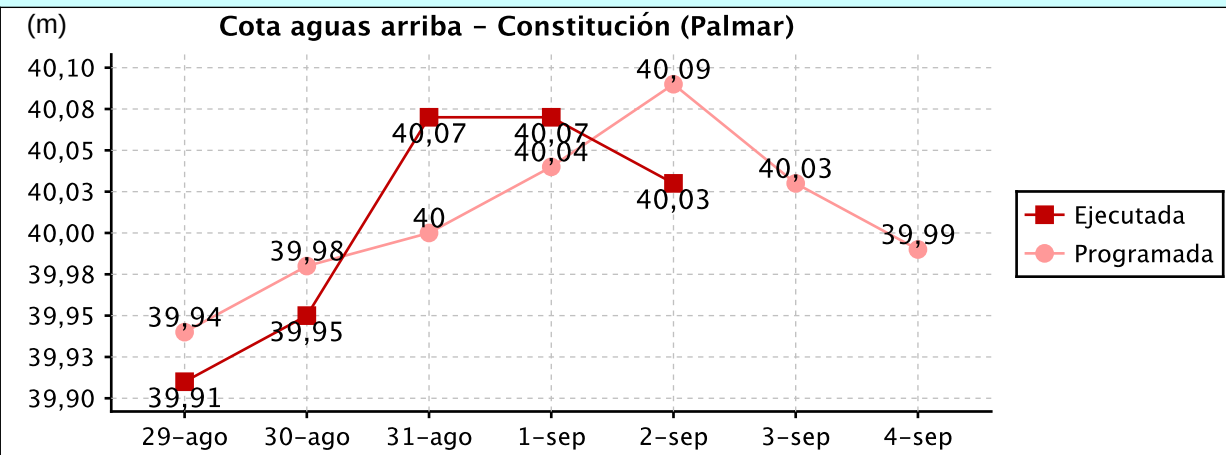
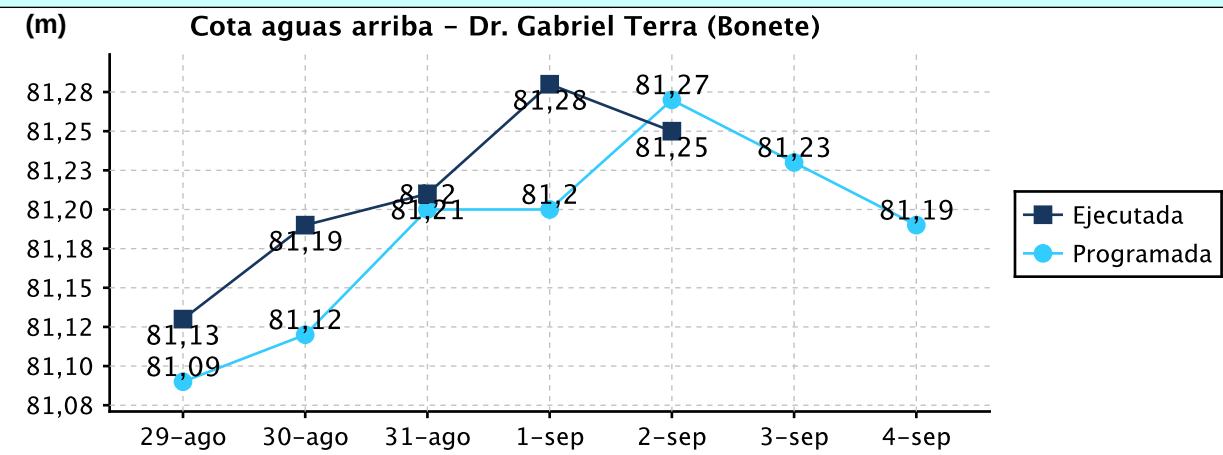


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,27	81,25
Baygorria	54,16	54,27
Palmar	40,09	40,03
SGU	36,07	35,96

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

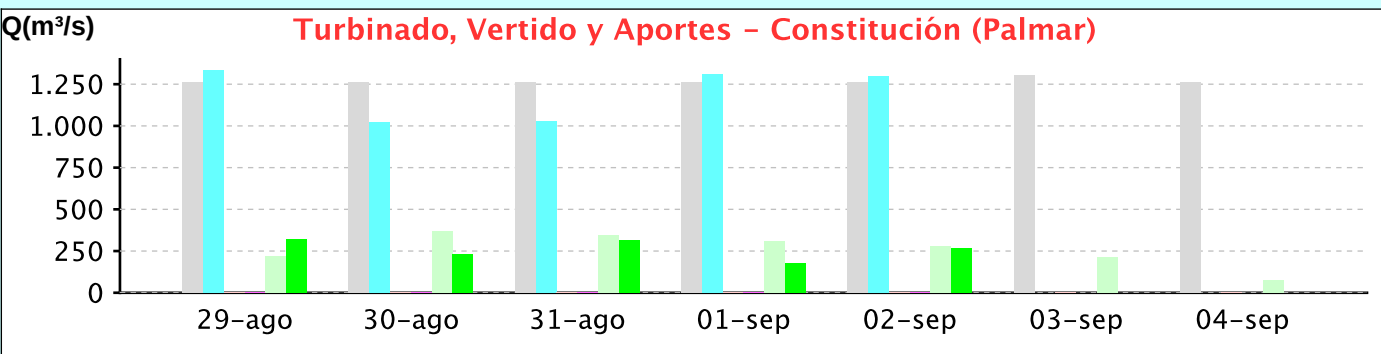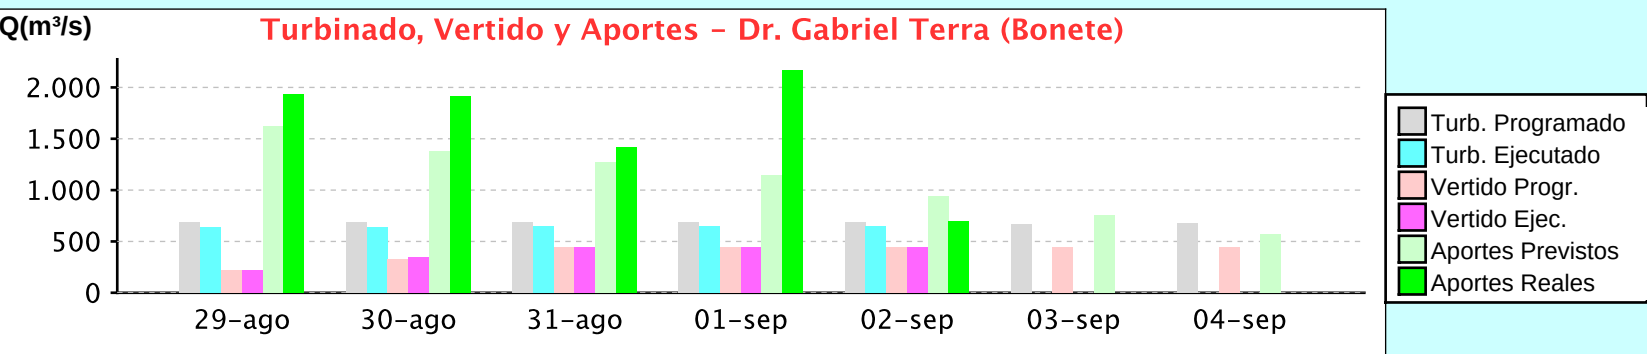

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

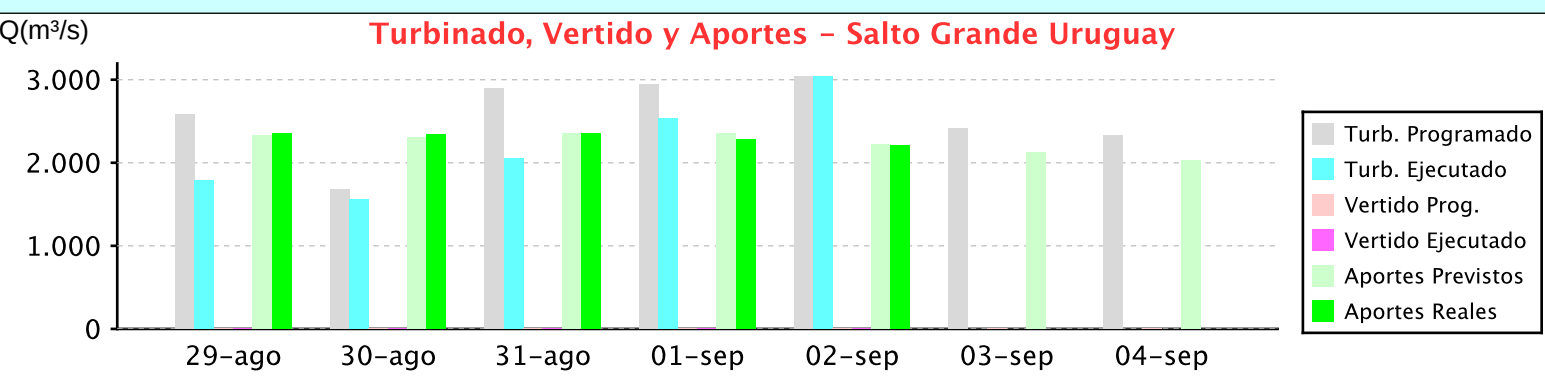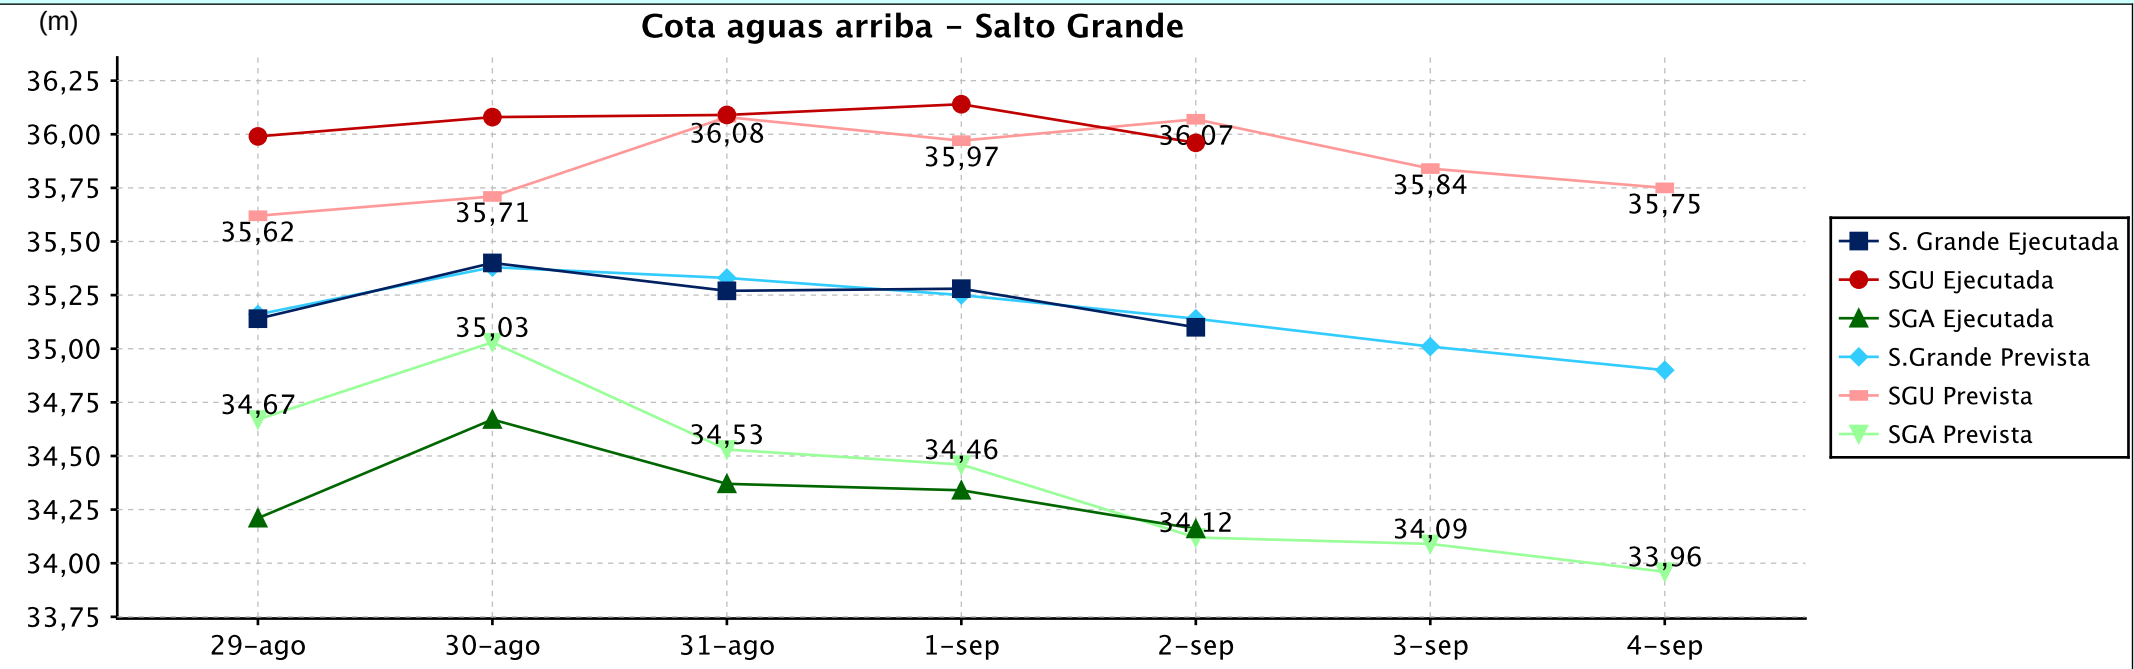

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,96
Cota Vista Arg	34,16
Cota real	35,10
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	42.336

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	683	648
Baygorria	896	875
Palmar	1.264	1.299
SGU	3.039	3.043

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	937	699
Baygorria	0	-6
Palmar	279	266
SGU	2.225	2.210

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	440	443
Baygorria	200	39
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
