




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.


viernes 04 de septiembre de 2015

Generación Térmica	
Central Battle	-7
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-3
Central La Tablada	-88
Central P. del Tigre	161
APR A	-0
APR B	-2
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
Terra	3.348
Baygorria	2.354
Palmar	7.552
Salto Grande	12.315
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores(MWh)	
Otros Generadores	4.350
TOTAL Generación	29.982

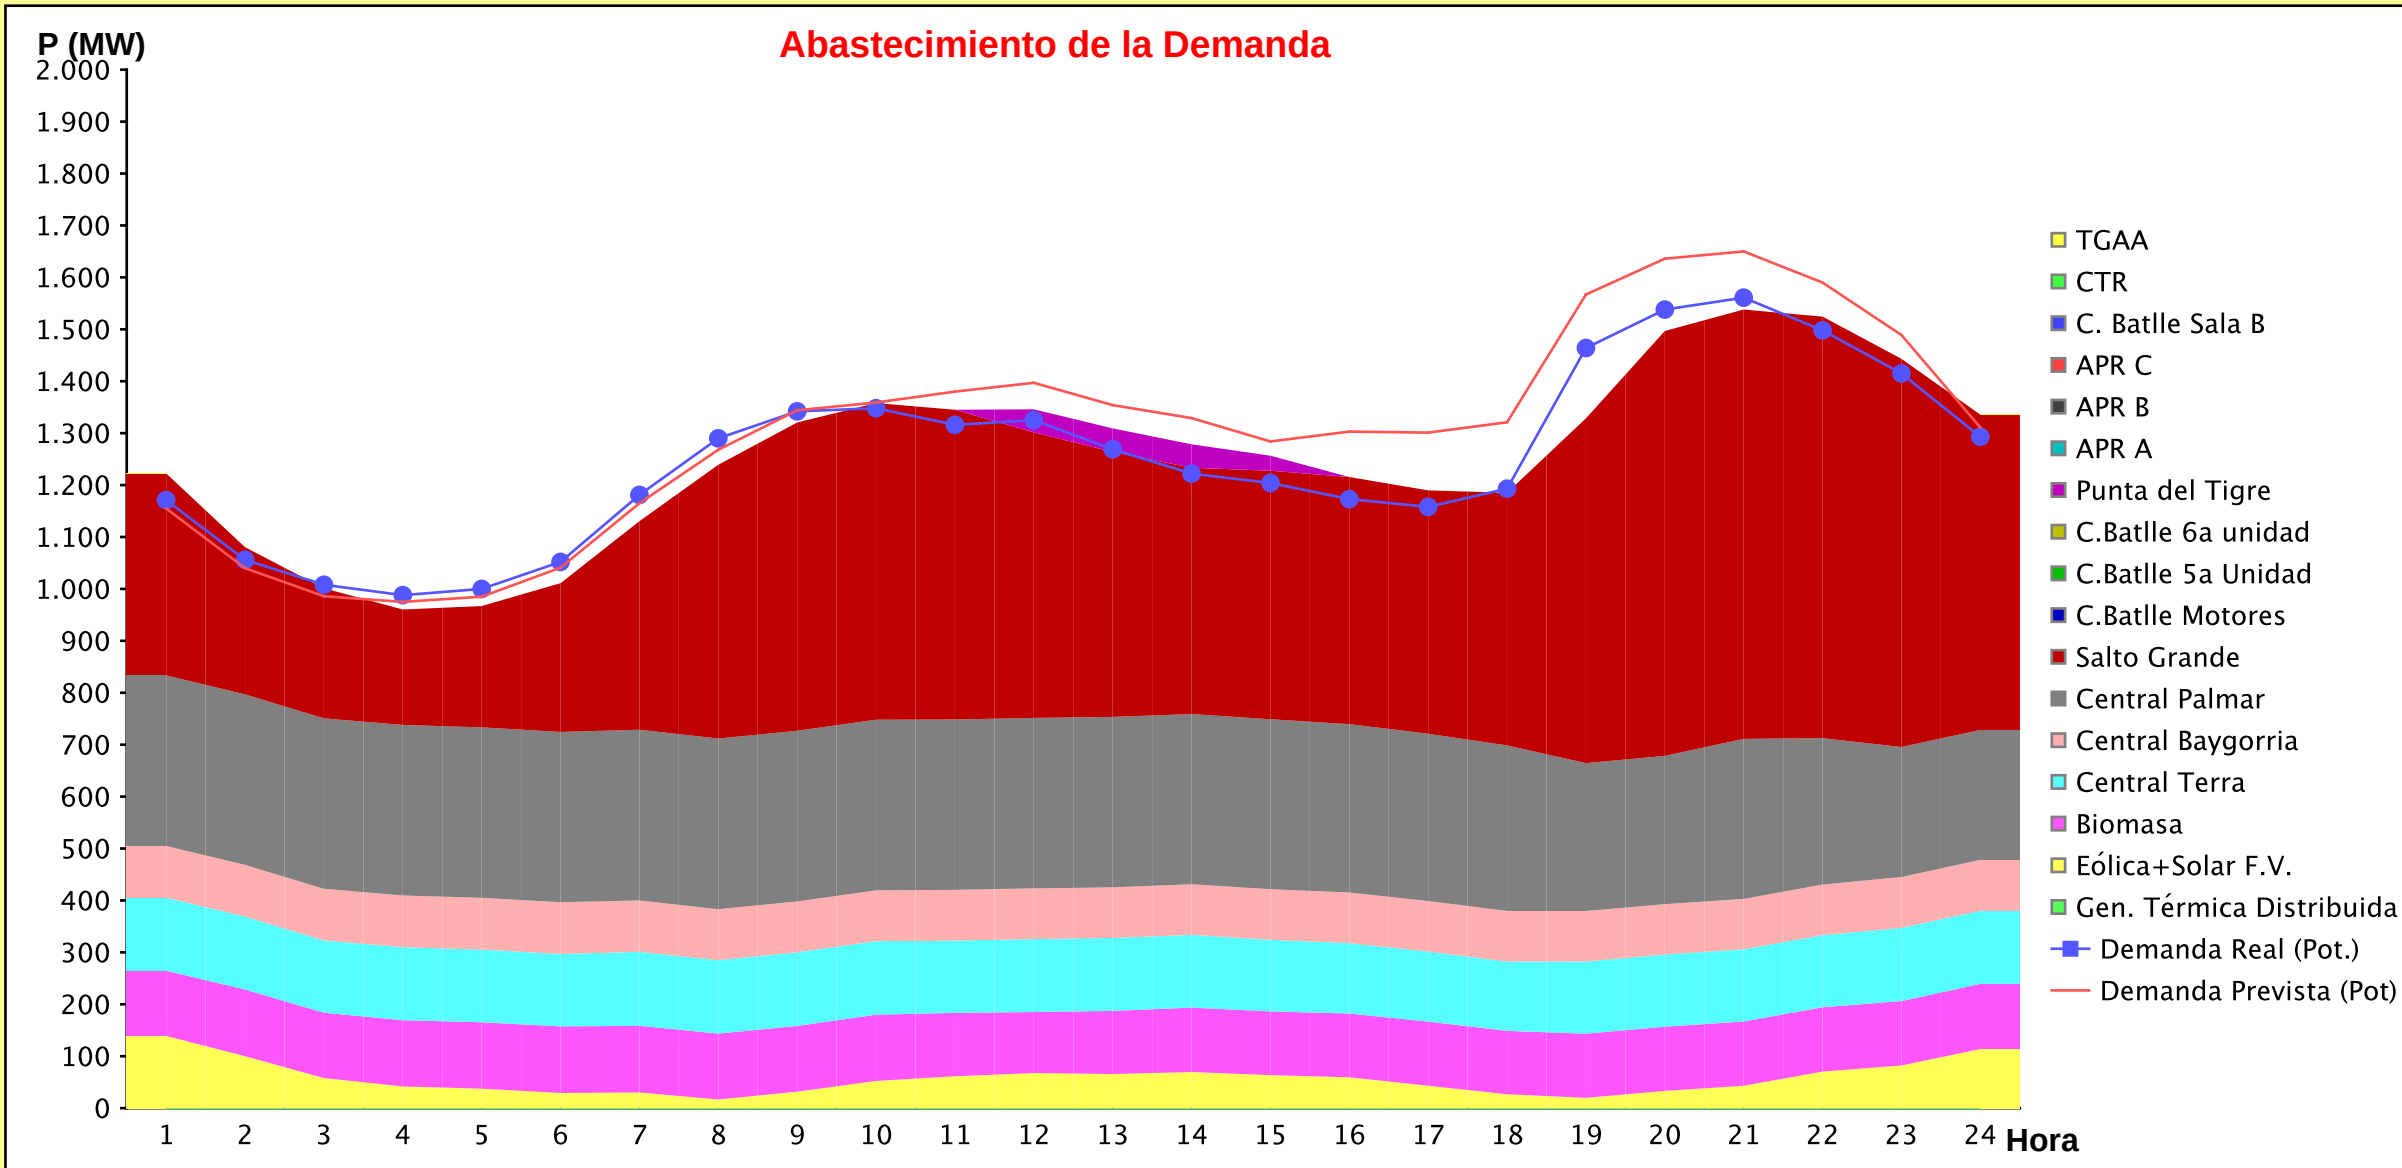




Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	29.982
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	
Demanda Programada (MWh)	31.230
Diferencia (MWh)	-1.248
Ejecutada - Programada	-4,00 %

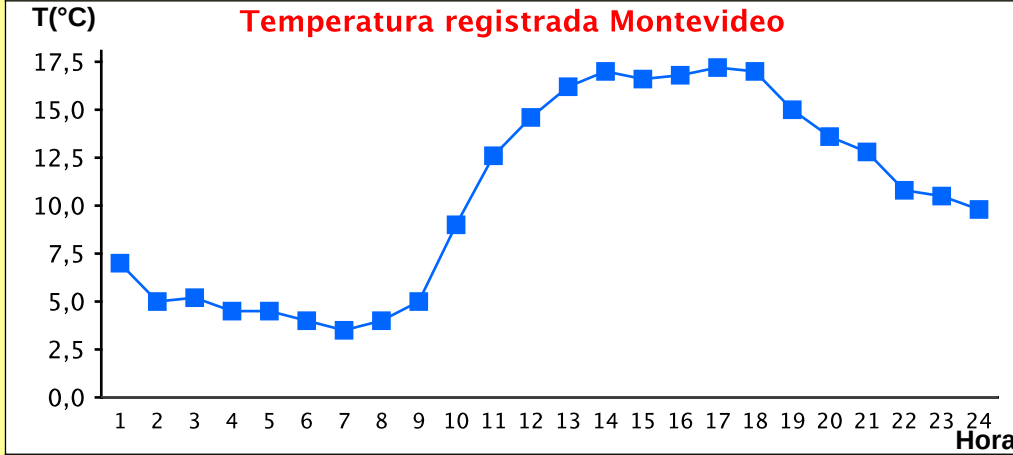



Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1386 Hora 09:27
Potencia mínima:	957 Hora 03:48
Pico noche:	1566 Hora 20:58

Generación Media (MW)	
Eólica	42,8
Biomasa	125,6
Solar fotovoltaica	16,1
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

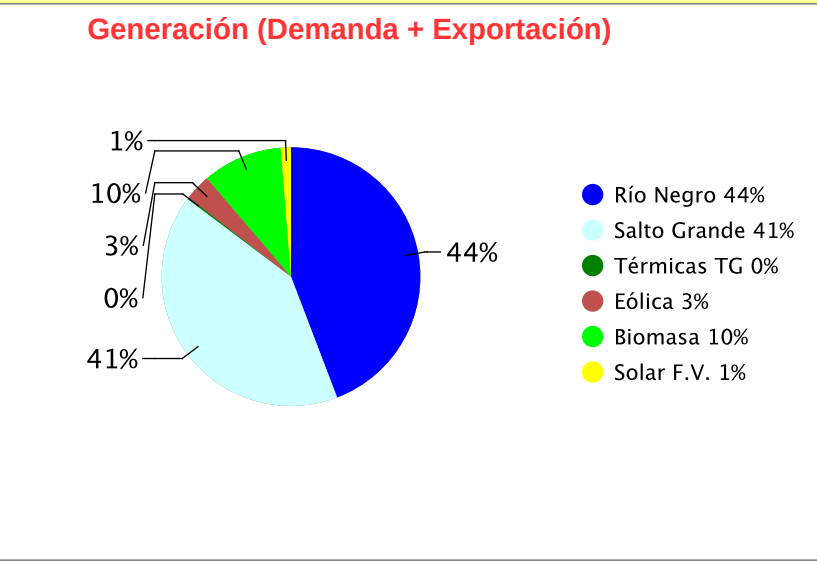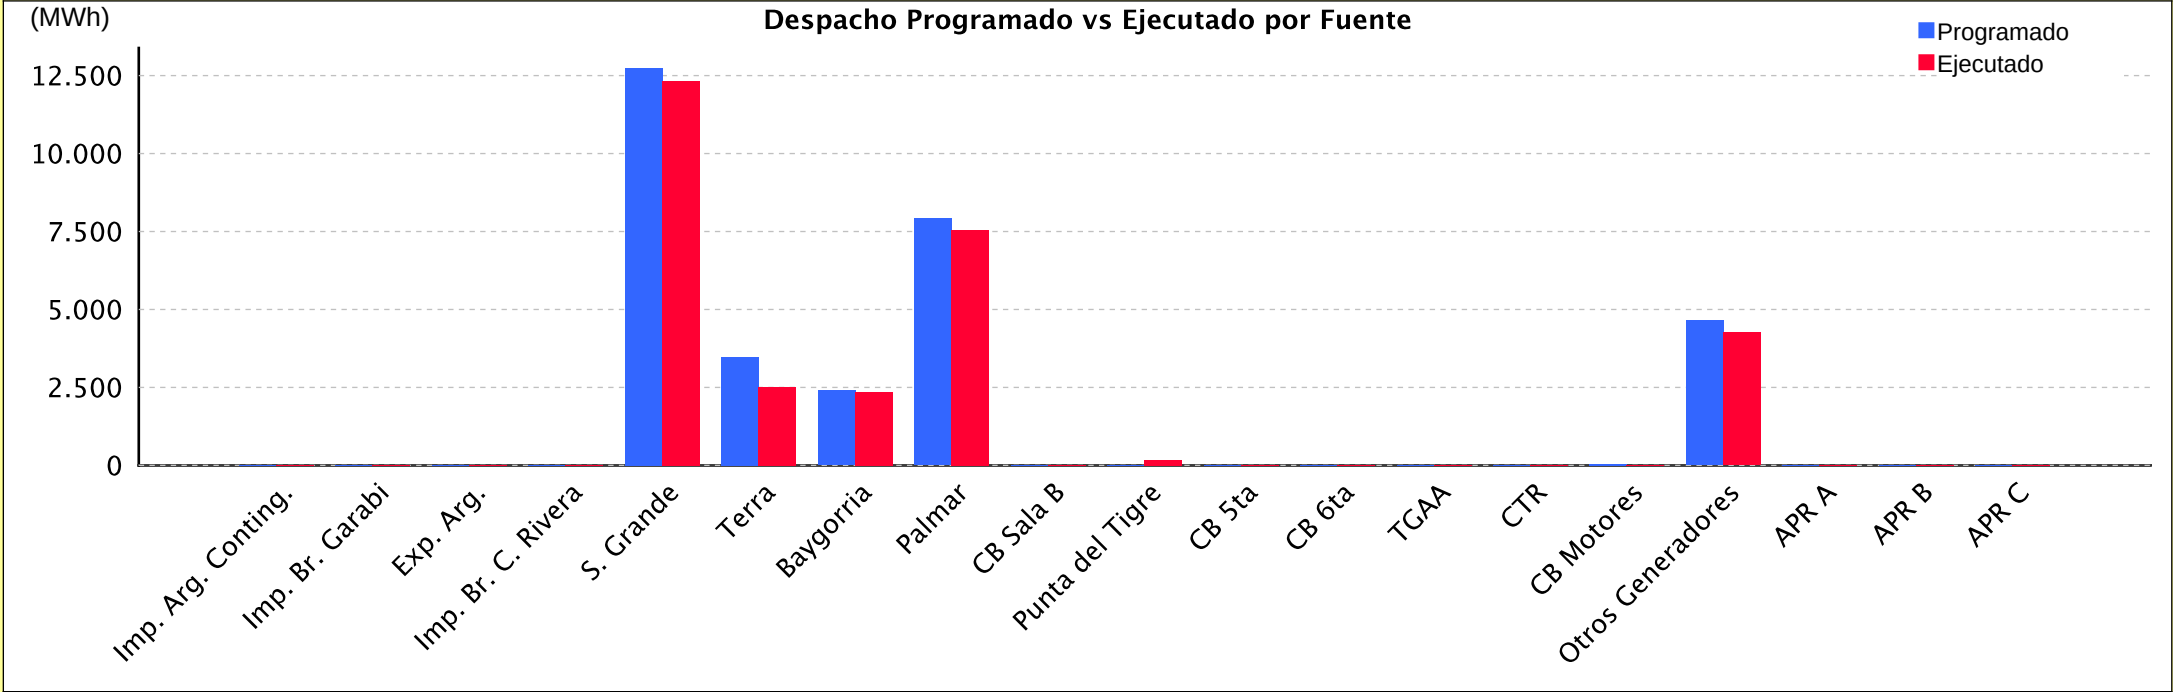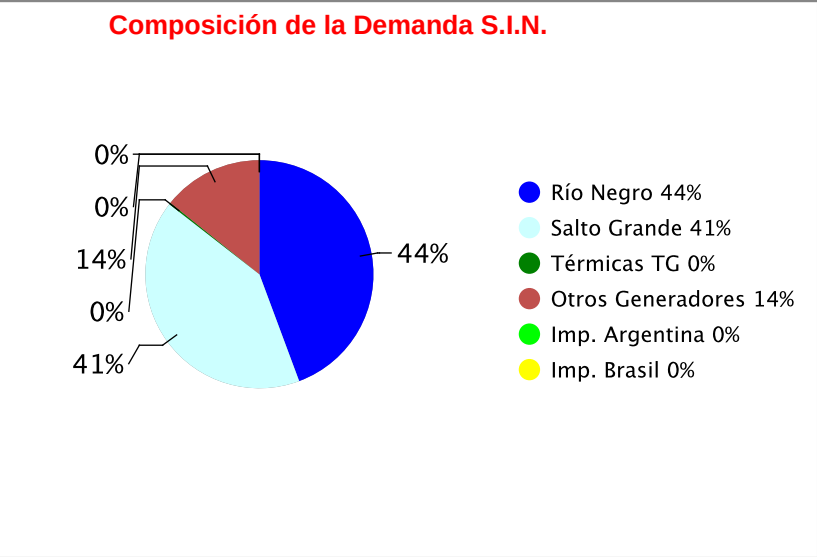



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

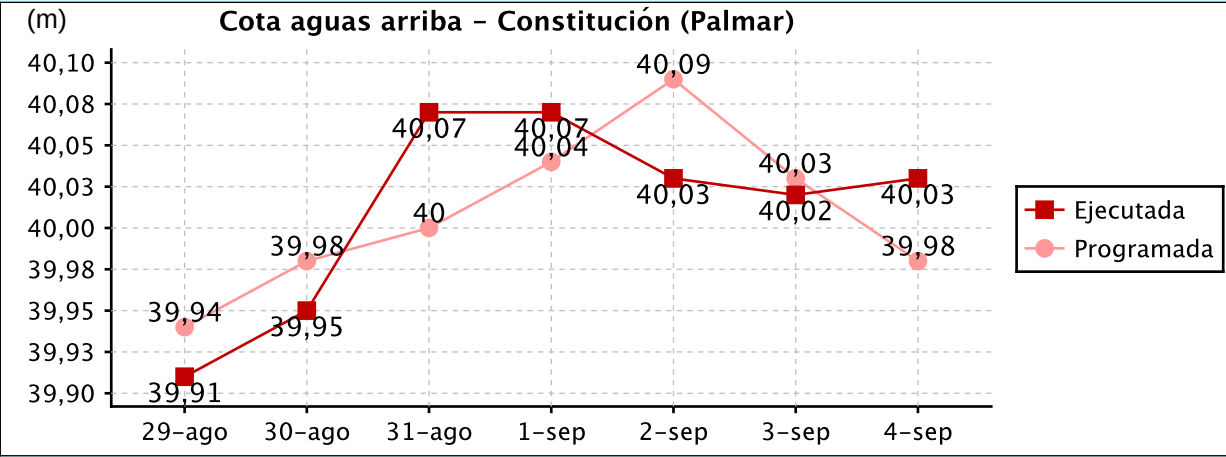
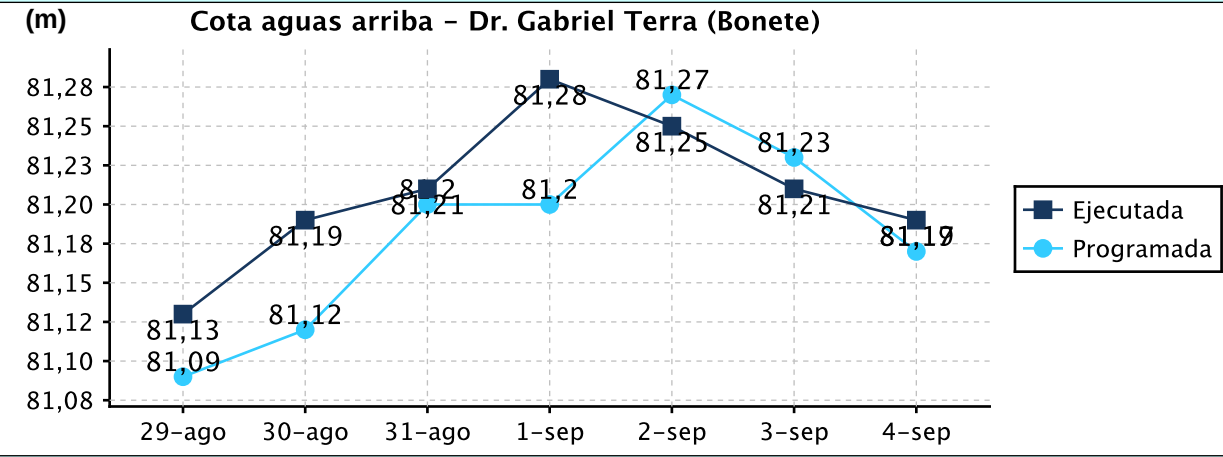


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,17	81,19
Baygorria	54,29	54,19
Palmar	39,98	40,03
SGU	35,83	35,92

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

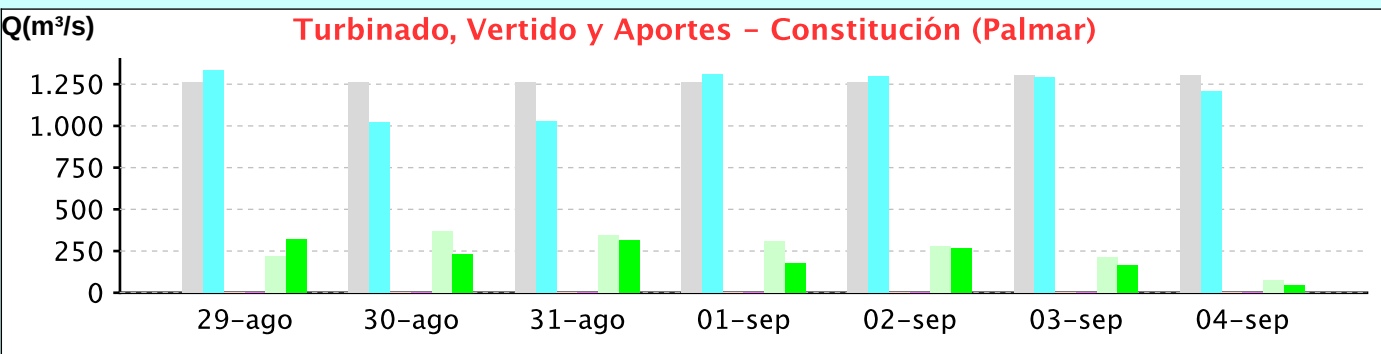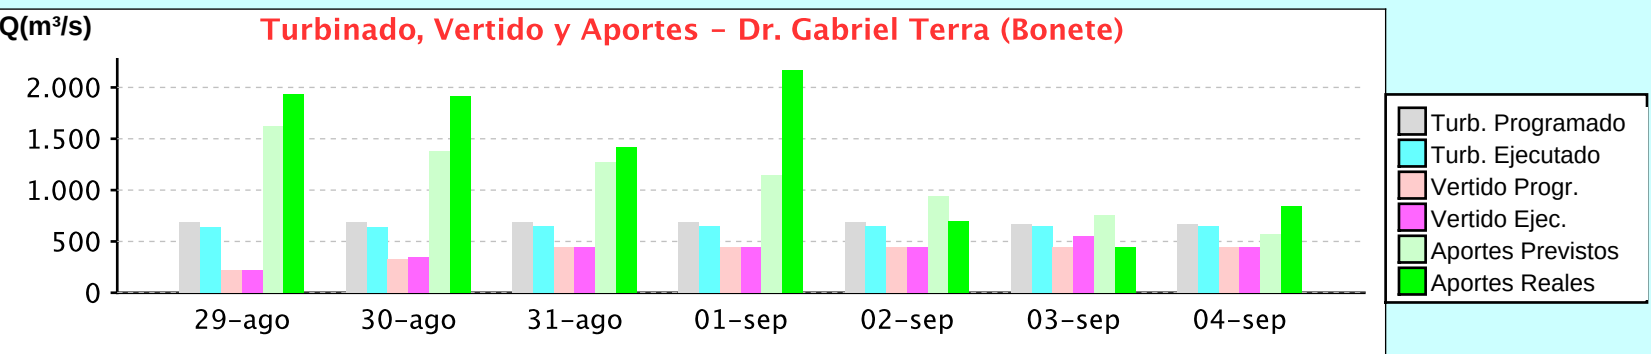

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguay y argentina) de la Represa Salto Grande

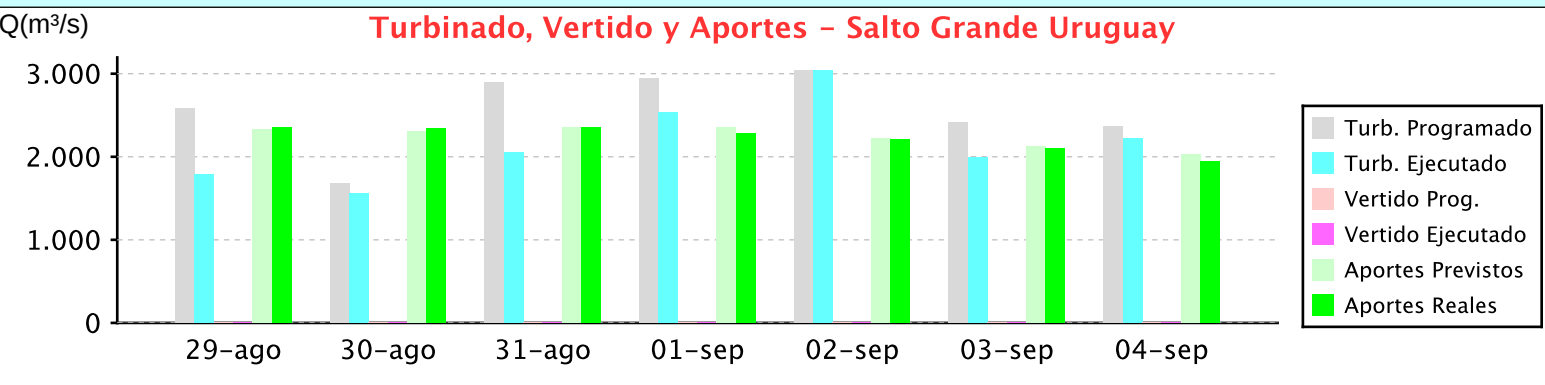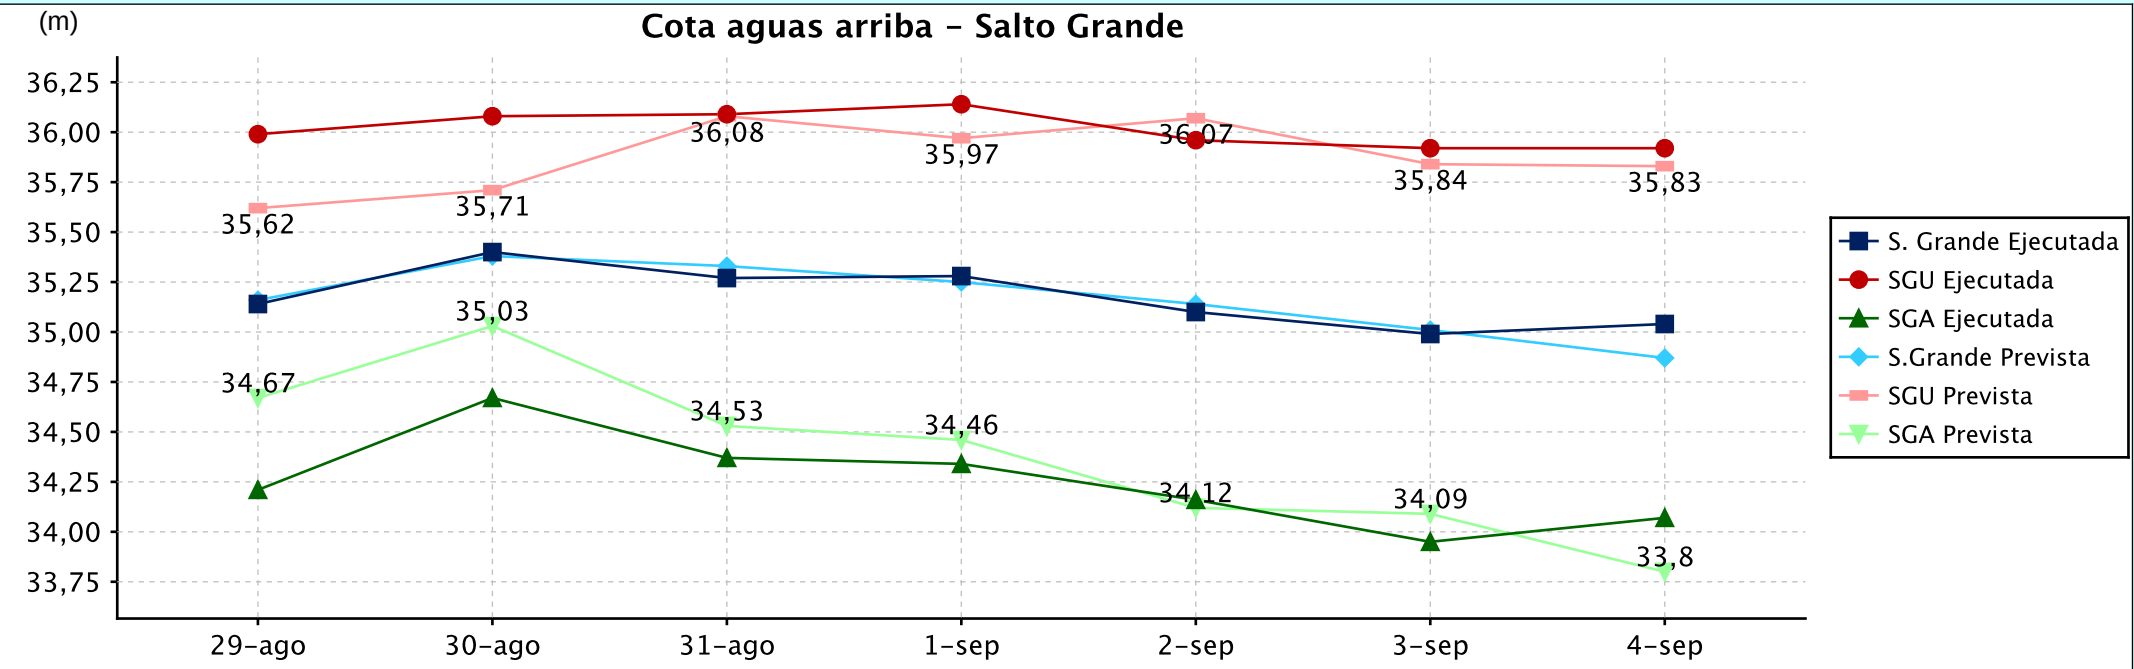

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,92
Cota Vista Arg	34,07
Cota real	35,04

Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	43.236
---------------------------------	--------

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	671	647
Baygorria	887	880
Palmar	1.304	1.211
SGU	2.369	2.223

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	568	846
Baygorria	0	39
Palmar	77	44
SGU	2.025	1.939

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	440	440
Baygorria	200	330
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
