




INFORME POST-OPERATIVO DIARIO
(prelimiar)

ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA DEL S.I.N.

sábado 05 de septiembre de 2015


Generación Térmica	
Central Battle	-4
Sala B	-4
5ta.	0
6ta.	0
Motores	-0
Central La Tablada	-89
Central P. del Tigre	-3
APR A	-0
APR B	-2
APR C	0
Central Maldonado	0
Generación Hidráulica	
Terra	3.333
Baygorria	2.352
Palmar	6.031
Salto Grande	9.547
Importación (MWh)	
Argentina	0
Contingente	0
Brasil	0
Rivera	0
SADI	0
Otros Generadores(MWh)	
Otros Generadores	6.205
TOTAL Generación	27.372

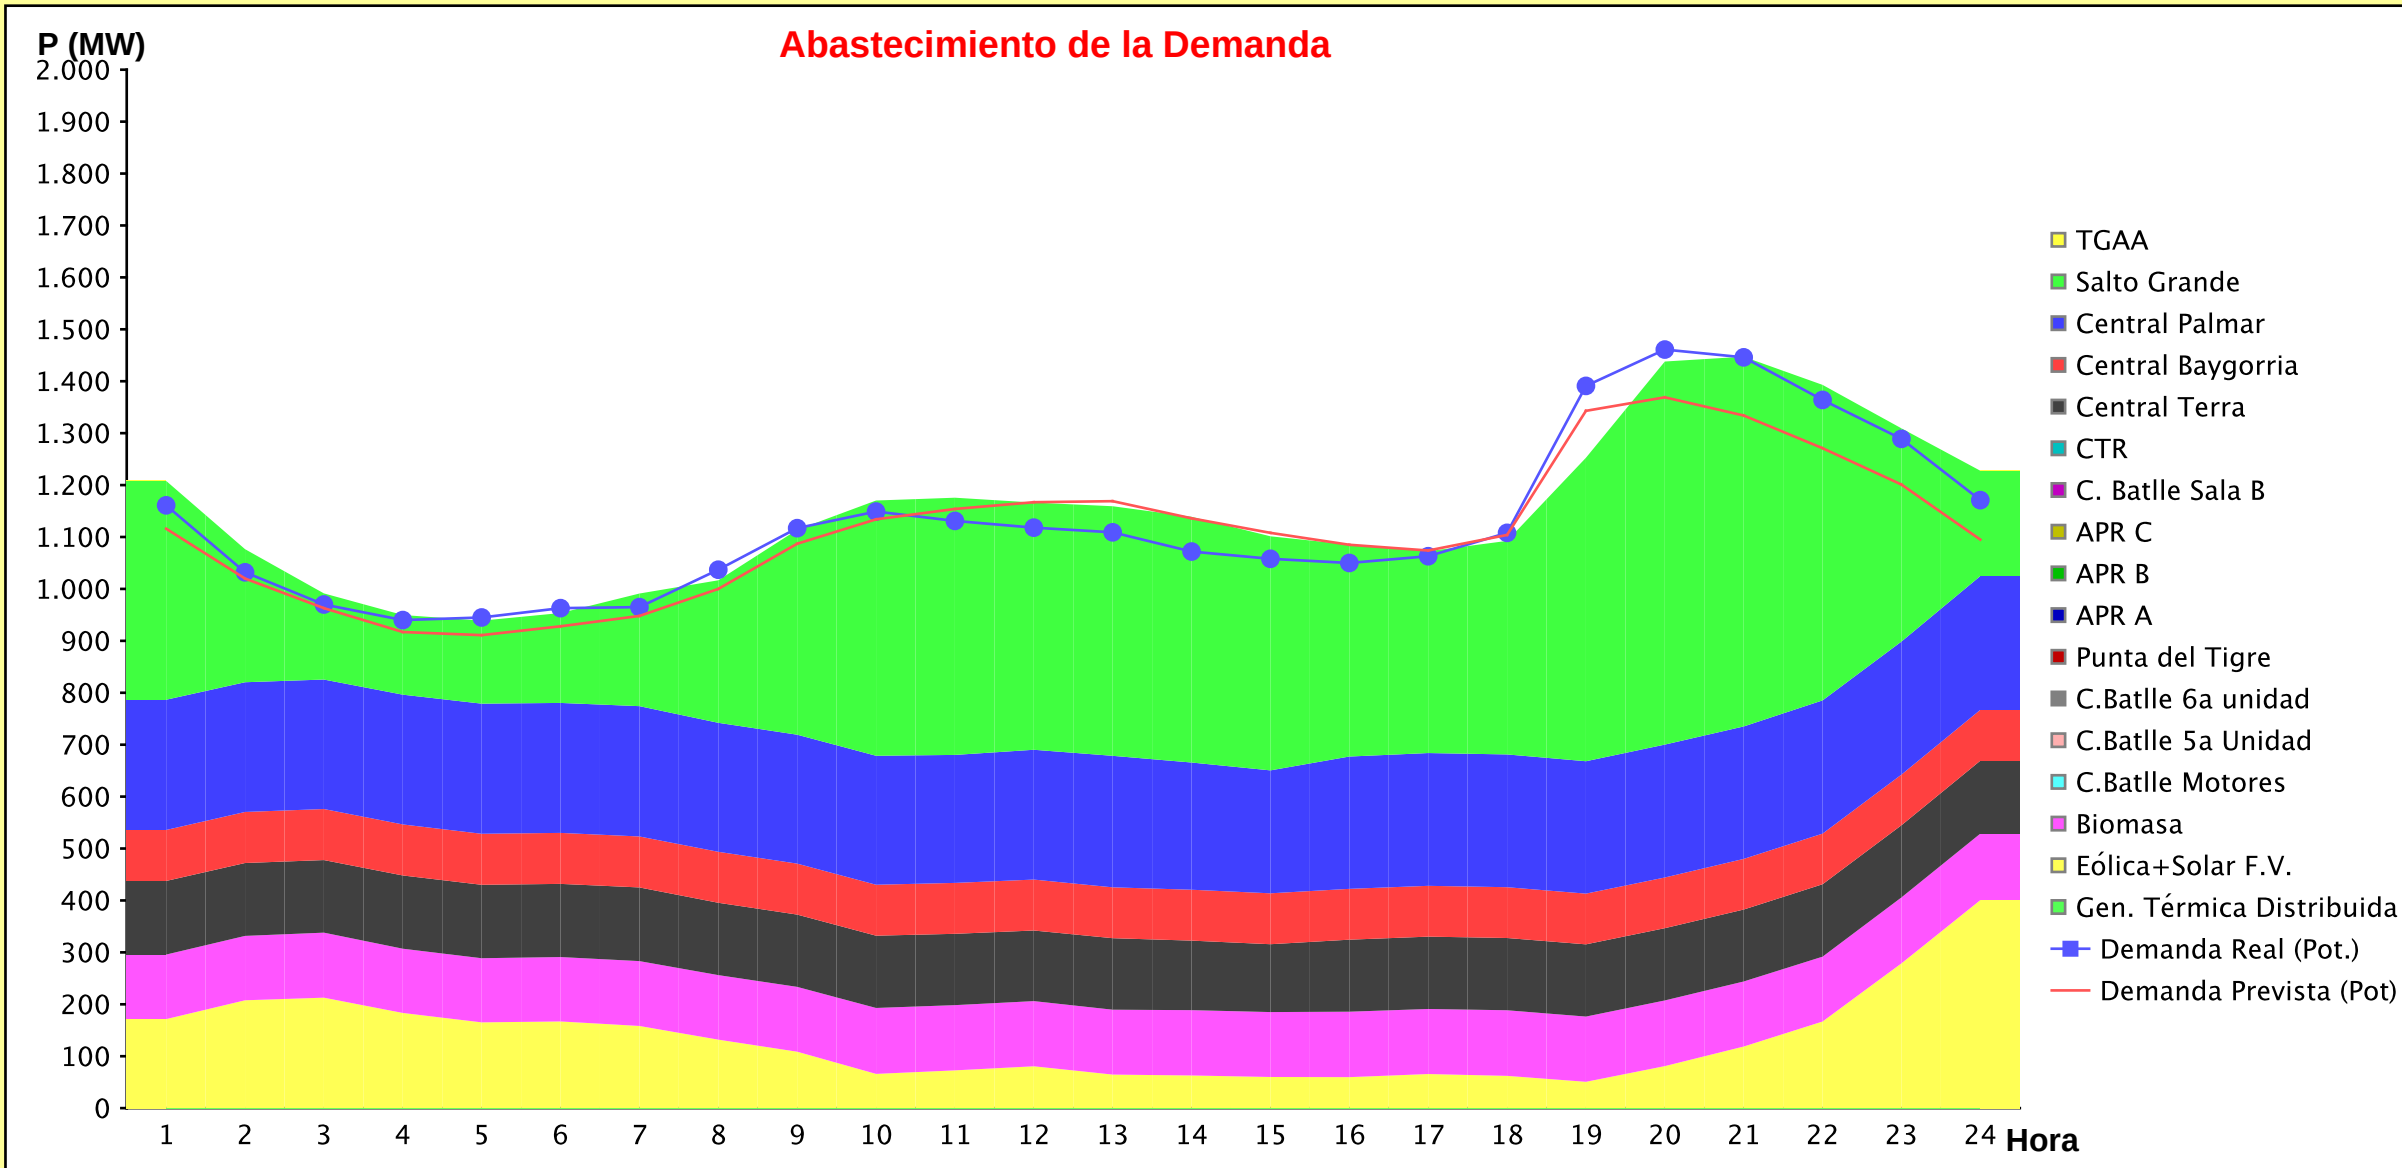

Exportación (MWh)	
Exportación a Arg.	0
Hidráulica	0
Térmica	0
Exportación a Brasil	0
TOTAL Exportación (MWh)	0

DEMANDA NETA S.I.N.(MWh)	27.372
(en bornes de generación, incluye pérdidas en la red)	


Demanda Programada (MWh)	26.634
Diferencia (MWh)	738
Ejecutada - Programada	2,77 %

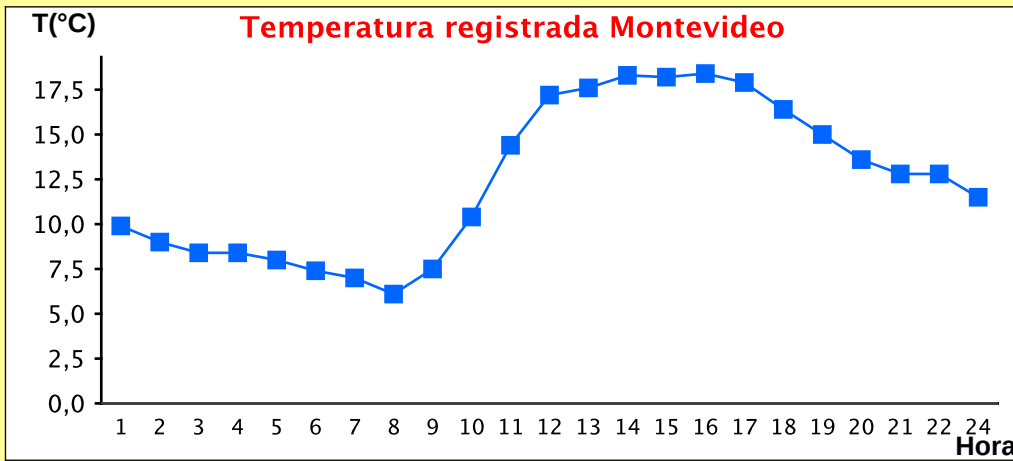

Picos de Potencia (MW)	
Pico mediodía:	1195 Hora 10:19
Potencia mínima:	942 Hora 04:30
Pico noche:	1471 Hora 20:26



Generación Media (MW)	
Eólica	118,0
Biomasa	125,9
Solar fotovoltaica	15,9
Térmica distribuida	0,0
Imp. Brasil Conversora	0,0
Imp. Argentina	0,0

Composición de la Demanda S.I.N.

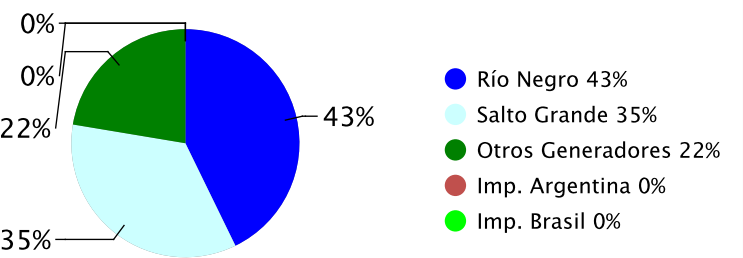



Otros Generadores incluye: generación de fuente biomasa, eólica,solar fotovoltaica y térmica distribuida

Generación (Demanda + Exportación)

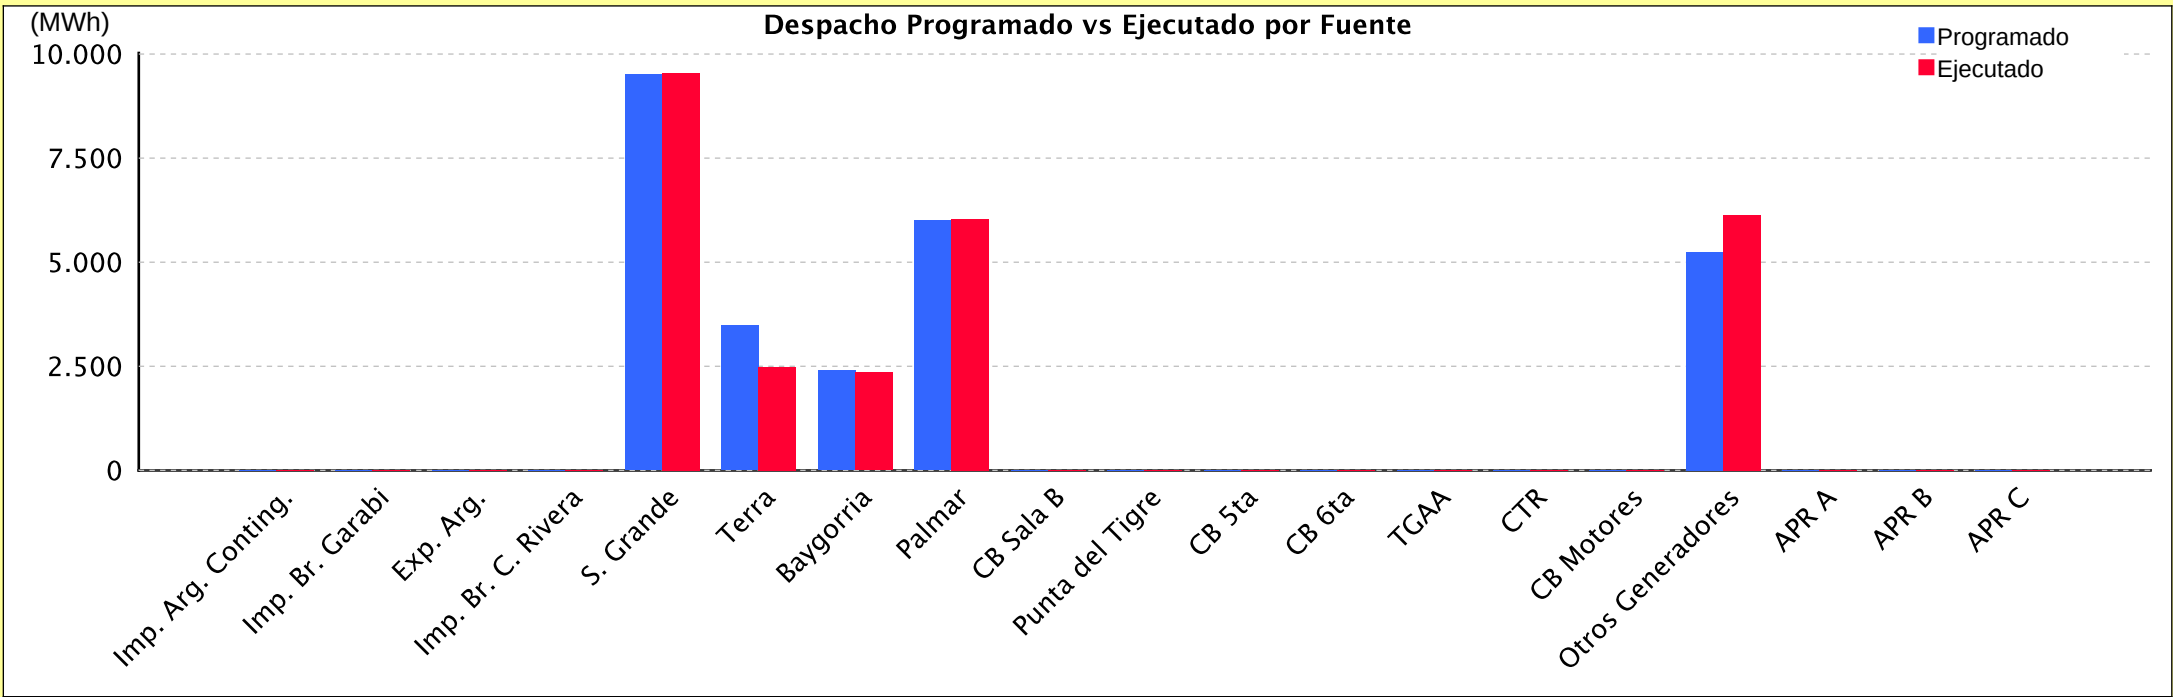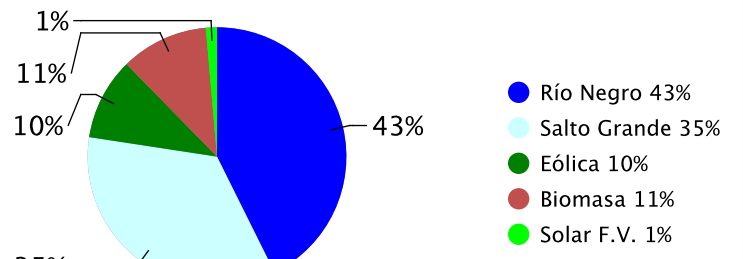



EVOLUCIÓN de los EMBALSES (Dr.G.Terra y Salto Grande)

Evolución registrada de las Cotas de las Represas Dr. Gabriel Terra y Constitución

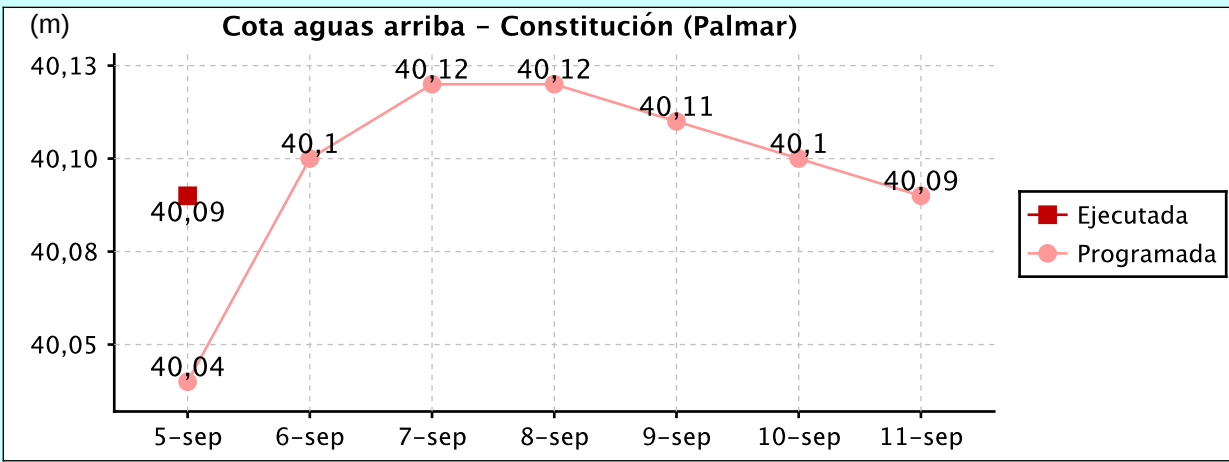
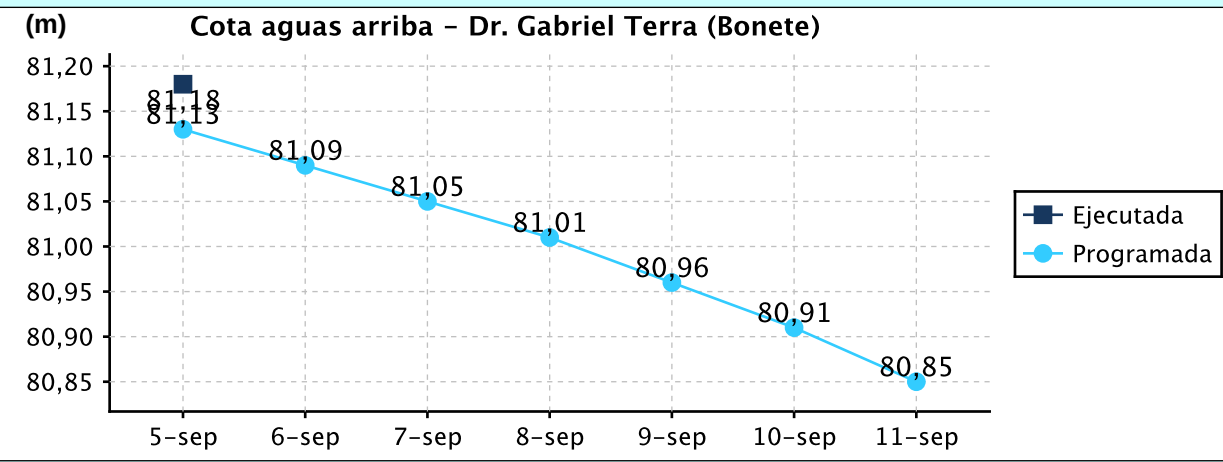


COTA FINAL	Prevista	Ejecutada
Represa	(m)	(m)
Terra	81,13	81,18
Baygorria	54,20	54,15
Palmar	40,04	40,09
SGU	35,80	35,95

Valores de Referencia (operación normal)		
Represa	Cota Min m	Cota Max m
Terra	70	80,7
Baygorria	53	54,5
Palmar	36	40
Salto Grande	30	35

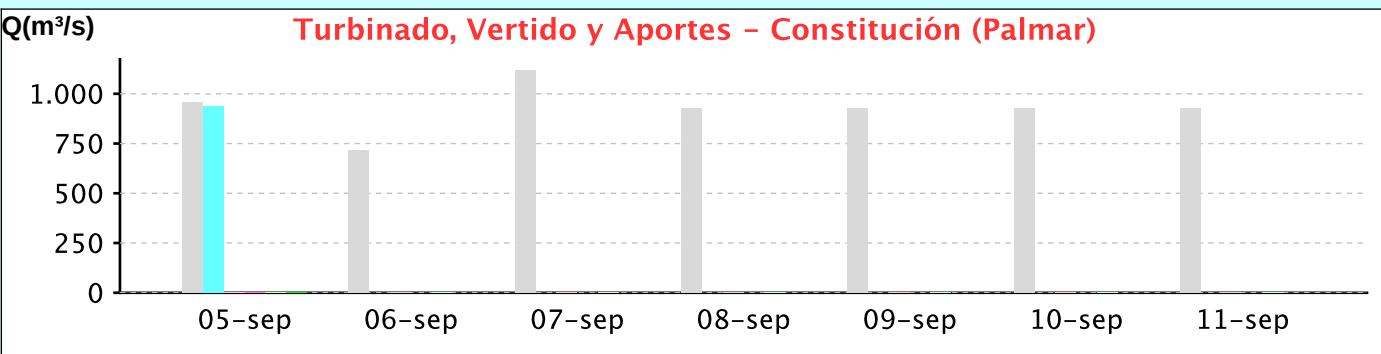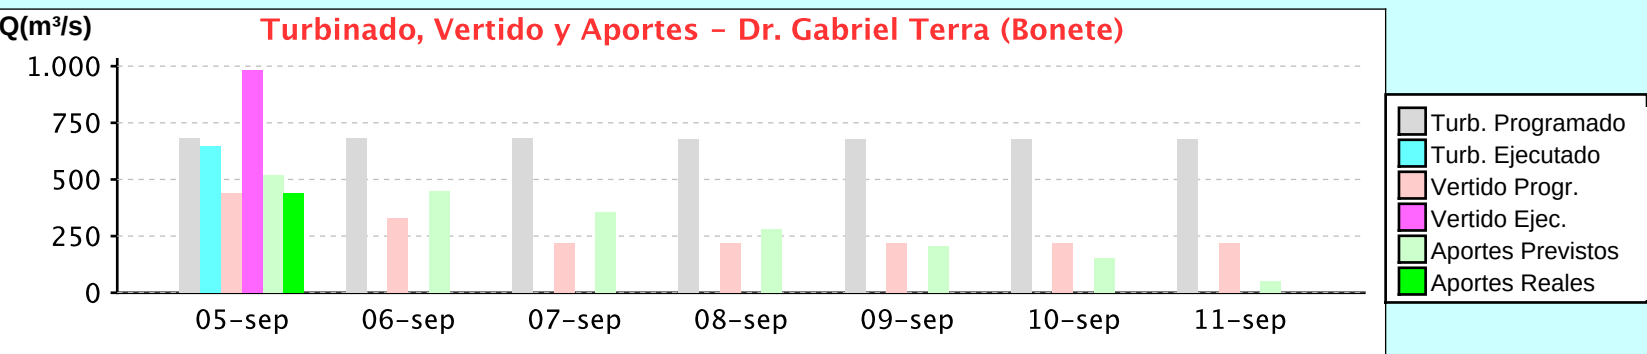

Evolución registrada de la Cota Real y Cota Vista (uruguaya y argentina) de la Represa Salto Grande

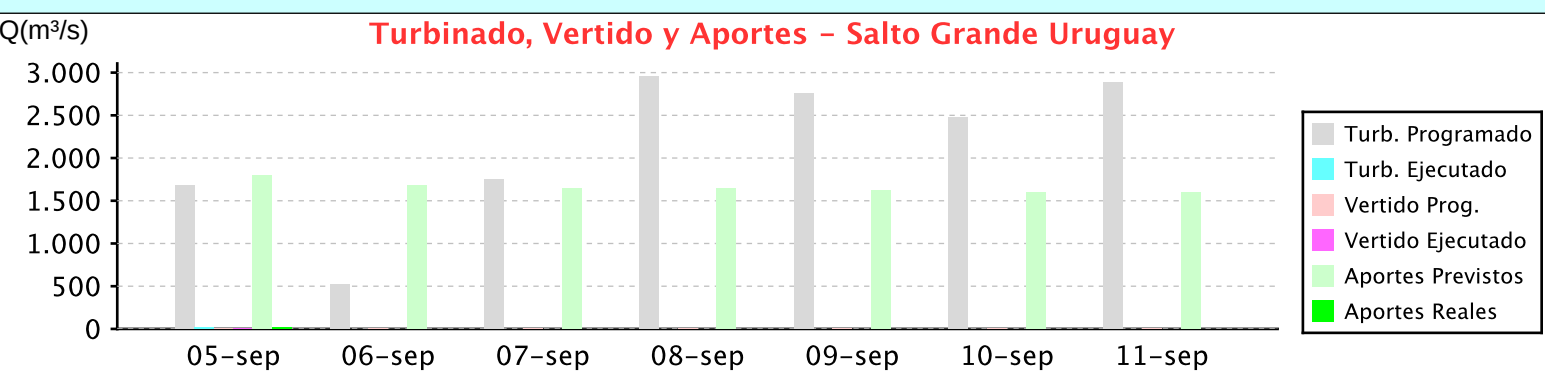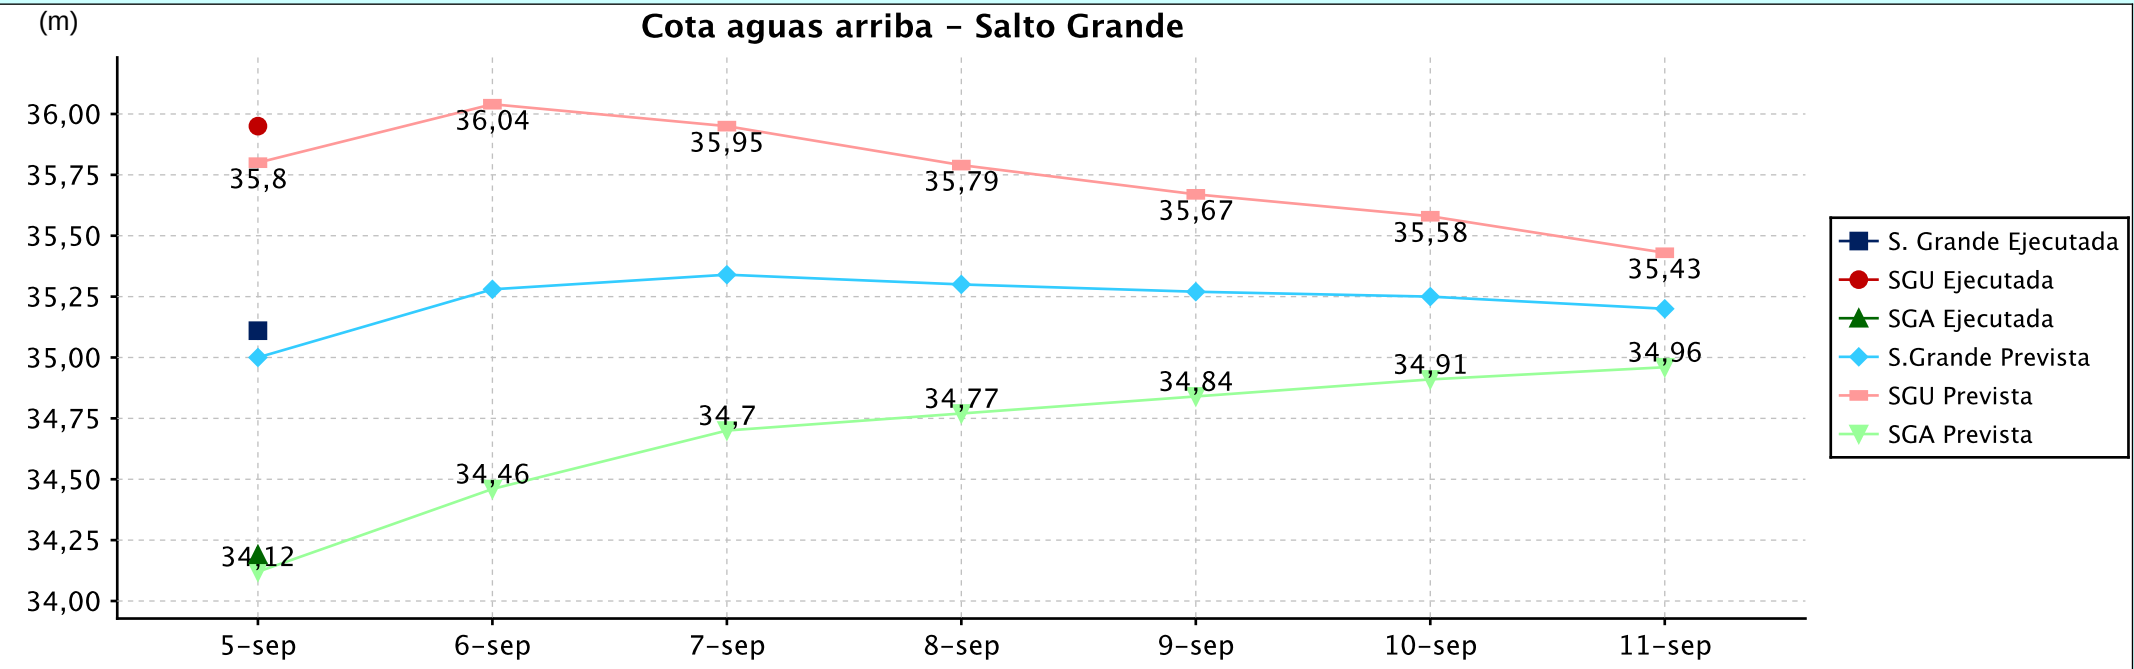

VALORES CTM	
Cotas	(m)
Cota Vista Uru	35,95
Cota Vista Arg	34,19
Cota real	35,11
Dif. Energ. (U-A) Acumulado MWh	41.366

TURBINADO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	683	645
Baygorria	896	884
Palmar	958	937
SGU	1.684	17

APORTES PROPIOS	Previstos	Reales
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	518	439
Baygorria	0	-522
Palmar	0	1
SGU	1.800	18

VERTIDO	Previsto	Ejecutado
Represa	(m³/s)	(m³/s)
Terra	440	981
Baygorria	280	269
Palmar	0	0
SGU	0	0

El aporte real se calcula a partir de la variación diaria de la cota real de la central, restando el caudal turbinado y vertido real del día.

OBSERVACIONES
